



المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

التقرير ربع السنوي
والتقرير نصف السنوي
المقدم إلى
كونغرس الولايات المتحدة

[30 تموز/يوليو 2010]

القانون العام 106-108 كما تم تعديله والقانون العام 95-452



رسالة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

يسرني أن أقدم إلى الكونغرس وإلى وزير الخارجية والدفاع التقرير ربع السنوي السادس والعشرين للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق حول وضعية الجهود الأميركية لإعادة إعمار العراق.

موضوع هذا التقرير – من نقل المسؤولية إلى تحويلها؟ - يعكس حقيقة وقوف الولايات المتحدة والعراق معاً على عتبة مجموعة واسعة من التغيرات الجوهرية والمنوعة الواضحة، والتي سوف تبدل بصورة أساسية طبيعة العلاقات الثنائية المستمرة للبلدين. ففي حين يكافح العراق لإدارة العملية السياسية الحساسة لتشكيل حكومة جديدة، لم يبق أمام الولايات المتحدة سوى أقل من شهر لإنهاء العمليات القتالية ولخفض عديد قواتها العاملة في العراق إلى أدنى مستوى له منذ ربيع ٢٠٠٣. عندما تشكلت الحكومة العراقية بنهاية المطاف، الأمر الذي لن يحصل على الأرجح قبل أيلول/سبتمبر، عليها ان تأخذ بالاعتبار مجموعة من القضايا الحرجة، من ضمنها:

- إقرار رزمة قوانين الهيدروكربون التي طال انتظارها.
- توضيح العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية، وعلى الأخص في ما يتعلق بكركوك.
- إجراء إحصاء على المستوى القومي.
- دمج المتمردين السنة السابقين في الحكومة العراقية.
- إصلاح الأنظمة القانونية والتنظيمية، ولا سيما تلك المتعلقة بمكافحة الفساد.
- التحرك فُدماً باتجاه الخصخصة.

في أيار/مايو، سافرت إلى العراق للمرة السابعة والعشرين، للتحقيق في تشكيلة منوعة من قضايا نقل المسؤولية وتحويلها مع كبار القادة الأميركيين والعراقيين. لقد حصلت على إيجاز حول عملية نقل مهمة تدريب الشرطة الفائقة الأهمية من وزارة الدفاع (DoD) إلى وزارة الخارجية (DoS)، وهي مهمة مبرمجة للإنجاز بحلول تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١. سوف تستهلك مهمة تدريب الشرطة أكبر جزء من أموال إعادة إعمار العراق خلال السنتين القادمتين. ويجري مكتب المفتش العام حالياً تدقيقاً حول ممارسات إدارة وزارة الخارجية لعملية تدريب الشرطة، ونتوقع إصدار تقريرنا في تشرين الأول/أكتوبر.

خلال وجودي في بغداد، تابحت، من بين آخرين، مع حاكم البنك المركزي العراقي، وكبار المسؤولين في هيئات مكافحة الفساد في العراق، من ضمنهم مفوض النزاهة، ورئيس المجلس الأعلى للتدقيق، وعدة مفتشين عامين للوزارات. هذه الاجتماعات أثارت موضوعاً متكرراً وهو – انتشار الفساد العام وأثاره المؤذية على التنمية السياسية والاقتصادية للعراق. بدأت الحكومة العراقية مؤخراً تطبيق إستراتيجيتها الجديدة لمكافحة الفساد التي تم تطويرها بدعم من الأمم المتحدة. هذه الخطة طموحة ومثيرة للإعجاب، لكن لا زالت هناك حاجة إلى عمل الكثير لتحقيق ما يحتاجه العراق من المساءلة والشفافية الضروريين.

خلال ربع السنة الحالي، واصل مُحققو المفتش العام متابعة أكثر من ١٠٠ قضية مفتوحة، لمتابعة الدلالات حولها في الولايات المتحدة والعراق وأماكن أخرى في العالم. شملت إنجازات التحقيق الجديرة بالذكر:

- اتهام واعتقال موظف سابق في وزارة الخارجية وجهت إليه تهمة احتيال بريدي بقيمة ١٤٧,٠٠٠ دولار.
- اتهام رائد في سلاح مشاة البحرية الأميركية ب ٢٢ تهمة تتعلق بأفعال غير قانونية خلال إشغاله وظيفة ضابط المشتريات في برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.
- تقديم معلومات جنائية تتهم موظفاً سابقاً في شركة بناء أميركية بالتآمر للاحتيال على الحكومة الأميركية.


- إدانة رقيب أول في سلاح مشاة البحرية الأميركية بتلقي رشوى وابتزاز أموال مقابل منح وإدارة عقود إعادة إعمار.
- الحكم بالسجن لمدة ٣٠ شهراً على نقيب في الجيش الأميركي لسرقته أموالاً من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.

أنتجت مديرية التدقيقات التابعة للمفتش العام خمسة تقارير خلال ربع السنة الحالي، أخذت ثلاثة منها خطوة إلى الوراء بدلاً من النظر في برنامج أو مشروع محدد، وقامت بالنظر في المسائل الأوسع المتعلقة بإدارة الإشراف على جهود إعادة الإعمار. راجعت التقارير ما يلي:

- **إدارة وزارة الدفاع لصندوق تنمية العراق (DFI).** درس المفتش العام الرقابة المالية والإدارية لوزارة الدفاع (DoD) في استخدام أموال صندوق تنمية العراق ووجد ان الضعف في الرقابة الداخلية لوزارة الدفاع تركها غير قادرة على تقديم بيان محاسبي حول ٨,٧ مليار دولار من أصل ٩,١ مليار دولار تلقتها لنشاطات إعادة الإعمار.
- **السياسة التي أتبعها وزارة الدفاع (DoD) ووزارة الخارجية (DoS) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في إدارة السجلات لحفظ بيانات إعادة إعمار العراق.** استنتج هذا التدقيق انه بينما كان لدى الوكالات الثلاث سياسات لإدارة السجلات، فان هذه السياسات لم تطبق بالكامل لأجل حفظ سجلات إعادة إعمار العراق. لدى المفتش العام قلق محدد حول غياب التقدم في عملية الحفاظ على المعلومات المتعلقة بالبرامج والمشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) ومن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- **استخدام وزارة الخارجية (DoS) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لأموال صندوق دعم الاقتصاد في العراق (ESF).** حدّد تدقيق المفتش العام ان معظم أموال صندوق دعم الاقتصاد المخصصة للاستخدام في العراق قد ألزمت وتمت تصفيتهما. تلقت وزارة الخارجية حوالي ١,٤٠ مليار دولار من أموال صندوق دعم الاقتصاد بين السنوات المالية ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨، تم إلزام ٩٩ بالمئة منها وتصفية قرابة ٧٥ بالمئة. اما بالنسبة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فقد تلقت حوالي ٢,٣٣ مليار دولار من أموال صندوق دعم الاقتصاد بين السنوات المالية ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩، وقد تم إلزام حوالي ٩٥ بالمئة منها وتمت تصفية ٨٣ بالمئة منها.

قيّم التدقيقان الآخران:

- **إدارة وزارة الخارجية لهبة بقيمة ٥٠ مليون دولار للمعهد الجمهوري الدولي (IRI) لنشاطات بناء الديمقراطية.** استنتج المفتش العام هنا ان إشراف وزارة الخارجية غير الكافي والتقيّد الضعيف للمعهد الجمهوري الدولي (IRI) بالشروط الفدرالية وشروط وزارة الخارجية الخاصة بالهبات مجتمعة تركت الحكومة الأميركية مع تبصر محدود حول ما تم تحقيقه فعلاً، باستثناء تنظيم ٢٧١ صف تدريب لحوالي ٥٠٠٠ عراقي.
 - **تدقيق المفتش العام الشرعي لكافة الأموال التي تم توفرها لإعادة إعمار العراق.** منذ بداية هذه المبادرة، درس المفتش العام ١٠٨,٠٠٠ معاملة مالية مقدرة بحوالي ٣٥,٨ مليار دولار وكشف معلومات أدت إلى فتح ٤٩ تدقيقاً جنائياً جديداً.
- يظهر التقرير ربع السنوي هذا بوضوح ان حجم ونطاق الالتزام الأميركي في العراق هو قيد التطور، وهو على تناقص، كما يجب أن يكون. غير ان الحاجة إلى إشراف قوي لا تزال قائمة. لذلك، فاني والعاملين معي نواصل التزام حماية مصالح دافعي الضرائب ضمن برامج العراق عن طريق منع، وكشف، وردع الهدر والاحتيايل وسوء الاستخدام، كما وتطبيق الدروس القاسية التي تم تعلمها في تحسين الانخراط المتواصل للولايات المتحدة في "بلاد ما بين النهرين".
- قدم بكل احترام في هذا اليوم الثلاثين من تموز/يوليو ٢٠١٠.



ستيوارت دبليو بووين جونيور
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
اعتباراً من ٣٠ تموز/يوليو ٢٠١٠

عمليات التدقيق

١٧١	التقارير الصادرة
٤٢٨	التوصيات الصادرة
\$١٥١,٤١	الأموال التي تم توفيرها واستعادتها (ملايين الدولارات)
\$٦٧٨,٣٢	الأموال التي أعيد استخدامها بصورة أفضل (ملايين الدولارات)
\$٣٨,٦٥	المدفوعات المشكوك بأمورها (ملايين الدولارات)

عمليات التفتيش

١٧٠	تقييمات المشاريع الصادرة
٩٦	التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقع
٨٧١	تقييمات صور الأقمار الصناعية

التحقيقات

٥١٤	التحقيقات التي بوشر بها
٤٠٢	التحقيقات التي أقيمت أو أحييت
١١٢	التحقيقات المفتوحة
٢٩	الاعتقالات
٤٣	الادعاءات
٣٤	الإدانات القضائية
\$٧٠,٧٢	قيمة الأصول المسترجعة أو المصادرة (النتائج النقدية) (ملايين الدولارات)

الاتصالات عبر الخط المباشر اعتباراً من ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠

١٨	الفاكس
٧٨	الهاتف
١١٢	حضور شخصي
٣٨٢	رسائل إلكترونية
٢٦	الإحالات
٢٨	البريد
١٥٩	عبر موقع المفتش العام على شبكة الانترنت
٨٠٣	مجموع الاتصالات عبر الخط المباشر

منتجات غير تدقيقية

٢٩	شهادات أمام الكونغرس
٥	التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة

القسم الثالث

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
عمليات التدقيق الشرعية للمفتش العام حول نفقات الوكالات ومبادرة التحقيقات/التدقيقات المسبقة
عمليات التدقيق للمفتش العام
تحقيقات المفتش العام
تقييمات المفتش العام
خط الاتصال المباشر للمفتش العام
موقع المفتش العام على شبكة الإنترنت
تحديث معلومات التشريعات

القسم الرابع

إشراف الوكالات الأخرى
مقدمة
عمليات تدقيق الوكالات الأخرى
تحقيقات الوكالات الأخرى

الهوامش

مختصرات وتعريفات

القسم الأول

ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
من نقل المسؤولية إلى تحويلها؟
تحديث معلومات التمويل
تحديث معلومات إعادة الإعمار
خطة التنمية الوطنية العراقية الجديدة
الكشف عن إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية في العراق (UNDAF)
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
الأمن
النمو الاقتصادي
قطاع النفط
النقص في إمدادات الكهرباء والاحتجاجات
مكافحة الفساد
إشراف المفتش العام
الكلفة البشرية

القسم الثاني

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها
مصادر التمويل
إدارة تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها
الأمن
البنية التحتية
نظام الحكم
الاقتصاد

* النص الكامل لصيغة التقرير ربع السنوي هذا للمفتش العام لإعادة إعمار العراق متوفر على موقع المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق SIGIR على شبكة الإنترنت www.sigir.mil . وهو النص الرسمي للتقرير الذي يحتوي على كافة الملحقات والتصحيحات.

الملحقات

ملحقات التقرير ربع السنوي هذا ليست مشمولة في النص المطبوع لهذا التقرير. انها مطبوعة على موقع المفتش العام على شبكة الانترنت www.sigir.mil.

الملحق أ – الإسنادات الترافقية لصفحات هذا التقرير مع المتطلبات القانونية لرفع تقارير المفتش العام بموجب القسم 3001 من القانون العام 106-108 كما هو مُعدل، وقانون المفتش العام لسنة ١٩٧٨، كما هو مُعدل.

الملحق ب - الإسنادات الترافقية لمصطلحات الموازنة المترافقة مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، والدعم الدولي لإعادة إعمار العراق.

الملحق ج - الإسنادات الترافقية لمشاريع وبرامج الوكالات الأميركية المختلفة ضمن القطاعات المحددة للمفتش العام.

الملحق د – تقارير حول المساهمات الدولية في جهود إعادة إعمار العراق.

الملحق هـ - يحتوي على قائمة عمليات التفتيش المكتملة للمفتش العام حول نشاطات إعادة إعمار العراق.

الملحق و – يحتوي على قائمة شاملة لحالات التعليق والحظر لمقاولي عقود إعادة إعمار العراق أو عقود دعم الجيش في العراق والكويت.

الملحق ز – يقدم ملخصات لعمليات التدقيق والمراجعات المنجزة والجارية على يد الوكالات الأميركية الأخرى حول برامج ونشاطات إعادة إعمار العراق.

الملحق ح – يحتوي على قائمة عمليات التدقيق والتقارير والشهادات المنجزة حول نشاطات إعادة إعمار العراق التي أصدرها المفتش العام ووكالات التدقيق الأميركية الأخرى.

ملاحظات

المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

من نقل المسؤولية إلى تحويلها؟
تحديث معلومات التمويل الأميركي
تحديث معلومات إعادة الإعمار
خطة التنمية الوطنية العراقية الجديدة
الكشف عن إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية في العراق (UNDAF)
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة
الأمن
النمو الاقتصادي
قطاع النفط
العجز في إمدادات الكهرباء والاحتجاجات
مكافحة الفساد
إشراف المفتش العام
الكلفة البشرية

القسم


١

من نقل المسؤولية إلى تحويلها؟

بعد شهر ويوم من تاريخ إصدار هذا التقرير، سوف تُنهي الولايات المتحدة رسمياً مهمتها القتالية في العراق، مُخفّضة وجود قواتها ضمن البلاد إلى أقل من ٥٠,٠٠٠ جندي - أدنى مستوى منذ نيسان/أبريل ٢٠٠٣. هذا الحدث التاريخي الذي يقع في ٣١ آب/أغسطس سوف يميّز بإعادة تسمية "عملية حرية العراق"، باسم "عملية الفجر الجديد". التسمية الجديدة تعكس الطبيعة المتطورة للعلاقات بين الولايات المتحدة والعراق. أنظر الشكل ١-١ لتحديث للمؤشرات الرئيسية.

الشكل ١-١

لوحة المؤشرات الرئيسية، ربع السنة الحالي مقابل ربع السنة الأعلى

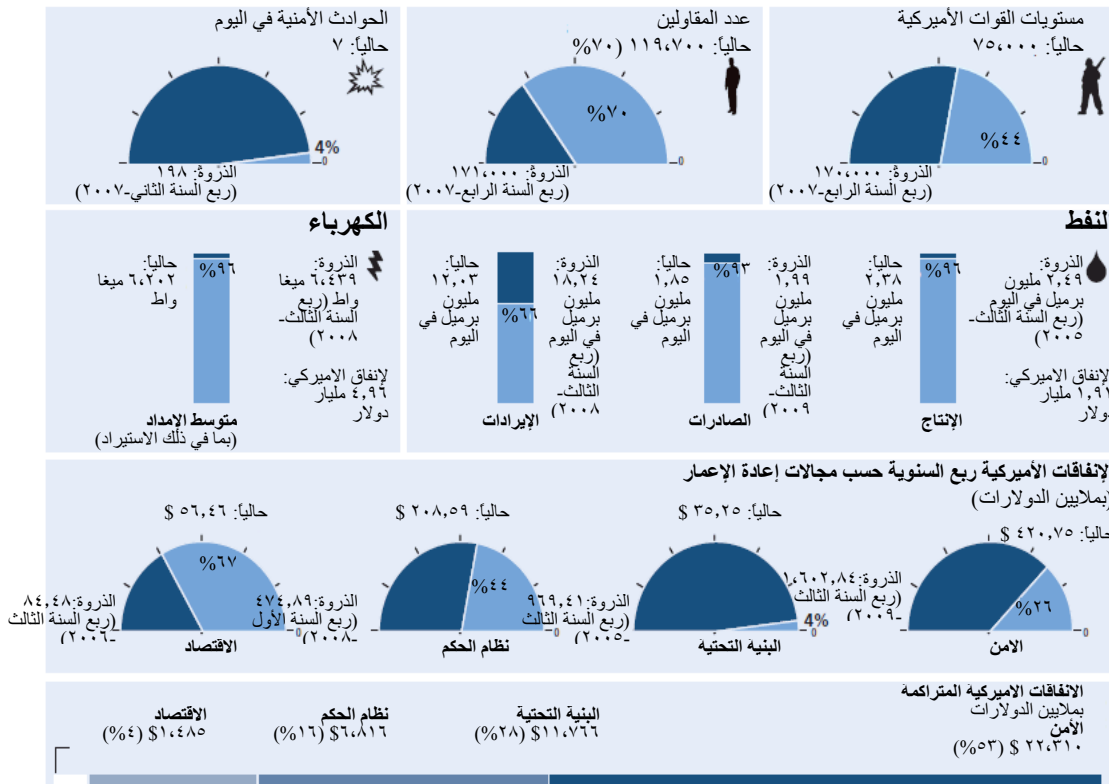

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. ربع السنة يشير إلى السنة التقويمية. المصادر: بالنسبة للمصادر، انظر البحث المحدد في القسم ٢.

بغض النظر عن من تلك التطورات الحيوية، تواصل تشكيلة من التحديات المحبطة مجابهة الديمقراطية العراقية الحديثة العهد، ومن بين هذه التطورات نذكر الحاجة الملحة إلى تشكيل حكومة جديدة، والوضع الأمني الهش، والقدرة الضعيفة للحكومة العراقية في تقديم الخدمات الأساسية لمواطنيها، وسرطان الفساد:

- **نظام الحكم:** بتاريخ ٢٠ تموز/يوليو ٢٠١٠، كانت الكتل الرئيسية في مجلس النواب (CoR) عاجزة عن الاتفاق حول من سيشغل المناصب الأساسية كرئيس البلاد ورئيس مجلس النواب، ورئيس الوزراء. فبدون حكومة ثابتة قائمة، تبقى آلاف المراكز الأخرى في الحكومة العراقية – بما في ذلك وزراء الوزارات – في أيدي الذين يصرفون الأعمال. فإلى حين تشكيل الحكومة الجديدة، سيظل التقدم في معظم المسائل متوقفاً، بما في ذلك تنظيم الإحصاء القومي الذي طال انتظاره، وتهدة التوترات الدائمة حول الصلاحيات بين الحكومة القومية في بغداد وحكومة إقليم كردستان (KRG).

- **الأمن:** لدى الولايات المتحدة حالياً حوالي ٧٥،٠٠٠ جندي منتشرين في أرجاء العراق، أي حوالي ٥٥،٠٠٠ جندي أقل مما كانت عليه الحال في تموز/يوليو ٢٠٠٩ – انخفاض بنسبة ٤٢ بالمئة^(١). اللافت ان الانخفاض الكبير في عديد القوات خلال السنة الفائتة لم ينتج عنه ارتفاع في المستوى الإجمالي للعنف. ولكن ربع السنة الحالي شهد هجمات ذات شأن ضد المؤسسات المالية العراقية، واغتيال شخصيات سياسية بارزة، وهجمات أكثر قتلاً ضد أعضاء منظمة أبناء العراق. مع مواصلة خفض عديد القوات الأميركية من الآن ولغاية نهاية ٢٠١١ (حيث من المبرمج انسحاب كامل القوات الأميركية من العراق)، يتوجب على قوات الأمن العراقية (ISF) تحسين قدراتها في نفس هذا الوقت لمواجهة مجموعة من التهديدات الأمنية التي لا تزال تواجه العراق.

- **الخدمات:** استقال وزير الكهرباء العراقي في ٢١ حزيران/يونيو ٢٠١٠، وهي خطوة سببتها عدة أيام من الاحتجاجات العنيفة في الجنوب أثارها العجز في إمداد الكهرباء. عُيّن وزير النفط وزيراً للكهرباء بالوكالة وسوف يحتفظ بالمنصبين إلى حين تشكيل الحكومة الجديدة^(١).

- **الفساد:** "التمرد الثاني" في العراق – الرشوة الحكومية المستشرية والمخالفات المؤذية التي يمارسها القطاع العام – تواصل حرمان الدولة من الموارد والقدرات اللازمة لها. علاوة على ذلك، في إحدى أهم المحاكمات حول الفساد منذ ٢٠٠٣، تمّت تبرئة وزير التجارة (هناك قضية ثانية ضده لا تزال عالقة). ولا يزال على العراق اعتبار موظف رسمي كبير واحد على الأقل مسؤولاً عن الفساد. هذا الفراغ في مجال النزاهة، من المفهوم انه يضعف ثقة الناس بالحكومة العراقية.


تحديث معلومات التمويل الأميركي

خصص الكونغرس أو جعل متوفراً ٥٣,٧٩ مليار دولار لجهود إعادة إعمار العراق منذ ٢٠٠٣ بصورة رئيسية عبر أربعة صناديق كبرى: صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).^(٣) بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان هناك ٢,٠٨ مليار دولار من الأموال الملزمة سابقاً ولم تنفق، كما كان هناك ٢,٣٤ مليار دولار إضافية ظلت غير مُلزَمة.^(٤) الشكل ١-٢ يُلخص الوضعية الحالية للإلزامات التي لم تُنفق من الصناديق الأربعة الرئيسية. للمزيد حول التمويل الأميركي لجهود إعادة الإعمار، أنظر القسم ٢.

الشكل ١-٢

الإلزامات غير المنفقة: الصناديق الأميركية الرئيسية
بمليارات الدولارات

المجموع: \$٢,٠٨

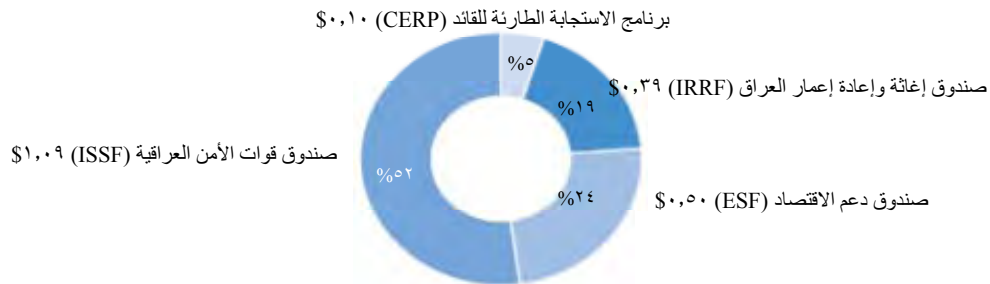

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. مكتب وزير الدفاع لم يذكر بيانات الزامات ونققات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) حسب فئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات فئة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) من نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) الذي يتأخر في رفع التقارير. لذلك، فقد لا يتناسب إجمالي الفئات في القسم الفرعي الخاص بالتمويل في هذا التقرير مع القيم الأعلى المذكورة في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: P.L. 108-106; P.L. 108-11; P.L. 108-287 P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 109-13; P.L. 109-148; P.L. 109-234; P.L. 109-289; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 110-28; P.L. 110-92; P.L. 110-116; P.L. 110-137; P.L. 110-149; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-32; ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢ و ٢٠١٠/٤/١٢؛ ٢٠١٠/٦/٣٠؛ ٢٠١٠/٧/٦؛ ٢٠١٠/٧/٨، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.

تحديث معلومات إعادة الإعمار

عمليات نقل المسؤوليات خلال الصيف يشمل الوصول الوشيك لقيادات عسكرية ودبلوماسية أميركية جديدة إلى بغداد، وكذلك فتح مكاتب جديدة لإدارة برامج ومشاريع إعادة الإعمار الأميركية المتبقية، ونشر خطة التنمية الوطنية العراقية (NDP) الجديدة، وإصدار إطار عمل جديد للتعاون بين الأمم المتحدة والحكومة العراقية.

القيادات المطلعة تعود إلى العراق

في ٢٨ حزيران/يونيو، سمى الرئيس باراك أوباما السفير جيمس جيفري كسفير مقبل للولايات المتحدة لدى العراق. السفير جيفري، سفيرنا الحالي في أنقره، سيحل محل السفير كريستوفر هيل الذي خدم كسفير لدى العراق منذ نيسان/إبريل ٢٠٠٩. يأتي السفير جيفري بثروة من التجارب ذات الصلة بالموضوع، إذ سبق له ان خدم كنائب لرئيس البعثة في بغداد ولاحقاً كقائم بالأعمال (سنة ٢٠٠٤ وسنة ٢٠٠٥)، ومن ثم كمستشار أول لوزيرة الخارجية وللبيت الأبيض حول العراق في (٢٠٠٥-٢٠٠٦). بعد تثبيته، سيكون السفير جيفري خامس سفير أميركي لدى العراق منذ ٢٠٠٣، بعد السفراء نيغروبونتي، خليلزاد، كروكر وهيل.

سوف يعاون السفير جيفري نائب جديد لرئيس البعثة (DCM)، ومساعد جديد لرئيس البعثة. خلال ربع السنة الحالي، حل ستيفارت جونز محل كامرون مونتر بصفة نائب رئيس البعثة، وحل بيتر بودّ محل باتريشيا هسلش كمساعد لرئيس البعثة.

وعين الرئيس أيضاً الفريق أول لويد أوستن برتبة جنرال مع تكليفه القيادة العامة للقوات الأميركية في العراق (USF-I). يحل أوستن الذي تبتت مجلس الشيوخ تعيينه في ٣٠ حزيران/يونيو محل الجنرال ريموند أودبيرنو الذي سيعود إلى الولايات المتحدة لقيادة القيادة المشتركة للقوات الأميركية في نورفولك بولاية فيرجينيا. الجنرال أوستن الذي كان مؤخراً مديراً للأركان المشتركة، كان في العراق سنة ٢٠٠٣، كمساعد قائد للفرقة الثالثة للمشاة، وسنة ٢٠٠٨-٢٠٠٩ كقائد عام للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق.

ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق



السفير جيمس جفري (الصورة لوزارة الخارجية)



الجنرال جيمس ماتيس (الصورة لوزارة الدفاع)



الجنرال لويد اوستن (الصورة لوزارة الدفاع)

وفي مناقشات قيادية بارزة أخرى، سُمي الجنرال جيمس ماتيس لقيادة القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) وحل محل الجنرال ديفيد بتريوس الذي يقود حالياً القوات الأميركية في أفغانستان. قاد الجنرال ماتيس فرقة مشاة البحرية الأولى خلال غزو العراق سنة ٢٠٠٣، وقاد قبلها كتيبة خلال عملية عاصفة الصحراء.

قيادة العقود لدى قيادة المنطقة الوسطى (C³) للقوات المسلحة الأميركية تحل محل القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A)
خلال ربع السنة الحالي، أسست القيادة المركزية للقوات المسلحة الأميركية وكالة جديدة للإشراف على العقود في مناطق مسؤولياتها - قيادة العقود لدى قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM). وفي ٣٠ حزيران/يونيو، نُقلت مسؤوليات القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A) إلى قيادة العقود (C³) المقيمة في قطر.^(٥)

مكتب الشراكة الإستراتيجية مع العراق (ISPO) يحل محل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO).

في أيار/مايو، وقع الرئيس على أمر تنفيذي يؤسس مكتب الشراكة الإستراتيجية مع العراق (ISPO). هذا المكتب القائم ضمن وزارة الخارجية يحل محل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) الذي حل محل مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO) سنة ٢٠٠٧. تولى المكتب الجديد (ISPO) مسؤوليات مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) المتبقية بما في ذلك دعم فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs).^(٦)

حماية سلامة الدبلوماسيين

خلال ربع السنة الحالي، طالبت وزارة الخارجية بأن تحوّل وزارة الدفاع بعض المعدات إلى وزارة الخارجية لأغراض أمنية وذلك في مراكز الحضور الدائم (EPPs) الخمسة الجديدة. تشمل المعدات ٢٤ طائرة مروحية و٥٠ عربة مصفحة ومعدات ثانوية أخرى لوجستية وأمنية.^(٧) إضافة إلى ذلك، طلبت وزارة الخارجية بأن يُسمح لها باستخدام عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني (LOGCAP) التابع لوزارة الدفاع لأجل مواصلة خدمات الدعم الحياتي لمراكز الحضور الدائم الخمسة وللسفارة الأميركية في بغداد.^(٨)

خطة التنمية الوطنية العراقية الجديدة

في ٤ تموز/يوليو ٢٠١٠، قدم رئيس الوزراء ووزير التخطيط والتعاون الإنمائي علناً خطة التنمية الوطنية العراقية الجديدة (NDP). ترسم الخطة التي وضعت بمساعدة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) والمجتمع الدولي، مساراً لمدة خمس سنوات للتنمية الاجتماعية والاقتصادية ولحماية البيئة في العراق. تفترض الخطة ان العراق سوف يُنتج ٣٣٤ مليار دولار من العائدات بين ٢٠١٠ و ٢٠١٤، مقيمة هذا الرقم على متوسط سعر لبرميل النفط بحدود ٦٠ دولار سنة ٢٠١٠، ٦٣ و دولار في ٢٠١١، و ٦٨ دولار في ٢٠١٣-٢٠١٤. وتشمل أهداف الخطة:^(٩)


- توفير ٣,٥ مليون وظيفة جديدة
- خفض البطالة بمعدل النصف من مستواها الحالي المقدر بـ ١٥ بالمئة
- توليد معدل نمو سنوي يبلغ ٩ بالمئة في إجمالي الناتج المحلي (GDP)
- إصلاح الأنظمة القانونية والإدارية
- تعزيز التنمية الريفية
- دعم اللامركزية
- خفض الفقر بنسبة ٣٠ بالمئة بالمقارنة مع مستويات ٢٠٠٧
- زيادة الحماية البيئية

وفقاً للخطة، سيكون هناك حاجة إلى ١٨٦ مليار دولار من الاستثمارات لتحقيق هذه الأهداف - ١٠٠ مليار دولار من الحكومة العراقية و ٨٦ مليار دولار من القطاع الخاص.

ملاحظات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

سوف تدعم هذه الأموال ٢٨٣١ مشروعاً، ٤٣ بالمئة منها ستكون لإعادة الإعمار.^(١) الشكل ٣-١ يظهر توزيع هذه الأموال حسب القطاعات.

الشكل ٣-١
خطة التنمية الوطنية العراقية

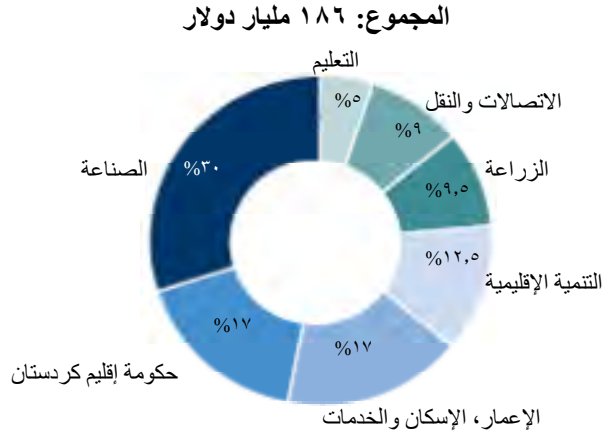

ملاحظة: يصنف المفتش العام البرامج والمشاريع حسب القطاعات مستخدماً معايير مختلفة عن تلك المذكورة في خطة التنمية الوطنية العراقية.

المصدر: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) "خطة التنمية الوطنية العراقية"، عرض موجز لمؤتمر برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، قصر الفاو، بغداد، ٢٠١٠/٧/٧، الشريحة ١١.

الكشف عن إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية في العراق (UNDAF)

خلال ربع السنة الحالي، وضعت الأمم المتحدة اللمسات الأخيرة على خطتها الإستراتيجية لمساعدة العراق – "إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة العراق للسنوات ٢٠١١-٢٠١٤". تقدم الخطة التوجيه الإستراتيجي للدعم الدولي للعراق للسنوات الأربع القادمة عبر خمس أولويات: نظام محسّن للحكم، تنمية اقتصادية، حماية البيئة، خدمات أفضل، ومزيد من الاستثمار في الرأسمال البشري. تُقدّر الأمم المتحدة ان إطار العمل لمساعدة التنمية في العراق سوف يكلف ١,٩٠ مليار دولار متوفر منها حالياً ٢٥٠ مليون دولار فقط.^(١)

أهداف إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية في العراق مشابهة بصورة مدهشة لتلك التي كانت في الخطة الخمسية السابقة للعراق التي وضعها الميثاق الدولي للعراق (ICI). هذا الميثاق الدولي للعراق الذي بوشر به سنة ٢٠٠٧، فصل قرابة ٣٠٠ علامة اهتداء لقياس التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي في العراق. غير ان مهمة الميثاق الدولي للعراق انتهت دون ان تتحقق معظم الأهداف أو انه جرى تناولها جزئياً. لتجنب المصير نفسه لإطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية في العراق (UNDAF)، سوف يتوجب على الأمم المتحدة والحكومة العراقية الإشراف المتشدد لتطبيق إطار العمل هذا.

تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

في ٧ آذار/مارس ٢٠١٠، أجرى العراق انتخابات لاشغال ٣٢٥ مقعداً في البرلمان. حصلت القائمة "العراقية" برئاسة رئيس الوزراء السابق إياد علاوي، على ٩١ مقعداً، وحصل ائتلاف "دولة القانون" برئاسة رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي، على ٨٩ مقعداً. الشكل ١-٤ يُلخص النتائج النهائية المصادق عليها لاقتراع آذار/مارس.^(١٢)

المصادقة على الانتخابات

في ٣ أيار/مايو ٢٠١٠، وبالبحاح من جانب لائحة "دولة القانون"، بدأت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) إعادة عدّ حوالي ٢,٥ مليون صوت في محافظة بغداد.^(١٣) بعد انقضاء ١١ يوماً على المراجعة اليدوية، أبقت الهيئة نتائج انتخابات آذار/مارس كما هي، وأعلنت ان القائمة "العراقية" قد احتفظت بتقدمها بفارق مقعدين على قائمة "دولة القانون".^(١٤) وقد صادق رئيس القضاة في العراق، مدحت محمود على نتائج الانتخابات، في الأول من حزيران/يونيو ٢٠١٠.^(١٥)


الرمال السياسية المتحركة

خلال ربع السنة الحالي، حاولت الكتل السياسية العراقية الكبرى جمع ال ١٦٣ صوت الضرورية ليكون لها الحق في اختيار رئيس الوزراء المقبل. لهذه الغاية، في ٥ أيار/مايو ٢٠١٠ أعلن ممثلون عن كتلة "دولة القانون" وكتلة "التحالف الوطني العراقي" (INA) تشكيل تحالف بين مجموعتيهما لكنهما لم يتوصلا إلى اتفاق حول مرشح منفرد لرئاسة الوزراء. الفئة المسيطرة في "التحالف الوطني العراقي" – الاتجاه الصدري – رفضت قبول إصرار "دولة القانون" إعطاء رئيس الوزراء المالكي فرصة ثانية. في تلك الأثناء، سعت "العراقية" و"التحالف الكردستاني" إلى الحصول على دعم المجموعات المنشقة، من بينها بعض الأعضاء في "دولة القانون" و"التحالف الوطني العراقي". في ٢٠ تموز/يوليو، اجتمع رئيس الوزراء المالكي مرة أخرى مع إياد علاوي لكن الاثنین عجزا عن الخروج من المأزق تاركين العراق بلا حكومة. في ٢١ تموز/يوليو، أعلن مقتدى الصدر، مرة جديدة، ان المالكي غير مقبول كرئيس مقبل للوزراء. الشكل ١-٥ يظهر بعض أهم الأحداث السياسية التي حصلت خلال ربع السنة الحالي، في حين يقارن الشكل ١-٦ الأحداث الرئيسية خلال دورة ٢٠١٠ الانتخابية مع دورة ٢٠٠٥-٢٠٠٦.

ملاحظات المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

الشكل ٤-١

نتائج انتخابات آذار/مارس ٢٠١٠ النهائية المصادقة



المصدر: الحكومة العراقية، الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، "نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي"، ٢٠١٠/٣/٢٨، Ihec-iq.com/en/results.html الذي تم الوصول إليه في ٢٠١٠/٧/٢١.


من يأتي أولاً: تفسيرات مختلفة

المادة ٥٥ و ٧٠ من الدستور العراقي تنصان على ان مجلس النواب ينتخب رئيساً له خلال أول جلسة له، ومن ثم ينتخب رئيساً للبلاد (لم يحدد موعد أقصى). في غضون ١٥ يوم على إجراء الانتخابات، وفقاً للمادة ٧٦، على الرئيس تكليف "أكبر كتلة" في مجلس النواب تسمية رئيساً للوزراء الذي يكون لديه ٣٠ يوماً لتشكيل الحكومة.^(١٦)

معنى عبارة "الكتلة الأكبر" كانت موضع خلاف. أصرت "العراقية" على ان ذلك يعني الكتلة التي نالت أكبر عدد من المقاعد، مذكرة بسابقة انتخابات مجلس النواب سنة ٢٠٠٥. لكن "دولة القانون" قالت ان العبارة تعني أوسع تحالف يُشكل بعد الانتخابات عن طريق ائتلافات بين أعضاء المجلس ال ٣٢٥. في ٢٥ آذار/مارس، أصدر قاضي القضاة حكماً يقول ان "الكتلة الأكبر" تعني تحالف الأكثرية التي تشكل بعد الانتخابات مع أكبر عدد من المقاعد.^(١٧)

الشكل ٥-١


جدول التطورات السياسية الرئيسية ما بعد الانتخابات، ٢٠١٠/٦/٣٠ – ٢٠١٠/٣/١



المصدر: تحليل المفتش العام لمستندات الحكومة العراقية والحكومة الأميركية ولمعلومات المصادر المفتوحة باللغتين الإنكليزية والعربية.

الشكل ٦-١

تشكيل الحكومة: ٢٠٠٥-٢٠٠٦ مقابل ٢٠١٠



المصدر: تحليل المفتش العام لمستندات الحكومة العراقية والحكومة الأميركية ولمعلومات المصادر باللغتين الإنكليزية والعربية.

اجتماع مجلس النواب

اجتمع مجلس النواب الجديد في ١٤ حزيران/يونيو ٢٠١٠ – بعد مرور ٩٩ يوماً على انتخابات آذار/مارس في جلسة لم تدم أكثر من ٣٠ دقيقة، وهو الوقت الكافي لأداء القسم. كان من المقرر ان يجتمع المجلس من جديد في ٢٧ تموز/يوليو ٢٠١٠ وان يكون على أجدنته كما هو مفترض، انتخاب رئيس المجلس ورئيس البلاد^(١٨) لكن، كان من الممكن تأجيل هذا الاجتماع في حال فشلت الكتلة السياسية الكبرى في الاتفاق على من سوف يشغل

هذين المنصبين. خطط مجلس النواب للاجتماع على أساس برنامج محدود جداً خلال شهر رمضان الذي يبدأ عند طلوع القمر في ١٠ آب/أغسطس. وهكذا، بات من الممكن ان يبقى العراق بلا قيادة جديدة وحكومة جديدة لغاية أيلول/سبتمبر، لم يكن أكثر.

التحديات القادمة

ستواجه الحكومة الجديدة عند تشكيلها سلسلة من القضايا المثيرة للنزاع التي تتطلب عملاً ملحاً:

- **مكافحة الفساد.** كيانات مكافحة الفساد الرئيسية في العراق – هيئة النزاهة (COI)، المفتشون العامون للوزارات (IGs) والمجلس الأعلى للتدقيق (BSA) – لا تزال تستمد شرعيتها من الأوامر التي صاغتها سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) في ٢٠٠٣-٢٠٠٤. غير ان كبار الرسميين في الحكومة العراقية أبلغوا المفتش العام، خلال ربع السنة الحالي، ان مجلس النواب الجديد سيضع في رأس أولوياته مناقشة وإقرار تشريع جديد لمكافحة الفساد مما سيوضح أدوار ومسؤوليات هيئة النزاهة، والمفتشين العامين، والمجلس الأعلى للتدقيق.^(١٩)
- **قانون الهيدروكربون.** هذه الرزمة من التشريعات التي طال انتظارها والتي تشمل أربعة قوانين منفصلة، أساسية لتوضيح النظام التنظيمي الذي سيحكم الاستغلال الجاري لموارد العراق من الهيدروكربون.^(٢٠)
- **السيطرة على كركوك.** تطالب المادة ١٤٠ من الدستور العراقي بإجراء استفتاء كجزء من العملية الدستورية لتحديد وضعية كركوك التي تطالب بها تاريخياً حكومة إقليم كردستان، وان كانت خارج صلاحياتها. لقد تأجل هذا الاستفتاء مراراً وتكراراً مما زاد التوترات بين الحكومة العراقية في بغداد وحكومة إقليم كردستان.
- **الإصلاح الدستوري.** في تموز/يوليو ٢٠٠٩، قدمت لجنة مراجعة الدستور التابعة للحكومة العراقية ٦٨ صفحة من التعديلات المقترحة على الدستور العراقي إلى مجلس النواب. في حال وافق عليها مجلس النواب الجديد، سوف يتبع ذلك استفتاءً وطنياً وستكون الفرصة متاحة للناخبين للموافقة أو لرفض رزمة الإصلاحات بأكملها.^(٢١)
- **التعيينات.** لا زال هناك أكثر من ١٠٠,٠٠٠ وظيفة شاغرة تنتظر تشكيل الحكومة العراقية الجديدة.



الأعضاء يؤدون القسم في أول جلسة لمجلس النواب الجديد.

الأمن

اتجاهات العنف

لا يزال العراق مكاناً خطيراً. لكن، عند المقارنة مع ذروة العنف المذهبي سنة ٢٠٠٦، يتبين ان البلاد أصبحت أكثر هدوءاً إلى حد كبير. على الرغم من هذه الحقيقة الإحصائية، لا يزال مئات المدنيين العراقيين يقعون ضحية العنف كل شهر. في حزيران/يونيو، قتل حوالي ٢٠٤، أدنى بنسبة ٣٩ بالمئة من أيار/مايو حيث قتل ٣٣٧ شخصاً. وكانت كلفة الوفيات في حزيران/يونيو أدنى بنسبة ٣٦ بالمئة بالمقارنة مع ٣٢٠ مدني قتلوا في حزيران/يونيو ٢٠٠٩. ^(٢٢) الشكل ١-٧ يظهر الوفيات المدنية على أساس شهري من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو ٢٠١٠.

لا تزال الهجمات الهامة مُركزة في بغداد وفي الشمال حول الموصل. في ١٣ حزيران/يونيو، هاجم مسلحون يرتدون زيّ الجيش العراقي البنك المركزي العراقي في بغداد وقتلوا ٢٦ شخصاً. ^(٢٣) بعدها بأسبوع، انفجرت سيارتان مفخختان خارج المصرف التجاري العراقي القائم في بغداد، وقتلت ١٨ شخصاً. ^(٢٤) وخلال فترة ثلاثة أيام في مطلع تموز/يوليو، قتل ٧٠ حاجاً شيعياً على الأقل في سلسلة تفجيرات حول بغداد. ^(٢٥)

وحصلت أعمال قتل سياسية أيضاً خلال ربع السنة هذا مع اغتيال عدة أعضاء من القائمة العراقية من بينهم بشار حميد اللعدي الذي فاز في انتخابات مجلس النواب في آذار/مارس. وقتل أيضاً مرشحان آخران للقائمة العراقية لم يفوزا بمقاعد، في مطلع حزيران/يونيو. ^(٢٦) الشكل ١-٨ يصور خريطة بعض الحوادث الأساسية التي حصلت بين منتصف نيسان/إبريل ومنتصف تموز/يوليو ٢٠١٠.

الشكل ٧-١

مديون عراقيون قتلوا جراء هجمات، ٢٠١٠/١ - ٢٠١٠/٦



المصدر: مؤسسة بروكنغز، المؤشر العراقي، ٢٠١٠/٦/٣٠، ص ٣-٤.

القوات الأميركية تخفض وجودها بسرعة

تحتفظ القوات الأميركية في العراق، الآن، بـ ١٢٤ قاعدة في العراق، أي بنسبة ٤٠ بالمئة أدنى من تموز/يوليو ٢٠٠٩. بحلول نهاية آب/أغسطس، عندما ستصل مستويات القوات إلى ٥٠,٠٠٠، سيبقى هناك ٩٧ قاعدة أميركية. القوات الأميركية المتبقية في العراق سوف تركز على تقديم المشورة ومساعدة قوات الأمن العراقية، ودعم عمليات مُنقذة لمكافحة الإرهاب بالتعاون مع قوات الأمن العراقية، وتقديم الأمن لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) التابعة لوزارة الخارجية الأميركية. من المبرمج ان يغادر جميع العسكريين الأميركيين العراق بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١.^(٢٧)

الجنرال أودبيرونو يقترح وجود قوات حفظ الأمن التابعة للأمم المتحدة في شمال العراق

تخفض القوات الأميركية حضورها بسرعة في شمال العراق. من أصل حوالي ٥٤ مرفق تابع للقوات الأميركية في العراق في مطلع ٢٠١٠، سوف يبقى حوالي ٨ مرفق فقط تحت السيطرة الأميركية الكاملة بحلول الأول من أيلول/سبتمبر.^(٢٨) في مطلع تموز/يوليو، أعلن قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال أودبيرونو، انه قد يُطلب، في نهاية المطاف، من قوات حفظ الأمن التابعة للأمم المتحدة، الحفاظ على الاستقرار في الشمال نظراً لزيادة التوترات بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية حول حقول نفط كركوك المتنازع عليها. قال الجنرال أودبيرونو ان وجود الأمم المتحدة سوف يحول دون انفجار العنف.^(٢٩)

الشكل ٨-١ الحوادث الأمنية الهامة، ٢٠١٠/٤/١٥ - ٢٠١٠/٧/٢١



ملاحظة: كافة أرقام الإصابات مستندة إلى أفضل المعلومات المتوفرة.
المصدر: تحليل المفتش العام لمستندات الحكومة العراقية والحكومة الأميركية ولمعلومات المصادر المفتوحة باللغتين الإنكليزية والعربية.

قوات الأمن العراقية

يبلغ عديد الجيش العراقي (IA) وقوات وزارة الدفاع (MOD) الأخرى أكثر من ٢٥٠,٠٠٠، في حين يبلغ عديد وزارة الداخلية (MOI) حالياً حوالي ٤١٠,٠٠٠ شرطي وفرد لحماية الحدود.^(٣٠) الجيش العراقي يقوم بنقل مسؤوليات الأمن الداخلي إلى وزارة الداخلية، وهي عملية سوف تتسارع خلال الأشهر القادمة. استجابة لهذا التحول، يواصل الجيش العراقي الاستحواذ على المعدات الحديثة بما في ذلك ١٤٠ دبابة "M1A1" التي سوف تسمح له بالتركيز على مهمته الأساسية وهي ضمان سلامة العراق ضد أية تهديدات خارجية. فكما قال أحد الجنرالات الأميركيين في حزيران/يونيو، "العراقيون مدركون تماماً أنهم يعيشون في جوار يوجب عليهم ان يكونوا قادرين على حماية سيادتهم".^(٣١)

في الأول من حزيران/يونيو، تولت القوات العراقية السيطرة الكاملة على كافة نقاط الدخول إلى المنطقة الدولية. كانت قوات الأمن العراقية (ISF) تقوم بوضع جنود حماية في نقاط الدخول هذه بالشراكة مع الجيش الأميركي منذ كانون الثاني ٢٠٠٩. لا تزال

القوات الأميركية تلعب دوراً استشارياً بالنسبة لقوات الأمن العراقية التي تحرس المنطقة الداخلية المحمية التي تضم العديد من مكاتب وزارات الحكومة العراقية والسفارة الأميركية في بغداد.^(٣٢)

منظمة أبناء العراق

خلال ربع السنة الحالي، كان المتمردون السُّنة السابقون المعروفون بمنظمة أبناء العراق (SOI) أهدافاً للهجمات الإرهابية بصورة متكررة. ففي ١٨ تموز/يوليو، بنوع خاص، هاجم انتحاري مجموعة من منظمة أبناء العراق بالقرب من بغداد وقتل أكثر من ٤٠ منهم. في نفس اليوم، قُتل ثلاثة آخرون من منظمة أبناء العراق على الأقل جراء تفجير انتحاري في القائم في محافظة الأنبار.^(٣٣)

حول الجيش الأميركي مسؤولية مدفوعات منظمة أبناء العراق إلى الحكومة العراقية سنة ٢٠٠٩، لكن الحكومة العراقية كانت متأخرة بصورة متكررة في تأمين الرواتب الشهرية. بتاريخ تموز/يوليو، كان أقل من نصف (حوالي ٤١,٠٠٠) أعضاء منظمة أبناء العراق – ٩٤,٠٠٠ – قد عُرضت عليهم وظائف في الحكومة،^(٣٤) وذكرت القوات الأميركية في العراق ان وزارة الدفاع العراقية قد أوقفت انتقال أعضاء منظمة أبناء العراق إلى ما بعد إعادة تقييم الوضع الأمني. إن رغبة الحكومة العراقية وقدرتها في مواصلة دمج منظمة أبناء العراق سوف تؤثر كثيراً على العلاقات المستقبلية بين الأكثرية الشيعية والأقلية السُّنية.^(٣٥)

تسليم آخر مرفق اعتقال كبير بإدارة أميركية إلى الحكومة العراقية

في ١٥ تموز/يوليو ٢٠١٠، نقلت القوات الأميركية في العراق السيطرة على مرفق اعتقال كروبر إلى "دائرة السجون العراقية" التي هي جزء من وزارة الداخلية. عند وقت تسليمه، كان مرفق كروبر يضم ١٦٠٠ معتقل.^(٣٦) يقع السجن بالقرب من مطار بغداد الدولي وهو آخر مرافق الاعتقال الرئيسية الموجودة تحت الإدارة الأميركية الذي يُسلم إلى الحكومة العراقية. معسكر بوكا في جنوب العراق تم نقل مسؤوليته في الخريف الماضي وتم نقل مسؤولية معسكر تاجي في أذار/مارس ٢٠١٠. في نهاية حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان لا يزال في مرافق الاعتقال الأميركية ١٧٦٩ معتقل مقابل حوالي ١٠,٠٠٠ في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ وأكثر من ٢٥,٠٠٠ قبل ثلاث سنوات.^(٣٧)

المفتش العام الخاص يجتمع بقيادة البنك المركزي العراقي في ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٠، اجتمع المفتش العام مع كبار الرسميين في البنك المركزي العراقي (CBI) بمن فيهم حاكم البنك، د. سينان الشبيبي. ركزت المناقشات على القضايا الاقتصادية الأساسية التي تواجه الحكومة العراقية حالياً بما في ذلك مكافحة الفساد، واجتذاب الاستثمارات الأجنبية، وخلق إطار عمل تنظيمي حديث يقود إلى الخصخصة. وبحسب ممثلي البنك المركزي العراقي: (٣٨)



سينان الشبيبي، حاكم البنك المركزي العراقي

- إن متابعة الأموال الحكومية المصروفة إلى الوزارات العراقية مشكلة جدية. فغياب الشفافية حول استخدام، أو سوء استخدام، أو عدم استخدام تلك الأموال يمنع حصول الحكومة العراقية على صورة كاملة أو دقيقة عن الوضع المالي.
- لدى الحكومة العراقية حوالي ٣ ملايين موظف – ١٠ بالمئة من العدد المقدر لسكان العراق – وهو أعلى رقم على الإطلاق.
- سوف يجد العراق صعوبة في زيادة إنتاج النفط سنة ٢٠١٠ أولاً بسبب البنية التحتية البالية وبسبب انخفاض الإنتاج من الحقول الموجودة حول كركوك. غير ان ممثلي البنك المركزي العراقي زعموا ان تهريب النفط قد بات مشكلة أقل أهمية. (عارض المفتش العام لوزارة النفط هذا الرأي في اجتماع منفصل مع المفتش العام).
- قطاع المصارف الخاصة في العراق لا يزال في عهد الطفولة. قطعت وزارة المالية الروابط مع البنوك الخاصة وترفض قبول شكاياتهم. علاوة على ذلك، تحول التحديات القانونية والتكنولوجية دون قيام المصارف الخارجية بتأسيس حضور لها في العراق.

النمو الاقتصادي

من المتوقع ان ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في العراق بمعدل سنوي يبلغ ٦,٣ بالمئة سنة ٢٠١٠، أي بزيادة ما يقدر بـ ٤,٥ بالمئة عن سنة ٢٠٠٩. يتوقف هذا النمو على قدرة قوات الأمن العراقية في الحفاظ على استقرار نسبي للوضع الأمني، وعلى حصول الحكومة العراقية – وتنفيذها الفعلي – لاستثمارات أجنبية متزايدة، ولا سيما في قطاع النفط. من المتوقع في سنة ٢٠١٢، حصول زيادات هامة في إنتاج النفط ناجمة عن الاستثمارات الأجنبية التي حصلت مؤخراً،^(٣٩) والتي ستبشر بالخير بالنسبة للتوقعات الاقتصادية للعراق على المدى المتوسط.

قطاع النفط

النفط: الأهداف، والإنتاج، والصادرات

في ٧ حزيران/يونيو، كرر وزير النفط العراقي الكلام عن خطط لزيادة إنتاج النفط الخام قرابة خمسة أضعاف بحلول ٢٠١٧، من أقل من ٢,٥ مليون برميل في اليوم حالياً، إلى ١٢ مليون برميل في اليوم. خلال ربع السنة هذا، لم يتغير إنتاج النفط بالنسبة لربع السنة السابق، فبقي ثابتاً عند ٢,٣٨ مليون برميل في اليوم، وهو أقل قليلاً من متوسط الإنتاج خلال ربع السنة نفسه سنة ٢٠٠٩. الصادرات هبطت بنسبة ٥ بالمئة بالنسبة لربع السنة الماضي إلى متوسط ١,٨٥ مليون برميل في اليوم.^(٤٠)

منطقة الحظر حول خطوط أنابيب النفط تُخترق لأول مرة

في ثلاثة حوادث متفرقة خلال ربع السنة الحالي، أصيبت خطوط أنابيب النفط داخل منطقة الحظر حول خطوط أنابيب النفط (PEZ) بأضرار جراً الهجمات. كانت هذه أول هجمات تم الإبلاغ عنها على خطوط الأنابيب المحمية منذ إقامتها في أواخر خريف ٢٠٠٧. إحدى الهجمات حالت دون تلقي مصفاة الدورة في بغداد حوالي ٢٠,٠٠٠ برميل في اليوم لعدة أيام. الهجمات الأخرى في نيسان/أبريل وحزيران/يونيو قطعت تدفق النفط في خط أنبوب التصدير إلى تركيا.^(٤١)

الاستثمارات الأجنبية في قطاع النفط

خلال ربع السنة الحالي، تعاقد كونسورتيوم صيني – تركي مع الحكومة العراقية لتوسيع الإنتاج في ثلاثة حقول للنفط في محافظة ميسان.^(٤٢) من أصل الأحد عشر عقد لخدمات النفط التي مُنحت لشركات نفط دولية سنة ٢٠٠٩، يبدو ان ائتلاف الشركات بين بريتيش بتروليوم وشركة النفط الوطنية الصينية لاستغلال حقل الرميلا هو الأكثر تقدماً. يتوقع المسؤولون في وزارة النفط زيادة الإنتاج قرابة ٢٠٠,٠٠٠ برميل في اليوم بحلول نهاية هذا العام.^(٤٣)

شركات خدمات النفط الخاصة، بما فيها العديد من الشركات ذات الروابط القوية مع الولايات المتحدة، بصدد زيادة حضورها في العراق لدعم الكونسورتيومات الفائزة بعقود. مثلاً، تخطط شركة وذر فورد إنترناشنال المحدودة لأن يكون لها على الأرض في العراق ١٠٠٠ موظف بحلول نهاية تموز/يوليو، وتتوقع شركة شلومبرغر ان يكون لها ٣٠٠ موظف بحلول نهاية هذا العام.^(٤٤) لمزيد من المعلومات حول الاستثمارات الدولية في قطاع النفط في العراق، أنظر القسم ٢.

العراق يخطط لبناء أربع مصافي نفط جديدة

نظراً للبنية التحتية المتقادمة ولسنوات من الحرب، أصبحت قدرات التكرير المحلية العراقية محدودة وتجبر البلاد الاعتماد على المستوردات من البلدان المجاورة بما فيها إيران. يُشغل العراق حالياً ثلاث مصافي رئيسية للنفط. وإحدى عشر مصفاة صغيرة ذات قدرات مجتمعة تبلغ ٧٩٠،٠٠٠ برميل في اليوم. أكبر المصافي الأربعة المخطط لإقامتها سوف تبنى في مدينة الناصرية الجنوبية وستكون لها قدرة تكرير تبلغ ٣٠٠،٠٠٠ برميل في اليوم. المصافي الثلاث الأخرى سوف تبنى في كركوك وميسان وكربلاء، وستكون لها قدرة مجتمعة تبلغ ٤٤٠،٠٠٠ برميل في اليوم.^(٤٥)

في حزيران/يونيو، أعلن وزير النفط رزمة من الحوافز تهدف إلى جذب الاستثمارات لدعم إنشاء المصافي الجديدة. سوف تكون المصافي أما ذات ملكية خاصة أو مكونة كشراكة عامة - خاصة. هذه المقاربة هامة نظراً لأن صناعة النفط في العراق هي الآن ملكاً للدولة بالكامل.^(٤٦)

العجز في إمداد الكهرباء والاحتجاجات

خلال ربع السنة الحالي، كان المتوسط اليومي لإمداد الكهرباء على الشبكة الوطنية العراقية ٦٢٠٢ ميغاواط (MW) من بينها ٥٤٣٥ ميغاواط في اليوم أنتجت محلياً و٧٦٧ ميغاواط في اليوم تم استيرادها (٧٨% منها من إيران). لقد ازدادت المستوردات خلال ربع السنة الحالي بنسبة ١٠ بالمئة عما كانت عليه خلال ربع السنة الماضي.^(٤٧)

إن الوقود والمياه غير الكافيين لتوليد الكهرباء، وانقطاع التيار المخطط وغير المخطط، والطلب القياسي على الكهرباء في حزيران/يونيو (الذي بلغ متوسطه ١٠،٨٠٠ ميغاواط) بسبب موجة حر شديد غير متوقعة، كلها قد فاقت انقطاعات التيار خلال الصيف التي هي آفة دائمة في العراق.^(٤٨) في أواسط حزيران/يونيو، قام المحتجون المتظاهرون ضد التعطيم بأعمال تخريب في البصرة والناصرية وبعقوبة. وأصبحت الاحتجاجات مميتة في البصرة، في ١٩ حزيران/يونيو، عندما قتلت قوات الأمن العراقية اثنين من المحتجين. عقب اضطرابات مماثلة في الناصرية، في ٢١ حزيران/يونيو، قدم وزير الكهرباء استقالته وتم استبداله بوزير النفط.^(٤٩)

مكافحة الفساد

منسق جديد للجهود الأميركية لمكافحة الفساد

في أواخر حزيران/يونيو، حلّ أندرو داودي محل السفير جوزف ستافورد كرئيس لمكتب تنسيق مكافحة الفساد (ACCO) في السفارة. إنه رابع رئيس للمكتب منذ إنشائه (استجابة لتدقيق للمفتش العام) في مطلع ٢٠٠٨، والمسؤول الرسمي الحادي عشر المكلف السهر على الجهود الأميركية لمكافحة الفساد منذ بداية ٢٠٠٤. اعتباراً من ٢٣ حزيران/يونيو، سوف يرفع المكتب التقارير مباشرة إلى مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية، في السفارة الأميركية في بغداد. في السابق، كان مكتب تنسيق مكافحة الفساد (ACCO) يرفع التقارير إلى مساعد رئيس البعثة الدبلوماسية^(٥٠).


هيئة النزاهة

خلال ربع السنة هذا، ذكرت هيئة النزاهة أنها فتحت ٩٣ قضية خلال الأشهر الأربعة الأولى من ٢٠١٠، من بينها قضية ضد وزير في الحكومة العراقية لم يفصح عن اسمه^(٥١) للاطلاع على التوزيع المفصل لهذه القضايا، أنظر الشكل ٩-١.


الشكل ٩-١

قضايا فتحتها هيئة النزاهة، ٢٠١٠/١/١ – ٢٠١٠/٤/٣٠ حسب أهمية المواضيع التي يتم التحقيق بها

المجموع: ٩٣



حسب المحافظات



■ < ٤٠ قضية ■ ٤٠-١٠ قضية ■ ١٠-٢ قضايا ■ ٢-٠ قضية

المصدر: استجابة الحكومة العراقية وهيئة النزاهة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.



المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق وأعضاء من أسرة المفتشين العاملين العراقيين – أيار/مايو ٢٠١٠.

تبرئة وزير التجارة

خلال ربع السنة هذا، ردت محكمة الرصافة الجنائية في بغداد واحدة من قضيتين ضد وزير التجارة السابق الذي زعم انه يبدد الأموال العامة المخصصة لنظام التوزيع العام العراقي (PDS)، وأعلنت لجنة النزاهة واحد أعضاء البرلمان السابق انهما ينويان الاستئناف. وهناك قضية فساد أخرى ضد وزير التجارة السابق لا تزال عالقة.^(٥٢)

المفتشون العامون

في نهاية أيار/مايو، نظم المفتش العام حلقة دراسية تدريبية لموظفي التدقيق في مكتبه ببغداد وفتح الدورة أمام كبار الموظفين الرسميين من أسرة المفتشين العاملين العراقيين. كان بين الحضور، المفتشون العامون من وزارات الكهرباء، والنفط، والصناعة

والمعادن، والمالية، والتعليم، والتجارة، والاتصالات، والداخلية (نائب المفتش العام). وقّرت الدورة لنظراء المفتش العام العراقيين نظرة حول الطريقة التي تقدم فيها المنظمة التدريب الداخلي لموظفيها كجزء من برنامج المفتش العام الخاص لضمان الجودة. وشملت الدراسة أيضاً معايير التدقيق، المتوفرة باللغة العربية، التي يعتمدها مكتب المحاسبة الحكومية الأميركي.

إشراف المفتش العام

عمليات التدقيق

أصدر المفتش العام خلال ربع السنة الحالي خمسة تقارير تدقيق. لتاريخه، أصدر المفتش العام ١٧١ تدقيقاً. وكما هو موصوف بمزيد من التفاصيل في القسم ٣، راجعت تدقيقات المفتش العام خلال ربع السنة الحالي ما يلي:

- **مخصصات صندوق دعم الاقتصاد (ESF).** يُحلل هذا التقرير وضعية الـ ٤٥ مليار دولار في صندوق دعم الاقتصاد المخصصة للاستخدام من جانب وزارة الخارجية (DoS) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في العراق. ركزت البرامج الممولة من صندوق دعم الاقتصاد على تحسين الوضع الأمني، وبناء قدرات الحكومة العراقية، وتعزيز النمو الاقتصادي. حدّد المفتش العام ان وزارة الخارجية (DoS) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) قد قامت بالزام ٩٦ بالمئة من المخصصات وبتصفية حوالي ٨٠ بالمئة اعتباراً من ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠.
- **صندوق تنمية العراق (DFI).** ابتداء من ٢٠٠٤، أدارت وزارة الدفاع (DoD) عائدات النفط العراقية المودعة في صندوق تنمية العراق. كانت الأموال مخصصة للاستخدام في إعادة إعمار العراق. بعد مراجعة رقابات وزارة الدفاع المالية والإدارية، استنتج المفتش العام إلى ان أوجه الضعف في هذه الرقابة تركت وزارة الدفاع عاجزة عن تقديم بيان محاسبي حول ٨,٧ مليار دولار من أصل ٩,١ مليار دولار تلقّتها في صندوق تنمية العراق. حصل ذلك، بالدرجة الأولى، لأن معظم منظمات وزارة الدفاع التي تلقت أموال صندوق تنمية العراق لم تتفتح الحسابات المطلوبة مع وزارة المالية الأميركية كما ان أي من منظمات وزارة الدفاع لم تكن مسؤولة عن إدارة استخدام أموال صندوق تنمية العراق. أوصى المفتش العام بأن تحدّث وزارة الدفاع أنظمتها الخاصة بالإدارة المالية والإرشاد وبأن تحدد ما إذا كانت أي منظمة تابعة لوزارة الدفاع لا تزال تحتفظ بأموال من صندوق تنمية العراق.
- **إشراف وزارة الخارجية على هيئات الديمقراطية المقدمة إلى المعهد الجمهوري الدولي (IRI).** وجدت مراجعة المفتش العام لإدارة وزارة الخارجية لهبة بقيمة

٥٠ مليون دولار إلى المعهد الجمهوري الدولي لنشاطات بناء الديمقراطية في العراق ان الإشراف الضعيف لوزارة الخارجية والتقييد الضعيف للمعهد الجمهوري الدولي بشروط الهبات تركا الحكومة الأميركية عرضة لدفع مبالغ زائدة عن اللزوم مع معلومات غير كافية حول ما تم تحقيقه - باستثناء تنظيم ٢٧١ جلسة تدريب لحوالي ٥٠٠٠ عراقي على مدى سنتين.

- **السياسة التي أتبعها وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في إدارة السجلات لحفظ بيانات إعادة إعمار العراق.** لم تطبق وزارة الدفاع ولا وزارة الخارجية ولا الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالكامل سياساتها الخاصة بالاحتفاظ بسجلاتها الخاصة بإعادة إعمار العراق، تاركة الحكومة الأميركية عرضة للهدر والسرقعة. وفي حين أظهر هذا التدقيق بعض التقدم في حفظ تلك السجلات، يبقى لدى المفتش العام بنوع خاص مخاوف حول غياب التقدم في حفظ سجلات صندوق قوات الأمن العراقية وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد.
- **التقدم في مبادرة التدقيق الشرعي للمفتش العام.** راجع المفتش العام لتاريخه، كجزء من مراجعته الشرعية المطلوبة قانونياً أكثر من ٥٣ مليار دولار من الأموال الأميركية المخصصة لإعادة إعمار العراق، حيث راجع ١٠٨,٠٠٠ معاملة مالية بقيمة ٣٥,٨ مليار دولار. بعد مراجعة المدفوعات المزدوجة المحتملة، المتعلقة بمشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، التابعة لوزارة الدفاع، استنتج المفتش العام إلى ان معظم المعاملات المالية المشبوهة كانت شرعية. وأنجز المفتش العام أيضاً مراجعته للمدفوعات المزدوجة المحتملة التي أجرتها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) فيما له صلة بالمشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) وصندوق دعم الاقتصاد (ESF). هنا وجد المفتش العام ان المدفوعات المزدوجة أو الزائدة عن اللزوم، وكذلك تصحيحات المدفوعات والحسابات، قد حصلت في ٣٦ من أصل ٥٤ معاملة مالية تمت مراجعتها، وان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) إما استعدت الأموال أو انها قامت بالتصحيحات المناسبة في دفتر الأستاذ بالنسبة لكافة المبالغ.

لمزيد من عمليات تدقيق المفتش العام خلال ربع السنة هذا، أنظر القسم ٣.

التحقيقات

يعمل محققو المفتش العام حالياً على ١١٢ قضية مفتوحة، العديد منها بالتعاون الوثيق مع شركاء محليين ودوليين من مُطبقي فرض القانون، في الولايات المتحدة والعراق وأماكن أخرى. لتاريخه، قاد عمل المفتش العام التحقيقي إلى ٢٩ اعتقال و٤٣ اتهام و٣٤ إدانة قضائية، وأكثر من ٧٠,٧ مليون دولار من الغرامات، والمصادرات والاعادات، والمدفوعات المستعادة. النقاط البارزة في العمل التحقيقي خلال ربع السنة الحالي تشمل:

- في ٢٢ تموز/يوليو ٢٠١٠، تم توقيف موظف رسمي سابق في وزارة الخارجية ووجهت إليه تهمة لعب دور في مخطط احتيال بريدي بقيمة ١٤٧,٠٠٠ دولار شمل تحويل ملكية تابعة للحكومة الأميركية لاستخدامه الخاص.
- في مطلع أيار/مايو، حكم على مايكل دونغ نغوين، خريج وست بوينت والنتيب في الجيش الأميركي، بالسجن لمدة ٣٠ شهراً إثر إقراره بالذنب لقيامه بجرم سرقة الأملاك الحكومية وتنظيم معاملات مالية مزورة. وكان قد اعترف قبلاً أنه أثناء خدمته في العراق، سرق وحول إلى استخدامه الخاص حوالي ٦٩٠,٠٠٠ دولار نقداً ناجمة من أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. خلال تنفيذ مذكرة تفتيش، اكتشف المحققون أكثر من ٣٠٠,٠٠٠ دولار من أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) المسروقة مُخبأة في الدور العلوي لمنزل عائلة نغوين في بورتلاند. أمر نغوينين بالخدمة لمدة ثلاث سنوات من إطلاق سراح الخاضع للمراقبة، وبإعادة مبلغ ٢٠٠,٠٠٠ دولار، والتنازل عن كافة ملكياته في كافة أملاكه الشخصية التي اشتراها بالأموال المسروقة كما الأموال المتبقية المصادرة من قبل الحكومة عند اعتقاله.
- في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٠، جرى اتهام فاوستينو غونزالس، النقيب في الجيش الأميركي، بتهمة تلقي إكرامية من موظف رسمي حكومي. كان غونزالس ضابط مشتريات للمشاريع في الجيش الأميركي في العراق. أقر غونزالس أنه في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦، تأمر مع شركة عقود لتلقي ٢٥,٠٠٠ دولار من الرشاوى مقابل منح عقود من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). أقرّ غونزالس بالذنب في ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠١٠ وهو ينتظر صدور الحكم.
- في ١٤ أيار/مايو ٢٠١٠، قُدمت معلومات جنائية إلى المحكمة الفدرالية تتهم موظفاً سابقاً في شركة إنشاءات مقيمة في الولايات المتحدة بالتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة بقبوله ٣٨٤,٠٠٠ دولار من العمولات غير القانونية من مقولين من الباطن ساعدهم في الحصول على عقود في مشاريع مباني حكومية في العراق بين الأعوام ٢٠٠٥ و٢٠٠٨.
- في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٠، أقرّ إريك شميدت، النقيب في مشاة البحرية الأميركية (USMC) بالذنب أمام محكمة فدرالية بالتآمر لارتكاب الاحتيال وتعبئة استثمارية ضرائب فدرالية مزورة. وجهت إلى شميدت وزوجته في ٤ آذار/مارس ٢٠١٠، تهمة التآمر لاختلاس حوالي ١,٧٥ مليون دولار من عقود حكومية مُنحت بموجب البرنامج العراقي الأول. عند صدور الحكم، سيواجه كل من النقيب شميدت وزوجته لغاية ٢٣ سنة في السجون الفدرالية.
- في نفس اليوم، تمت إدانة الرقيب الأول تيرنس والتون، من مشاة البحرية في الجيش الأميركي، من قبل المحكمة العسكرية العامة، بتهمة الرشوة، وابتزاز المال وعدم إطاعة أمر مباشر. كان والتون أخصائي عقود في العراق من ٢٠٠٥ إلى

٢٠٠٦. لقد حكم عليه بالتأنيب القاسي، وأنزلت رتبته من E-8 إلى E-3، ودفع غرامة بقيمة ٦٥,٠٠٠ دولار، و٦٢ يوم احتجاز. نتيجة لهذه الإدانات، تم تنفيذ مذكرة بحقه في ٣ حزيران/يونيو ٢٠١٠ وصادر عملاء فدراليون منه أربع سيارات.

- في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٠، سلم راند في مشاة البحرية الأميركية نفسه إلى السلطات الفدرالية في ولاية أريزونا إثر مذكرة توقيف بتهمة إيداع أكثر من ٤٤٠,٠٠٠ دولار في حساب في مصرف أميركي بعد خدمته سنة ٢٠٠٥ في العراق حيث خدم كضابط مشتريات للمشاريع لحساب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).

- في أحدث تطورات "قضية كوكراهام" التي نتج عنها لتاريخه أحد عشر اتهام وتسع إدانات قضائية، قام قريب للرائد السابق في الجيش الأميركي، جون كوكراهام، بتسليم شيكاً بقيمة ١٠٠,٠٠٠ دولار طوعاً إلى حساب الأصول المصادرة لدى دائرة المحققين الأميركيين. يدعي الاتهام ان القريب هذا قد تلقى ٣٠٠,٠٠٠ دولار من شركة مقاولات مقيمة في الكويت. وقد تمّ التحديد بأن الأموال كانت ضمن مخطط رشاوى نظمه كوكراهام.

- في ٧ تموز/يوليو ٢٠١٠، أقرّ الرائد في الجيش الأميركي، تشارلز إي سوبليت، بالذنب أمام محكمة فدرالية في ولاية تينيسي لتقديمه بيانات خاطئة إلى وكالة فدرالية. وفقاً للتهمة، وفي الوقت الذي كان فيه سوبليت ضابط عقود سنة ٢٠٠٥ في العراق، هرب إلى الولايات المتحدة أكثر من ١٠٠,٠٠٠ دولار نقداً.

لتفاصيل إضافية حول نشاطات المفتش العام التحقيقية الأخيرة، أنظر القسم ٣.

تقارير عمليات التفتيش والتقييمات القادمة

في وقت متأخر من هذه السنة، سوف يصدر المفتش العام تقريره النهائي لعمليات التفتيش، ملخصاً ومحللاً النتائج التي توصل إليها من خلال ١٧٠ تقييم لمشاريع، و ٩٦ تقييم محدود في الموقع، و ٨٧١ تقييم جوي أصدرها خلال السنوات الخمس الأخيرة. معظم الأعضاء السابقين في مديرية التفتيش التابعة للمفتش العام قد انتقلوا إلى مديرية التقييمات الجديدة ويساهمون حالياً في إعداد أول تقارير التقييم التي سوف تصدر لاحقاً في ٢٠١٠.

الشهادات

في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٠، عقدت لجنة التعاقد في وقت الحرب في العراق وأفغانستان (CWC) جلسات استماع حول قدرة الحكومة الأميركية على كبح الهدر والاحتيايل وإساءة الاستخدام في العمليات الطارئة. ركزت جلسات الاستماع على التحديات التي تواجه وكالات فرض تطبيق القانون، بما فيها إعداد قضايا المقاضاة الجنائية الناجحة في البيئات الطارئة.^(٥٣) أدلى نائب المفتش العام ومساعد المفتش العام للتحقيقات بشهادتيهما حول

ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

اتساع النشاط الإجرامي الملاحظ في العراق، وحول قدرات المفتش العام التحقيقية، والعمليات والإعمال الضرورية لمنع الاحتيال واكتشافه في العمليات الطارئة الأخرى.^(٥٤)

في ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠١٠، أدلى المفتش العام بشهادته أمام اللجنة الفرعية للكونغرس حول الأمن القومي والشؤون الخارجية المتفرعة من لجنة الإشراف والإصلاح الحكومي، كجزء من هيئة تدرس المشاكل المتصلة بالتعاقد من الباطن في العمليات الطارئة. لاحظت شهادة المفتش العام ان القادة الحكوميين بحاجة لاتخاذ الخطوات لمنع المقاولين – والذين يأتون بعدهم في الترتيب - من تفويض مصالح الحكومة. خلال شهادته، تحدث المفتش العام أيضاً، مرة أخرى، عن توصيتين سبق له ان قدمهما وهما: تطبيق قانون التملك الفدرالي الطارئ^{٥٥} وإنشاء مكتب جديد متكامل لإدارة عمليات إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار.



الموظفون الرسميون في مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR) وموظفون رسميون آخرون يمارسون الإشراف، يدلون بشهاداتهم أمام لجنة العقود وقت الحرب في العراق وأفغانستان، في أيار/مايو ٢٠١٠.

الكلفة البشرية

الوفيات بين المدنيين الأميركيين

ذكرت وزارة الخارجية ان ثلاثة مدنيين أميركيين توفوا في العراق خلال ربع السنة الحالي. توفي اثنان لأسباب طبيعية، ويبقى سبب وفاة الحالة الثالثة غير محدد. منذ آذار/مارس ٢٠٠٣، توفي في العراق ٣٠٥ مواطنين أميركيين مدنيين على الأقل.^(٥٥)

المقاولون

في ٢٢ تموز/يوليو ٢٠١٠، انفجرت عدة صواريخ داخل المنطقة الدولية فقتلت ثلاثة مقاولين أجانب يعملون لحساب تريبل كانوبي، وهي شركة أمنية قائمة في الولايات المتحدة. الشكل ١-١٠ يدرج أسماء ١٥ شركة تعاقدت في تقاريرها انه كان لها أكبر عدد من الوفيات في العراق منذ آذار/مارس ٢٠٠٣.

خلال ربع السنة الحالي، تلقت وزارة العمل (DoL) تقارير حول ١٢ وفاة إضافية لمقاولين يعملون في برامج مُمولة من الولايات المتحدة في العراق. وتلقت وزارة العمل أيضاً تقارير حول ٨٨٢ إصابة خلال ربع السنة الحالي سببت للمقاولين المصابين فقدان أربعة أيام عمل أو أكثر. منذ ٢٠٠٣، تم في وزارة العمل تسجيل ١٤٨٧ وفاة على الأقل.^(٥٦)

الصحفيون

في ٦ أيار/مايو ٢٠١٠، عثر على جثة الطالب الصحفي الكردي سردشت عثمان بالقرب من الموصل. كان قد تلقى طلقتين في رأسه. حاز عثمان على درجة من الشهرة محلياً جراء مقالاته الناقدة للفساد في حكومة إقليم كردستان. كان يساهم في جريدة أشتينامه في اربيل، وقد نُشر أيضاً عمله في عدة منتديات على شبكة الإنترنت. كان عثمان الصحفي الوحيد الذي قتل في العراق خلال ربع السنة الحالي.^(٥٧)

في أعقاب اغتيال عثمان، أرسلت لجنة حماية الصحفيين (CPI) كتاباً مفتوحاً إلى الرئيس مسعود برزاني في حكومة إقليم كردستان تعرب فيه عن هواجسها حول الظروف المتردية للحرية الصحفية في إقليم كردستان، وانتقدت اللجنة أيضاً الموظفين الرسميين في حكومة إقليم كردستان لإقامة دعاوى جنائية تهدف إلى إسكات تغطية الأنباء ودعت الرئيس برزاني إلى إصدار توجيه واضح إلى كافة القوى الأمنية مع تعليمات للامتناع عن مهاجمة أو عرقلة عمل الصحفيين.^(٥٨)

الأمم المتحدة تصدر تقريرها حول حقوق الإنسان


في مطلع تموز/يوليو، أصدرت الأمم المتحدة آخر تقرير لها حول وضع حقوق الإنسان في العراق، ولاحظت انه في الوقت الذي حقق فيه العراق بعض التقدم، لا تزال هناك مجالات هامة تثير المخاوف. أعد التقرير بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة (UNAMI) ومكتب المفوضية العليا لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. يغطي التقرير الأشهر الستة الأخيرة من ٢٠٠٩. شملت النتائج الأساسية التي تم التوصل إليها ما يلي:^(٥٩)

- تراجعت وفيات المدنيين قليلاً خلال النصف الثاني من ٢٠٠٩ (١٩٩٨) بالمقارنة مع النصف الأول (٢٠٧٠).
- أصيب حوالي ٩٧٤٧ مدني بجروح خلال فترة التقرير أي بزيادة ملحوظة بالنسبة للأشهر الستة الأولى من ٢٠٠٩ عندما ذكر ان ٦١٨٨ مدني أصيبوا بجروح.
- يواصل المقاتلون مهاجمة أماكن العبادة، وقد قصفوا أو فجروا على الأقل ١١ كنيسة و ٥ مساجد شيعية.
- الأحكام بالإعدام تصدر بصورة متكررة أكثر (٣١ حكم بالإعدام من كانون الثاني/يناير إلى حزيران/يونيو مقابل ٩٣ من تموز/يوليو إلى كانون الأول/ديسمبر).
- تواصلت الهجمات المحددة الأهداف ضد الموظفين الرسميين الحكوميين والشخصيات البارزة خلال تلك الفترة مع استهداف القضاة وقادة القبائل والوزراء وأعضاء مجالس المحافظات وكبار المسؤولين الأمنيين.

ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الشكل ١٠-١

أصحاب العمل الذين سجلوا أكبر عدد من الوفيات بموجب قانون قاعدة الدفاع، ٢٠٠٣/٣/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠

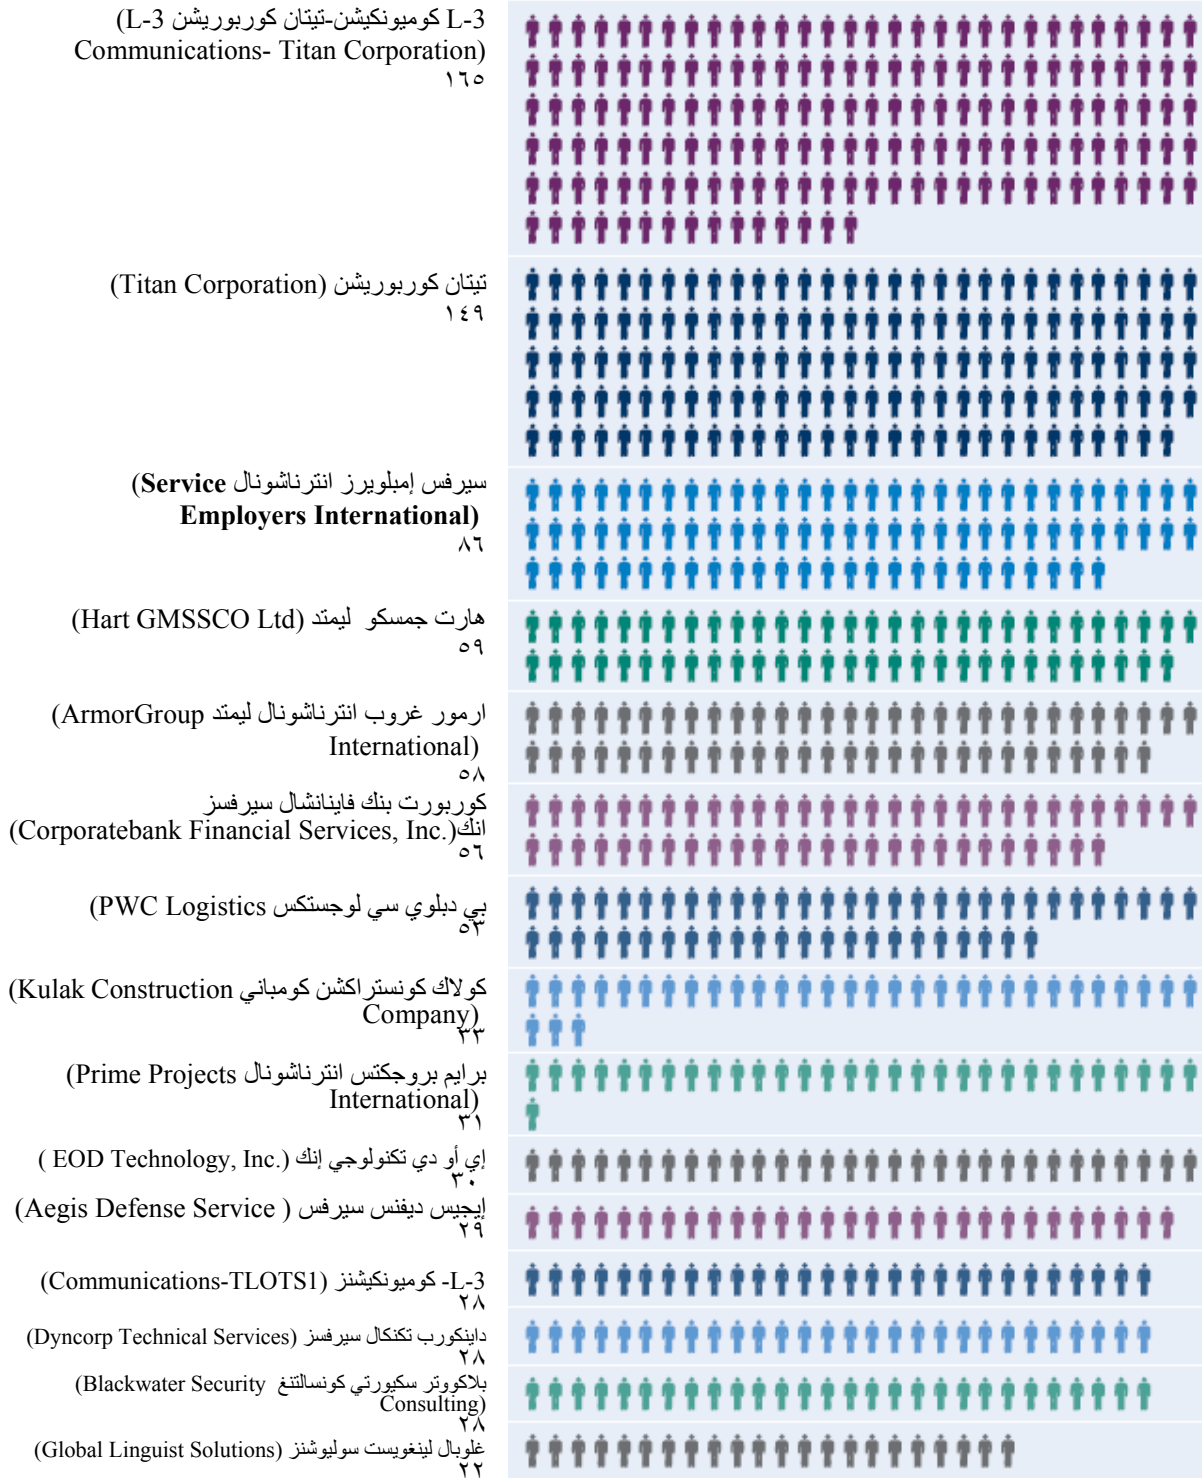

ملاحظة: كل رمز يمثل قتيلا

المصدر: استجابة وزارة العمل لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

مصادر التمويل
إدارة مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها
الأمن
البنية التحتية
نظام الحكم
الإقتصاد

القسم

٢

مصادر تمويل إعادة الإعمار

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان حوالي ١٥٧,١٧ مليار دولار قد تمّ توفيرها لإغاثة وإعادة إعمار العراق عبر ثلاثة مصادر رئيسية: (٦٠)

- الأموال العراقية التي كانت تشرف عليها سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) وموازنات العراق الرأسمالية – ٩١,٤٣ مليار دولار.
- تعهدات المساعدات الدولية والقروض من مصادر غير أميركية - ١١,٩٦ مليار دولار.
- المخصصات الأميركية – ٥٣,٧٩ مليار دولار

أنظر الشكل ١-٢ للاطلاع على نظرة عامة على مصادر التمويل هذه.


التمويل العراقي

حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان العراق قد قدّم ٩١,٤٣ مليار دولار للإغاثة وإعادة الإعمار: ٢,٠٧ مليار دولار عبر تمويل عراقي من عهد سلطة الائتلاف المؤقتة و ٧٩,٣٦ مليار دولار عبر موازناته الرأسمالية السنوية. (٦١)

توقعات إيرادات الحكومة العراقية سنة ٢٠١٠

حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الحكومة العراقية قد تلقت ٢٤,٣٥ مليار دولار من إيرادات النفط منذ بداية السنة التقويمية. على افتراض ان متوسط حجم الصادرات والأسعار سيبقى هو نفسه خلال النصف الثاني من السنة، سوف تتلقى الحكومة العراقية ٤٨,٧٠ مليار دولار كإجمالي إيرادات النفط السنوية لسنة ٢٠١٠، أي ٣٢ بالمئة أكثر من ال ٣٧,٠٢ مليار دولار من إيرادات النفط سنة ٢٠٠٩. (٦٢) منذ بداية السنة، تلقت العراق ٧٤,٩٣ دولار كمتوسط سعر لبرميل النفط المصدر (٦٣)، أي أعلى بكثير من سعر ٦٢,٥٠ دولار المستخدم في توقعات إيرادات النفط العراقي لسنة ٢٠١٠. (٦٤)

الشكل ١-٢
مصادر التمويل، ٢٠٠٣-٢٠١٠
بمليارات الدولارات

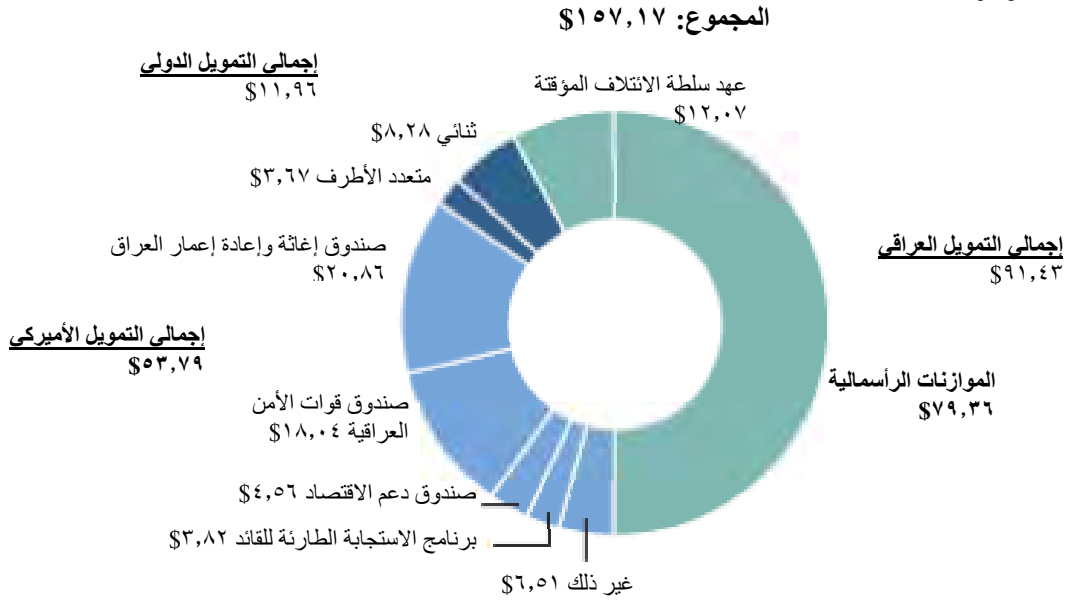

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. أموال العراق في عهد سلطة الائتلاف المؤقتة شملت ١,٧٢ مليار دولار من الأموال المكتسبة، و ٠,٩٣ مليار دولار من الأموال المصدرة، و ٩,٣٣ مليار دولار من صندوق تنمية العراق و ٠,٠٩ مليار دولار من أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي قدمها بنك العراق المركزي.

المصادر: الحكومة العراقية، مجلس النواب "قانون الموازنة الفدرالية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٧/١/٢٠١٠، استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٣، الحكومة العراقية، إيرادات ونفقات موازنة ٢٠٠٣، تموز/يوليو - كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، الحكومة العراقية، رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة: موازنة الدولة العامة لسنة ٢٠٠٥، ٢٠٠٥، الحكومة العراقية، المجلس الرئاسي، "قانون الموازنة العامة الفدرالية للسنة المالية ٢٠١٠"، ١٠/٢/٢٠١٠، استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١/٤، ٢٠٠٩/٤/٩، ٢٠٠٩/٤/٩، التقرير ربع السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٤، ص ٢٦، P.L. 108-106; P.L. 108-11; P.L. 108-287; P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 109-13; P.L. 109-148; P.L. 109-234; P.L. 109-289; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 110-28; P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-32.

توقعت الموازنة العراقية لسنة ٢٠١٠ عجزاً بقيمة ١٩,٥٩ مليار دولار^(٦٥). غير ان إيرادات النفط قد تجاوزت توقعات الحكومة العراقية لكل شهر منذ حزيران/يونيو ٢٠٠٩^(٦٦)، وإذا بقيت الاتجاهات الحالية ثابتة، سوف يتجاوز العراق توقعاته حول إيرادات النفط للسنة الحالية^(٦٧). علاوة على ذلك، ووفقاً لوزارة الدفاع الأميركية، سوف يُبطئ التأخير في تشكيل الحكومة العراقية تفويضات تنفيذ الموازنات الرأسمالية^(٦٨). نظراً لتلك الاتجاهات، يعتقد بعض المراقبين ان العراق سينهي السنة مع فائض في الموازنة^(٦٩).

كانت النتائج مماثلة سنة ٢٠٠٩. لقد توقعت الحكومة العراقية لتلك السنة عجزاً بقيمة ١٥,٩ مليار دولار، بالدرجة الأولى بسبب أسعار النفط المتدنية في أواخر ٢٠٠٨^(٧٠). غير ان معدل التنفيذ المتدني للموازنة الرأسمالية السنوية وأسعار النفط المتزايدة بحلول أواخر ٢٠٠٩ نتج عنهما فائض في الموازنة بلغ ٢,٥ مليار دولار^(٧١).

خطة التنمية الوطنية العراقية

الخطة التنموية الوطنية العراقية الجديدة (NDP) التي تغطي الفترة الزمنية من ٢٠١٠ إلى ٢٠١٤ نشرت على الملأ في ٤ تموز/يوليو ٢٠١٠. ترسم الخطة الجديدة مساراً للتنمية الاجتماعية والاقتصادية والحماية البيئية وهي تتطلب استثمارات بقيمة ١٠٠ مليار دولار من الحكومة العراقية و٨٦ مليار دولار من القطاع الخاص. تفترض الخطة الجديدة ان العراق سوف يتلقى ٣٣٤ مليار دولار من الإيرادات بين ٢٠١٠ و٢٠١٤، استناداً إلى متوسط سعر متوقع للنفط يبلغ ٦٠ دولار للبرميل سنة ٢٠١٠، و٦٣ دولار سنة ٢٠١١، و٦٨ دولار للبرميل سنة ٢٠١٢-٢٠١٤. لمزيد من المعلومات حول خطة التنمية الجديدة وأهدافها، انظر القسم الأول (١) من هذا التقرير.

الدعم الدولي

حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان المانحون الدوليون قد التزموا بتقديم ١١,٩٦ مليار دولار لإغاثة وإعادة إعمار العراق: ٦,١٥ مليار من هبات المساعدات، و٥,٨١ مليار دولار من القروض^(٧٣). خلال ربع السنة الحالي، ازداد إجمالي ما جرى الالتزام به مبلغ ٥٠٨,٤ مليون دولار (٤%)^(٧٤) على الشكل التالي:

- التزم اليابان تقديم ١٠٩,٤ مليون دولار مساعدات إنسانية ثنائية.
- التزمت إيطاليا تقديم ١٥٠ مليون دولار قروض، مضاعفة التزامها السابق.
- حرّر البنك الدولي شريحة ال ٢٥٠ مليون دولار الثانية من قرض سياسة تنمية العراق دعماً للبرامج الإصلاحية للحكومة العراقية، التي تركّز على إدارة المالية العامة، وإصلاح القطاع العام، وخفض الفقر.

حتى تاريخ ٣٠ حزيران يونيو ٢٠١٠، كان المانحون الدوليون قد تعهدوا بتقديم ١٨,١٠ مليار دولار: ٥,٢٦ مليار دولار على شكل هبات مساعدات، و١٢,٨٤ مليار دولار على شكل قروض^(٧٥).

وبحسب مكتب شؤون الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) في وزارة الخارجية الأميركية، بإمكان العراق الاستفادة من القروض الميسرة التي تعهد بها المانحون للحفاظ على زخم التنمية الاقتصادية في حال نتج عن أسعار النفط المتدنية إيرادات غير كافية للحكومة العراقية^(٧٦).

التزامات بعض المانحين تجاوزت تعهداتهم. ودول أخرى، وخصوصاً في الشرق الأوسط، قد التزمت أقل بكثير مما تعهدت به.

يبلغ إجمالي الالتزامات ٦٦ بالمئة من التعهدات، لكن النسبة المئوية تتفاوت إلى حد كبير بين المانحين. فالتزامات بعض المانحين تجاوزت تعهداتهم. ومانحون آخرون، وبنوع خاص في الشرق الأوسط، قد التزموا أقل بكثير مما تعهدوا به^(٧٧). للإطلاع على توزيع التعهدات والالتزامات حسب نوع المساعدة والمانحين، أنظر الشكل ٢-٢.

إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF): إطار عمل جديد لمساعدات الأمم المتحدة


في ١١ أيار/مايو ٢٠١٠، أصدر فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT) إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) الذي أعد بالتشاور مع وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة العراقية (MoPDC).^(٧٨)

يعكس إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) تطبيق الأمم المتحدة والعراق لإعلان باريس لمبادئ فعالية المساعدات الذي يُشدد على امتلاك الدولة المضيفة لعملية مساعدات التنمية. ويعكس أيضاً افتراض قيام الأمم المتحدة بالدور القيادي في التنسيق مع المجتمع الدولي.^(٧٩)

هناك الكثير من النقاط المشتركة بين إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) والميثاق الدولي مع العراق (ICI)، وهي خطة تنمية قومية خمسية – أطلقت سنة ٢٠٠٧- وشملت علامات الانتهاء والتزامات متبادلة للحكومة العراقية والمجتمع الدولي.^(٨٠) على غرار إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، تمّ التفاوض بشأن الميثاق الدولي مع العراق (ICI) مع الأمم المتحدة وكان هذا التفاوض مستنداً، جزئياً، إلى "أهداف الألفية للتنمية". تتضمن الخطتان العديد من الأهداف وآليات التطبيق المتشابهة.^(٨١)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

الشكل ٢-٢
الهبات والقروض الدولية حسب نوع المساعدات والمانحين
بمليارات الدولارات

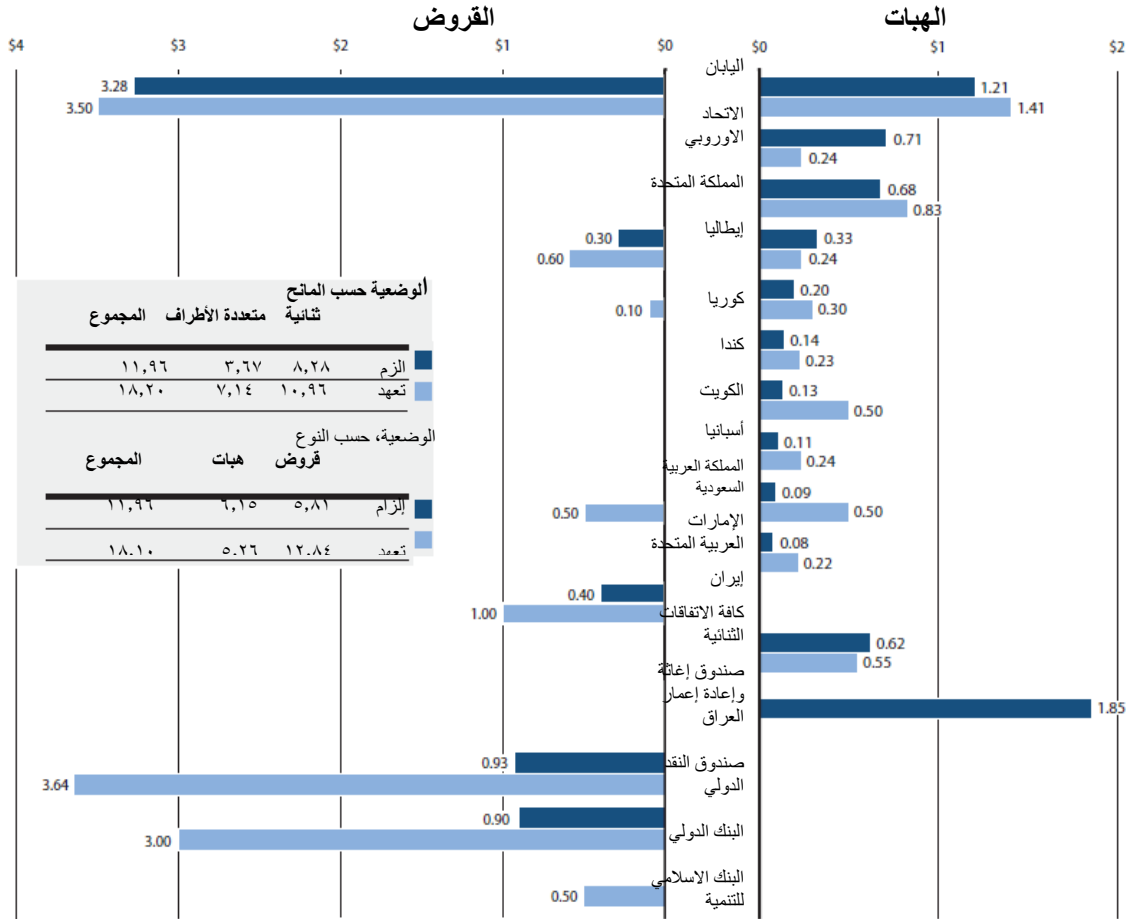

ملاحظة: البيانات لم تدقق - الأرقام تتأثر بالتدوير. الالتزامات الثنائية تستثني ودائع صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق. قد تتغير المبالغ عن ربع السنة السابق بسبب التغييرات في أسعار الصرف الخارجي.
المصدر: استجابة مكتب الشرق الأدنى - العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.

الاجتماع الأول والوحيد على المستوى الوزاري لمراجعة الميثاق الدولي مع العراق (ICI) عقد في أيار/مايو ٢٠٠٨. تحدث تقرير المؤتمر عن حصول تقدم تشريعي كبير وعن مؤشرات اقتصادية إيجابية، وتعزيز للمكاسب الأمنية الأخيرة، لكنه لاحظ وجود مشاكل جارية حول حقوق الإنسان.^(٨٢) وفصل ملحق التقرير مدى التقدم باتجاه ٢٧٢ معلم: ٥٢ معلم (١٩%) أنجز أو تمت الموافقة عليه، ١٤٦ معلم (٥٤%) قيد الإنجاز، أو منجز جزئياً أو تشارف على الإنجاز، ٥٨ معلم (٢١%) لم يبدأ أو تأجل، و ١٦ معلم (٦%) بدون بيانات^(٨٣)، بعض الأهداف التي لم تكن "قد بدأت بعد" قد أنجزت منذ ذلك الحين، مثل وضع استراتيجية قومية لمكافحة الفساد. والبعض الآخر كان "قيد الإنجاز" مثل التشريعات الشاملة للهيدروكربون، والذي لا زال بلا حل^(٨٤). وبحسب مكتب شؤون الشرق الأدنى-العراق (NEA-I)، كانت المراجعات على المستويات الوزارية الثانوية والسفراء قد جرت قبل نقل المسؤولية من الميثاق الدولي مع العراق إلى إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF).^(٨٥)

أولويات إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) والموارد المتوفرة يذكر إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية إيرادات النفط العراقية الكبيرة كوسيلة لتسريع تعافي العراق وبلوغ وضعية الدخل المتوسط لكنها تحذر من الفساد الكامن. وفقاً لتحليل فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، "يفتقر العراق إلى الأنظمة الضرورية لضمان مساءلة الدولة والشفافية"، وخلص إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية إلى أن "عملية التنمية مرتبطة بشكل وثيق بالعملية السياسية"^(٨٦).

استناداً إلى "أهداف الألفية للتنمية" التابعة للأمم المتحدة، والتقييم المشترك لحاجات العراق أجرته الأمم المتحدة والعراق، والخطة الخمسية الجديدة للحكومة العراقية أي خطة التنمية الوطنية العراقية الجديدة (NDP)، حدّد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) خمسة مجالات ذات أولوية، وقدّر الاحتياجات في الموارد لتلك المجالات^(٨٧) كما يلي:

- ١- نظام حكم محسّن بما في ذلك حماية حقوق الإنسان (٢٩٩ مليون دولار).
- ٢- نمو اقتصادي قابل للاستدامة، وشمولي، وأكثر عدالة (٤١٧ مليون دولار).
- ٣- إدارة بيئية وتقيّد بالمعاهدات والموجبات الدولية المصادق عليها (٢١٩ مليون دولار).
- ٤- إمكانية الوصول المتزايد إلى الخدمات الأساسية الجيدة النوعية (٨٧٠ مليون دولار).
- ٥- استثمار في الرأسمال البشري، وتمكين النساء، والشباب، والأطفال (٩٨ مليون دولار).

الكلفة الإجمالية المقدرة لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) هو حوالي واحد بالمئة من إجمالي كلفة خطة التنمية الوطنية العراقية الجديدة (NDP)

إجمالي الكلفة المقدرة لمساهمة الأمم المتحدة في جهود إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) للسنوات الخمس تقارب ١,٩٠ مليار دولار من ضمنها ٢٥٠ مليون دولار فقط كانت متوفرة لدعم إطار العمل عند إصداره. ال ١,٦٥ مليار دولار المتبقية لا تزال بحاجة إلى "جمعها" من البلدان المانحة^(٨٨). وبحسب مكتب الشرق الأدنى- العراق (NEA-I)، تعهد المانحون بتقديم ٣,٥١ مليار دولار لدعم الميثاق الدولي مع العراق (ICI)، سلف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية: ٧٢٣ مليون دولار من مانحين ثنائيين و ٢,٧٩ مليار دولار من مانحين متعددي الأطراف. ليست هناك بيانات متوفرة حول التزامات الميثاق الدولي مع العراق.^(٨٩)

تغطي خطة إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) فترة زمنية مشابهة لخطة التنمية الوطنية العراقية الجديدة (NDP).^(٩٠)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخدماتها

خطة ومعايير تطبيق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)
إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية هو إطار عمل استراتيجي. سوف تقوم لجنة توجيه بصورة دورية بتقييم التقدم الحاصل في إطار العمل هذا، لكن التطبيق الفعلي يتوقف على قدرة وكالات الأمم المتحدة وشركاء العراق على وضع إطار العمل قيد التنفيذ دعماً لأولويات العراق الوطنية. مجموعات العمل المنظمة حول الأولويات الخمس سوف تركز على التخطيط والرصد وتقييم البرامج والمشاريع.^(٩١)

يشمل إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، على غرار الميثاق الدولي مع العراق (ICI)، العديد من المقاييس لتقييم التقدم باتجاه تحقيق الأهداف المتفق عليها. للاطلاع على مثال يتعلق بالتمويل الدولي، انظر الجدول ٢-١. يمكن العثور على مقاييس وأهداف إضافية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية في هذا التقرير.

الجدول ٢-١

هدف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية من أجل الحصول على مساعدة دولية

المقاييس	الخط القاعدي	هدف ٢٠١٤
النسبة المئوية لتدفق المساعدات الدولية التي تعكس أولويات التنمية في العراق	١٥ بالمئة (٢٠٠٩)	٦٠%

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية ٢٠١٤-٢٠١١، ٢٠١٠/٥/١١، الملف أ: نتائج إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية، ص ص ٤٣-٥٩.

افتراضات ومخاطر إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)
ستظل وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي (MoPDC) الشريك الأول لفريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)^(٩٢) لكن كل جزء من الحكومة العراقية منخرط بصورة معينة في إطار العمل. يدعو إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية إلى التشديد الخاص على المشاركة المتزايدة للمجتمع المدني والقطاع الخاص^(٩٣). المجموعة الواسعة من شركاء الحكومة العراقية مشكلة محتملة نظراً للشكوك الناتجة بعد الانتخابات بما فيها أولويات التنمية وقدرة التحالف الحاكم الجديد.^(٩٤)

عيّن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية عدة افتراضات رئيسية ضرورية للتطبيق الناجح:^(٩٥)

- التحسّن المستمر في الأمن وإمكانية الوصول إلى المجتمعات الأهلية.
- تقيد الحكومة القادمة بالالتزامات التي أقرتها الحكومة الحالية.
- توفر الموارد الكافية لتحقيق إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية.
- وجود رغبة لدى شعب العراق ككل للدعم والمشاركة في عملية استعادة عافيتهم وتنميتهم.

المخاطر الأساسية التي عيّن إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية تشمل:

- التحولات الكبرى داخل الوزارات والمؤسسات النظيرة الأخرى بعد الانتخابات قد تؤخر تطبيق البرامج المتفق عليها.

- فجوات القدرات داخل الحكومة والمؤسسات الاجتماعية قد تقوّض نظام الحكم والجهود الإصلاحية.
- العلاقات بين السلطات المركزية وسلطات المحافظات في ما يتعلق باللامركزية قد تبقى بلا حل.
- التأثيرات الاقتصادية والسياسية العالمية قد تعيق النمو.
- العنف المتجدد قد يُطلق التحركات الشعبية ويخلق وضعاً إنسانياً مهيماً على الأوضاع.

التمويل الأميركي

منذ ٢٠٠٣، خصص الكونغرس الأميركي وجعل متوفراً بطرق أخرى ٥٣,٧٩ مليار دولار لجهود إعادة الاعمار في العراق بما ذلك بناء البنية التحتية المادية، وإقامة المؤسسات السياسية والاجتماعية، وإعادة تكوين القوات الأمنية، وشراء المنتجات والخدمات لصالح الشعب العراقي.^(٩٧)

حتى تاريخه ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان ٤٧,٢٨ مليار دولار قد توفرت عبر أربعة صناديق رئيسية^(٩٨):

- صندوق إغاثة وإعادة اعمار العراق (IRRF) ٢٠,٨٦ مليار دولار
- صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) – ١٨,٠٤ مليار دولار
- صندوق دعم الاقتصاد (ESF) ٤,٥٦ مليار دولار
- برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) ٣,٨٢ مليار دولار

من بين التمويلات الرئيسية، هناك ٢,٠٨ مليار دولار من الأموال الملزمة التي لم تُنفق حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠. وهناك ٢,٣٤ مليار دولار إضافية بقيت دون الزام، لكن ١,٣٥ مليار دولار من تلك الأموال غير الملزمة قد انتهت صلاحيتها فقط الأموال التي لم تنته صلاحيتها بعد، أي ٩٩٥ مليون دولار حتى ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، يمكن إلزامها في مشاريع جديدة.^(٩٩)

وقد وقر الكونغرس أيضاً ٦,٥١ مليار دولار عبر عدة مصادر تمويل صغيرة.^(١٠٠)

للاطلاع على نظرة شاملة على مخصصات وإلزامات وإنفاقات الصناديق الأربعة الكبرى، حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، أنظر الشكل ٢-٣. للاطلاع على تفاصيل حول تخصيصات الصناديق الأربعة الرئيسية والصناديق الأصغر، وحول وضعية هذه الصناديق حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، أنظر الجدول ٢-٣.

الكونغرس ينظر في طلب أموال تكميلية للسنة المالية ٢٠١٠

خلال ربع السنة المنصرم، طلبت الإدارة ٤,٤٥ مليار دولار من المخصصات الجديدة لإعادة إعمار العراق: ١,٥٢ مليار دولار كمخصصات تكميلية للسنة المالية ٢٠١٠ و ٢,٩٣ مليار دولار من المخصصات النظامية للسنة المالية ٢٠١١^(١٠١). وطلبت الإدارة أيضاً ١,٥٧ مليار دولار للنفقات التشغيلية المرتبطة بإعادة الإعمار ومصاريف التشغيل ذات الصلة لوزارة الخارجية (DoS) كان القصد منها دعم نقل خمسة فرق لإعادة إعمار المحافظات (PRTs) إلى مراكز الحضور الدائم (EPPs) التي يديرها رئيس البعثة^(١٠٢). طلبات موازنة الإدارة هي قيد

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها


الدرس من جانب الكونغرس. للاطلاع على الوضعية حتى تاريخ ٢٢ تموز/يوليو ٢٠١٠، أنظر الجدول ٢-٢.

في ٢٤ آذار/مارس ٢٠١٠، أقرّ مجلس النواب مشروع قانون المخصصات المالية التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠ (H.R.4899). تضمن القانون، كما أقرّ أصلاً، أحكاماً لأعداد كبيرة من الوظائف الصيفية وإغاثة الكوارث، ولم يتضمن أي تمويل للعراق أو لعمليات وزارة الخارجية.^(١٠٣)

في ٢٧ أيار/مايو ٢٠١٠، أقرّ مجلس الشيوخ تعديله لمشروع القانون H.R. 4899.^(١٠٤) شمل مشروع القانون مليار دولار لقوات الأمن العراقية سوف يبقى متوفراً لغاية ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١١. وشمل أيضاً ٦٥٠ مليون دولار من التمويل للصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE) للعراق: ٤٥٠ مليون دولار لتكاليف البدء لمرة واحدة وتكاليف عمليات محدودة لبرامج الشرطة العراقية، و ٢٠٠ مليون دولار للتنفيذ، والإدارة، والأمن، والاتصالات، والنفقات الأخرى ذات الصلة بالبرنامج^(١٠٥). مثل ذلك زيادة صافية بلغت ١٣٣ مليون دولار عن طلب الإدارة، أي تمويل أقل من المطلوب لتكاليف البدء لمرة واحدة المتعلقة بمسؤولية وزارة الخارجية الجديدة لتدريب الشرطة العراقية، لكن ٢٥٠ مليون دولار إضافية لبند غير مطلوب على صلة "بالتنفيذ، والإدارة والأمن."^(١٠٦)

في تقريره المرافق لمشروع القانون، خصصت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ ١,٠٣ مليار دولار لـ "دعم توظيف مزيد من الموظفين، وإنشاء مرافق مؤقتة، ودعم الأمن لنقله إلى الجهد الذي يقوده المدنيون في العراق". التوصية الصافية بالنسبة للنفقات التشغيلية المتعلقة بإعادة الإعمار كانت أقل بـ ٥٤٠ مليون دولار من طلب الإدارة. لاحظت لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ أنها دعمت إنشاء مراكز "على طول الخطوط الفاصلة المتفجرة العربية-الكرديّة"، وسمحت بتمويل إنشاء مرافق مؤقتة لهذا الغرض لكنها لم توص بإعطاء ٥٢٧ مليون دولار مطلوبة "لتطوير المواقع وإنشاء قنصليات دائمة في البصرة وشمال العراق". بدلاً من ذلك، أوصت اللجنة بأن تعطى الأولوية لتمويل ما تحتاجه تلك المرافق ضمن المبالغ المخصصة للأمن، والإنشاء والصيانة العائدة للسفارة ضمن قوانين المخصصات النظامية.^(١٠٧)

الشكل ٣-٢
وضعية الصناديق الأميركية الكبرى
بمليارات الدولارات

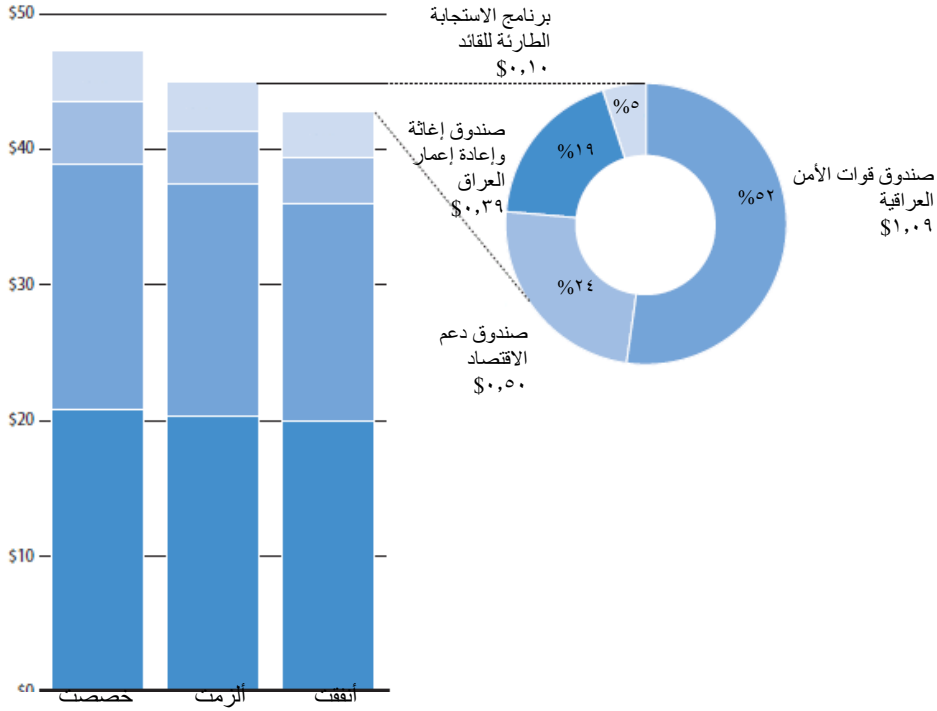

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن إجمالي الفئات المذكورة في القسم الفرعي المتعلق بمصادر التمويل في هذا التقرير قد لا يتطابق مع قيم الخط العلى المذكورة في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: القانون العام P.L. 108-106; P.L. 108-111; P.L. 108-287; P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 109-13; P.L. 109-148; P.L. 109-234; P.L. 109-289; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 110-28; P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-32 الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨، استجابة وزارة الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٧/١٤/٢٠٠٩ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٩/٤/٢، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية لطلب المفتش العام ٢٠٠٩/٤/٢.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

الجدول ٢-٢

المخصصات التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠ والنظامية للسنة المالية ٢٠١١، حتى تاريخ ٢٠١٠/٧/٢٢
بملايين الدولارات

النظامية للسنة المالية ٢٠١١	المخصصات	مجلس النواب	مجلس النواب	الطلب	الصندوق	
						المساعدات الخارجية
٢,٠٠٠	*	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)	الدفاع
٢٠٠					برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)	
٢,٢٠٠	*	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	المجموع الفرعي	
٣٨٣				٠	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	العمليات الخارجية
٣١٥	*	٦٥٠	٦٥٠	٥١٧	الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE)	
٣٠				٠	برنامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومقاومة الإرهاب ونزع الألغام والبرامج العائدة لها (NADR)	
٢				٠	التدريب العسكري والتعليمي الدولي (IMET)	
٧٢٩	*	٦٥٠	٦٥٠	٥١٧	المجموع الفرعي	
٢,٩٢٩	*	١,٦٥٠	١,٦٥٠	١,٥١٧	إجمالي المساعدات	
						الإنفاقات التشغيلية ذات العلاقة بإعادة الاعمار
٠	*	١,٠٣٠	١,٠٣٠	١,٥٧٠		الوضعية
٠	*	١,٠٣٠	١,٠٣٠	١,٥٧٠		الإجمالي التشغيلي

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. يعكس الجدول تعديل لجنة المخصصات في مجلس النواب في ٢١ تموز/يوليو ٢٠١٠ للقانون H.R. 4899 المبالغ التي أقرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليست نهائية. المفاوضات جارية وليس من المعروف متى سيمر مشروع القانون النهائي.

المصادر: وزارة الدفاع "طلب موازنة السنة المالية ٢٠١١: نظرة عامة" ٢٠١٠/٢، الفصل ٦، ص.ص. ٥، ٩، وزارة الخارجية، "تقرير الموازنة التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/٢/١، ص ٣؛ وزارة الخارجية، "تقرير الكونغرس للمساعدات الخارجية للسنة المالية ٢٠١١: جداول الملخصات"، ٢٠١٠/٣/٨، ص ٢٣، مشروع القانون H.R. 4899، تقرير مجلس الشيوخ 111-188 لمرافقة مشروع القانون H.R. 4899. "تقرير المخصصات التكميلية للحالات الطارئة للكوارث والإغاثة والوظائف الصيفية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ ولأغراض أخرى" ص ٢٥، ٥٥ و ٦٤.

الجدول ٣-٢ الأموال الأميركية المخصصة بملايين الدولارات

المخصصات حسب السنوات المالية، السنة المالية ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٨

P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149, P.L. 110-161, P.L. 110-252	P.L. 109-289, P.L. 110-28	P.L. 109-102, P.L. 109-148, P.L. 109-234	P.L. 109-13	P.L. 108-106, P.L. 108-287	PL. 108-7 P.L. 108-11
٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٣
صناديق رئيسية					
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول الثاني (IRRF&2) (١)					
١٨,٣٨٩ ٢,٤٧٥					
صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)					
٣,٠٠٠	٥,٥٤٢	٣,٠٠٧	٥,٤٩٠		
صندوق دعم الاقتصاد (ESF) (٢)					
٦٦٤	١,٤٧٨	١,٥٤٥			
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) (٣)					
٩٨٦	٧٤٣	٦٤٩	٧١٨	١٤٠	
المجموع الفرعي					
٤,٦٥٠	٧,٧٦٤	٥,٢٠١	٦,٢٠٨	١٨,٥٢٩	٢,٥٢٥
برامج المساعدات الأخرى					
صندوق إعادة إصلاح الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية (NRRRF) (٤)					
٨٠١					
صندوق حرية العراق (نشاطات أخرى لإعادة الإعمار) (٥)					
٧٠٠					
مساعادات الهجرة واللجوءين (MRA) والمساعدة الطارئة للاجئين والهجرة (ERMA)					
٢٧٨	٦٦				
الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE)					
٨٥	١٧٠	٩١			
القانون العام ٤٨٠، المساعدات الغذائية (العنوان II وغير العنوان II)					
٢٤			٣	٣٦٨	
صندوق الديمقراطية (الديمقراطية)					
٧٥	٢٥٠				
هيئة مساعدة الكوارث العالمية (IDA) ومساعدات الكوارث الدولية والمجاعة (IDFA)					
٨٥	٤٥				
صندوق حرية العراق (TF-BSO)					
٥٠	٥٠				
برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومقاومة الإرهاب ونزع الألغام والبرامج العائدة لها (NADR) (٦)					
١٦	١٩				
صندوق برامج إنقاذ حياة الأطفال وصحتهم (CSH)					
١٠	٦	٥	٣٧		
وزارة العدل (DoJ)					
٧	٥	٧			
برامج التعليم والتبادل الثقافي (ECA)					
المساعدات التقنية للشؤون الدولية (OTA)					
المساعدات الإنسانية الخارجية والكوارث والمدنية (OHDACA)					
٢	٢	٣	١	٣	٩
خدمات مدراء الشرطة الأميركيين					
التدريب العسكري والتعليمي الدولي (IMET)					
١					

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

الجدول ٣-٢ (تابع)

المخصصات حسب السنوات المالية، السنة المالية ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٨

P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149, P.L. 110-161, P.L. 110-252	P.L.109-289, P.L.110-28	P.L.109-102, P.L.109-148, P.L.109-234	P.L.109-13	P.L.108-106, P.L.108-287	PL.108-7 P.L.108-11
٢٠٠٨	٢٠٠٧	٢٠٠٦	٢٠٠٥	٢٠٠٤	٢٠٠٣
				٥	
					محطة إذاعة الحرة في العراق
٦٣١	٦١٨	١١٩	١٤	٩	٢,٠٤٩
					المجموع الفرعي
					التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة الإعمار
				٩٠٨	سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) ^(ج)
	٦٣٠	٢٠٠			مكتب المشاريع والعقود (PCO) ^(د)
٤٦		٧٩	٢٤		التكاليف التشغيلية الأميركية للتنمية الدولية (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID))
٣٨					المساهمات الأميركية إلى المنظمات الدولية
	١٠٠				التكاليف الإدارية لصندوق حرية العراق (PRT)
٨٤	٧٣٠	٢٧٩	٢٤	٩٠٨	٢١
					المجموع الفرعي
					الإشراف على إعادة الإعمار
٣	٣٥	٢٤		٧٥	المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)
٧	٣		٣	٢	٤
					الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/مكتب المفتش العام (USAID/OIG)
٢١		٥			وزارة الدفاع - مكتب المفتش العام (DoD) OIG)
٤	٣	١			مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (DoS OIG)
	١٦				وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA)
٣٤	٥٧	٣٠	٣	٧٧	٤
٥,٣٩٩	٩,١٦٩	٥,٦٢٩	٦,٢٤٩	١٩,٥٢٣	٤,٥٩٩
					المجموع الفرعي
					المجموع

ملاحظات:

- (أ) كان الكونغرس قد خصص في البداية ١٨,٦٤٩ مليون دولار لصندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني، لكنه خصص ٢١٠ ملايين دولار لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في الأردن ولبيروا والسودان. حولت الإدارة إلى حسابات أخرى ٥٦٢ مليون دولار أخرى إلى برامج لها علاقة بالعراق لا يمكن تنفيذها إلا من خلال حسابات أخرى. (مثل البرنامج الثاني لإعفاء العراق من دينه). علاوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية ٢٠٠٦، خصص الكونغرس حوالي ١٠ ملايين دولار كي تنقل إلى صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق من حساب صندوق دعم الاقتصاد التابع لوزارة الخارجية. في السنة المالية ٢٠٠٨ الغى القانون P.L. 110-252 مبلغ ٥٠ مليون دولار.
- (ب) تعكس السنة المالية ٢٠٠٣، ٤٠ مليون دولار من حساب صندوق دعم الاقتصاد الأساسي لم يتم تسديدها و ١٠ ملايين دولار من القانون العام P.L. 108-11.
- (ج) عموماً، لا يخصص الكونغرس أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) إلى بلد محدد، بل إلى صندوق للعراق وأفغانستان. ذكر مكتب المفتش العام مخصصات من وزارة الدفاع إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد كمخصصات للعراق. أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية ٢٠٠٩ توفرت بموجب القانون P.L.110-252.
- (د) يتضمن الأموال الممولة من صندوق حرية العراق
- (هـ) يتضمن الأموال المخصصة إلى صندوق حرية العراق بموجب القانون العام P.L.108-11 تحت العنوان الأول، والمحولة إلى نشاطات إعادة الإعمار، باستثناء الأموال المحولة إلى صندوق إعادة إصلاح الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية (NRRRF) المسجلة تحت هذا الصندوق.
- (و) خصص مبلغ ٢٠ مليون دولار المبلغ عنه في التقرير للسنة المالية ٢٠٠٩ بموجب القانون P.L.111-8.
- (ز) وضعية الصناديق حتى تاريخ ٢٠١٠/٣/٣١ لمكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) لم تكن متوفرة.
- (ح) يستثنى مبلغ ٧٥ مليون دولار للمفتش العام بموجب القانون P.L.108-106.
- (ط) تمويل دعم إعادة الإعمار مقدم لنشاطات مكتب المشاريع والعقود بموجب القانون P.L.109-234 و P.L.110-28.

مصادر التمويل

الجدول ٣-٢ (تابع)

وضع الصناديق	السنة المالية		مجموع المخصصات	٢٠٠٩/١٢/١٦	٢٠٠٩/٦/٢٤	
	٢٠١٠	٢٠٠٩				
المنتبهة الصلاحية	المنفقة	الملزمة	١٢/١٩ ٢٠٠٩			
الصناديق الرئيسية						
٤٧٩	١٩,٩٩١	٢٠,٣٨٥	٢٠,٨٦٤			
					صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول والثاني (IRRF1&2) (١)	
٤٨٣	١٦,٠٠٣	١٧,٠٩١	١٨,٠٣٩		١,٠٠٠ صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)	
٢٥٤	٣,٣٦١	٣,٨٥٧	٤,٥٥٩	٣٨٣	٤٣٩ صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	
١٣٤	٣,٥٠٢	٣,٦٠١	٣,٨١٦	٢٤٥	٣٣٥ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)	
١,٣٤٩	٤٢,٨٥٧	٤٤,٩٣٤	٤٧,٢٧٨	٢٤٥	٣٨٣	١,٧٧٤ المجموع الفرعي
إجمالي برامج المساعدات الأخرى						
	٨٠١	٨٠١	٨٠١			
					صندوق إعادة إصلاح الأخطار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية (NRRRF)	
	٦٥٤	٦٨٠	٧٠٠		صندوق حرية العراق (IFF) (نشاطات أخرى)	
	٥٤٦	٥٩٢	٦٠٤		٢٦٠ مساعدات الهجرة واللجئين (MRA) والمساعداات الطارئة للاجئين والهجرة (ERMA)	
	٢٤٠	٣٦٨	٤٣٨	٥٢	٢٠ الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE)	
	٣٩٥	٣٩٥	٣٩٥		القانون P.L.480، المساعدات الغذائية (العنوان II وغير العنوان II)	
	١٩٧	٢٦٥	٣٢٥		صندوق الديمقراطية (الديمقراطية)	
	١٩٤	٢١٥	٢١٩	٦	٥١ هيئة التنمية الدولية (IDA) مساعدة ضحايا المجاعة والكوارث العالمية (IDFA)	
	٥٠	٨٦	١٧٤		٧٤ صندوق حرية العراق، فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار (TF-BSO)	
	٦٢	٦٢	١٠١	٣٠	٣٦ برامج عدم انتشار أسلحة الدمار الشامل، ومقاومة الإرهاب ونزع الألغام والأمور المتصلة بها (NADR)	
١	٨٩	٨٩	٩٠		صندوق برامج إنقاذ حياة الأطفال وصحتهم (CSH)	
	٣٦	٥٨	٦٥	٣	٤ وزارة العدل (DoJ)	
			٣٣	٧	٧ برامج التعليم والتبادل الثقافي (ECA)	
	١٤	١٦	١٦		المساعدة التقنية للشؤون الدولية	
	١٠	١٦	١٦		المساعدات الإنسانية الخارجية وبمناسبة الكوارث والمدنية (OHDACA)	
	٩	٩	٩		١ برنامج مارشال	

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

الجدول ٣-٢ (تابع)


وضع الصناديق	السنة المالية		مجموع الملتزمة	السنة المالية	السنة المالية	السنة المالية
	٢٠١٠	٢٠٠٩				
المنتبهة الصلاحية	المنفقة	الملتزمة	مجموع الملتزمة	٢٠١٠	٢٠٠٩	٢٠٠٩
التدريب العسكري والتعليمي الدولي (IMET)	٣	٦	٦	٢	٢	
محطة الحرة في العراق	٥	٥	٥			
المجموع الفرعي	١	٣,٣٠٤	٣,٩٩٦	١٠١	٤٥٤	
التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة الإعمار						
سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA)	٧٩٩	٨٣٢	٩٠٨			
مكتب المشاريع والعقود (PCO)			٨٣٠			
النفقات التشغيلية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية			٢٧٩	٥٧	٥٢	
المساهمات الأميركية إلى المنظمات الدولية			١٠١	١٠١	٣٣	٣٠
التكاليف الإدارية لصندوق حرية العراق (PRT)			١٠٠			
المجموع الفرعي	٧٩٩	٨٣٢	٢,٢١٨	٩٠	٨٢	
الإشراف على إعادة الإعمار						
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)	١٧٣	١٨٥	٢٠٣	٢٣	٤٤	
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/مكتب المفتش العام (USAID/OIG)			٢٩	٧	٤	
وزارة الدفاع - مكتب المفتش العام			٢٦			
مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (DoS/OIG)			٢١	٧	٦	
وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA)			١٦			
المجموع الفرعي	١٧٣	١٨٥	٢٩٥	٣٧	٥٤	
المجموع	١,٣٥٠	٤٧,١٣٣	٥٣,٧٨٧	٢٤٥	٦١٠	٢,٣٦٤

المصادر: استجابة مجلس حكام محطات البث (BBG) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣١؛ استجابة وزارة العدل الأميركية (DOJ)، فرع الإدارة العدلية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١؛ وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، استجابة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/١٧ و ٢٠١٠/٤/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة (OMB) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، ٢٠٠٩/٤/١٥، ٢٠٠٩/٤/١٩، ٢٠١٠/٧/١٣، ٢٠١٠/٧/١٤، ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة وزارة الخارجية الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣ و ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ وزارة المالية، مكتب المساعدة الفنية (OTA)، "نظرة عامة على مكتب المساعدة الفنية"، ٢٠٠٥/١٢/٣٠، ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٠٩/١٠/١٦؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١/١٢ و ٢٠٠٩/٤/٨، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/١٢ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "القروض والهبات الخارجية الأميركية (الكتاب الأخضر)"، ٢٠٠٨، gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?program=eads/gbk/countryReport&unit=N، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٤/١٥؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.

الشكل ٢-٤

الأموال الأميركية المتوقع توفرها لإعادة إعمار العراق من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRFF)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)

بمليارات الدولارات

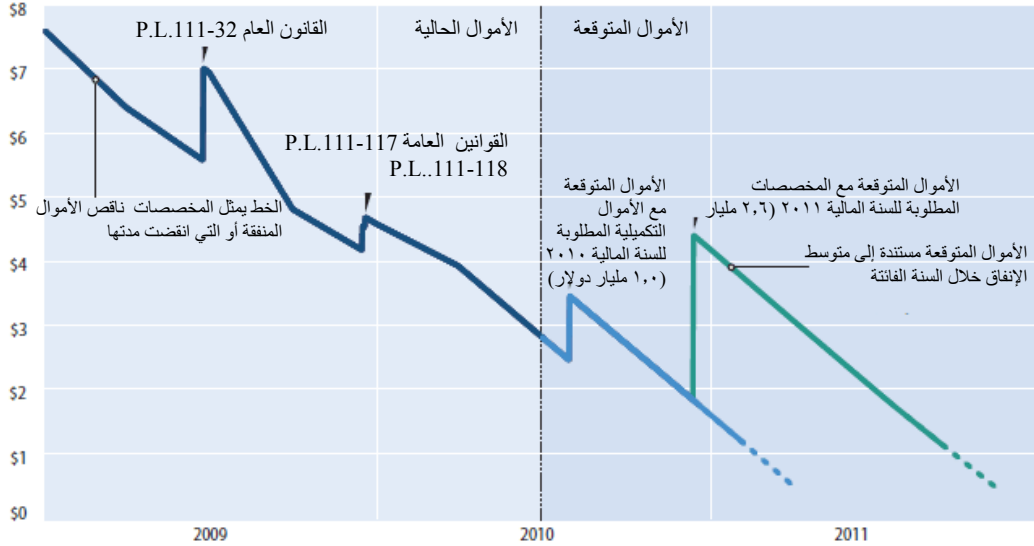

ملاحظة: البيانات لم تدقق - الأرقام تتأثر بالتدوير. الأموال المتوقعة تشمل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، صندوق قوات الأمن العراقية، صندوق دعم الاقتصاد وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد. تمثل الخطوط المخصصات ناقص الأموال المنفقة والتي انتهى أجلها. معدل الإنفاق المتوقع مساو لمعدل متوسط الإنفاق، حسب الصندوق، خلال السنة السابقة. الأموال المتوقعة التي انتهت مدتها مساوية للأموال التي انتهت مدتها بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠. تفترض كلا التوقعات ان الكونغرس سوف يخصص كافة المليار دولار للسنة المالية ٢٠١٠ للمخصصات التكميلية إلى صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF). يفترض التوقع الآخر أيضاً ان الكونغرس سوف يُخصص كامل ال ٢,٥٨ مليار دولار لصندوق قوات الأمن العراقية، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وصندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية ٢٠١١.

المصادر: P.L. 108-106; P.L. 108-11; P.L. 108-287; P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 109-13; P.L. 109-148; P.L. 109-234; P.L. 109-289; P.L. 110-161; P.L. 110-252; P.L. 110-28; P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149; P.L. 111-117; P.L. 111-118; P.L. 111-32، استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، استجابة مكتب الشرق الأدنى العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤، استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام ٢٠٠٩/٤/٢، المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٣-٢٠١٠/٤.

في الأول من تموز/يوليو ٢٠١٠، وافق مجلس النواب على تعديل مجلس الشيوخ لمشروع القانون H.R.4899 (مع تعديله المجلس نفسه المتعلق بحسابات أخرى) وإيد رسمياً المخصصات التكميلية - ٢,٦٨ مليار دولار - التي خصصها مجلس الشيوخ للسنة المالية ٢٠١٠، للعراق^(١٠٨) في ٢٢ تموز/يوليو، ردّ مجلس الشيوخ تعديل مجلس النواب وأعاد مشروع القانون إلى مجلس النواب^(١٠٩).

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

المبالغ التي أقرها مجلس النواب ومجلس الشيوخ ليست نهائية والمفاوضات جارية بشأنها. حتى تاريخ ٢٢ تموز/يوليو لم يكن معروفاً بعد متى سيتم إقرار المخصصات التكميلية.

المخصصات الأميركية المتبقية لإعادة إعمار العراق

استناداً إلى معدلات الإنفاق التاريخية وإلى المخصصات المتوقعة، يقدر المفتش العام ان التمويلات الأميركية الرئيسية لإعادة إعمار العراق التي تم تخصيصها وطلبها حتى الآن سوف تنفق إلى حد كبير في أي وقت خلال العامين القادمين. الشكل ٢-٤ يظهر توقعين قائمين على السيناريوهين التاليين^(١٠):

- التخصيص الكامل بحسب طلب الإدارة للأموال التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠.
- التخصيص الكامل بحسب طلبات الإدارة للمخصصات التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠ وللمخصصات النظامية للسنة المالية ٢٠١١.

يقدر المفتش العام ان التمويلات الأميركية الرئيسية لإعادة إعمار العراق المخصصة والمطلوبة سوف تُنفق إلى حد كبير في أي وقت خلال العامين القادمين.

التدقيق الشرعي للمفتش العام

في تموز/يوليو، أصدر المفتش العام رابع تقرير مؤقت حول تدقيقاته الشرعية لأموال إعادة إعمار العراق وحدد حالات إضافية من النشاطات المالية المشكوك بأمرها. خلال ربع السنة الحالي، راجع المفتش العام ٢٥,٠٠٠ معاملة مالية إضافية بقيمة ٣,٨ مليار دولار، مما رفع إجمالي المعاملات المالية التي تمت مراجعتها إلى ١٠٨,٠٠٠ بقيمة ٣٥,٨ مليار دولار. أنتجت الجهود ٣٩ تحقيقاً جنائياً بما فيها ٤ تحقيقات فُتحت خلال ربع السنة الحالي. لمزيد من المعلومات، انظر القسم ٣ من هذا التقرير.

الجدول ٢-٤

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF): وضعية الأموال حسب التخصيصات والقطاعات بملايين الدولارات

التخصيصات	القطاع	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
		ألزمت	أنفقت	ألزمت	أنفقت
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF1)	المجموع الفرعي	٢,٢٥٨,٧	٢,٢٤٨,٥	-٢,١ (%)	-٠,٣ (%)
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2)	الأمن وفرض تطبيق القانون قطاع الكهرباء العدل، البنية التحتية للسلامة العامة، والمجتمع المدني	٤,٩٢٩,٦	٤,٨٩٢,٥	-١,٤ (%)	٦,٥ (%)
	الموارد المائية والصرف الصحي	٤,١٠٢,٦	٢,٢٠٩,٢	٢,٨ (%)	-٠,٢ (%)
		١,٩٩٦٨,٠	١,٩٤٤,٦	-٣,٥ (%)	١٧,٦ (%)

الجدول ٤-٢ (تابع)

التخصيصات	القطاع	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
		أُنفقت	أُزمت	أُنفقت	أُزمت
البنية التحتية للنفط	١,٦٠٤,٣	١,٥٩٢,٥	٠,١ (%)	٠,١ (%)	-٠,١ (%)
تنمية القطاع الخاص	٨٦٠,٠	٨٣٠,٠			
العناية الصحية	٨١٦,٨	٨٠١,٥	١٤,٩ (%)		١٩,١ (%)
التعليم، اللاجئين، حقوق الإنسان والديمقراطية ونظام الحكم	٥١٩,٦	٤٤٧,٦			
مشاريع النقل والاتصالات	٤٦٦,٦	٤٥٢,٨	-٠,٣ (%)		١٣,٠ (%)
الطرق، الجسور والإنشاءات	٢٧٩,٨	٢٦٧,١	-٠,٢ (%)		
الإنفاقات الإدارية	٢١٩,٥	٢١٧,٩			
تنمية قدرات مكتب الشراكة الاستراتيجية مع العراق (ISPO)	٤٥,٤	٢٨,٨	-٣,١ (%)		٢,٢ (%)
المجموع الفرعي	١٨,١٢٦,٠	١٧,٧٤٢,٠	٩,١ (%)		٦٠,٥ (%)
المجموع العام	٢٠,٣٨٤,٦	١٩,٩٩٠,٦	٧,٠ (%)		٦٠,٢ (%)

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. القطاع المسمى سابقاً "تنمية قدرات مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)" أعيدت تسميته "تنمية قدرات مكتب الشراكة الاستراتيجية مع العراق (ISPO)".

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى للعراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦؛ استجابة مكتب وزير الدفاع، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣ و ٢٠١٠/٧/٨، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام، ٢٠٠٩/٤/٢.

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

لقد كان صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، أكبر مصدر للأموال الأميركية لإعادة الإعمار، وشمل ٢٠,٨٦ مليار دولار جُعلت متوفرة عبر تخصيصين اثنين: صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF1) (٢,٤٨ مليار دولار) وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2) (١٨,٣٩ مليار دولار).^(١١١)

حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، لم تكن ٣٩٤ مليون دولار من الأموال الملزمة قد أنفقت: ١٠ ملايين دولار من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF1) و ٣٨٤ مليون دولار من إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2). وبقي ٤٧٩ مليون دولار إضافية غير ملزمة. غير ان هذه الأموال انقضت أجلها ولن يكون بالإمكان إلزامها لمشاريع جديدة.^(١١٢)

تمّ إلغاء صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF1) في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، بعد مرور خمس سنوات على الفترة الزمنية التي كان فيها مسموحاً بتقرير الزامات جديدة، تبعاً لذلك،

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

ليس هناك سلطة لإلزام أو إنفاق أية أموال من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF1).^(١١٣)

للاطلاع على وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF1)، حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، أنظر الجدول ٢-٤.

صندوق قوات الأمن العراقية


كان الكونغرس قد خصص، منذ العام ٢٠٠٥، ١٨,٠٤ مليار دولار لصندوق قوات الأمن العراقية لدعم وزارة الدفاع ووزارة الداخلية في العراق في تطوير قوات الأمن العراقية (ISF).^(١١٤)

حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان لا يزال هناك ١,٠٩ مليار دولار من الأموال الملزمة لم تنفق بعد، وبقي ٩٤٩ مليون دولار إضافي دون الزام، غير أن ٤٨٣ مليار دولار من هذا المبلغ قد انقضى أجلها، ويترك ذلك ٤٦٦ مليون دولار من الأموال المخصصة للسنة المالية ٢٠٠٩/٢٠١٠ بموجب القانون العام P.L.111-32 متوفرة للالزام في مشاريع جديدة. الأموال المخصصة لصندوق قوات الأمن العراقية بموجب القانون العام P.L.111-32 سوف ينقضي أجلها في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، وبعد هذا التاريخ لن يعود بالإمكان إلزامها لمشاريع جديدة.^(١١٥)

للاطلاع على وضعية صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، بما في ذلك توزيع الالزامات غير المنفقة، حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، أنظر الشكل ٢-٥.

الشكل ٢-٥

صندوق قوات الأمن العراقية: وضعية الأموال – بملايين الدولارات

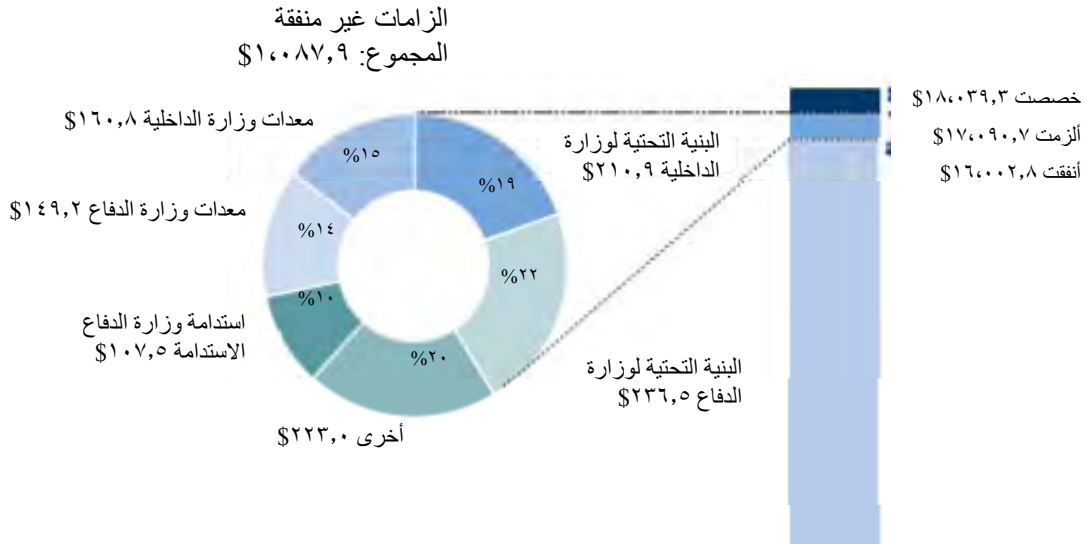

ملاحظة: البيانات غير مدققة – الأرقام تتأثر بالتدوير

المصدر: القانون العام؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-28؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-102؛ P.L. 108-7؛ P.L. 111-32؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 111-32 استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.

الإلزامات والإنفاقات ربع السنوية لصندوق قوات الأمن العراقية

حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، تم تخصيص ١٧,٠٦ مليار دولار (٩٥%) من أصل ١٨,٠٤ مليار دولار مخصصة لصندوق قوات الأمن العراقية الى أربع مجموعات نشاطات فرعية كبرى: المعدات، البنية التحتية، الاستدامة، والتدريب. أما مبلغ ٩٧٦ مليون دولار المتبقية (٥%) من صندوق قوات الأمن العراقية فقد خصصت الى مجموعات نشاطات فرعية أصغر، هذه المجموعات المسماة جماعيا "نشاطات ذات صلة" تشمل صندوق الاستجابة السريعة لصندوق قوات الأمن العراقية، وإنشاء مراكز الاعتقال ومجمعات حكم القانون.^(١١٦)

للاطلاع على وضعية صندوق قوات الأمن العراقية والتغيرات ربع السنوية، حسب الوزارات ومجموعات النشاطات الفرعية، حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، انظر الجدول ٢-٥.

خلال ربع السنة الحالي، ألزمت القوات الأميركية في العراق ٤٩,٩ مليون دولار من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وهو أدنى مبلغ ألزم خلال أي ربع سنة منذ تأسيس صندوق قوات الأمن العراقية، وأقل من ٦ بالمائة من المتوسط ربع السنوي للإلزامات صندوق قوات الأمن العراقي.^(١١٧)

**خلال ربع السنة الحالي، ألزمت القوات الأميركية في العراق
٤٩,٩ مليون دولار من صندوق قوات الأمن العراقية، وهو
أدنى مبلغ ألزم خلال أي ربع سنة منذ تأسيس صندوق قوات
الأمن العراقية.**

وما لم يمدد الكونغرس الفترة الزمنية للإلزام الأموال المخصصة لصندوق قوات الأمن العراقية بموجب القانون العام P.L. 111-32، فإن أي من ال ٤٦٦ مليون دولار من الأموال المتوفرة غير الملزمة قبل ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ سينقضي أجلها.^(١١٨) معظم الإلزامات ربع السنة الحالي كانت لمعدات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية.^(١١٩)

الجدول ٢-٥

صندوق قوات الأمن العراقية وضعية الأموال، حسب الوزارات ومجموعات النشاطات الفرعية
بملايين الدولارات

الوزارة	مجموعات النشاطات الفرعية		وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي
	الأنفقت	الزمت	الأنفقت	الزمت	
الدفاع	المعدات	٤,٦٢١,٧	٤,٤٧٢,٥	٢٩,٤ (١%)	٨٧,٨ (٢%)
	البنية التحتية	٣,٠٧٥,٥	٢,٨٣٩,٠	١٣,١- (٠%)	٧٦,١ (٣%)
	الاستدامة	١,٨٨٢,٩	١,٧٧٥,٤	٤,٨ (٠%)	٦٦,٦ (٤%)
	التدريب	٤٦٦,٢	٤٢٣,٠	١٥,٠ (٣%)	٢٧,٢ (٧%)
	المجموع الفرعي	١٠,٠٦٤,٣	٩,٥٠٩,٨	٣٦,١ (٠%)	٢٥٧,٦ (٣%)
الداخلية	التدريب	٢,٤٤٩,٢	٢,٣٨٧,٤	٢٠,٨ (١%)	١٣,٨ (١%)
	المعدات	١,٧٥٣,٧	١,٥٩٢,٩	٢,٦ (٠%)	٥٦,٠ (٤%)
	البنية التحتية	١,٣٧٤,٩	١,١٦٤,٠	٤,١- (٠%)	٥٦,١ (٥%)
	الاستدامة	٥٩٥,٢	٥٥٤,٢	٠,٣- (٠%)	٧,٥ (١%)
أخرى	المجموع الفرعي	٦,١٧٢,٩	٥,٦٩٨,٦	١٩,٠ (٠%)	١٣٣,٣ (٢%)
	نشاطات ذات صلة	٨٧١,٥	٧٩٤,٥	٥,٢- (١-٠%)	٢٨,١ (٤%)
	المجموع العام	١٧,٠٩٠,٧	١٦,٠٠٢,٨	٤٩,٩ (٠%)	٤١٩,٠ (٣%)

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢ و ٢٠١٠/٧/١٣.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

خلال ربع السنة الحالي، انفقت القوات الأميركية في العراق ٤١٩ مليون دولار، وهو أدنى مبلغ أنفق منذ ربع السنة الأول الذي كان فيه صندوق قوات الامن العراقية متوفراً، وحوالي ٥٠ بالمئة من متوسط النفقات ربع السنوية. كانت معظم النفقات الجديدة لوزارة الدفاع.^(١٢٠)

للاطلاع على نظرة عامة على الالزامات والنفقات ربع السنوية من صندوق قوات الامن العراقية، انظر الشكل ٦-٢.

الشكل ٦-٢

الالزامات والإنفاقات ربع السنوية من صندوق قوات الامن العراقية
بملايين الدولارات



ملاحظة: البيانات لم تدقق - الأرقام تتأثر بالتدوير

المصدر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٥/١٠-٢٠١٠/٤.

صندوق دعم الاقتصاد

منذ ٢٠٠٣، كان الكونغرس قد خصص ٤,٥٦ مليار دولار لصندوق دعم الاقتصاد لتحسين البنية التحتية وأمن المجتمع الأهلي، وتشجيع الديمقراطية والمجتمع المدني، ودعم بناء القدرات والتنمية الاقتصادية.^(١٢١)

أغلبية مخصصات صندوق دعم الاقتصاد أعطيت كل سنة للمسار الأمني.

حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان هناك ٤٩٦ مليون دولار من الأموال الملزمة غير منفق. وبقي ٧٠٢ مليون دولار إضافية غير ملزمة، لكن ٢٥٤ مليون دولار من هذا المبلغ قد انقضى أجلها. يترك هذا ٤٤٨ مليون دولار مخصصة بموجب القانون العام P.L.111-32 والقانون العام P.L.111-117 متوفرة للالزام لمشاريع جديدة. الأموال المخصصة لصندوق دعم الاقتصاد بموجب القانون العام P.L.111-32 ينقضي أجلها في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. بعد هذا التاريخ لن يكون بالإمكان إلزامها لمشاريع جديدة.^(١٢٢)

خلال ربع السنة الحالي، اصدر المفتش العام تدقيقاً حول الزامات وإنفاقات صندوق دعم الاقتصاد شملت مناقشة الأموال التي ألغى الزامها وإعادة برمجتها المحتملة. إجمالي التمويل في تدقيق المفتش العام يختلف عن ذلك المذكور في هذا القسم لان التدقيق مركز بصورة أوثق ويحلل السجلات المالية، وليس القيم التي تذكرها الوكالات. بالنسبة لمخلص النتائج التي توصل إليها المفتش العام والتوصيات، أنظر القسم ٣ من هذا التقرير.

للاطلاع على وضعية صندوق دعم الاقتصاد بما في ذلك توزيع الالزامات غير المنفقة، حتى تاريخ ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠١٠، أنظر الشكل ٢-٧.

الإلزامات والإنفاقات ربع السنوية لصندوق دعم الاقتصاد (ESF)

خصص صندوق دعم الاقتصاد برامج على ثلاثة مسارات: أمني، وسياسي، واقتصادي. أغلبية مخصصات صندوق دعم الاقتصاد خصصت للمسار الأمني في كل سنة.^(١٢٣)

للاطلاع على وضعية صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وللتغيرات ربع السنوية، حسب المسارات والبرامج، حتى تاريخ ٣٠ حزيران/ يونيو ٢٠١٠، أنظر الجدول ٢-٦.

خلال ربع السنة الحالي، كان هناك ١١٠,٧ مليون دولار من الإلزامات الصافية لصندوق دعم الاقتصاد. معظم هذه الأموال أعطيت لبرامج في المسار الأمني بما في ذلك ٥٧,٥ مليون دولار لصندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT/QRF) و ٤٠ مليون دولار لمشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRT/PRDC). كانت هذه الزامات صافية تم إلغاؤها من برامج في المسار الاقتصادي.^(١٢٤)

خلال ربع السنة الحالي، كان هناك ٢٤١,١ مليون دولار من النفقات الصافية من صندوق دعم الاقتصاد. فعلى غرار الإلزامات، كانت أغلبية الإنفاقات مخصصة لبرامج في المسار الأمني بما في ذلك ٤٩,٨ مليون دولار لبرنامج الحكم المحلي و ٤٥,٨ مليون دولار لصندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT/QRF).^(١٢٥)

صندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT/QRF): الموافقة على المشاريع وإدارتها وتقييمها

صندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT/QRF) برنامج ممول من صندوق دعم الاقتصاد كانت وزارة الخارجية (DoS) قد أقامته في آب/أغسطس ٢٠٠٧ من أجل تزويد فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) وفرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة (ePRT) بألية تمويل مرنة لأجل دعم مشاريع قصيرة الأمد، ذات الأثر الاقتصادي والاجتماعي والحكومي الرفيع.^(١٢٦) تعمل فرق إعادة إعمار المحافظات مع المجموعات المحلية لتطوير اقتراحات مشاريع تهدف إلى معالجة حاجات مجتمعاتها الأهلية.^(١٢٧) صندوق الاستجابة السريعة، مشابه في بعض النواحي، لبرنامج الاستجابة السريعة للقائد التابع لوزارة الدفاع^(١٢٨) لكن تمويله جرى على مستويات أدنى بكثير: ٣٠٣ مليون دولار خصصت لصندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات مقابل ٣,٨٢ مليار دولار خصصت لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد^(١٢٩). وفقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تهدف الهيئات إلى "تقدم التغيير الديمقراطي السلمي" كما ان العديد منها قد يركز على قضايا عالية المخاطر او نشاطات ليست ممولة حالياً من آخرين.^(١٣٠)


مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

وفقاً لمكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) فُدم ١٥٤,٥ مليون دولار من أصل الـ ٢٦٦,٤ مليون دولار من الزامات صندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات إلى المستفيدين على شكل هبات. يوجد نوعان من هبات صندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات^(١٣١):

- هبات صغيرة تديرها وزارة الخارجية ومكتب شؤون المحافظات (OPA) في السفارة الأميركية في بغداد. وهي محددة بـ ١٠٠,٠٠٠ دولار وتشكل ٦٤,٦ مليون دولار (٢٤ بالمئة) من الزامات صندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات.
- برنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP) الذي تديره الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومقاولها، دفلويمنت أولترناتيفز انترناشونال، انك، (DAI). يتضمن أكبر هبة مكوّنة لصندوق الاستجابة السريعة. الهبات الكبيرة محددة بـ ٥٠٠,٠٠٠ دولار وتشكل ٨٩,٩ مليون دولار (٣٤ بالمئة) من الزامات صندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات.

الشكل ٧-٢

صندوق دعم الاقتصاد: وضعية الأموال
بمليارات الدولارات

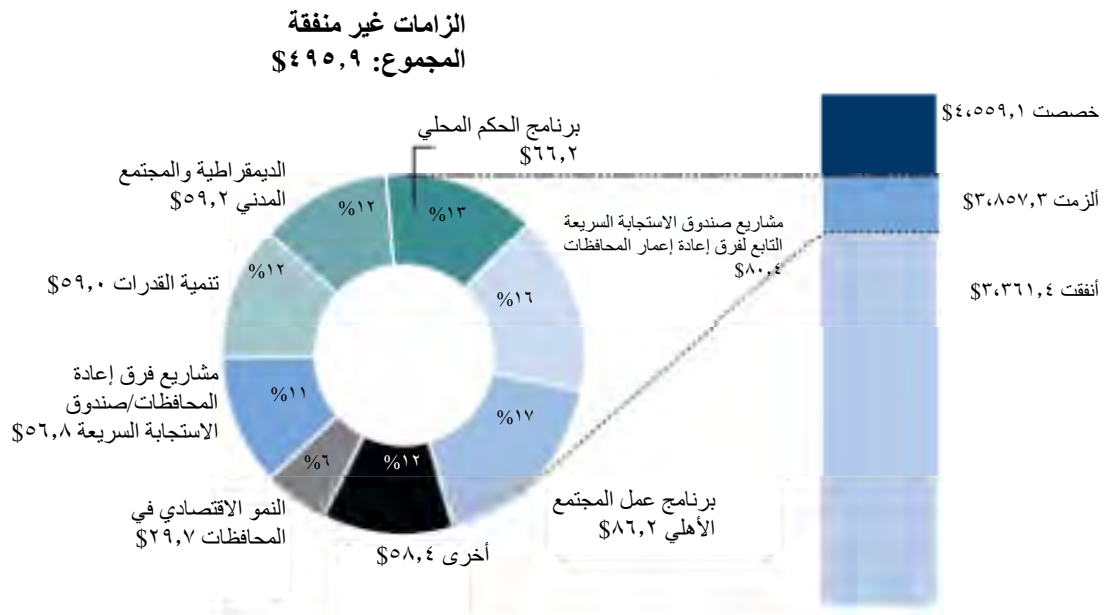

ملاحظة: البيانات غير مدققة - الأرقام تتأثر بالتدوير

المصادر: القوانين P.L. 108-7; P.L. 109-102; P.L. 110-28; P.L. 110-161; P.L. 111-32; P.L. 111-117. السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٨، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.

صندوق الاستجابة السريعة مشابه، في بعض النواحي، لبرنامج الاستجابة السريعة للقائد التابع لوزارة الدفاع لكن تمويله كان على مستويات أدنى بكثير.

من أصل ١١١,٩ مليون دولار ملزمة، هناك على الأقل ٥٠,٨ مليون دولار (١٩ بالمئة) من تكاليف العقود الممولة والرسوم المدفوعة إلى مقاولي وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية^(١٣٢). لم يتلق المفتش العام تقارير من مكتب الشرق الأدنى-العراق والوكالة الأميركية للتنمية الدولية حول استخدام وتوزيع ال ٦١,١ مليون دولار المتبقية من الزامات صندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات. من الممكن أن بعض هذه الأموال على الأقل قد استخدمت من جانب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتمويل مقاولي الباطن لبرنامج المساعدة السريعة للعراق.^(١٣٣)

تقدم وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مستخدمة الهبات وصلاحيات المشتريات، المساعدة للمنظمات غير الحكومية (NGOs)، الأميركية والعراقية، والتابعة لبلدان ثالثة، ولحكومات البلديات والمحافظات العراقية، وشركات الأعمال، والجمعيات المهنية، والمنظمات الخيرية والمؤسسات التعليمية^(١٣٤). الهبات تحول الأموال النقدية أو السلع إلى كيان معين لممارسة نشاط مجدد. الفترة الزمنية لأداء الهبة لا يمكن ان تتجاوز اثنتي عشر شهر^(١٣٥). كما يتم استخدام صلاحيات المشتريات لشراء السلع والخدمات المطلوبة من جانب الحكومة الأميركية لدعم مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات، ويمكن تحويلها إلى المستفيدين من الهبات.^(١٣٦)

كافة اقتراحات هبات صندوق الاستجابة السريعة تقوم بمراجعتها لجنة التقييم الفني في السفارة الأميركية (ETEC) في بغداد. في حال كانت القيمة أكثر من ٢٥,٠٠٠ دولار، ترسل اقتراحات الهبات إلى لجنة التقييم الفني في واشنطن (WTEC) للمزيد من المراجعة. عند الموافقة، باستطاعة فريق صندوق الاستجابة السريعة في بغداد كتابة الهبة وتحرير الأموال^(١٣٧). طلبات المشتريات الأدنى من ٢٥,٠٠٠ دولار توافق عليها وتنفقها فرق إعادة إعمار المحافظات^(١٣٨). طلبات المشتريات التي تفوق ٢٥,٠٠٠ دولار لن يدعمها صندوق الاستجابة السريعة بعد الآن.^(١٣٩)

الجدول ٦-٢

صندوق دعم الاقتصاد (ESF): وضعية الأموال حسب المسارات والبرامج
بملايين الدولارات

المسار	البرنامج	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
		أنفقت	أنفقت	أنفقت	أنفقت
الأمني	برنامج استقرار المجتمع الأهلي	٦١٩,٣	٦١٩,٠		
	مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRT/PRDC)	٥٤٨,٥	٤٦٨,١	٤٠,٠ (%)	٣٢,١ (%)
	برنامج الحكم المحلي	٤١٠,٥	٣٤٤,٣	٣,٠ (%)	٤٩,٨ (%)
	برامج عمل المجتمع الأهلي	٣٨٨,٩	٣٠٢,٦	٦,٨ (%)	٣٤,٤ (%)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

الجدول ٦-٢ (تابع)

المسار	البرنامج	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
		أنفقت	أُزمت	أنفقت	أُزمت
	صندوق الاستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار العراق	٢٠٩,٦	٢٦٦,٤	٤٥,٨ (%٢٨)	٥٧,٥ (%٢٨)
	حماية أمن البنية التحتية	١٨٣,٩	١٨٧,٧	٢,١ (%١)	٣,٧ (%٢)
	المجموع الفرعي	٢,١٢٧,٤	٢,٤٢١,٢	١٦٤,٣ (%٨)	١١١,٠ (%٥)
السياسي	تنمية القدرات الوطنية	٢٥٠,٤	٣٠٩,٤	١,٢- (%٠)	
	الديمقراطية والمجتمع المدني	١٧٨,٨	٢٣٨,٠	٢٣,٢ (%١٥)	٣,٨ (%٢)
	اللاجئون العراقيون	٩٠,٦	٩٥,٠		
	الحكم الاقتصادي المرحلة الثانية، إصلاحات القوانين والسياسة	٨٥,٠	٨٥,٠		
	تنمية القدرات الوزارية	٣٠,٠	٤١,٠٨		
	مكتب اتصال جرائم النظام	٢٨,٠	٢٨,٥	٠,٤- (%١-)	١,٦- (%٥-)
	دعم الانتخابات	١٣,٨	١٣,٩	٠,٤ (%٣)	
	الرصد والتقييم	٣,٢	٧,٥	٢,٧ (%٥٧٥)	٠,١- (%٢-)
	نفقات برنامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	٠,٠	٠,٠	٠,١- (%١٠٠-)	٠,٢- (%١٠٠-)
	المجموع الفرعي	٦٧٩,٨	٨١٨,٣	٢٤,٦ (%٤)	١,٩ (%٠)
الاقتصادي	استدامة التشغيل والصيانة	٢٦٦,٦	٢٦٧,٦	٤,٢- (%٢-)	٤,٤- (%٢-)
	تطوير برنامج إنماء للأعمال الزراعية	١١٥,٣	١٢٤,٠	٣٢,٧ (%٤٠)	
	النمو الاقتصادي في المحافظات	٥٦,١	٨٥,٨	١٨,٠ (%٤٧)	
	برنامج التنمية المحددة الأهداف	٣٦,٩	٥٧,٤	٥,٥ (%١٨)	
	تنمية القدرات على مستوى المعامل والتدريب الفني ازدهار	٤٧,٩	٥٠,١	٠,١ (%٠)	٢,٢ (%٥)
		٣١,٤	٣٢,٨		
	المجموع الفرعي	٥٥٤,١	٦١٧,٧	٥٢,٢ (%١٠)	٢,٣- (%٠)
	المجموع العام	٣,٣٦١,٤	٣,٨٥٧,٣	٢٤١,١ (%٨)	١١٠,٧ (%٣)

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. البرنامج المعروف سابقاً "برنامج نفقات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية" أعيد تصنيفه باسم "الرصد والتقييم".
 المصادر: استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠ و ٢٠١٠/٧/٨، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠١٠/٤/٨، ٢٠١٠/٧/١٤ و ٢٠١٠/٧/١٦، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢ و ٢٠١٠/٤/١، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.

الهيئات الصغيرة

الهيئات الصغيرة (أقل من ١٠٠,٠٠٠ دولار) والمشتريات الصغيرة (أقل من ٢٥,٠٠٠ دولار) تديرها وزارة الخارجية ومكتب شؤون المحافظات (OPA) الذي يقدم الإرشاد السياسي والدعم إلى فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق. اقتراحات الهيئات الصغيرة تصدر عن فرق إعادة إعمار المحافظات وتعرض عبر قاعدة بيانات صندوق الاستجابة السريعة، وهي استمارة طلب قائمة على شبكة الإنترنت يديرها مقالول تابع لمكتب شؤون المحافظات التابع لوزارة الخارجية، منجمنت سيستمز انترناشونال، انك (MSI). على فرق إعادة إعمار المحافظات إدخال تفاصيل اقتراح الهيئات او المشتريات في قاعدة البيانات وإدخال موازنة مفصلة وتعبئة أية استمارات اخرى مطلوبة من جانب آلية التمويل المحددة.^(١٤٠)

تتم عملية رصد أية هبة صغيرة وتقييمها من جانب فرقة إعادة إعمار المحافظة الراعية للهبة، مستخدمة مقاييس مسجلة في قاعدة بيانات الهيئات التي تديرها منجمنت سيستمز انترناشونال (MSI).^(١٤١) مقاييس كل هبة صغيرة تتعلق بطبيعة المشروع.^(١٤٢)

الهيئات الكبيرة: بحسب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وعلى الرغم من ان برنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP) سوف يستمر لغاية ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠^(١٤٣)، فهو حالياً في طور الإغلاق، ولن توافق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بعد الآن على أية هبات جديدة تستخدم صندوق الاستجابة السريعة^(١٤٤). هبات برنامج المساعدة السريعة للعراق - التي تُشكّل قسم "الهيئات الكبيرة" في صندوق الاستجابة السريعة- مصممة من جانب مقالولي فرق إعادة إعمار المحافظات/صندوق الاستجابة السريعة (PRT/QRF) لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ودفلوبمنت اولترناييفز انترناشونال (DAI)، مع مساهمة من فرقة إعادة إعمار المحافظات الراعية^(١٤٥). وبحسب الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، قدمت دفلوبمنت اولترناييفز انترناشونال المساعدة الفنية وراجعت كافة مقترحات الهيئات قبل عرضها على لجنة التقييم الفني في السفارة الأميركية في بغداد (ETEC) للمراجعة لضمان تناغمها مع السياسات والإجراءات، واستمارات منح، والتصرف بالتملكات لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية^(١٤٦). بعد موافقة لجنة التقييم التقني في السفارة الأميركية في بغداد - ولجنة التقييم الفني في واشنطن (WTEC) إذا زادت عن ٢٥,٠٠٠ دولار - تعرض مقترحات برنامج المساعدة السريعة للعراق على الممثل الفني لضابط العقود لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وعلى ضابط العقود للمراجعة والموافقة.^(١٤٧)

أداء المنح الكبيرة ترصده وتقيمه دفلوبمنت اولترناييفز انترناشونال (DAI) وفرقة إعادة إعمار المحافظات (PRT) الراعية^(١٤٨) التي تحافظ على الاتصال مع المستفيد طوال الفترة الزمنية لأداء الهبة وتقوم أحياناً بزيارات للموقع^(١٤٩). التسليمات والأداء العام للمنح يتم تعقبها عن طريق استخدام قاعدة بيانات المنح.^(١٥٠) على غرار الهيئات الصغيرة، تكون مقاييس الهبة فريدة لكل هبة^(١٥١). تضع دفلوبمنت اولترناييفز انترناشونال مؤشرات الأداء عند بداية المشروع، وتتعبق التقدم خلال الفترة الزمنية لأداء الهبة، وتقدم تقريراً نهائياً عند نهاية المشروع^(١٥٢). برنامج المساعدة السريعة للعراق له خطة عامة للأداء والرصد مع أهداف ومؤشرات ترفع دفلوبمنت اولترناييفز انترناشونال التقارير على أساسها^(١٥٣). وتنفذ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضاً تقييمات في منتصف فترة الأداء وتقييمات نهائية لكافة اتفاقيات الهيئات.^(١٥٤)

الأولويات والأنماط في توزيع هبات برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF) بحسب مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) تركز برامج هبات صندوق الاستجابة السريعة لكل من وزارة الخارجية/مكتب شؤون المحافظات (DoS/OPA) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية/ دفلوبمنت اولترنايفز انترناشونال (USAID/DAI)، على مساعدة المجتمعات الأهلية للاقلييات. بموجب توجيه من الكونغرس خُصص ١٠ ملايين دولار من اصل ٣٨٢,٥ مليون دولار من مخصصات صندوق دعم الاقتصاد (ESF) للسنة المالية ٢٠١٠، لهذا الغرض^(١٥٥). حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان قد تم الزام ٩,٧٩ مليون دولار لمشاريع القصد منها بالدرجة الأولى استفادة الاقلييات، وقد تم إنجاز معظمها^(١٥٦).

الانتماءات السياسية المختلفة بين القادة المحليين سببت تضارب بين القرارات المستندة إلى الحاجات وتلك المبنية حصراً على هواجس دينية أو إثنية.

أكثر من ٨٠ بالمئة من مشاريع الاقلييات الجارية او المنجزة، المقدره بقرابة ٩٩ بالمئة من مجموع الإلزامات، قد نفذت عبر برنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP)^(١٥٧). ركز دعم برنامج المساعدة السريعة للعراق للاقلييات العراقية على مناطق في نينوى تسكنها بالغالب بعض مجموعات الأقلييات بما فيها مجموعات الشبك والتركمان والمسيحيين واليزيديين.

بحسب تقرير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/ دفلوبمنت اولترنايفز انترناشونال (USAID/DAI)، ان "التنمية التمييزية" لهذه الجهود قادت أحياناً المستفيدين من الهبات وغيرهم إلى الادعاء ان النشاط كان مخصصاً لمجموعاتهم الخاصة الاثنية او الدينية، علماً ان انتقاء دفلوبمنت اولترنايفز انترناشونال (DAI) للمستفيدين لم يكن موجهاً لاستبعاد أي فرد او مجموعة من غير الاقلييات مقيمة في المناطق المستهدفة. كان هذا الالتباس ظاهراً على وجه التحديد خلال عملية اختيار الموقع لهبة برنامج المساعدة السريعة للعراق الداعمة لإنشاء مدرسة، حيث سببت الانتماءات السياسية المختلفة للقادة المحليين تضارب بين القرارات المستندة إلى الحاجة وتلك المبنية حصراً على الهواجس الدينية أو الاثنية^(١٥٨).

بحسب السفارة الأميركية في بغداد، الهدف الاولي المتبقي لبرنامج الهبات الصغيرة التابع لوزارة الخارجية/مكتب شؤون المحافظات (DoS/OPA) هو تمويل المشاريع القصيرة الأمد (اقل من سنة) التي تنفذها حكومات المحافظات والمستفيدون الآخرون، والتي تدعم الأهداف الاستراتيجية الملخصة في خطة عمل فرق إعادة إعمار المحافظات وخطة الحملة المشتركة (JCP). تشمل أولويات وزارة الخارجية/ مكتب شؤون المحافظات تقديم التدريب الفني والموارد لمجالس المحافظات. خلال ربع السنة الحالي، ساند صندوق الاستجابة السريعة مبادرة حكومية في النجف، مشروع لبناء القدرات في تكنولوجيا المعلومات في بابل، ومجلة المحافظة في الانبار^(١٥٩). قرابة ٦٠ بالمئة من الهبات الجارية لوزارة الخارجية ومكتب شؤون المحافظات تدعم التعليم^(١٦٠).


الشكل ٢-٨

مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات/صندوق الاستجابة السريعة (QRF/PRT) حتى تاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠

الموضوع	الالتزامات المترجمة لوزارة الخارجية/مكتب شؤون المحافظات (DoS/OPA) حسب نوع المستفيد					توزيع أحجام المشاريع
	المنظمات غير الحكومية	الحكومة	شركات الأعمال	أخرى	المجموع	
التعليم	٣,٤١١	٦,٢٧٥	٢,٩١٥	١,٠٩٣	١٣,٦٩٥	<p>النسبة المئوية ٩٠</p> <p>النسبة المئوية ١٠</p> <p>النسبة المئوية ٧٥</p> <p>متوسط</p> <p>النسبة المئوية ٢٥</p>
الزراعة/البيئة	٢,٩٧٢	٣,١٢١	٥٩٨	٢,٩٠٩	٩,٦٠٠	
قضايا الحكم	٨٣٠	٦,٤٣٢	٦٢٦	٦٠٢	٨,٤٩٠	
المجتمع المدني	٣,٠٣١	١,٩٠٣	٩٤٧	٢,٠٠٢	٧,٨٨٣	
الصحة	٥٩٨	٣,٣٨٢	٤٦٤	٥٦٤	٥,٠٠٧	
التنمية الاقتصادية	١,٤٦٩	١,٧٤٥	٧٦٥	٥٥٧	٤,٥٣٧	
برامج النساء	٢,٦١٣	١٧٩	٩٠	٥٢٠	٣,٤٠٢	
برامج الشباب	٩٥٩	١,٠٠٥	٢١٩	١,١٠٠	٣,٢٨٣	
غير قابلة للتطبيق	٢	٢,٩٣٥	٢	٩٠	٣,٠٣٠	
تنمية شركات الأعمال	١,٣٤٧	٢١٣	١,٠٥٦	٢٢٠	٢,٨٣٥	
حكم القانون	٣٨٥	١,٧٣٦	١٧١	٤٦٧	٢,٧٥٨	
المخصص للاقليات	٥٠	٤٦	٠	٧	١٠٣	
المجموع	١٧,٦٦٨	٢٨,٩٧٣	٧,٨٥٢	١٠,١٣٠	٦٤,٦٢٤	

مشاريع قيد التنفيذ لوزارة الخارجية/
مكتب شؤون المحافظات (DoS/OPA)
بآلاف الدولارات
المجموع: \$٧,٤٩٨

مشاريع على
نطاق البلاد:
\$٣,٩٧٩



المشاريع المنجزة لوزارة الخارجية/
مكتب شؤون المحافظات (DoS/OPA)
بآلاف الدولارات
المجموع: \$٥٧,١٢٦


مشاريع على نطاق
البلاد:
\$٥٨




مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

الموضوع	الالتزامات المتراكمة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية/ دفلوبمنت اولترنايفز انترناشونال (USAID/DAI) حسب نوع المستفيد				
	المجموع	أخرى	شركات الأعمال	الحكومة	المنظمات غير الحكومية
قطاع الحكم	١٤,٧٩٠	١٥٢	٤٧	٨,٦٢٨	٥,٩٦٢
المجتمع المدني	١٢,٤٥١	٩٢٥	٠	٤٠٩	١١,١١٧
التنمية الاجتماعية	١٠,٧١٥	١٠٠	٧٠٢	١,١١٢	٨,٨٠١
المخصص للأقليات	٩,٦٨٣	١٩٠	٠	٢,٢٢٢	٧,٢٧١
الصحة	٩,٢١٦	٠	٠	٣,٢٠٨	٦,٠٠٨
التعليم	٨,٧٥٣	٥١٨	١١٤	٤,٧٥٧	٣,٣٦٤
برامج النساء	٥,٧٨٤	٠	١٠١	٤٦٨	٥,٢١٦
الزراعة/البيئة	٥,٥١٠	٢٢٦	٠	٢,٥٩٩	٢,٦٨٦
حكم القانون	٥,١٩٥	٢٤٢	٠	٢,١٠٣	٢,٨٤٩
تنمية شركات الأعمال	٤,٩٠٠	٣٥	٢٥٠	٤٩٩	٤,١١٦
برامج الشباب	٢٦٧٠	٢٢	٠	٠	٢,٦٤٨
غير قابلة للتطبيق	٢٠٠	٠	٠	٢٠٠	٠
المجموع	٨٩,٨٦٨	٢,٤١٠	١,٤٢١٤	٢٦,٢٠٦	٦٠,٠٣٩

مشاريع قيد التنفيذ للوكالة الأميركية للتنمية الدولية/ دفلوبمنت اولترنايفز انترناشونال (USAID/DAI) بالآلاف الدولارات
المجموع: \$١٢,٦٠٣



المشاريع المنجزة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية/ دفلوبمنت اولترنايفز انترناشونال (USAID/DAI) بالآلاف الدولارات
المجموع: \$٧٧,٢٦٦



ملاحظة: البيانات لم تدقق - الأرقام تتأثر بالتدوير. المشاريع في أرجاء البلاد تشير إلى المشاريع التي تديرها وزارة الخارجية والتي ليست منفذة ضمن محافظة معينة. المشاريع الممثلة على الخرائط مرمزة حسب المحافظة حيث توجد فرقة إعادة إعمار المحافظات/الفرق المرافقة التي تقوم بالتنفيذ. بعض فرق إعادة إعمار المحافظات تنفذ مشاريع خارج المحافظة التي تقيم فيها، وعلى الأخص أربيل، والتي تخدم كفريق إعادة إعمار إقليمي وينفذ مشاريع في دهوك والسليمانية (المرمزة كما لو ان ليس لها مشاريع، عند استخدام تلك التكنولوجيا)، إضافة إلى أربيل. بيانات أماكن المشاريع لم تكن متوفرة. معظم مواضيع المشاريع المرمزة من جانب وزارة الخارجية/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية كغير قابلة "للتطبيق" هي مشاريع إنشاء طرق او مباني.

المصدر: استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣

برنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP) هو حالياً في مرحلة الإقفال. كان الموعد الأقصى لتقديم اقتراحات المنح نهاية نيسان/أبريل ٢٠١٠^(١٦١). مشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/ دفلوبمنت اولترنايفز انترناشونال (USAID/DAI) الجاري تنفيذها أكثر تنوعاً لناحية المواضيع من تلك التي تدعمها وزارة الخارجية ومكتب شؤون المحافظات (DoS/OPA). من حيث الزامات الهبات، كان التركيز على المشاريع الداعمة للصحة (٢٠ بالمئة)، الاقليات (١٨ بالمئة)، التعليم (١٣ بالمئة) الزراعة/البيئة (١٢ بالمئة) وبرامج النساء (١١ بالمئة).^(١٦٢)

للاطلاع على التفاصيل حول هبات صندوق الاستجابة السريعة (QRF) المنجزة او الجاري تنفيذها، انظر الشكل ٨-٢.

المعلومات حول هبات فرق إعادة إعمار المحافظات/صندوق الاستجابة السريعة (PRT/QRF) متوفرة لدى مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، في قاعدة للبيانات يمكن الوصول إليها من جانب أعضاء فرق إعادة إعمار المحافظات الذين يطلبون ذلك^(١٦٣). تشمل التفاصيل اسم الاقتراح والوكالة التي تديره (وزارة الخارجية او الوكالة الأميركية للتنمية الدولية). ترعى فرقة إعادة إعمار المحافظات المبالغ الملزمة والمنفقة، والموضوع، ونوع المستلم^(١٦٤). وفقاً لمكتب الشرق الأدنى-العراق، تواريخ بدء وإنجاز المشاريع، والأهداف ومقاييس تقدم الهبات الفردية ليست متوفرة حتى الآن في استمارة التقارير.^(١٦٥)

التكاليف العامة

عقود وزارة الخارجية/مكتب شؤون المحافظات (DoS/OPA) مع منجمنت سيستمز انترناشونال (MSI) ممولة بحوالي مليون دولار من صندوق الاستجابة السريعة/فرق إعادة إعمار المحافظات أي ما يساوي تقريباً ٣ بالمئة من إجمالي تكاليف هبات صندوق الاستجابة السريعة/فرق إعادة إعمار المحافظات المقدمة عبر برامج الهبات الصغيرة لوزارة الخارجية/مكتب شؤون المحافظات^(١٦٦). لم يقدم مكتب الشرق الأدنى-العراق معلومات عما إذا كانت تمويلات فرق إعادة إعمار المحافظات من المصادر الأخرى تساوي كلفة تنفيذ برامج الهبات الصغيرة لوزارة الخارجية/مكتب شؤون المحافظات.

إجمالي التكاليف والرسوم المرافقة لعقود دفلوبمنت اولترناييفز انترناشونال (DAI) ٤٨,٨ مليون دولار او حوالي ٥٤ بالمئة من إجمالي تكاليف هبات صندوق الاستجابة السريعة/فرقة إعادة إعمار العراق المقدمة عبر برنامج هبات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الكبيرة^(١٦٧). التكاليف العامة لعقود دفلوبمنت اولترناييفز انترناشونال (DAI) تشمل الامن^(١٦٨)، الذي، وبحسب للوكالة الأميركية للتنمية الدولية^(١٦٩) تقدم دفلوبمنت اولترناييفز انترناشونال (DAI) أيضاً الموظفين الميدانيين، والمكاتب الإدارية، واللوجستية والاتصالات، ومشتريات معدات المكاتب والسيارات والدعم المالي.^(١٧٠)

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)

منذ ٢٠٠٤، قدم الكونغرس ٣,٨٢ مليار دولار لتمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للعراق لغرض تمكين القادة العسكريين في العراق من الاستجابة لمتطلبات إنسانية وإعادة إعمار ملحة ضمن مناطق مسؤولياتهم.^(١٧١)

حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان هناك ١٠٠ مليون دولار من الأموال الملزمة غير منفقة، وبقي ٢١٤ مليون دولار إضافية غير ملزمة، لكن ١٣٤ مليون دولار من هذا المبلغ انقضى أجلها. يترك هذا ٨١ مليون دولار مخصصة بموجب القانون العام P.L.111-118 للسنة المالية ٢٠١٠ متوفرة للالزام لمشاريع جديدة. الأموال المخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد بموجب القانون العام P.L.111-118 ينقضي أجلها في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، وبعد هذا التاريخ لن يكون بالإمكان إلزامها لمشاريع جديدة.^(١٧٢)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

للاطلاع على وضعية أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، بما في ذلك توزيع الأموال غير المنفقة، حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، أنظر الشكل ٩-٢.

الشكل ٩-٢
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد: وضعية الأموال
بملايين الدولارات



ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣، تقرير الفئات لنظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات الأميركية في العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠١٠/٧/٢.

الالتزامات والإنفاقات ربع السنوية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)
في هذا التقرير، كما في السابق، لم يقدر المفتش العام على تقديم المستوى الكامل لمحاسبة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد مع البيانات التي قدمها مكتب نائب وزير الدفاع في وزارة الدفاع (مراقب الحسابات) (OUSD (C)). هذا لأن المكتب المذكور لم يرفع تقارير عن الالتزامات والإنفاقات ربع السنوية بحسب المشاريع أو فئات المشاريع لمخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) للسنة المالية السابقة.

في ٢ حزيران/يونيو ٢٠١٠، ناقش المفتش العام هذه المسألة مع نائب وزير الدفاع الذي وعد بمساعدة المفتش العام في الحصول على البيانات الضرورية. عطفاً على ذلك، في ١٩ تموز/يوليو، كتب مكتب نائب وزير الدفاع (OUSD (C)) إلى المفتش العام عارضاً عليه الوصول إلى بيانات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على مستوى المشاريع التي تحتفظ بها دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS). وبحسب دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية، تحافظ المصلحة على بيانات محدثة على مستوى المشاريع للالتزامات والنفقات من ٢٠٠٥ من الوقت الحاضر. أكد مكتب نائب وزير الدفاع للمفتش العام انه يعمل مع دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية لتقديم المعلومات في استمارة سوف تمكّن المفتش العام تحليل البيانات حسب المشاريع على الرغم من

أن الميادين الضرورية لتصنيف المشاريع المنفذة قبل ٢٠٠٨ قد تكون غير متناغمة مع بعضها البعض.^(١٧٣)

لاحظت اللجنة غياب تبرير المشاريع والإشراف و"التسرع في إنفاق مئات ملايين الدولارات".

عندما سيتمكن المفتش العام من الوصول إلى بيانات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) على مستوى المشاريع التي تحتفظ بها دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS)، سوف يحاول استخدامها لتحديث البيانات حسب المشاريع وفئات المشاريع لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد. من المفترض أن ذلك سيؤدي إلى محاسبة مختلفة – ولكن أكثر دقة – لالزامات وإنفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد بالمقارنة مع ما كان المفتش العام قادراً على رفعه في تقارير حتى الآن. لكن، وإلى حين حصول المفتش العام على بيانات دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية، سوف يواصل الاعتماد على نظام إدارة وإعادة إعمار العراق (IRMS) للقيام بالمهمة التي فوضها له الكونغرس وهي تقديم بيانات حول الزامات وإنفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد بحسب فئات المشاريع لكافة مخصصات السنة المالية. فكما نوقش الموضوع في التقارير ربع السنوية السابقة للمفتش العام، لم يحتسب نظام إدارة إعادة الإعمار كافة الإلزامات والنفقات المعكوسة في الخط الأعلى لبيانات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي قدمتها مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية^(١٧٤). علاوة على ذلك، من المبرمج إقبال نظام إدارة إعادة إعمار العراق في الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠١٠^(١٧٥).

للاطلاع على وضعية برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، والتغيرات ربع السنوية، باستخدام بيانات نظام إدارة وإعادة إعمار العراق، حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، انظر الجدول ٢-٧.

استخدام وتبرير برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)

طالب الكونغرس بالاحتفاظ بمبلغ ٥٠٠ مليون دولار من مخصصات السنة المالية ٢٠١٠ لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد بانتظار تسليم "مراجعة شاملة" للبرنامج^(١٧٦). في تقريرها حول القانون H.R.3326، وهو مشروع قانون مخصصات وزارة الدفاع للسنة المالية ٢٠١٠، أعلنت لجنة المخصصات في مجلس النواب "عن هواجسها العميقة بأن برنامج الاستجابة الطارئة للقائد قد تطور من أداة قوية مضادة للتمرد إلى برنامج تنمية أميركي بديل مع قيود قليلة وإدارة محدودة" ولاحظت غياب تبرير المشاريع والإشراف و"التسرع في إنفاق ملايين الدولارات"^(١٧٧).

نص البيان التفسيري للقانون العام أنه يجب أن يشمل مراجعة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ما يلي^(١٧٨):

- تقيماً للعراق (وتقييم آخر منفصل لأفغانستان) حول أهداف تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد والغرض منه والمطالب المتوقعة خلال السنة القادمة.
- العملية التي يتم بموجبها تحديد مطالب موازنة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وتبريرها.
- الإدارة والإشراف القائم على أموال وعقود برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من قبل وزارة الجيش، والمراقب المالي (OUSD(C)) والقيادة المركزية الأميركية.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

- عملية تنسيق المشاريع مع الوكالات الحكومية الأميركية الأخرى ومع المنظمات غير الحكومية التي تقوم بتنفيذ المشاريع في العراق (وأفغانستان).
 - شروط مساندة استدامة المشاريع التي يتم تنفيذها بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.
 - الإجراءات التي تضمن ان تكون المشاريع المنفذة بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد منسقة مع الحكومات المضيفة وقادة المجتمع المدني.
 - عمليات وأنظمة تعقب المشاريع المنفذة بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.
- وطالب الكونغرس أيضاً بأن ترفع وزارة الدفاع أيضاً التقارير حول صوابية تأسيس مكتب برامج لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد يكون مسؤولاً عن تطوير الموازنات، والخطط الاستراتيجية والرقابة على البرامج، وشروط تنسيق البرامج ومعايير التدريب.^(١٧٩)

استنتاجات مراجعة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) والإجراءات التصحيحية

القسم السياسي في مكتب نائب وزير الدفاع (OUSD) والمراقب المالي في المكتب المذكور قادا معا المراجعة، وزود البيانات أصحاب المصالح الرئيسيين في برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من أنحاء وزارة الدفاع. خلاص تقرير وزارة الدفاع، الصادر في تموز/يوليو ٢٠١٠، إلى ان إدارتها لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد كانت مرضية، لكن كان هناك مجال كبير للتحسين. وفقاً لهذا التقرير، بادرت وزارة الدفاع إلى القيام بإجراءات تصحيحية فور تحديد المشاكل. الإصلاحات الرئيسية التي حددها التقرير شملت^(١٨٠):

- تنسيق افضل بين القوات الأميركية في العراق (USF-I) وفرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) عند تسمية، وتطوير، وتنفيذ مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.
- التشديد على التشاور مع الحكومة العراقية وعلى الأخص في ما يتعلق باستدامة المشاريع.
- التركيز على بناء القدرات عبر المطالبة بمشاركة المقاولين المحليين.
- حدود جديدة لعدد المشاريع الجارية تحت إشراف كل مدير مشروع وضابط مشتريات للمشاريع.
- مراجعات شهرية على مستوى القيادة لكافة المشاريع المفتوحة والمغلقة.
- معايير تدريب جديدة لموظفي برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الأساسيين.
- قدرات محسنة لدمج بيانات المشاريع.

معظم الإصلاحات التي حددتها وزارة الدفاع متناغمة مع توصيات المفتش العام.

عتبات المشاريع وسلطة الموافقة

يمول برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) مجموعة متنوعة من المشاريع وتختلف التكاليف الفعلية للمشاريع بوضوح حسب أنواعها. فكل نوع من المشاريع له ميزاته التي تحدده ومجموعة من عتبات تكاليفه. وإذا ما ازدادت تكاليف مشروع معين إلى أكثر من الحدود المقررة، تتوجب عندها الموافقة عليه من سلطة من مستوى أعلى.

الإرشاد العام من القوات الأميركية في العراق (USF-I) يحدد ان برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) هو للمشاريع القابلة للاستدامة التي تقل كلفتها عن ٥٠٠,٠٠٠ دولار. أما المشاريع التي تزيد كلفتها عن ذلك فمن المتوقع ان يكون عددها قليل نسبياً، غير ان المشاريع "الضرورية" من ذلك الحجم يمكن ان يوافق عليها نائب الجنرال قائد العمليات في القوات الأميركية في العراق (USF-I) (DCG-O) "على أساس استثنائي"^(١٨١). المشاريع التي تزيد قيمتها عن ٥٠٠,٠٠٠ دولار يجب تنسيقها مع فرق إعادة إعمار المحافظات، كما أن هذا التنسيق يجب ان يُذكر في مستندات المشاريع.^(١٨٢)

الجدول ٧-٢

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP): وضعية الأموال حسب فئات المشاريع
بملايين الدولارات

فئات المشاريع	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
	أنفقت	ألزمت	أنفقت	ألزمت
المياه والصرف الصحي	٦٩٠,٢	٦٢٥,٧	١,٨ (%)	٠,٥ (%)
الإجراءات الوقائية	٤٧٦,٨	٤٤٠,٤	١,٣ (%)	٠,٥ (%)
الكهرباء	٣٨١,٥	٣٣٠,٧	٣,١ (%)	٠,٥ (%)
النقل	٣٥٧,٢	٣٠٣,٩	٣,٤ (%)	٠,٢ (%)
التعليم	٣٣٩,٩	٢٩٧,١	٠,٢ (%)	٨,٦ (%)
نشاطات التنظيف المدنية	٢٠٧,٥	١٩٢,٩	٠,٢ (%)	٠,٣ (%)
المشاريع الإنسانية وإعادة الإعمار الأخرى	١٧٤,٠	١٣٧,٠	٠,٣ (%)	١,٥ (%)
التحسينات الاقتصادية والمالية والإدارية	١٣٧,٢	١١٤,٧	١,٥ (%)	٠,٤ (%)
الزراعة	١٢٢,٣	١٠٩,٥	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
حكم القانون ونظام الحكم	١٢٠,٦	١١٠,٩	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
العناية الصحية	١١٢,٦	١٠٤,١	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
إصلاح البنية التحتية المدنية	١٠٤,٥	١٠٠,٠	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
مدفوعات التعزية	٥٠,٨	٤٨,٨	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
إصلاحات أضرار المعارك	٤٤,١	٣٧,٧	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
الاتصالات	٣٢,٦	٢٨,٣	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
عربات الدعم المدني	٢٤,٦	٢٣,٣	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
إنتاج وتوزيع الغذاء	١٧,٤	١٦,١	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
المدفوعات للمعتقلين السابقين	١,٤	١,٣	٠,٣ (%)	٠,٣ (%)
المجموع الفرعي	٣,٣٩٥,٥	٣,٠٢٢,٦	٢٢,٢ (%)	٠,٧ (%)
مدفوعات غير محتسبة في مخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد	٢٠٥,٩	٤٧٩,٣		
المجموع	٣,٦٠١,٤	٣,٥٠١,٨	٥١,٥ (%)	٧٢,٢ (%)

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع البيانات والمخصصات والالزامات والانفاقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية، حصل المفتش العام على بيانات مخصصات والزامات وانفاقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره. لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى المذكورة في الأقسام الفرعية الأخرى. المصادر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٣ و ٢٠١٠/٧/١٣. تقرير الفئات لنظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات الأميركية في العراق، ٢٠١٠/٧/٢.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

بتاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠، كان ٨٥ بالمئة من كافة المنح الصغيرة جداً للسنة المالية ٢٠١٠ أدنى من حد ٢,٥٠٠ دولار للمشاريع "النموذجية" أو أقل بقليل من حد ٥,٠٠٠ دولار لما يستطع قائد اللواء الموافقة عليه.

بعض المشاريع تقع ضمن فئات تعطي القادة المحليين مرونة أكبر – وسرعة – في تصميم المشاريع والموافقة عليها. غير ان هذه الفئات الخاصة محددة بطريقة ضيقة وتخضع لقيود صارمة لناحية الكلفة:

- مدفوعات التعازي التي يمكن دفعها للتعبير عن التعاطف او لتقديم إغاثة إنسانية ذات حاجة ماسة. المدفوعات بسبب الوفاة او الإصابات يمكن السماح بها عموماً لغاية ٢٥٠٠ دولار. الوفاة او الإصابة لأب أسرة يمكن ان ينتج عنها دفعة قصوى قدرها ٥٠٠٠ دولار. في الحالات الاستثنائية، يمكن إجراء مدفوعات قدرها ١٠,٠٠٠ دولار لكل حادث و ٥٠,٠٠٠ دولار للحادث الواحد مع موافقة من مستوى أعلى.^(١٨٣)
- مدفوعات أضرار المعارك تعوّض على العراقيين عن حوادث الإضرار بالممتلكات التي سببتها القوات الأميركية او العراقية. المبالغ لا تتعدى عادة ٢٥٠٠ دولار، لكن يمكن الموافقة على مدفوعات لغاية ١٠,٠٠٠ دولار للحادث الواحد ولغاية ٥٠,٠٠٠ دولار للحادث الواحد في الحالات الاستثنائية. ليس هناك من حدود لمدفوعات أضرار المعارك عندما يكون سببها قوات الأمن العراقية.^(١٨٤)
- مدفوعات الأبطال العراقيين تدفع إلى الزوجات الباقيات على قيد الحياة او إلى أقرب ذوي أفراد قوات الأمن العراقية او (في الحالات الاستثنائية) إلى المدنيين الحكوميين الذين قتلوا نتيجة حوادث سببتها القوات الأميركية. على القادة الذين يسددون المدفوعات إلى الأبطال العراقيين ان ينسقوا أي مساعدة مع وزارتي الداخلية والدفاع التي تدير برامج المساعدات الخاصة الطويلة الأمد الخاصة بهما.^(١٨٥)
- الهيئات الصغيرة تقدم المساعدات المالية "لرواد الأعمال المحرومين"^(١٨٦) الذين تعرفهم القوات الأميركية في العراق بأنهم أصحاب مشاريع أعمال مجرّبين يفتقرون إلى قروض الأعمال الكافية بشروط تجارية معقولة. التوزيع بالسلع مفضّل لأنه يساعد في ضمان ان لا تضعع المنح في الفساد او ان يتم تحويلها إلى المتمردين.^(١٨٧)

للاطلاع على التفاصيل حول عتبات حدود المشاريع وعدد وقيمة مشاريع السنة المالية ٢٠١٠ في كل فئة، انظر الشكل ٢-١٠. عتبات المشاريع تتعلق بالاحتياجات وليس بالبند او المشروع. إن تقسيم المشاريع – حيث تكون هناك مشتريات متعددة متعلقة بنفس الاحتياجات لاجل البقاء دون الحدود المالية المفروضة- محظور.^(١٨٨)

مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تتركز بمعظمها حول الحدود المفروضة. مثلاً، بتاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠، كان ٨٥ بالمئة من كافة الهيئات الصغيرة للسنة المالية ٢٠١٠ تحت حدود ال ٢٥٠٠ دولار للمشاريع "النموذجية"، او أقل بقليل من حدود ٥,٠٠٠ دولار لما يستطيع قائد لواء الموافقة عليه.^(١٨٩)

على نفس المنوال، هناك حدّ قدره مليون دولار لمشاريع إعادة الإعمار التي يمكن للمراقب المالي لوزارة الدفاع الموافقة عليها. المشاريع التي تتعدى المليون دولار يجب ان يوافق عليها وزير الدفاع.^(١٩٠) بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، لم يكن هناك مشاريع للسنة المالية ٢٠١٠ تتعدى المليون دولار، وإنما كانت هناك ستة مشاريع ذات قيم تتراوح بين ٩٥٠،٠٠٠ ومليون دولار للمشروع الواحد^(١٩١). بالنسبة للتفاصيل حول تلك المشاريع الكبيرة، انظر الجدول ٢-٨.


وفقاً للمال كنظام سلاح (MAAWS)، يجب ان تشمل المشاريع التي تزيد عن ٩٥٠،٠٠٠ دولار خطة لخفض نطاق المشاريع التي يمكن تنفيذها في حال حصول زيادات في الكلفة قد تنقل إجمالي كلفة المشاريع إلى أكثر من مليون دولار. خطة خفض النطاق يجب ان تعين أوجه او مكونات المشروع التي يمكن إلغاؤها او تصغير حجمها لأجل خفض الكلفة، مع الإبقاء على تنفيذ الهدف العام للمشروع. ان وجود خطة لخفض النطاق "يوفر الحيطه ضد الإلغاء المحتمل للمشروع".^(١٩٢)

العدد الكبير للمشاريع الصغيرة جداً (وعلى الأخص الهيئات الصغيرة) – والعدد الصغير للمشاريع الكبيرة جداً – يشوّه نسب توزيع تكاليف مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. مثلاً، قرابة ٦٠ بالمئة من مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية ٢٠١٠ مقدرة بأقل من ٥٠٠٠ دولار. لكن، وجود مشاريع إعادة الإعمار الكبيرة جداً ينتج عنها قيمة وسطية قدرها ٤٠،٩٦٣ دولار للمشاريع، أي أكثر من ١٢ مرة من الحجم المتوسط للمشاريع. هناك علاقة مماثلة تسيطر على حياة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد كما هو مبين في الشكل ٢-١١. بوجه عام، هناك عدد صغير من المشاريع الكبيرة جداً التي تُشكّل معظم الزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد خلال السنة المالية ٢٠١٠، مثلت ١٠ بالمئة من المشاريع ٧٤ بالمئة من الالزامات.^(١٩٣)

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

الشكل ١٠-٢

عتبات حدود سلطة هبات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وعدد المشاريع المقابل للسنة المالية ٢٠١٠
بآلاف الدولارات

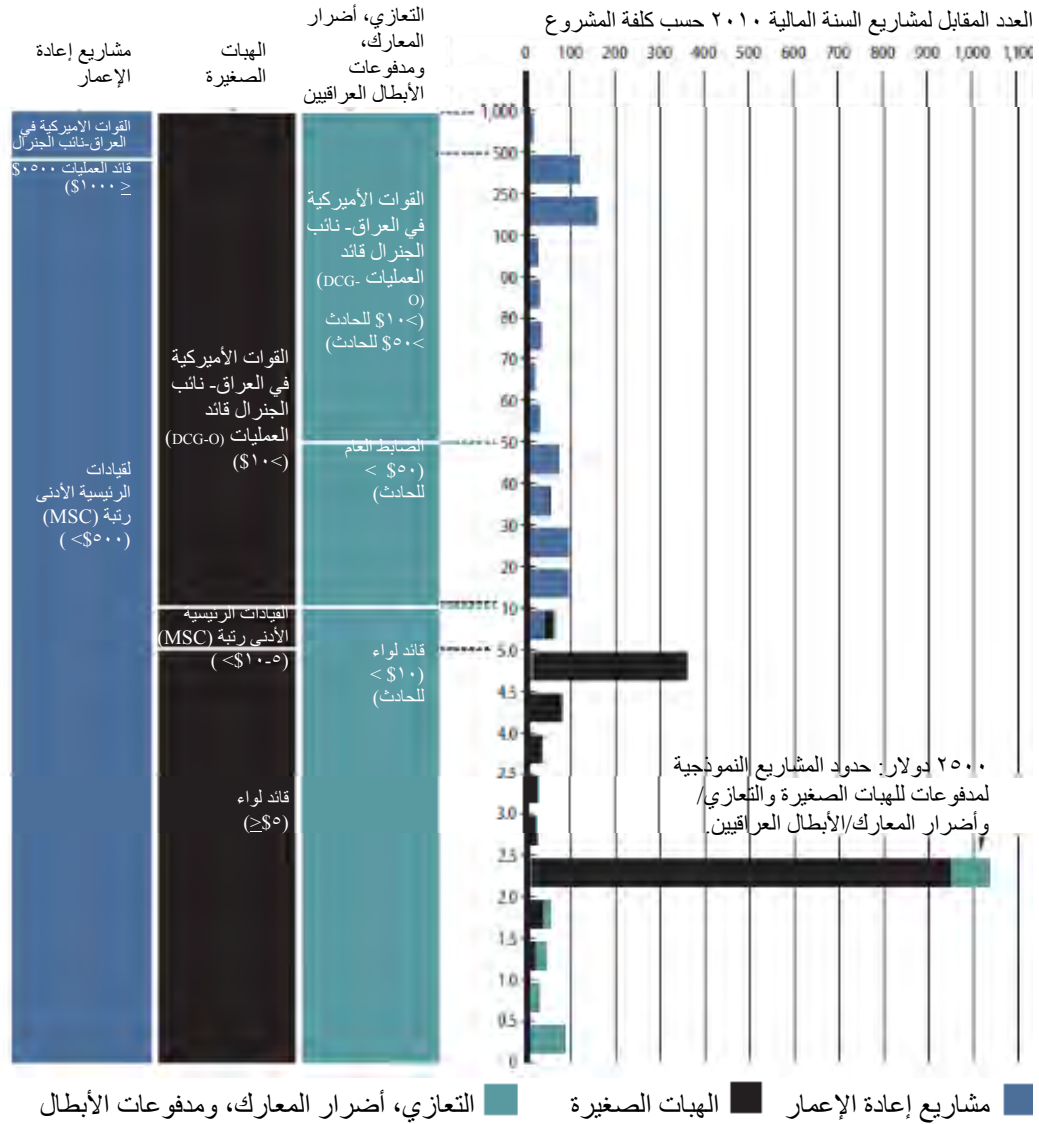

ملاحظة: البيانات لم تدقق. فئة "مشاريع إعادة الإعمار" لا تشمل الهبات الصغيرة ومدفوعات التعازي، ومدفوعات أضرار المعارك أو مدفوعات الأبطال العراقيين. بإمكان وزير الدفاع الموافقة على المشاريع التي تتجاوز ٢٥,٠٠٠,٠٠٠ دولار، لكن عليه أن يبلغ الكونغرس في غضون ١٥ يوماً. هناك حدود لمجموع ما تمنحه الأولوية من ٢٥,٠٠٠ دولار من الهبات الصغيرة التي تتطلب عملية توقف ومراجعة. ليس هناك من حدود لمدفوعات أضرار المعارك عندما تسببها أعمال قوات الامن العراقية. DSC-O = نائب الجنرال القائد للعمليات. MSC: القيادات الرئيسية الأدنى رتبة.

المصادر: القوات الأميركية في العراق، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/١، الملحق ب والملحق ب٢، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.

المرة الأخيرة التي ذكر فيها المفتش العام التوزيع التاريخي لحجم مشاريع برنامج الاستجابة للقائد (في نيسان/أبريل ٢٠٠٩)، أظهرت انه كان هناك ميل قوي باتجاه مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الأصغر.^(١٩٤) غير ان هذا التراجع الظاهر كان عائد بالدرجة الأولى إلى العدد الكبير من الهبات الصغيرة المبلغ عنها والى البيانات غير الكاملة، لكن هذا الميل لم يستمر. إذ يبدو الآن ان أول ربع سنة ٢٠٠٩ كان يُشكّل نقطة دنيا. منذ ذلك الحين، ازداد حجم المشاريع، ولا سيما عند الطرف الأدنى للتوزيع.^(١٩٥)

تنسيق خفض برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

عقد نائب الجنرال القائد للعمليات (DCG-O) في القوات الأميركية في العراق مؤخراً اجتماعاً مع قادة الفرق والمراقبين الماليين لمناقشة ما نفذه برنامج الاستجابة الطارئة للقائد خلال السنة المالية ٢٠١٠ واحتياجات هذا البرنامج من الأموال للسنة المالية ٢٠١١. القوات الأميركية في العراق وقيادة العقود الجديدة في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) (C3) هي في طور تطوير توصيات الجداول الزمنية لخفض برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وإعادة النظر في قواعد التفويضات لاجل المطالبة بزيادة سلطات الموافقة بالنسبة للمشاريع العالية المخاطر. علاوة على ذلك، خططت القوات الأميركية في العراق لاستضافة مؤتمر في ٧-٨ تموز/يوليو ٢٠١٠ يطور خلاله ممثلون عن السفارة الأميركية في بغداد، ومكتب شؤون المحافظات، وفرق إعادة إعمار المحافظات، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، والقوات الأميركية في العراق، خطة دعم مشتركة لاستخدام برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لاجل بناء القدرات وعمليات إرساء الاستقرار خلال خفض البرنامج.^(١٩٦)

الصناديق الأصغر

خصص الكونغرس، او جعل متوفراً بطريقة أخرى، قرابة ٦,٥١ مليار دولار في مجالات التمويل الصغيرة لإعادة إعمار العراق. صنّف المفتش العام مجالات التمويل هذه ضمن ثلاث فئات^(١٩٧):

- برامج المساعدات الأخرى- ٤ مليارات دولار
- نفقات تشغيلية ذات علاقة بإعادة الإعمار- ٢,٢ مليار دولار.
- الإشراف على إعادة الإعمار- ٠,٢٩ مليار دولار.

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان ٤,٦٨ مليار دولار (٧٢ بالمئة) من هذه الأموال قد الزم، و٤,٢٨ مليار دولار على الأقل (٦٦ بالمئة) قد انفق.^(١٩٨) للاطلاع على التفاصيل حول وضعية أموال الصناديق، انظر الجدول ٢-٣.

مصادر تمويل إعادة إعمار العراق واستخداماتها

الجدول ٨-٢
مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للسنة المالية ٢٠١٠ التي تتعدى ٩٥٠,٠٠٠ دولار.


عنوان المشروع	المحافظة	الكلفة بالدولار الأميركي	كلفة الحكومة العراقية	الوصف
مرفق الزبير لمعالجة المياه	البصرة	٩٩٥,٢٨٧	١,٥٠٠,٠٠٠	تزويد المواد، والمعدات، واليد العاملة لإنجاز مرفق لمعالجة المياه يوفر مياه آمنة ونظيفة ل ١٥٠,٠٠٠ إنسان.
إعادة تجديد محطة الضخ في مرفق معالجة المياه في الديوانية	القادسية	٩٨٩,٠٠٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	إعادة ترميم محطات الضخ ومستودع الترسيب ومحطة التجريع في مرفق لمعالجة المياه لاجل توفير إمدادات مياه يعتمد عليها ٥٠٠,٠٠٠ إنسان.
الضحلة (لاغون) البيولوجية في حديثة	الأنبار	٩٨٣,٨٨٣	٥٨٥,٠٠٠	تزويد اليد العاملة، والمواد، والمعدات لإنشاء مرفق لمعالجة ضحلة بيولوجية سوف يستفيد منه ١٠٠,٠٠٠ مقيم.
الضحلة (لاغون) البيولوجية في الحبانية	الأنبار	٩٨١,٩٥١	٦٧٥,٠٠٠	تزويد اليد العاملة، والمواد، والمعدات لإنشاء مرفق لمعالجة ضحلة بيولوجية سوف يستفيد منها ١٠٠,٠٠٠ مقيم.
إعادة تجهيز مستشفى حماد شباب	بغداد	٩٧٩,٩٥٣	٢٠٠,٠٠٠	إعادة تجهيز جناح مستشفى حماد شباب لتأمين جناح للتوليد وخدمة العناية الطبية للحالات الطارئة لمليون مقيم.
الضحلة (لاغون) البيولوجية في القائم	الأنبار	٩٧٢,٢٩١	٧٥٠,٠٠٠	تزويد اليد العاملة، والمواد، والمعدات لإنشاء مرفق لمعالجة ضحلة بيولوجية سوف يستفيد منه ١٥٠,٠٠٠ مقيم.

ملاحظة: البيانات لم تدقق - الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصدر: استجابة القوات الأميركية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.

الشكل ١١-٢

توزيع الزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على نشاطات المشاريع الجاري تنفيذها، حسب أرباع السنة، ٢٠٠٤-٢٠١٠.
بالآلاف الدولارات

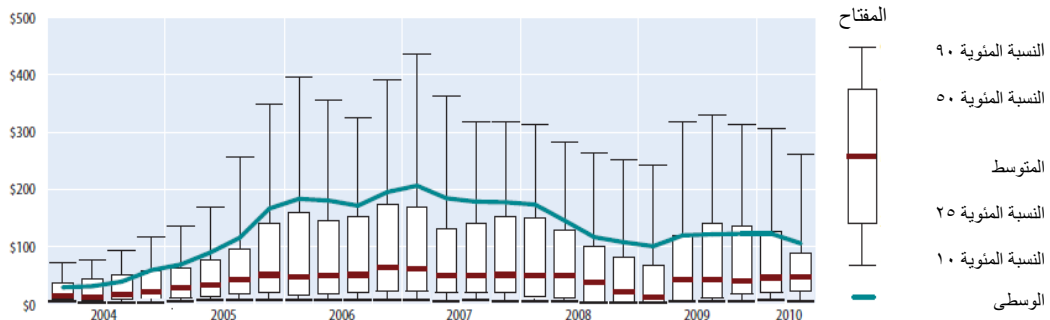

ملاحظة: البيانات لم تدقق. القيم ربع السنوية تشمل الزامات كافة المشاريع الجاري تنفيذها. تعتبر المشاريع جارية التنفيذ إذا بدأت قبل نهاية ربع السنة وانجزت بعد ربع السنة الذي بدأت فيه (أو التي لم تنجز فيه).

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠١٠/٧/٢.

إدارة تمويل إعادة الإعمار وإستخداماتها

يوصل الدور الأميركي في العراق تطوره من التشديد الحالي على مشاريع تنمية القدرات الممولة من الولايات المتحدة وترتيبات "المشورة والمساعدة" الأمنية، إلى شراكة طويلة الأمد مركزة على علاقات ثنائية اقتصادية، ودبلوماسية، وثقافية، وأمنية. خلال ربع السنة الحالي، تسببت التغييرات التنظيمية المتعددة بتثبيت الحضور الأميركي على الأرض.

المهام المتطورة ترسم شكل التغييرات التنظيمية

في ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠١٠، عين الرئيس أوباما السفير جيمس جيفري خلفاً للسفير كريستوفر هيل كرئيس للبعثة الأميركية في العراق.^(١٩٩) السفير جيفري يخدم حالياً كسفير للولايات المتحدة في تركيا.^(٢٠٠) من حزيران/يونيو ٢٠٠٤ إلى آذار/مارس ٢٠٠٥، خدم كنائب لرئيس البعثة في العراق أيام السفير جون نيغروبونتي. بعد ذهاب السفير نيغروبونتي في آذار/مارس ٢٠٠٥، خدم السفير جيفري كقائم بالأعمال الأميركي في العراق لغاية حزيران/يونيو ٢٠٠٥.^(٢٠١)

في تموز/يوليو ٢٠١٠، أوصى وزير الدفاع، روبرت غيتس، بان يكون الجنرال جيمس ماتيس القائد الجديد لقيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM)، وسوف يحل محل الجنرال ديفيد بتريوس الذي يقود الآن قوات الولايات المتحدة والحلف الأطلسي في أفغانستان. الجنرال ماتيس هو حالياً قائد قيادة القوات المشتركة الأميركية.^(٢٠٢)

**بتاريخ ١٥ تموز/يوليو كان يوجد حوالي ٧٥،٠٠٠ جندي
أميركي في العراق – أقل من نصف العديد الذي كان منتشر في
العراق أثناء أكبر عملية "زيادة" للقوات الأميركية هناك.**

في ١٨ أيار/مايو ٢٠١٠، عين الوزير غيتس الفريق أول لويد أوستن خلفاً للجنرال ريموند أوديرينو كقائد للقوات الأميركية في العراق،^(٢٠٣) وقد تم تثبيته من جانب مجلس الشيوخ في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠.^(٢٠٤)

حتى تاريخ ٢٥ تموز/يوليو، كان هناك حوالي ٧٥،٠٠٠ جندي أميركي في العراق،^(٢٠٥) – أقل من نصف الـ ١٧٦،٠٠٠ جندي أميركي تقريباً الذين كانوا منتشرين في العراق خلال أكبر عملية "زيادة" للقوات الأميركية في العراق، في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧.^(٢٠٦) بحلول أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، تتوقع القوات الأميركية في العراق ان لا يتواجد أكثر من ٤٩،٣٩٢ جندي أميركي في العراق.^(٢٠٧)

مكتب الشراكة الإستراتيجية مع العراق (ISPO) يحل محل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)

في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٠، أصدر الرئيس أوباما أمراً تنفيذياً لإنشاء منظمة مؤقتة تدعى مكتب الشراكة الإستراتيجية مع العراق (ISPO) داخل وزارة الخارجية لأجل دعم الدوائر والوكالات التنفيذية في "تسهيل العلاقات الإستراتيجية بين الحكومة الأميركية والجمهورية العراقية، في

تعزيز أكبر للأمن وإرساء الاستقرار في البلاد، ومن أجل الاستمرار في الحضور الدبلوماسي الفعال في العراق".^(٢٠٨) ينص الأمر التنفيذي على أن يقوم مكتب الشراكة الإستراتيجية مع العراق (ISPO) بما يلي:^(٢٠٩)

- المساعدة في خفض عدد فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) وتنسيق عملها.
- دعم وإنشاء بعثة لاستدامة حكم القانون في العراق، تشمل برنامج تطوير الشرطة (PDP).
- استكمال أية وظائف تنسيق، وإشراف، أو رفع تقارير حول أموال متبقية في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF).
- تولي مسؤولية أية وظائف متبقية كانت معهودة إلى مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO).
- أداء أية وظائف أخرى قد تحددها وزيرة الخارجية وتكون ذات صلة بأهداف المكتب.

وفقاً للأمر التنفيذي، سوف يرث مكتب الشراكة الإستراتيجية مع العراق (ISPO) جميع موظفي مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) وأصوله، ومطلوباته، وسجلاته.^(٢١٠) هناك بين السجلات الموروثة، تلك المتواجدة في نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)،^(٢١١) المقرر إقفاله في الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠١٠.^(٢١٢) عندما سيحصل ذلك، يخطط مكتب الشراكة الإستراتيجية مع العراق (ISPO) لاستخدام تقرير وضعية إعمار العراق (ISOC) لتعقب المشاريع الجاري تنفيذها. التقرير (ISOC) هو مجموعة من بيانات المشاريع أعدها ووزعها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) خلال عدة سنوات.^(٢١٣)

بالنسبة لمهمة حكم القانون، فإن مكتب الشراكة الإستراتيجية مع العراق (ISPO) منخرط حالياً في إكمال أو إصلاح مشاريع الإنشاءات، التي تبين أنها دون المعايير المحددة لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ومن هذه المشاريع على سبيل المثال دور المحاكم والمرافق القضائية الأخرى. لم ينخرط مكتب الشراكة الإستراتيجية مع العراق (ISPO) في برنامج تطوير الشرطة (PDP) إلا بشكل محدود، فلم يتم بأكثر من مساعدة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) في تأمين الموظفين للقسم ٣١٦١ (موظفين مؤقتين للحكومة الأميركية). وبحسب السفارة الأميركية في بغداد، فإن التوظيف في القسم ٣١٦١ سوف يساعد في إصلاح مشكلة المقاولين الذين يشرفون على عمل مقاولين آخرين.^(٢١٤) مُنسق حكم القانون لدى السفارة الأميركية في بغداد (RoLC) لم يتم إشراكه في أية مناقشات أو تخطيط يتعلق بمهمة حكم القانون التابع لمكتب (ISPO).^(٢١٥) يعمل مُنسق حكم القانون مع نظرائه في المؤسسات العراقية المعنية لتنسيق نشاطات حكم القانون في أرجاء العراق.^(٢١٦)

يرأس مكتب الشراكة الإستراتيجية في العراق (ISPO) مدير بالإنابة. يعمل بمكتب بغداد حالياً ١١ موظفاً: ٩ موظفين في القسم ٣١٦١، ومستشار عسكري أميركي، ومترجم متعاقد/مستشار ثقافي. بين موظفي القسم ٣١٦١، هناك ثلاثة مستشارين كبار يعملون مع موظفي السفارة حول قضايا توليد الكهرباء، ونقلها، ومياه الصرف الصحي والمسائل البيئية. سوف ينخفض عدد الموظفين مع إنجاز مشاريع مكتب الشراكة الإستراتيجية في العراق (ISPO) ومع انتهاء وظيفته الاستشارية الوزارية. حالياً، يُتوقع إنجاز كافة المشاريع كما يتوقع أن يغادر جميع موظفي مكتب الشراكة الإستراتيجية في العراق (ISPO) بغداد بحلول تموز/يوليو ٢٠١١.^(٢١٧)

مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL): تخطيط برنامج تطوير الشرطة الجديد وتولي جهود مكافحة الفساد

من المتوقع ان يتولى مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) كامل مسؤولية برنامج تطوير الشرطة في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١، مع اقتراب نهاية انسحاب الجيش الأميركي. (٢١٨) بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) يعمل مع مكاتب وعناصر وزارة الخارجية في السفارة الأميركية في بغداد على التخطيط العملائي واللوجستي. (٢١٩)

للاعداد لنقل مسؤولية تدريب الشرطة من وزارة الدفاع إلى مكتب شؤون المخدرات الدولي (INL)، طالبت الإدارة بـ ٨٣٢ مليون دولار من المخصصات التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠ والمخصصات النظامية للسنة المالية ٢٠١١ للصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE). (٢٢٠) كان الطلب يساوي تقريباً ضعفي المخصصات التراكمية للصندوق المذكور (INCLE) للعراق منذ السنة المالية ٢٠٠٣ عبر المخصصات النظامية للسنة المالية ٢٠١٠ التي بلغ مجموعها ٤٣٨ مليون دولار. (٢٢١)

في أواخر نيسان/إبريل ٢٠١٠، سافر معاون وزيرة الخارجية لمكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (INL) إلى العراق لعقد اجتماعات تخطيط مشتركة مع نظرائه في محافظات بغداد وأربيل والبصرة حول الانتقال إلى برنامج لتطوير الشرطة بقيادة مدنية. (٢٢٢) في ٢٦ نيسان/إبريل، خلال اجتماع طاولة مستديرة في السفارة الأميركية في بغداد، وضع الموظفون الرسميون في مكتب شؤون المخدرات (INL) والحكومة العراقية الخطوط العريضة لبرنامج قد يدوم من ثلاث إلى خمس سنوات. (٢٢٣) للاطلاع على تفاصيل مهمة المساعدة الأمنية الجاري تنفيذها حالياً والتغييرات المبرمجة المخطط لها، أنظر القسم الفرعي حول "الأمن" في هذا التقرير.

بحسب السفارة الأميركية في بغداد، التوظيف في القسم ٣١٦١ يجب أن يساعد في إصلاح مشكلة المقاولين الذين يشرفون على عمل مقاولين آخرين

اعتباراً من تاريخ منتصف حزيران/يونيو، سوف يرفع مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميركية في بغداد (ACCO) التقارير مباشرة إلى مدير مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) المقيم في بغداد. سابقاً، كان المكتب يرفع التقارير إلى معاون رئيس البعثة. (٢٢٤) بحسب السفارة الأميركية في بغداد، سوف يبقى مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميركية في بغداد (ACCO) مكتباً منفصلاً كما ان برامجه سوف تبني على الأعمال السابقة. (٢٢٥) لمزيد من المعلومات حول نشاطات مكافحة الفساد التي تقوم بها كل من الولايات المتحدة والحكومة العراقية، أنظر القسم الفرعي حول "نظام الحكم" في هذا التقرير.

السفارة الأميركية في بغداد: إدماج فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) وضمان سلامتها
خلال ربع السنة المنصرم، طالبت الإدارة بـ ١,٥٧ مليار دولار لأجل انتقال خمس فرق لإعادة إعمار المحافظات إلى مراكز الحضور الدائم (EPPs) الموجودة في البصرة وعلى الخط الفاصل العربي - الكردي، في محافظات نينوى وأربيل وتأميم وديالى. (٢٢٦)

لم يوافق الكونغرس بعد على التمويل، وبحسب السفارة الأميركية في بغداد لن يكتمل التخطيط إلى حين معرفة المخصصات النهائية.^(٢٢٧) حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان حضور فرق إعادة إعمار المحافظات يشمل ١٨ فرقة: ١٥ فرقة لإعادة إعمار المحافظات، وفرقة لإعادة الإعمار الإقليمي، وفرقتين مرافقتين (ePRTs).^(٢٢٨) قبل ستة أشهر، (بتاريخ ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩) كان عدد الفرق يبلغ ٢٢ فريق.^(٢٢٩) المكاتب التابعة قد أعيدت تسميتها بمكاتب "الحضور المتقدم". بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو، كان عدد هذه المكاتب يبلغ ١٥ مكتب "حضور متقدم" مقابل ٢٢ من المكاتب التابعة قبل ستة أشهر.^(٢٣٠) للاطلاع على أماكن تواجد فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) الحالية، أنظر الشكل ٢-١٢. للاطلاع على عدد الموظفين، بحسب فرق إعادة إعمار المحافظات، أنظر الجدول ٢-٩. لمزيد من المعلومات حول نشاطات فرق إعادة إعمار المحافظات، أنظر القسم الفرعي "حول نظام الحكم" في هذا التقرير.

بغية دعم وحماية موظفيها العاملين في مختلف أرجاء العراق، طلبت وزارة الخارجية في تقارير لها ٢٤ طائرة مروحية UH-60، و ٥٠٠ عربة مقاومة للقنابل، وشاحنات ثقيلة، وعربات مقطورة للوقود، وأنظمة مراقبة ذات تقنية رفيعة. بحسب مكتب OUSD(P)، سوف تستكمل هذه المعدات جهود وزارة الخارجية الأمنية وتساعد في الحد من المخاطر.^(٢٣١)

وطلبت وزارة الخارجية أيضاً السماح لها باستخدام برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني III (LOGCAP) لدعم عملياتها في العراق، بعد كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١. ولكن بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، تقرر أن لا تبقى شركة كيلوغ، براون أند روت (KBR) - المقاول الوحيد لبرنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني الثالث (LOGCAP III) - في العراق إلى ما بعد نهاية ٢٠١١.^(٢٣٢) وبحسب السفارة الأميركية في بغداد، ليس لدى وزارة الخارجية أية خطط لتلبية احتياجات الدعم في حال انسحبت شركة كيلوغ، براون أند روت (KBR).^(٢٣٣)

فرقة منطقة الخليج بصدد استكشاف الخيارات حالياً لمناولة المشاريع التي لن تكون منجزة قبل مغادرة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) العراق.

سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE): نقل قيادة فرقة منطقة الخليج (GRD) واستكشاف الخيارات للمشاريع الجاري تنفيذها

بتاريخ ٩ تموز/يوليو ٢٠١٠، حل العقيد جون كريستنسن محل العقيد ديونيسيوس أنينوس كقائد لفرقة منطقة الخليج (GRD) التابعة لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي. يتوقع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) ان يكون العقيد كريستنسن آخر قائد لفرقة منطقة الخليج (GRD) المبرمج انسحابها في أواخر ٢٠١١.^(٢٣٤)

فرقة منطقة الخليج (GRD) تدرس حالياً الخيارات لتناول المشاريع التي لن تكون قد أنجزت قبل مغادرة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) العراق.^(٢٣٥) بتاريخ الأول من تموز/يوليو ٢٠١٠، كان سلاح الهندسة في الجيش الأميركي قد أنجز ٤٨٥٥ مشروعاً بكلفة إنشاء تبلغ ٧,٨ مليار دولار ولا يزال لديه ٢٦١ مشروع قيد التنفيذ بكلفة إنشاء تبلغ مليار دولار.^(٢٣٦) أحد الخيارات التي يدعمها "بقوة" سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) هي توظيف وتدريب مهندسين عراقيين محليين وموظفي دعم. بتاريخ ٨ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) ٢٣٣ موظف يتكلمون العربية مسلحين في برنامج المشاركين العراقيين (IAP)، وهو عقد بقيمة ١٠ ملايين دولار ممول من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) لتعليم معايير البناء والسلامة الدولية. موظفو العقد المشاركون في البرنامج (IAP) يقدمون أنواعاً مختلفة من الخدمات في مشاريع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) بما في ذلك الدعم الإداري والهندسي.^(٢٣٧)

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان JCC-I/A: الانتقال إلى قيادة العقود في قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) في ١١ حزيران/يونيو ٢٠١٠، نقلت قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A) إلى قيادة العقود (C³) لديها. أُجري التغيير لتسهيل توسعة إشراف المنظمة على كافة العمليات الطارئة في مناطق عمليات قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية - بما في ذلك الكويت وباكستان - وفقاً للعقيدة المشتركة، "التي تطورت لتأخذ بالاعتبار الحالات الطارئة المُعددة الطويلة الأمد" (٢٣٨). لهذه الغاية، سوف تنتقل قيادة العقود (C³) إلى قطر وتعيد تقييم حاجاتها للموظفين. (٢٣٩)

إضافة إلى الإشراف على العقود، سوف تشمل مسؤوليات قيادة العقود (C³) في العراق العلاقات المتبادلة مع منظمات التعاقد للخدمات المسلحة، مقدمة إحصاء شهرياً للمقاولين وقاعدة البيانات لنظام التعقب المتزامن السابق للانتشار والعملائي (SPOT)، وإقامة وترأس مجلساً لدعم العقود المشتركة لأجل تنسيق فرض تطبيق إجراءات التعاقد والمدفوعات. (٢٤٠)

الشكل ٢-١٢

مناطق وجود فرق إعادة إعمار المحافظات، حتى تاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠



إدارة تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الجدول ٩-٢
عدد الموظفين، بحسب فرق إعادة الإعمار (PRT)

الموظفين	فرق إعادة الإعمار
٦٤	الأنبار
٦	انبار الاسد
٣٤	بابل
٩٣	وسط بغداد
١٤	شمال بغداد
١١	جنوب بغداد
٨	غرب بغداد
٤٩	البصرة
١٠٠	ديالى
٥٥	أربيل
٣٠	كربلا
٢٥	ميسان
٣٥	المتنى
٢٧	النجف
٦١	نينوى
٢٥	القادسية
٤٥	صلاح الدين
٦٠	التأميم
٥٧	ذي قار
٣٤	واسط
٨٣٣	المجموع

ملاحظة: البيانات غير مدققة. تشمل الموظفين العسكريين والمدنيين.

المصدر: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٥.

مسائل حفظ السجلات

الحفاظ على سجلات إعادة الإعمار

تغير رفع التقارير حول المتطلبات والممارسات باستمرار منذ بداية الجهود الأميركية لإعادة إعمار العراق في سنة ٢٠٠٣، مع تطور المقاييس ومع نقل المسؤوليات إلى الوكالات المتتالية لإدارة إعادة الإعمار والعقود.

معظم التقارير الرئيسية بما في ذلك تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، وتقرير مكتب الإدارة والموازنة للقسم ٢٢٠٧ في السفارة الأميركية في بغداد، وتقرير قياس الاستقرار والأمن في العراق الصادر عن وزارة الدفاع، مطلوبة قانونياً. التقارير الأخرى بما في ذلك بعض التقارير الأسبوعية أو الشهرية حول الوضعية، فقد أنشأتها الوكالات المختلفة. انتقلت مسؤولية بعض التقارير مثل تقرير وضعية العراق، من يد إلى يد عدة مرات. وتطورت المقاييس وفقاً لذلك مع تغيير سياسة الأولويات والتغير في توفر البيانات. بعض المقاييس تغيرت مع الوقت لتخدم بصورة أفضل صنّاع السياسة أو استجابة لتوصيات قدمتها وكالات الإشراف. فمثلاً، كانت مقاييس قوات الأمن العراقية (ISF) عرضة لتعديلات هامة،

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

وأعطت بشكل متتابع صورة عن القوات العاملة، والقوات المدربة والمجهزة، وتقييمات جهوزية الوحدات (تقييم الجهوزية في المرحلة الانتقالية)، وتقييم قدرة قوات الأمن العراقية (ISF) على السيطرة على الأرض (السيطرة العراقية على المحافظات)^(٢٤١) وقد أُلغيت مقاييس أخرى لأنها لم تعد مُتبعة من جانب الحكومة الأميركية مثل أعداد قوات الأمن العراقية المتدربة التي كانت تنشر في تقرير وزارة الدفاع 'مقياس الاستقرار والأمن في العراق'.



القائد السابق لمنطقة الخليج يراجع مخطط الموقع لمركز العليل للتدريب في الموصل مع مقاول وشريك عراقي من مكتب الموصل. (صورة لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي)

مع تراجع جهود إعادة الإعمار الأميركية، تشارك الوكالات الأميركية بنشاطات أقل كما ان عدد موظفيها أصبح أقل. وفي الوقت نفسه، انخفضت نسبة التقارير. خلال العام الفائت، توقفت الوكالات عن إنتاج وتوزيع عدة تقارير بارزة مثل:

- تقرير المؤشرات الأساسية لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)
- تقارير الوضع الأسبوعي والشهري (SITREPs) لفرقة منطقة الخليج (GRD)
- نظرة إجمالية تحليلية حول الطاقة في العراق
- تقرير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) الأسبوعي - حول الكهرباء
- تقرير خلية دمج الطاقة النفطية.

وجد التدقيق ان وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم تطبق بالكامل الإجراءات للحفاظ على سجلاتها الخاصة بإعادة إعمار العراق. هذا الوضع يترك الحكومة الأميركية معرضة للهدر والسرقة.

علاوة على ذلك، انخفضت إمكانية التوقع لإصدار وزارة الدفاع لمقياس الاستقرار والأمن في العراق. مثلاً، عدد آذار/مارس ٢٠١٠، لم يصدر إلا في ٢٩ نيسان/أبريل ٢٠١٠^(٢٤٢). أخيراً، فإن نظام إدارة إعمار العراق (IRMS) الذي كان المركز الرئيسي لإيداع البيانات المتعلقة

إدارة تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

بمشاريع إعادة الإعمار الممولة من الولايات المتحدة منذ تأسيسه في أواخر ٢٠٠٥، سوف يُقفل في الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. (٢٤٣)

خلال ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام تقرير تدقيق حول خطط وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للحفاظ على سجلات برنامج عقود إعادة الإعمار. وعلى الرغم من ان لدى تلك الوكالات سياسات وإجراءات لإدارة السجلات، وجد التدقيق انها لم تطبق بالكامل تلك الإجراءات للحفاظ على سجلاتها الخاصة بإعادة إعمار العراق. هذا الوضع يترك الحكومة الأميركية عرضة للهدر والسرقة لأنه قد لا يكون لديها المعلومات الضرورية لمتابعة حالات الاحتيال المحتملة و/أو أداء التدقيقات حول نشاطات إعادة الإعمار. وأظهرت مراجعة المفتش العام مجالاً من التقدم في الحفاظ على السجلات. المزيد من التفاصيل حول هذا التدقيق موجود في القسم ٣ من هذا التقرير. (٢٤٤)

الرقابة على الممتلكات في السفارة الأميركية في بغداد

في نيسان/أبريل ٢٠١٠، أصدر مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (OIG) "تدقيق المساءلة حول الممتلكات في السفارة الأميركية في بغداد". قِيم التدقيق الذي أجري في حزيران/يونيو ٢٠٠٩، رقابات وزارة الخارجية على الجردات والسجلات والحفاظ على المعدات والممتلكات العائدة للحكومة الأميركية في العراق (٢٤٥). للاطلاع على التفاصيل حول النتائج الأساسية التي توصل إليها التدقيق واستجابة السفارة الأميركية في بغداد، أنظر الجدول ٢-١٠.

الجدول ٢-١٠

الرقابة على الممتلكات في السفارة الأميركية في بغداد

رد السفارة الأميركية في بغداد	النتائج التي توصل إليها المفتش العام لوزارة الخارجية
من كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩ لغاية آذار/مارس ٢٠١٠، أجرت السفارة الأميركية في بغداد جردة دقيقة للعربات التي تمتلكها وزارة الخارجية في العراق. لقد كانوا غير قادرين على احتساب ٢٧ عربية، البعض منها ربما لم يصل أبداً إلى البلاد. كافة العربات مُدخلة الآن في قاعدة البيانات، كما جرى وضع عمليات تعقب أفضل لتجنب الفوضى في المستقبل.	تمتلك السفارة الأميركية في بغداد حوالي ١,١٦٨ عربية، ١٥٩ من أصلها مقدرة ب ١٨,٥ مليون دولار، لم يكن من الممكن احتسابها. علاوة على ذلك، لم يتم إدخال ٢٨٢ عربية مقدرة ب ٤٠,٤ مليون دولار في قاعدة بيانات السيارات.
في شباط/فبراير ٢٠١٠، طورت السفارة الأميركية في بغداد إجراءات قياسية تشغيلية تحكم برنامج الإمدادات القابلة للاستهلاك. بتاريخ ٤ نيسان/أبريل ٢٠١٠، طبقت السفارة نظام الخدمات الإلكترونية كآلية وحيدة لطلب، وإصدار، وتعقب الإمدادات القابلة للاستهلاك.	مقارنة سجلات الجردات مع الجردات المادية لثلاثة مبانٍ للسفارة أظهرت غياب ٢,٣ مليون دولار من الممتلكات غير المعدة للاستهلاك. علاوة على ذلك، كان هناك ٢,٢٥ مليون دولار من الممتلكات التي وجدت أثناء الجردة لكنها لم تكن مسجلة. صدرت إمدادات استهلاكية مقدرة ب ١,٣ مليون دولار دون مستندات صحيحة لم تكن مسجلة في نظام الجرد الملائم، كانت ناقصة أو غير معروف كيف تم التصرف بها.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الجدول ٢-١٠ (تابع)

رد السفارة الأميركية في بغداد	النتائج التي توصل إليها المفتش العام لوزارة الخارجية
السفارة الأميركية في بغداد تُدخل كافة الأدوية في نظام الجردات لديها، وبتاريخ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩، كان الأعضاء الموظفون الذين يأخذون علاجات من الصيدلية قد قدموا المستندات المناسبة. غير ان الإمدادات الطبية لا يتم إدخالها، لان عمل ذلك قد يخلق "كمية غير اعتيادية من عمل الإدخال المزدوج الذي لا معنى له". بدلاً من ذلك، تحفظ السفارة لائحة بالتجهيزات الطبية في ورقة عمل مفصلة على نظام Exel، استناداً إلى الطلبات المقدمة.	قراءة ٢٠ بالمئة من المواد المسجلة في السفارة، في نظام الجرد للوحدات الطبية لم يعثر عليها.
المتطلبات العسكرية التوافقية الجديدة تفرض على السفارة الأميركية في بغداد استخدام ٥٩ جهاز متنagam وقد تم نقل ٨٠ جهاز آخر إلى السفارة الأميركية في القاهرة. التخطيط الحالي للمشاركة الدائمة (EPPs) قد يتطلب استخدام كافة الأجهزة المتبقية كما ان عمليات النقل الأخرى قد أوقفت.	لدى السفارة الأميركية في بغداد حوالي ١٠٠٠ جهاز راديو محمول يدوياً فائض تقدر قيمتها ب ٩٣٦,٠٠٠ دولار.
في ١٩ أيار/مايو ٢٠١٠، أصدرت السفارة الأميركية في بغداد سياسة مكتوبة حول الهواتف الخليوية، وجردت أيضاً أجهزة الهواتف الخليوية الفائضة وهي بصدد التخلص منها. الاستثمارات الجديدة لطالبي الهواتف تعلن بوضوح الحدود أمام المستخدم للهاتف لكل دورة فوترة من ١٠٠ دولار (ما لم يسمح بزيادة) وتصف المسؤوليات الشخصية للاستخدام غير المرخص. قدرات المكالمات الدولية متوفرة فقط في حال أعطى المشرفون الإذن بها مع تبرير مكتوب.	تنفق السفارة الأميركية في بغداد حوالي ٨٣٠,٠٠٠ دولار سنوياً على خطوط الهواتف الخليوية. قرابة نصف ال ٤,٥٦٨ هاتف خليوي في السفارة بقيت دون تخصيص، ومع هذا فهي تسبب ٢٦٨,٠٠٠ دولار من التكاليف في السنة.

المصدر: تقرير مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الرقم MERO-A-10-07، "تدقيق محاسبة الممتلكات في السفارة الأميركية في بغداد"، ٢٠١٠/٤، ص ١، مذكرة معلومات السفارة الأميركية في بغداد إلى مكتب المفتش العام لوزارة الخارجية"، استجابة لتدقيق مذكرة حول محاسبة الممتلكات في السفارة الأميركية في بغداد ل (MERO-A-10-07)، ٢٠١٠/٦/٨.

اعترف التدقيق انه على الرغم من تراجع العنف، لا يزال العراق موقع يطرح التحدي: حركة تبديل الموظفين أقصر من المعتاد، وتواصل السفارة الاعتماد على الجيش الأميركي بالنسبة للنقل واللوجستية، كما ان البيئة لا زالت "انتقالية وغير مستقرة"^(٢٤٦). علاوة على ذلك، ووفقاً للمفتش العام لوزارة الخارجية، "الحجم والعدد الكبير جداً من الموظفين" يعني ان السفارة الأميركية في بغداد تمتلك كمية كبيرة جداً من الممتلكات. إذا أضيفت إلى ذلك تعقيدات الانتقال إلى المجمع الجديد للسفارة (NEC) خلال فترة زمنية قصيرة، فإن هذا يعني ان السفارة الأميركية كانت غير قادرة على رصد او رقابة جرداتها بصورة ملائمة.^(٢٤٧)

ينص القانون على ان على الوكالات الحكومية الأميركية الحفاظ على الرقابة المناسبة على جردات الموجودات وعلى سجلات الممتلكات. تقرض سياسة وزارة الخارجية بأن تجري السفارات جردات مادية سنوية وأن تصادق على النتائج بحلول ١٥ آذار/مارس من كل سنة. تلقت السفارة الأميركية في بغداد تنازلاً عن هذا المطلب سنة ٢٠٠٤، وجرى تمديده كل سنة

إدارة تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

لغاية آخر ٢٠٠٩^(٢٤٨). أنجزت السفارة الأميركية في بغداد التصديق على أول جردة سنوية- غطت السنة المالية ٢٠٠٩- في ١٧ حزيران/يونيو ٢٠١٠. ذكر التقرير وجود ١٧,٨٥ مليون دولار من جردات الموجودات غير القابلة للاستهلاك (٦ بالمئة اقل من الإجمالي المبيّن في سجلاتها للجردات) و ١,٦١ مليون دولار من الجردات القابلة للاستهلاك (٦,٣ بالمئة أكثر مما تشير سجلاتها)^(٢٤٩) غير ان السفارة الأميركية في بغداد لاحظت ان جردة معدات تكنولوجيا المعلومات لم تصدق بعد.^(٢٥٠)

دعم المقاولين والحاصلين على هبات

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان هناك ١١٣,٦٤٩ مقاول وموظف مستفيد يدعمون الجهود الأميركية في العراق.^(٢٥١) للإطلاع على تفاصيل المقاولين والحاصلين على هبات، حسب الوكالات والغرض والأصول القومية، انظر الجدول ٢-١١.

مواطنو الدول الثالثة يشكلون حالياً نسبة مئوية من إجمالي مقاولي وزارة الدفاع أكثر من أي وقت سابق.

يقدم المقاولون تشكيلة متنوعة من الخدمات. وفقاً لأحدث إحصاء أجرته وزارة الدفاع حول مقاوليها في العراق، يؤدي حوالي ٦٥ بالمئة وظائف دعم أساسي^(٢٥٢)، مثل صيانة المواقع، وإدارة مرافق الطعام، وتقديم خدمات غسل وكوي الملابس^(٢٥٣). البيانات القابلة للمقارنة لم تكن متوفرة من جانب وزارة الخارجية أو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

الجدول ٢-١١

المقاولون والحاصلون على هبات ممولة من الولايات المتحدة، بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠.

الوكالة	الغرض	مواطنون أميركيون	مواطنو الدول الثالثة	المواطنون العراقيون	المجموع
وزارة الدفاع	غير امني	٣١,٠٧١	١٣,٤٦٧	٤٤,٩١٣	٨٩,٤٥١
	الشركات الأمنية الخاصة (PSCs)	١,٣٦٥	١٤,١٣٦	١,٣١١	١٦,٨١٢
	المجموع الفرعي	٣٢,٤٣٦	٢٧,٦٠٣	٤٦,٢٢٤	١٠٦,٢٦٣
وزارة الخارجية	الشركات الأمنية الخاصة (PSCs)	١,٢٠٢	٢,٤٩١	١,١٧٧	٤,٨٧٠
	غير أمنية	*	*	*	*
	المجموع الفرعي	١,٢٠٢	٢,٤٩١	١,١٧٧	٤,٨٧٠
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية	الشركات الأمنية الخاصة (PSCs)	٣	٥٤١	١٣٨	١,٤٨٥
	المجموع الفرعي	١٦٠	١,٧٣١	٦٢٥	٢,٥١٦
المجموع		٣٣,٧٩٨٨	٣١,٨٢٥	٤٨,٠٢٦	١١٣,٦٤٩

ملاحظة: البيانات لم تدقق- لم يتلق المفتش العام تقارير من وزارة الخارجية عن عدد المقاولين غير الأمنيين والحاصلين على الهبات.

المصدر: استجابة مكتب الأمن الإقليمي (RSO) – السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١، استجابة القوات الأميركية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٣.

الصفة العامة لمقاولي وزارة الدفاع في العراق تعيّرت مع الوقت. عدد المقاولين الذين يقدمون خدمات دعم أساسية كان على العموم متوازياً مع عدد القوات الأميركية في العراق. في هذه الأثناء، ومع تحول تركيز برنامج المساعدات الأميركية من مشاريع البنية التحتية الكبيرة النطاق، تراجع عدد مقاولي الإنشاء كما ان النسبة المئوية للمقاولين الذين يقدمون الأمن قد تزايد. مواطنو البلدان الثالثة يشكلون حالياً نسبة مئوية من إجمالي مقاولي وزارة الدفاع أكثر من أي وقت سابق، كما ان نسبة المواطنين العراقيين تراجعت إلى أدنى نقطة حتى الآن.^(٢٥٤)

للاطلاع على التفاصيل حول أنواع الخدمات المقدمة من جانب مقاولي وزارة الدفاع وأصولهم القومية، أنظر الشكل ٢-١٣.

تعقب المقاولين والحاصلين على هبات في العراق

في ٢٣ آذار/مارس ٢٠١٠، عقدت اللجنة الفرعية للجنة الخدمات المسلحة حول الإشراف والتحقيقات جلسات استماع حول المنح والعقود في العراق وأفغانستان. كان بين المواضيع التي نوقشت التطوير الجاري لقاعدة البيانات لنظام التعقب المتزامن السابق للانتشار والعملائي (SPOT) التي تهدف إلى الخدمة كأداة تنسيق للوكالات الأميركية والمقاولين والحاصلين على منح.

أعلن ممثلو وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب المحاسبة الحكومية ما يلي:

- وفقاً لوزارة الدفاع، حوالي ٧٥ بالمئة من مقاوليها تم إدخالهم في قاعدة البيانات (SPOT). تسجيل المقاولين العراقيين الذين لا يعملون في قواعد أميركية عسكرية أو منشآت لوزارة الدفاع لا زال أكبر التحديات الباقية. تستخدم وزارة الدفاع قاعدة البيانات (SPOT) لتعقب خفض عدد مقاوليها.^(٢٥٥)
- وفقاً لوزارة الخارجية، وسّعت الوزارة استخدامها لقاعدة البيانات (SPOT) لكي تشمل الحاصلين على هبات كما والمقاولين. علاوة على ذلك، تستخدم وزارة الخارجية كتب الأذونات (LOAs) التي تولدها قاعدة البيانات (SPOT) لمنح الامتيازات للمقاولين، مثل وجبات الطعام وبطاقات الدخول العامة (CACs)، وبإمكانها تعقب حركة المقاولين داخل البلاد عن طريق استخدام الماكنات التي تقرأ كتب الأذونات.^(٢٥٦)
- وفقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، يفوق العبء الإداري والمالي لإدخال البيانات الفردية لجميع الشركاء (المعرف عنهم بالمقاولين والحاصلين على هبات) الفوائد لأن الكثير منهم لا يحتاجون إلى كتب أذونات. علاوة على ذلك، هناك هواجس بأن شركاء الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذين يعملون في بعض المجتمعات الأهلية قد يعرضون سلامتهم للخطر. تفاهمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع وزارة الدفاع لإدخال البيانات الشخصية للشركاء الذين يطالبون بكتب أذونات وجمع البيانات للشركاء الذين لا يطالبون بها.^(٢٥٧)
- وفقاً لمكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، كشفت تدقيقاته ان المعلومات غير الكافية حول المقاولين والحاصلين على منح قد تعرقل التخطيط، وتزيد التكاليف، وتدخل مخاطر غير


إدارة تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها


ضرورية. لقد حققت الوكالات بعض التقدم في تطبيق قاعدة البيانات لنظام التعقب المترامن السابق للانتشار والعملائي (SPOT)، لكن جهودها لا تزال مقصرة من حيث امتلاك بيانات كاملة ويعتمد عليها لتلبية الشروط القانونية ولتحسين الإدارة والإشراف. البدائل لقاعدة البيانات (SPOT)، بما في ذلك المسوحات الدورية، تكون غير كاملة عادة ولا يعتمد عليها وبنوع خاص لتحديد الاتجاهات والتوصل إلى استنتاجات.^(٢٥٨)

وفقاً لشهادات أخرى من جانب وزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، توصلت هاتان الوكالتان إلى اتفاق سوف تقدم الوكالة الأميركية بموجبه البيانات الإجمالية للحاصلين على هبات – مفصلة حسب الفئات العريضة للمواطنين الأميركيين والمحليين والبلدان الثالثة- التي ستكون كافية لتمكينهم من استخدام قاعدة البيانات (SPOT) كأداة إدارية.^(٢٥٩) اعترف ممثل مكتب المحاسبة الحكومية ان أنواع مختلفة من البيانات سوف تُطلب لمختلف طبقات المقاولين والحاصلين على هبات، وأنه يعود إلى الوكالات أمر تحديد أي نوع يصلح أكثر، والتنسيق فيما بينها.^(٢٦٠)

الشكل ٢-١٣

مقاولو وزارة الدفاع في العراق، ٢٠٠٨/٣ - ٢٠١٠/٣

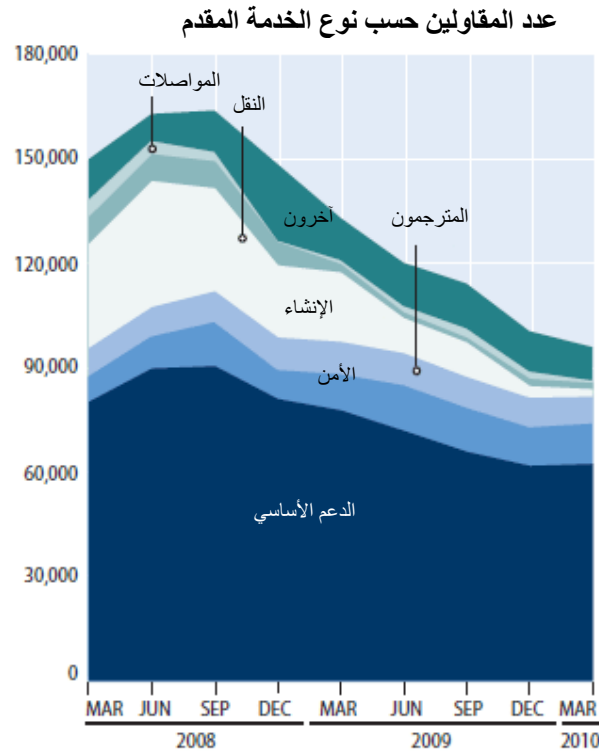

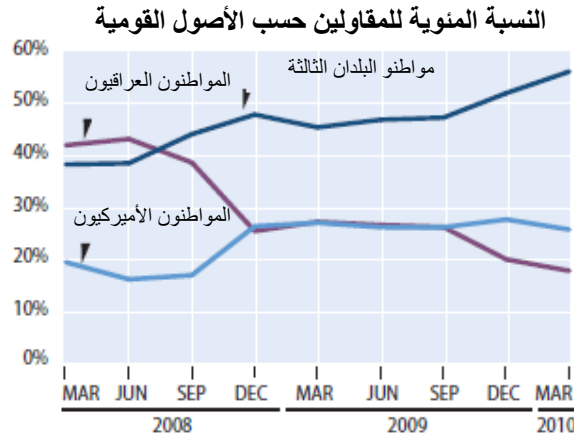

ملاحظة: البيانات لم تدقق. مساعد نائب وكيل وزارة الدفاع (ADUSD) التابع لوزارة الدفاع (دعم البرنامج) يقدم بيانات الخط الأعلى لعدد المقاولين حسب الأصول القومية، وعدد المقاولين حسب نوع الخدمات المقدمة، لا تفصل وزارة الدفاع بيانات الأصول القومية حسب نوع الخدمات المقدمة، ولذا من غير الممكن تحديد، مثلاً، ما إذا كان المقاولون الامنيون هم في أغليبتهم من مواطني البلدان الثالثة. وزارة الدفاع لم تتعقب بصورة منفصلة اللوجستية/الصيانة او التدريب لغاية الربع الأول من سنة ٢٠١٠، هذه الفئات مجموعة في فئة "أخرى" هنا. المصادر: موشيه شوارتز، تقرير مصلحة خدمات الأبحاث في الكونغرس (CRS) R40764 "مقاولو وزارة الدفاع في العراق وأفغانستان: الخلفية والتحليل"، ٢٠١٠/٧/٢، ص ص ٢٤-٢٥، مساعد نائب وكيل وزارة الدفاع (ADUSD) (دعم البرنامج)، "دعم المقاولين للعمليات الأميركية في منطقة مسؤولية قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (US CENTCOM)، العراق، وأفغانستان، ٢٠١٠/٢ و ٢٠١٠/٥.

إطلاق النظام الفدرالي للمعلومات حول أداء ونزاهة الفائزين بالعقود (FAPIS)

في ٢٢ نيسان/أبريل ٢٠١٠، أطلقت إدارة الخدمات العامة (GSA) النظام الفدرالي للمعلومات حول أداء ونزاهة الفائزين بالعقود (FAPIS) "المصمم لتعزيز قدرة الحكومة بصورة كبيرة على تقييم اخلاقيات أعمال ونوعية المقاولين المتوقعين المتنافسين على العقود الفدرالية وعلى حماية دافعي الضرائب من التعامل مع مقاولين لا يشكلون مصادر للمسؤولية".^(٢٦١) كان النظام مصمماً لتلبية شروط القسم ٨٧٢ من قانون دانكن هانتر لأذونات الدفاع القومي لسنة ٢٠٠٩ (P.L. 110-417)^(٢٦٢) الذي أمر إدارة الخدمات العامة تأسيس قاعدة بيانات لتعقب نزاهة وأداء المقاولين.^(٢٦٣)

قبل منتصف العام ٢٠٠٩، كانت المعلومات الوحيدة المتوفرة على النطاق الحكومي لضباط العقود لوائح أعمال الحظر والتعليق المحافظ عليها في نظام قائمة الفرقاء المستبعدين (ELPs). النظام الفدرالي للمعلومات حول أداء ونزاهة الفائزين بالعقود يوسع نطاق المعلومات المتوفرة لموظفي العقود، بما في ذلك^(٢٦٤):

- سجلات أداء المقاولين
- تحديدات عدم مسؤولية ضباط العقود
- إنهاء مهمة المقاول للتخلف او سبب آخر
- تحديدات الوكالة الناقصة للأسعار
- الاتفاقيات الإدارية المستخدمة لحلّ حالة الحظر او التعليق
- الإبلاغ الذاتي من جانب المقاول عن إدانات جنائية، مسؤوليات مدنية، وأعمال إدارية مخالفة

النظام الفدرالي للمعلومات حول أداء ونزاهة الفائزين بالعقود (FAPHS) "مصمم لتعزيز قدرة الحكومة بدرجة كبيرة في تقييم اخلاقيات أعمال ونوعية المقاولين المتوقعين"

النظام القائم على شبكة الإنترنت ممكن دخوله فقط للمسؤولين الحكوميين والمقاولين الذين أدخلت بياناتهم^(٢٦٥). بإمكان المفتشين العامين ووكالات فرض تطبيق القوانين الفدرالية المطالبة بالدخول بموجب أحكام القانون العام P.L. 110-417 الخاص بالدخول "لغير المسؤولين الحكوميين كما يقرر المدير أن ذلك مناسباً". قانون حرية المعلومات يطالب بأن يتم التعامل به على أساس كل حالة بمفردها.^(٢٦٦)

استخدامات التمويلات

يصنّف المفتش العام الصناديق الأميركية الكبرى لإعادة الإعمار ضمن أربع مجالات تتضمن ١٧ قطاعاً. التنمية في المجالات الأمنية والبنية التحتية ونظام الحكم والاقتصاد تناقش في الصفحات التالية لهذا التقرير. بالنسبة لوضعية التمويل الأميركي لإعادة الإعمار حسب الاستخدام، أنظر الجدول ٢-١٢. للاطلاع على وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، حسب البرامج، انظر الملحق ج.

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان قد انفق ٤٤,٨٦ مليار دولار (٩١ بالمئة) من اصل ال ٤٧,٢٨ مليار دولار التي خصصت لأربعة صناديق كبرى لإعادة الإعمار. وفقاً لتحليل المفتش العام، دعم أكثر من ٢٢,٣١ مليار دولار (٥٢ بالمئة) من النفقات البرامج ذات العلاقة بالأمن، بما في ذلك الجهود لتطوير قوات الأمن العراقية (ISF) وتحسين حكم القانون في العراق. حوالي ١١,٧٧ مليار دولار (٢٧ بالمئة) دعمت البرامج ذات العلاقة بالبنية التحتية، بما في ذلك إعادة تأهيل أو إنشاء قطاعات النفط والغاز، الكهرباء، المياه والصرف الصحي، والنقل والاتصالات. وانفق المتبقي على برامج تنمية قدرات نظام الحكم (٦,٨٢ مليار دولار) ودعم التنمية الاقتصادية (١,٤٨ مليار دولار).^(٢٦٧)

لقد تقلب تركيز الجهود الأميركية لإعادة الإعمار مع الوقت. ركزت الولايات المتحدة بالدرجة الأولى على البنية التحتية في السنة المالية ٢٠٠٣ والسنة المالية ٢٠٠٤ وعلى الأمن في السنوات التي تلت.^(٢٦٨)

للاطلاع على التفاصيل حول النفقات ربع السنوية، حسب مجال إعادة الإعمار، أنظر الشكل ٢-١٤. بالنسبة ل نظرة عامة النفقات التراكمية، بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، حسب الصندوق والاستخدام، أنظر الشكل ٢-١٥.

**أكثر من ٥٢ بالمئة من النفقات استعملت لدعم برامج ذات
علاقة بالأمن.**

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الجدول ٢-١٢

وضعية صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، حسب الاستخدام بملايين الدولارات

المجال	القطاع	وضعية الصناديق (بملايين الدولارات)			التغير ربع السنوي		
		أُلزمت	أنفقت	الزمت	أنفقت		
الأمن	المعدات	٧,٣٣٧,٩	٧,٠٦٦,٢	٦,٧٥٥,٩	٣٢,٠ (%)	١٤٣,٧ (%)	
	التدريب	٦,٠٠٣,٤	٥,٨١٨,٩	٥,٦٨٨,٠	٣٤,٥ (%)	٤١,٠ (%)	
	البنية التحتية	٥,٨٠٧,١	٥,٥٣١,٨	٥,٠٧٨,٥	١٧,٣- (%)	١٣٢,٢ (%)	
	مساندة الاستدامة	٢,٦٣٥,٢	٢,٤٧٨,١	٢,٣٢٩,٦	٤,٤ (%)	٧٤,١ (%)	
	حكم القانون	١,٥٩٢,٦	١,٥٥٠,٧	١,٤١١,١	١,١- (%)	١,٧ (%)	
	نشاطات ذات صلة	١,٢٤٩,٧	١,١٣٥,١	١,٠٤٧,٢	٥,٢- (%)	٢٨,١ (%)	
	المجموع الفرعي	٢٤,٦٢٥,٩	٢٣,٥٨٠,٨	٢٢,٣١٠,٣	٤٧,٣ (%)	٤٢٠,٧ (%)	
البنية التحتية	الكهرباء	٥,١٨٨,١	٥,٠٥٤,٥	٤,٩٥٥,٤	٨,٥ (%)	٩,٠ (%)	
	المياه والصرف الصحي	٢,٨٤٦,٢	٢,٦٩٤,٢	٢,٦٠٦,٥	١,٦- (%)	١٧,٧ (%)	
	النفط والغاز	٢,٠٤٦,٩	١,٩٢٦,٥	١,٩١٣,٨	٠,٦- (%)	١,٠ (%)	
	البنية التحتية العامة	١,٢٥٠,٧	١,٢٣٦,٨	١,٢٣٦,٠	١,٦- (%)	٠,٣- (%)	
	النقل والاتصالات	١,١٩٥,٠	١,١٤٠,٨	١,٠٥٤,٣	٠,٣- (%)	٨,٧ (%)	
		المجموع الفرعي	١٢,٥٢٦,٩	١٢,٠٥٢,٩	١١,٧٦٦,٠	٤,٤ (%)	٣٥,٣ (%)
نظام الحكم	تنمية القدرات	٢,٤٨١,٧	٢,٣٩٧,٣	٢,١٣٢,٢	٩٤,٣ (%)	٨١,٧ (%)	
	الديمقراطية والمجتمع المدني	٢,٢٢٦,٧	٢,١٨٦,٠	١,٩٣٤,٩	١٣,٦ (%)	١٠٧,٩ (%)	
الاقتصاد	الخدمات العامة	٢,٠٤٠,١	٢,٠٠٠,٦	١,٩٠٣,٩	١٩,١ (%)	١٩,١ (%)	
	الإغاثة الإنسانية	٩٠٠,٩	٨٩٥,٤	٨٤٥,٦	٩,٢ (%)	٩,٢ (%)	
		المجموع الفرعي	٧,٦٤٩,٣	٧,٤٧٩,٣	٦,٨١٦,٥	١٣٦,٢ (%)	٢٠٨,٦ (%)
	نظام الحكم الاقتصادي	٨٣٩,٨	٨٤٣,٦	٧٨٧,٩	٠,٣ (%)	٠,٢ (%)	
	تنمية القطاع الخاص	٨٢٦,٦	٧٧١,٥	٦٩٦,٧	١,٥ (%)	٥٦,٢ (%)	
		المجموع الفرعي	١٤,٦٦٦,٤	١٤,٦١٥,١	١٤,٤٨٤,٦	١,٧ (%)	٥٦,٢ (%)
	لم تحتسب مخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد	٢٩٢,٨	٢٠٥,٩	٤٧٩,٣	٢٩,٣ (%)	٧١,٥ (%)	
	المجموع	٤٦,٧٦١,٣	٤٤,٩٣٤,٠	٤٢,٨٥٦,٧	٢١٩,٠ (%)	٧٩٢,٥ (%)	


ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي والتمويل، في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأربعة حول ميادين إعادة الإعمار.

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات الأميركية في العراق- برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٤/١٣، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣، ٢٠١٠/٤/٨، ٢٠١٠/٧/١٤، ٢٠١٠/٧/١٦، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٤/١٣، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.


إدارة تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الشكل ٢-١٤

نفقات الصناديق الرئيسية لإعادة الإعمار، حسب مجال إعادة الإعمار
بملايين الدولارات

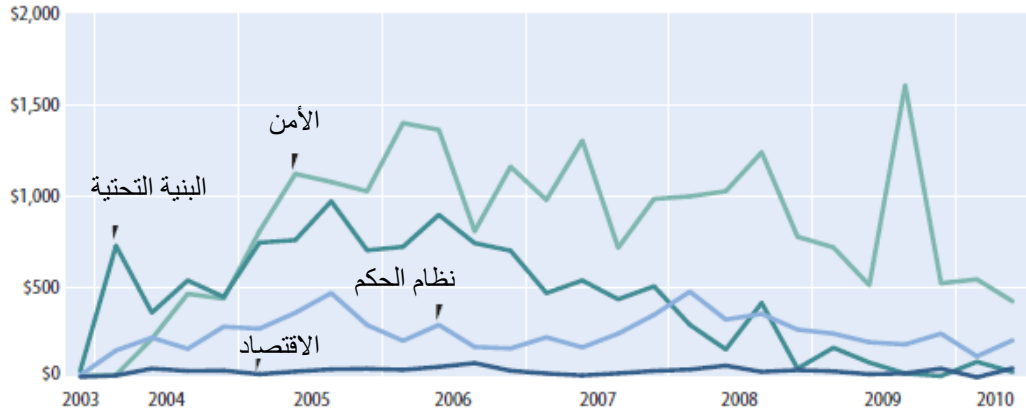

الإلزامات غير المنفقة
المجموع: \$٢,٣٥٠,٧

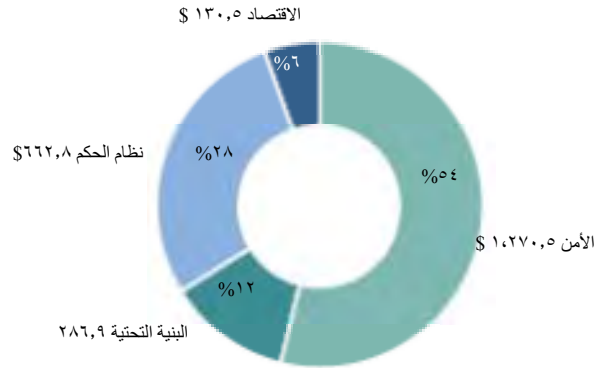

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. خط الاقتصاد لم يشمل \$٣٥٢ من ديون العراق الملغاة، الممولة من صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق في ربع السنة المالي الثاني من ٢٠٠٥، غير أن هذا المبلغ مشمول في قيم الخط الأعلى للاقتصاد في هذا التقرير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفتات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات الأميركية في العراق- برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤، استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢. التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٣ - ٢٠١٠/٤.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الشكل ١٥-٢

نفقات البرنامج الأميركي حسب الصندوق والاستخدام
بملايين الدولارات



الأمن ■ البنية التحتية ■ نظام الحكم ■ الاقتصاد

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. البرامج التي تُشكل أقل من واحد بالمئة من إجمالي النفقات جرى تجميعها في فئة واحدة سميت "أخرى" بحسب مجال الصندوق وإعادة الإعمار. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع الخط الأعلى للقيم التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأربعة حول ميادين إعادة الإعمار.

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، ٢٠١٠/٧/١٣، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات الأميركية في العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢.

الأمّن

حتى تاريخ ٣٠ حزيران/يونيو، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢٤,٦٣ مليار دولار، وألّزمت ٢٣,٥٨ مليار دولار وأنفقت ٢٢,٣١ مليار دولار في برامج ومشاريع لتطوير قوات الأمن العراقية (ISF)، ودعم حكم القانون في العراق^(٢٦٩). بالنسبة لوضع هذه الأموال، أنظر الشكل ٢-١٦. ويوزع الجدول ٢-١٣ فئات الإنفاق التي عرفت أكبر زيادات في الالتزامات والنفقات خلال ربع السنة الحالي.

كما هو مبين في الشكل ٢-١٧، كان متوسط النفقات الأمنية مليار دولار كل ربع سنة منذ منتصف العام ٢٠٠٥ ولغاية آخر العام ٢٠٠٨. بلغت النفقات ربع السنوية نقطتها الأعلى في ربع السنة الرابع من السنة المالية ٢٠٠٩، عندما تم إنفاق ١,٥٩ مليار دولار من حسابات ٢٠٠٧/٢٠٠٨ و ٢٠٠٩/٢٠٠٨ لصندوق قوات الأمن العراقية- بنوع خاص على مستويات مشتريات المعدات لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية (٩٤٠,٣ مليون دولار) وتدريب وزارة الداخلية (٣٨٠,٩ مليون دولار)^(٢٧٠).

دعم الحكومة العراقية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية: السياق الدولي

من العام ٢٠٠٧ إلى العام ٢٠١٠، خصصت الحكومة العراقية ٤٣,٥١ مليار دولار لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية^(٢٧١). خلال تلك الفترة الزمنية نفسها تقريباً، خصصت الولايات المتحدة ٩,٥٤ مليار دولار من تمويل صندوق قوات الأمن العراقية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية، أو ٢٢ بالمئة من مخصصات الحكومة العراقية^(٢٧٢) في شباط/فبراير ٢٠١٠، طلبت الإدارة مليار دولار من المخصصات التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠^(٢٧٣). للاطلاع على مقارنة بين مساهمة الحكومة العراقية والمساهمة الأميركية في المؤسسات الأمنية العراقية، أنظر الجدول ٢-١٤.


بحسب وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، بلغ إجمالي الإنفاق الدفاعي العراقي ٨,٦ بالمئة من إجمالي ناتجه المحلي (GDP)^(٢٧٤). كنسبة مئوية من إجمالي الدخل المحلي، يساهم العراق أكثر في الإنفاق الدفاعي من كافة بلدان العالم باستثناء ثلاثة بلدان، عُمان، قطر والمملكة العربية السعودية^(٢٧٥). للاطلاع على مقارنة حول الإنفاق الدفاعي في العالم، أنظر الجدول ٢-١٤.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الشكل ١٦-٢

الأمن: وضعية الأموال في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) بملايين الدولارات


الزمامات غير منفقة
المجموع: ١,٢٧٠,٥



ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات الأميركية في العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤، تقرير المفتش العام ربع السنوي ونصف السنوي إلى كونغرس الولايات المتحدة ٢٠٠٤/٣-٢٠١٠/٤.

الشكل ١٧-٢
الأمن: النفقات الأميركية ربع السنوية حسب قطاع إعادة الإعمار
بملايين الدولارات

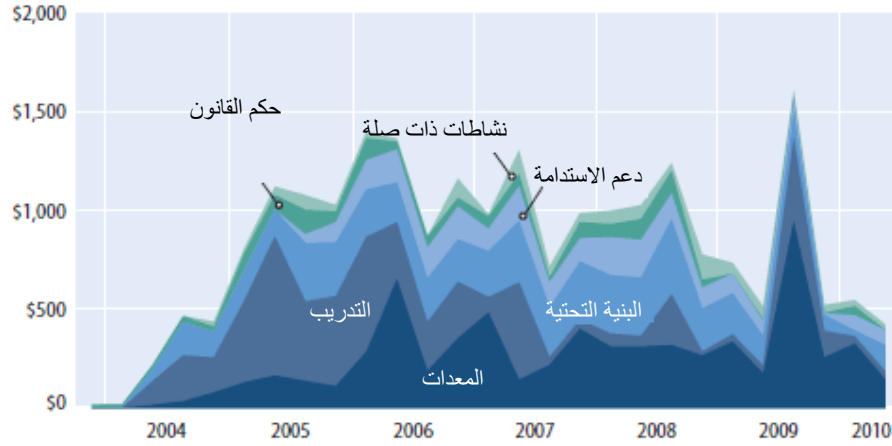

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفتات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفتات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٥، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات الأميركية في العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، تقرير الفتات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤، تقارير المفتش العام ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٣-٢٠١٠/٤.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الجدول ٢-١٣
الأمن: وضعية البرامج المنتقاة
بملايين الدولارات

البرنامج	وضعية الأموال		التغيرات ربع السنوية	
	أُنفقت	أُلمت	أُنفقت	أُلمت
معدات وزارة الدفاع (صندوق قوات الأمن العراقية)	٤,٦٢١,٧	٤,٤٧٢,٥	٢٩,٤ (%)	٨٧,٨ (%)
البنية التحتية لوزارة الدفاع (صندوق قوات الأمن العراقية)	٣,٠٧٥,٥	٢,٨٣٩,٠	١٣,١- (%)	٧٦,١ (%)
دعم الاستدامة لوزارة الدفاع (صندوق قوات الأمن العراقية)	١,٨٨٢,٩	١,٧٧٥,٤	٤,٨ (%)	٦٦,٦ (%)
البنية التحتية لوزارة الداخلية (صندوق قوات الأمن العراقية)	١,٣٧٤,٩	١,١٦٤,٠	٤,١- (%)	٥٦,١ (%)
معدات وزارة الداخلية (صندوق قوات الأمن العراقية)	١,٧٥٣,٧	١,٥٩٢,٩	٢,٦ (%)	٥٦,٠ (%)
نشاطات ذات صلة (صندوق قوات الأمن العراقية)	٨٧١,٥	٧٩٤,٥	٥,٢- (%)	٢٨,١ (%)
تدريب وزارة الدفاع (صندوق قوات الأمن العراقية)	٤٦٦,٢	٤٢٣,٠	١٥,٠ (%)	٢٧,٢ (%)
تدريب وزارة الداخلية (صندوق قوات الأمن العراقية)	٢,٤٤٩,٢	٢,٣٨٧,٤	٢٠,٨ (%)	١٣,٨ (%)
أخرى	٧,٠٨٥,٣	٦,٨٦١,٧	٢,٩- (%)	٩,٢ (%)
المجموع	٢٣,٥٨٠,٨	٢٢,٣١٠,٣	٤٧,٣ (%)	٤٢٠,٧ (%)

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. البرامج المدرجة في هذا الجدول قد تغيرت بنسبة ٢٠ مليون دولار على الأقل في الالتزامات والنفقات ربع السنوية مجتمعة، الملحق (ج) يظهر وضعية كافة البرامج الممولة من الصناديق الأربعة الكبرى بما في ذلك تلك التي في مجال إعادة الإعمار الأمني المجموعة المصنفة في الفئة المسماة في فئة "أخرى" هنا. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات الأميركية في العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢ و ٢٠١٠/٧/٦، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، ٢٠١٠/٤/١٢ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/١٦ و ٢٠١٠/٧/١٤.

الأمن في العراق

استمرت التهديدات الأمنية الداخلية خلال ربع السنة الحالي لكنها كانت أدنى بكثير من المستوى الذي أُفيد عنه قبل الانتخابات البرلمانية في ٧ آذار/مارس ٢٠١٠. حوادث العنف الجماعي والهجمات المحددة الأهداف ضد الأفراد كانت تستهدف عموماً مؤسسات الدولة (خصوصاً البنوك ومراكز الشرطة) أو المصالح المذهبية (بما في ذلك أعضاء منظمة أبناء العراق والأحياء السننية والشيعية). غير أن التهديدات الخارجية أطلت برأسها خلال ربع السنة الحالي مع دولتين

جارتين (إيران وتركيا) من خلال مهاجمة مقاتلين مقيمين في المناطق المأهولة بالأكراد داخل حدود العراق.

كان متوسط الحوادث الأمنية خلال نيسان/أبريل-حزيران/يونيو ٢٠١٠، ٧ حوادث في اليوم أي أقل بنسبة ٧٦ بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة المنصرم. ٧ حوادث في اليوم أي أقل بنسبة ٧٦ بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة المنصرم.

كان متوسط الحوادث الأمنية خلال نيسان/أبريل-حزيران/يونيو ٢٠١٠، ٧ حوادث في اليوم أي أقل بنسبة ٧٦ بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة المنصرم وأقل ب ٩٢ بالمئة من ربع السنة نفسه في العام المنصرم. حوالي ٨٥ بالمئة من كافة الهجمات وقعت في محافظات بغداد، الأنبار، ديالى، نينوى وصلاح الدين التي يقيم فيها حوالي نصف سكان العراق^(٢٧٦). للاطلاع على نظرة تاريخية على الحوادث الأمنية، أنظر الشكل ٢-١٨.

التهديدات الناشئة

القدر الكبير الأخير من الهجمات بواسطة السيارات المفخخة استمر خلال ربع السنة الحالي. مثلاً، في ٢٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، قتل انفجار سيارة مفخخة ٢٦ شخصاً في بغداد خارج البنك التجاري العراقي^(٢٧٧). وبرهن المتطرفون أيضاً على قدرة تكتيكية على التكيف. ففي ١٣ حزيران/يونيو ٢٠١٠، قادوا غارة بنمط الكوماندوس ضد البنك المركزي العراقي. قُتل في هذا الهجوم ١٥ موظف في البنك وجميع المقاتلين السبعة خلال إطلاق النار الذي جرى مع قوات الأمن العراقية^(٢٧٨). علاوة على ذلك، كان بين الذين اغتيلوا خلال ربع السنة الحالي، ضباط شرطة ولواء في الجيش العراقي ومسؤولون في مجالس المحافظات، كما استهدفت عدة هجمات قادة منظمات أبناء العراق ونقاط التفيتيش التي تعمل فيها وحدات أبناء العراق^(٢٧٩).

في حزيران/يونيو، أشعلت مطالب الكهرباء التي لم تتحقق التظاهرات العنيفة في جنوب العراق. في ١٩ حزيران/يونيو، قتلت القوات الأمنية متظاهرين في البصرة وجرحت اثنين آخرين. بعدها بيومين، جرح ١٤ شخص على الأقل في الناصرية^(٢٨٠). لمزيد من المعلومات حول وضع الكهرباء. انظر قسم "البنية التحتية" في هذا التقرير.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الجدول ٢-١٤

دعم الحكومة العراقية والدعم الأميركي للمؤسسات الأمنية العراقية ضمن السياق بمليارات الدولارات

الوزارة	فئة الموازنة	السنة التقويمية				
		٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	المجموع
وزارة الدفاع	تشغيلية	٤,٠٩	٤,٩٢	٣,٨٥	٤,٥٢	١٧,٣٨
	رأسمالية	٠,٠٥	٤,٩٢	٠,٢٧	٠,٣٨	٥,٦٢
	المجموع الفرعي	٤,١٤	٩,٨٤	٤,١٢	٤,٩٠	٢٣,٠٠
وزارة الداخلية	تشغيلية	٣,١٤	٥,١٦	٥,٢٧	٥,٨٩	١٩,٤٥
	رأسمالية	٠,٠٤	٠,٥٤	٠,٢٢	٠,٢٦	١,٠٦
	المجموع الفرعي	٣,١٨	٥,٧٠	٥,٤٩	٦,١٤	٢٠,٥١
المجموع	٧,٣٢	١٥,٥٤	٩,٦١	١١,٠٤	٤٣,٥١	
	موازنة وزارة الدفاع ووزارة الداخلية	%١٨	%٢٢	%١٦	%١٥	%١٨
	مجتمعة كنسبة مئوية من مجموع موازنة الحكومة العراقية					

مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)

الوزارة/الفئة	السنة المالية				
	٢٠٠٧	٢٠٠٨	٢٠٠٩	٢٠١٠	المجموع
وزارة الدفاع	٣,٧٥	١,٥٩	٠,٥٥	٠,٠٠	٥,٧١
وزارة الداخلية	١,٥٧	١,٢٦	٠,٣٨	٠,٠٠	٣,٢١
نشاطات ذات صلة	٠,٤٠	٠,١٥	٠,٠٨	٠,٠٠	٠,٦٣
المجموع	٥,٥٤	٣,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	٩,٥٤
صندوق قوات الأمن العراقية كنسبة مئوية من موازنات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية مجتمعاً	%٧٦	%١٩	%١٠	%٠	%٢٢

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. دعم الحكومة العراقية يشمل مخصصات الموازنة التشغيلية والرأسمالية لوزارة الدفاع ووزارة الداخلية. الأرقام تعرض الإنفاق على البرامج الدفاعية كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي (GDP). البيانات مأخوذة من أحدث سنة متوفرة. يجري احتساب إجمالي الناتج المحلي على قاعدة سعر الصرف، وليس على أساس القوة الشرائية (PPP).

المصادر: استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة الملحق المالي في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/١/١٧، الحكومة العراقية، "قانون الموازنة العامة الفدرالية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/١/٢٧، الجدول الملحق (ب)، وكالة الاستخبارات المركزية، كتاب الوقائع العالمية، www.cia.gov/library/publications/the-worldfactbook/rankorder/2034rank.html، تم الوصول إليه في ٢٠١٠/٧/١٦.

في شمال العراق، أزهق العنف لدواعي سياسية، أرواح ثلاثة من أعضاء قائمة الائتلاف العراقية، أحدهم انتخب مؤخراً في آذار/مارس. حصلت الاغتيالات خلال فترة أسبوعين في أواخر أيار/مايو ومطلع حزيران/يونيو في مناطق يسيطر عليها السنة بالقرب من الموصل.^(٢٨١)

في حزيران/يونيو، استأنفت تركيا حملتها ضد حزب العمال الكردستاني (PKK)، وهي مجموعة مقاتلة تؤيد كردستان مستقلة وهي التي أنهت مؤخراً وقفها لإطلاق النار من جانب واحد ضد تركيا. ذكر ان القوات البرية التركية دخلت على عمق كيلو مترين داخل الحدود العراقية^(٢٨٢). في الأول من تموز/يوليو ٢٠١٠، دُكر ان ١٢ مقاتلاً كردياً و ٥ حراس أترك قتلوا أثناء المناوشات.^(٢٨٣)

على الحدود الأخرى بين إيران وإقليم كردستان، تحدثت تقارير متضاربة عن هجمات إيرانية ضد مقاتلي حزب الحياة الحرة لكردستان (PJAK). ودُكر أن القصف المدفعي بدأ في ٢٩ أيار/مايو ٢٠١٠ ضد أعضاء المجموعة الإرهابية الكردية المقيمة في المنطقة لكن التفاصيل لم يجر تأكيدها من جانب المسؤولين في حكومة إقليم كردستان^(٢٨٤). انظر الشكل ٢-١٩ للاطلاع على مواقع الهجمات الرئيسية التي حصلت خلال ربع السنة الحالي.


النزاع الطائفي المتواصل

يبدو ان تراجع الحوادث إجمالاً ينعكس بصورة إيجابية على الانتقال الجاري للمسؤوليات الأمنية إلى الحكومة العراقية. غير ان تهديدات العنف الداخلي لم تنبذ. فخلال جلسة استماعه الهادفة إلى الحصول على التثبيت، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، صرح الفريق أول لويد اوستن ان أحد تحديات الاستقرار الدائمة في العراق هو "غياب رؤية وطنية مشتركة وتطوير ثقافة سياسية جديدة تتناغم مع الديمقراطية". سلط الجنرال، قائد القوات الأميركية في العراق القادم، الأضواء على التوترات العربية-الكردية المتواصلة حول الحدود الداخلية المتنازع عليها، وعلى تقاسم السلطة، وقانون الهيدروكربون، كما وعلى الوضع الحساس للأقليات في العراق.^(٢٨٥)

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الشكل ٢-١٨


الحوادث الأمنية والإصابات المميتة في العراق، ٢٠٠٤/٦-٢٠١٠/٦.

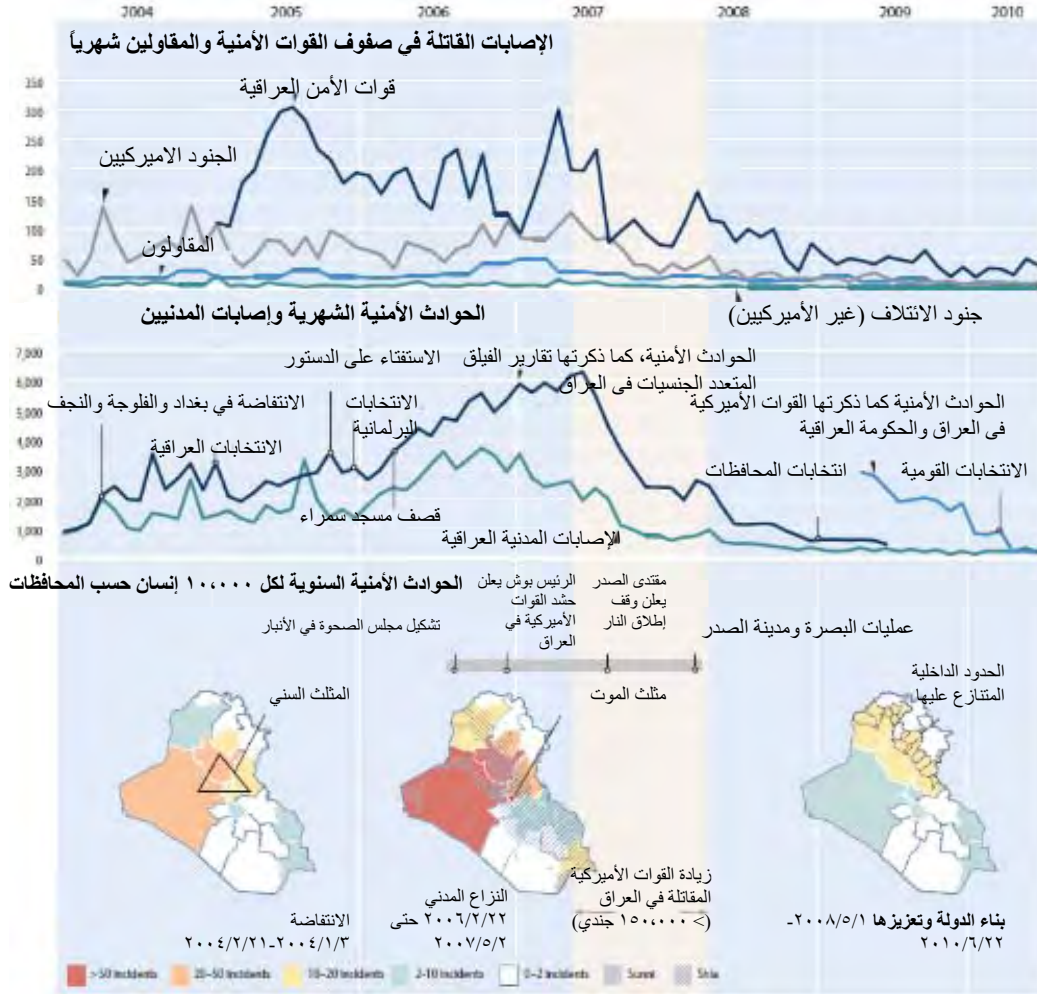

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. تشير "زيادة القوات الأميركية المقاتلة في العراق" إلى الفترة الزمنية عندما كان يوجد في العراق ١٥٠,٠٠٠ جندي أميركي على الأقل. بيانات الإصابات بين قوات الأمن العراقية حول الوفيات التي حدثت قبل ٢٠٠٥/١/٤ غير متوفرة. بيانات الحوادث الأمنية من مصدرين معروضين: الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق للفترة الزمنية ٢٠٠٤/١/١-٢٠٠٩/٦/٢٤ والقوات الأميركية في العراق للفترة الزمنية ٢٠٠٩/٤/١-٢٠١٠/٣/٢٦ (تضمّن القوات الأميركية في العراق تقارير الحكومة العراقية).

المصادر: وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٦/٢-٢٠٠٩/٩، استجابة وزارة العمل لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/١/٥، ٢٠١٠/٤/١٢ و ٢٠١٠/٧/٧، مؤسسة بروكينغز، مؤشر العراق، ٢٠١٠/٦/٣٠، ص ٣، ٥ و ١٣، المفتش العام، التقارير ربع السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٤، ٢٠٠٩/١٠ و ٢٠١٠/١، استجابة الحكومة العراقية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٢/٢١، استجابة القوة المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦، ٢٠٠٩/٧/٢، ٢٠١٠/٣/٣١ و ٢٠١٠/٤/١، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١/١٠ و ٢٠١٠/٢/٢٢، استجابة القوات الأميركية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣١ و ٢٠١٠/٧/٧.

الشكل ١٩-٢ الحوادث الأمنية في العراق، ٢٠١٠/٧/١٨-٢٠١٠/٣/٧، فترة ما بعد الانتخابات

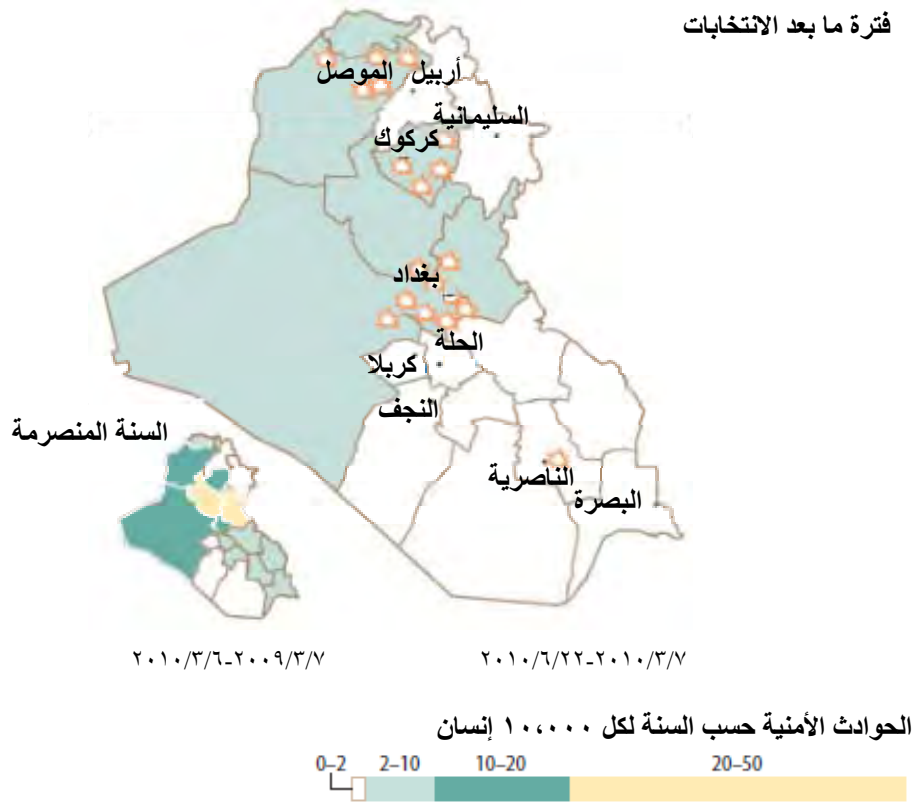

المصادر: استجابة القوة المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦ و ٢٠٠٩/٧/٢، استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأمريكية (CENTCOM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١/١٠، استجابة القوات الأمريكية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١، ٢٠١٠/٣/٣١، و ٢٠١٠/٧/١، تحليل المفتش العام لمستندات الحكومة العراقية والحكومة الأمريكية ومعلومات المصادر المفتوحة باللغتين الإنكليزية والعربية.

تواصل المجموعات السنية والشيعية، المحفزة جزئياً بالفوارق الدينية، شن الهجمات إما لطرده القوات الأميركية او للحد من نفوذ الحكومة العراقية في مناطقها. هذه المجموعات التي يدعمها إما البعثيون السنة او الأجنحة المقاتلة للمنظمات الشيعية، تقوم بعمليات في أرجاء البلاد^(٢٨٦). علاوة على ذلك أوجب الخلافات السياسية والاثنية في التأميم ونبوى النزاعات داخل حكومات المحافظات كما والتهديدات المتكررة والعنف التي تستهدف مجتمعات الأقليات. المكاسب غير المتوقعة التي حققها العرب والتركمان في التأميم قد أوجب التوترات السياسية وقد ينتج عنها مزيد من العنف.^(٢٨٧)



الشرطة العراقية تقوم بدورية في نهر دجلة في محافظة ميسان بجنوب العراق مع مستشارين من البحرية الأميركية في ١١ نيسان/أبريل ٢٠١٠ (صورة للجيش الأميركي)


إن بعض مستويات العنف لا زالت تحصل بسبب نشاطات عصابات انتهازية مجرمة والضغائن الشخصية أو التنافس بين القبائل مما يجعل من الصعب أحياناً كثيرة التمييز بين نشاطات المتمردين. ولكن يبدو ان عناصر القاعدة في العراق (AQI) والعناصر المتطرفة الشيعية مسؤولة عن معظم العنف في بغداد. لا يزال المسيحيون الهدف الخاص للقاعدة في العراق خصوصاً في الموصل حيث استهدف تفجير في ٢ أيار/مايو ٢٠١٠ باص ينقل طلاباً مسيحيين. هاجمت القاعدة في العراق أيضاً أعضاء من الأقلية اليزيدية العراقية مستخدمة سترات انتحار وسيارات مفخخة.^(٣٨٨)

للاطلاع على نظرة عامة حول دائرة العنف المتواصل، انظر الشكل ٢-٢٠.

حققت القوات الأميركية في العراق وقوات الأمن العراقية مكاسب كبيرة جداً ضد شبكة القاعدة في العراق.

خلال ربع السنة الحالي، حققت القوات الأميركية في العراق وقوات الأمن العراقية مكاسب كبيرة جداً ضد شبكة القاعدة في العراق، فاعتقلت او قتلت ٣٤ من بين كبار قادتها ال ٤٢.^(٢٨٩) على الرغم من ان القاعدة في العراق تواصل الحفاظ على موقعها اللوجستي والمالي في محافظة نينوى، إلا أنها تواجه بيئة عملانية تزداد صعوبة. فتدفق المقاتلين الأجانب إلى العراق هو عند مستويات تاريخية متدنية، كما ان التقديرات الحالية تفيد أن ٩٥ بالمئة من تشكيل القاعدة في العراق هم من العراقيين. مع تراجع أعداد القوات الأميركية في العراق، أصبحت القاعدة في العراق تركز على الخطابة والهجمات ضد الحكومة العراقية والمجموعات الشيعية في محاولة لتشويه سمعة الحكومة المركزية والحث على العنف المذهبي.^(٢٩٠)

الشكل ٢-٢٠
دائرة العنف في العراق



المصادر: ديفيد كيلكولن، حرب العصابات العرضية: خوض حروب صغيرة في وسط حرب كبرى، نيويورك: مطابع جامعة أوكسفورد، ٢٠٠٩، ديفيد سي غومبرت، تيرنس كاي. كيلي وجيسكا واتكنز، الأمن في العراق، إطار عمل لتحليل التهديدات الناشئة مع مغادرة القوات الأميركية، سانتا مونيكا، شركة راند، ٢٠١٠.

في ٣ أيار/مايو ٢٠١٠، أعلنت قيادة عمليات بغداد، وهي مقر مشترك لقيادة القوات الأميركية في العراق/الحكومة العراقية، ان جداراً أمنياً سوف يُبنى حول عاصمة العراق لمساعدة قوات الأمن العراقية في منع المجموعات المتمردة من دخول المدينة. علاوة على ذلك، من المتوقع ان يحدّ السياج الاسمّنتي من ازدحام السير داخل المدينة عن طريق استبدال نقاط التفتيش الداخلية بثمانية مداخل حول المدينة. تدعو خطط نقاط التفتيش هذه إلى دعمها بكاميرات تركيب حول الجدار الدائري. بحسب قيادة العمليات في بغداد، الجمع بين نقاط التفتيش الممكن إدارتها وأنظمة المراقبة الحديثة سوف تسمح لقوات الأمن العراقية بتحويل الموظفين والموارد إلى مجالات أمنية أخرى تواجه تحديات. ذكرت القوات الأميركية في العراق انها لم تتشارك في تخطيط أو إنشاء أو تمويل الجدار الأمني. (٢٩١)

بين ٢٠٠٣ و ٢٠٠٧ دفعت وزارة الدفاع ووزارة الخارجية
والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من خمسة مليارات
دولار مباشرة للمقاولين الأمنيين.

وضعية القوات

في الأول من حزيران/يونيو ٢٠١٠، تولت قوات الأمن العراقية وحدها مسؤولية تشغيل الرقابة على نقاط الدخول إلى المنطقة الدولية في بغداد. بدأ الجنود الأميركيون تأمين تلك المراكز في

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

العام ٢٠٠٣، وتولوا دورا داعماً قبل أكثر من سنة. هذا الانتقال هو بمثابة بداية عدم مشاركة القوات الأميركية في مهمة ضمان أمن المنطقة الدولية، وهي خطوة من بين عدة خطوات في خفض المتواصل لعدد القوات المقاتلة الأميركية، وذلك بموجب الاتفاقية الأمنية الأميركية-العراقية (SA) وأمر الرئيس أوباما الذي أعلنه بوضوح في ٢٧ شباط/فبراير ٢٠٠٩.^(٢٩٢)

للاطلاع على وضعية موظفي المقاولين الأيمنيين الأميركيين والعراقيين ومقاولي الأمن الخاص المسلحين (PSC) في العراق، بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، أنظر الجدول ٢-١٥.

حتى تاريخ منتصف تموز/يوليو ٢٠١٠، بقي في العراق حوالي ٧٥,٠٠٠ جندي أميركي يعملون من ١٢٤ قاعدة^(٢٩٣). سلمت الولايات المتحدة السيطرة على ٣٧٣ قاعدة إضافية إلى الحكومة العراقية. من أصل ما يزيد عن ثلاثة ملايين قطعة من المعدات التي كانت تسيطر عليها القوات الأميركية في العراق في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، تم حتى الآن شحن أكثر من النصف إلى الولايات المتحدة، أو نُقلت إلى الحكومة العراقية أو انها مبرمجة للنقل إلى أفغانستان.^(٢٩٤)

حتى تاريخ ٣١ آب/أغسطس ٢٠١٠، من المتوقع ان يبقى في العراق أقل من ٥٠,٠٠٠ جندي لإدارة عمليات إرساء الاستقرار^(٢٩٥). النشاطات الملحوظة تشمل^(٢٩٦):

- تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية.
- حماية الجنود والموظفين المدنيين الاميركيين والمرافق الأميركية.
- إدارة عمليات مكافحة الإرهاب، بشكل أساسي بواسطة قوات العمليات الخاصة.


تدعو الخطط أفراد القوات الأميركية إلى تدريب ونصح ومساعدة قوات الأمن العراقية لغاية ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١، عندما سينتهي الانسحاب الأميركي^(٢٩٧). للاطلاع على الحجم المتوقع للقوة الأميركية بحلول أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، انظر الشكل ٢-٢١.

دعم مقاولي الأمن الخاص

في حزيران/يونيو ٢٠١٠ قدمت دراسة لمؤسسة راند (RAND) تفاصيل جديدة عن الاستخدام غير المسبوق لدعم مقاولي الأمن الخاص في العراق خلال السنوات السبع الأخيرة. وفقاً للتقرير، بين ٢٠٠٣ و٢٠٠٧، دفع أصحاب العمل الرئيسيين- وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية - أكثر من ٥ مليارات دولار مباشرة إلى مقاولي الأمن الخاص، خلال تلك الفترة نفسها، دفع المقاولون في العراق ٣ مليارات إلى ٦ مليارات دولار إضافية لخدمات مقاولي الأمن الخاص.^(٢٩٨)

الشكل ٢-٢١

حجم القوات الأميركية المتوقع في العراق، ٢٠١٠/٦-٢٠١٠/٩



ملاحظة: كافة قيم المجموع كما كانت في أول يوم من كل شهر. "القادة" تشير إلى الرتب التي يحملها ضباط رتبة الرتبة. المصدر: استجابة القوات الأميركية في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.

دعا الجيش الأميركي مقاولي الأمن الخاص إلى تقديم مجموعة متنوعة من الخدمات بما فيها الأمن الثابت للقواعد، حماية القوافل، ومرافقات الأمن الشخصي وحماية سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، وتنسيق النشاطات العسكرية عبر مراكز عمليات إعادة الإعمار. استخدمت وزارة الخارجية عدة أنواع من المقاولين المسلحين لبرامج أمن المواطنين في العراق بمن فيهم العملاء الخاصين بالأمن الدبلوماسي، وحراس الأمن البحري، ومواطنو البلدان الثالثة، وأخصائيي الأمن الشخصي.^(٢٩٩)

وفقاً لقوانين وزارة الدفاع، "من غير مسموح لموظفي مقاولي الأمن الخاص المشاركة في عمليات هجومية وعليهم التقيد بالقوانين الخاصة لقيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) حول استخدام القوة" التي تسمح باستخدام القوة القاتلة فقط في حالة الدفاع عن النفس، والدفاع عن المرافق أو الممتلكات (كما هو محدد في عقودهم)، و"لمنع أعمال تهديد الحياة الموجهة ضد المدنيين". تعطي القوات الأميركية في العراق الإرشاد حول قوانين استخدام القوة وتصدر بطاقات السلاح لموظفي مقاولي الأمن الخاص الموافقة عليهم وتسمح لهم بحمل السلاح. توقيع المقاول على بطاقة السلاح تعني الإقرار بفهم تلك القوانين.^(٣٠٠)

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الجدول ٢-١٥
القوات الأمنية التي تحمي العراق بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠

المنحى	الموظفون المكلفون	الخدمة
↓	٧٥,٠٠٠	القوات الأميركية ^(١)
↑	٢٠,٧٣٨	مقاولو الأمن الخاص المسجلين ^(٢) العاملون لمصلحة وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية
		قوات الأمن العراقية
-	١٩٧,٣٣٦	الجيش العراقي (IA)
-	٤٦,٤٥٩	التدريب والدعم
-	٤,٠٢٣	سلاح الجو
-	٢,٩١٠	البحرية
-	٢٥٠,٧٢٨	مجموع وزارة الدفاع
-	٣٠١,٢٨٦	الشرطة العراقية ^(٣)
↑	٤٣,٩٥٧	الشرطة الفدرالية العراقية
↑	٦٠,٦٠٥	حماية الحدود
↑	٢٩,٤١١	شرطة النفط
-	٩٠,٠٠٠	مصلحة حماية المرافق (FPSs)
↑	٥٢٥,٢٥٩	مجموع وزارة الداخلية
-	٤,١٢٠	القوات الخاصة
↑	٧٨٠,١٠٧	مجموع قوات الأمن العراقية
↑	٨٧٥,٨٤٥	المجموع العام

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.

- (أ) عدد الجنود بتاريخ ٢٠١٠/٧/١٥
(ب) أرقام مقاولي الأمن الخاص تتغير باستمرار استناداً إلى نشاطات العقود المتغيرة ومستوى الخدمات الأمنية المطلوبة.
(ج) الأعداد المكلفة تبين بيانات جدول الرواتب، انها لا تعكس إجمالي الحاضرين للخدمة.

المصادر: المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/١-٢٠١٠/٧، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢، ٢٠٠٩/٧/١، ٢٠٠٩/٩/٣٠، وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/١٢/٣١، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١، استجابة السفارة الأميركية في بغداد، مكتب الأمن الإقليمي (RSO)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.

للاطلاع على القيم الإجمالية لمقاولي الأمن الخاص المسلحين الذين يخدمون وزارة الدفاع ووزارة الداخلية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أنظر الجدول ٢-١٦. لمزيد من التفاصيل حول المقاولين في العراق، أنظر القسم الفرعي المعنون "إدارة مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها" في هذا التقرير.

كما ذكر المفتش العام خلال ربع السنة المنصرم، ضايق بعض رجال وموظفي الحكومة العراقية مقاولي الأمن الخاص هذه السنة. قدم مكتب الأمن الإقليمي في السفارة الأميركية أمثلة إضافية عن قيود بيروقراطية وتحديات عملانية غير مبررة ذكرتها تقارير خلال ربع السنة الحالي^(٣٠١).

بدأت أول دبابات MIAI ال ١٤٠ التي اشترتها الحكومة العراقية بالسير خلال هذا الصيف.

الجدول ٢-١٦

مقاولو الأمن الخاص المسلحون في العراق بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠

المجموع	العراقيون	مواطنو البلدان الثالثة	مواطنون أميركيون	
١٤,٨٣٧	١,٦٤٦	١٢,٢٠٤	٨٨٧	وزارة الدفاع
٥,٩٠١	١,٦٦٤	٣,٠٣٢	١,٢٠٥	وزارة الخارجية
٢٠,٧٣٨	٢,٨٢٣	١٤,٦٩٥	٢,٠٨٩	المجموع

المصادر: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.

- في منتصف حزيران/يونيو، وصل موظفون لمقاول للأمن الخاص غير تابعين لرئيس البعثة الدبلوماسية، في تحرك إداري بمفردهم إلى نقطة تفتيش عند مدخل وكانوا يستعدون لتقديم المستندات. دُكر أن موظفين في الجيش العراقي أنزلوا موظفي الأمن الخاص من سياراتهم واعتدوا عليهم مهددينهم بالقتل. تم توقيف الموظفين وصودرت معداتهم وعرباتهم، وأخذوا إلى مكان آخر حيث قيل انهم تعرضوا للاعتداء. أسباب هذه الأعمال من جانب الجيش العراقي غير معروفة.
- دُكر أن مكتب منح التراخيص لشركات الأمن الخاص التابع لوزارة الداخلية كان يصدر أوامر اعتباطية ويفرض مواعيد نهائية يصعب تليبيتها تجهد قدرة وزارة الداخلية على إدارة حمولتها من الأعمال.
- ذكر بعض مقاولي الأمن الخاص أنهم انتظروا أشهراً قبل ان توافق وزارة الداخلية على طلب تجديد ترخيص سنوي، وكانت هذه الأخيرة تطلب من الشركات تقديم طلب تجديد حتى قبل الموافقة على الطلب الأصلي. مكتب الأمن الإقليمي غير متأكد ما إذا كان ذلك مقصوداً أم هو نتيجة الكسل.



جنود الفرقة الخامسة في الجيش العراقي تحيي العلم العراقي خلال حفل تغيير القيادة لنقل السيطرة على مركز الملاحة القتالي الأمامي في محافظة ديالى. حلت القوات العراقية محل قوات فرقة سنرايكر الأولى الأميركية في ٢٥ حزيران/يونيو ٢٠١٠. (الصورة للقوات الأميركية في العراق).

قوات الأمن العراقية

بحسب القوات الأميركية في العراق، تجاهد قوات الأمن العراقية لبلوغ أهداف "الحد الأدنى من القدرات الأساسية"^(٣٠٢):

- **قوات وزارة الدفاع:** يعمل الجيش العراقي جيداً كقوة لمكافحة التمرد، وتقوم البحرية بالدفاع عن أرصفة تحميل النفط قبالة الشاطئ، كما يزيد سلاح الجو من كفاءته ومن قدرته على التحرك، ومراقبة المجال الجوي والهجمات البرية.

- **قوات وزارة الداخلية:** الشرطة الفدرالية وشرطة النفط كلاهما ذات كفاءة عملانية كما ان شرطة المحافظات وشرطة الحدود قد أظهرتا تقدماً في أدائها لوظائفها الأمنية.

الجنرال قائد القوات الأميركية في العراق الذي ثبت مؤخراً، قال في شهادته في حزيران، "في الوقت الذي نشهد فيه قوات عراقية أكثر استقلالاً وقادرة على تأمين الأمن الداخلي، فإننا لا نزال بحاجة إلى عمل الكثير"، وشدد على أن الجهود الأميركية المتواصلة لتدريب ونصح وتجهيز قوات الأمن العراقية ستكون ضرورية لتلبية الإرشاد الرئاسي ورؤيته حول عراق سيد ومستقر ويعتمد على نفسه"^(٣٠٣)

خطط التدريب والتجهيز الحالية تتوقع تحولاً في عمليات قوات الأمن العراقية، مع لعب قوات وزارة الداخلية دوراً أكبر في الأمن الداخلي، في حين تتحرك قوات وزارة الدفاع باتجاه هيكلية قوة أكثر تقليدية مع التركيز على التهديدات الخارجية والاحتفاظ في الوقت نفسه بالقدرة على تنفيذ عمليات مكافحة التمرد وإرساء الاستقرار. هذا الانتقال قيد التنفيذ بشكل جيد، كما ان وزارة الدفاع بصدد بناء قدراتها الدفاعية التقليدية"^(٣٠٤)

- بدأت أول دبابات من أصل ١٤٠ دبابة MIAI اشترتها الحكومة العراقية السير خلال هذا الصيف، وقد تلقى أيضاً التدريب ٦٥ من طواقم هذه الدبابات. يدرّب الجيش العراقي بنشاط في ١٠ مراكز تدريب يديرها العراقيون في البلاد ويشحذ المهارات الفردية المتخصصة ويعمل بغية تنظيم تمرين كبير للتدريب المشترك في نيسان/ابريل ٢٠١١.

- يشغل سلاح الجو العراقي حالياً ١١٠ طائرات. لقد ضاعف تقريباً عدد أفراده خلال السنة الماضية ولديه خطة لمضاعفة أعداده مرة أخرى (لبلوغ قوة تبلغ ١٠٠،٠٠٠ فرد) بحلول نهاية ٢٠١١. تدرّب وزارة الدفاع بنفسها حالياً على قيادة طائراتها وطوافاتها. خلال الانتخابات القومية، قامت أسراب سلاح الجو ب ١٣٤ طلعة – نقالة صناديق الاقتراع بصورة آمنة، ومؤدية الإشراف، ومقدمة المعلومات الاستخباراتية والرقابة والاستطلاع ومجرية اتصالات في الوقت المناسب مع مراكزها للعمليات.

- البحرية العراقية تنمو هي أيضاً من حيث الحجم والكفاءات مع أكثر من ٥٠ مركبة منتشرة لحماية بنية النفط التحتية الأساسية قبالة الساحل والمياه الإقليمية والموانئ التجارية. قامت البحرية العراقية ب ٥٠ دورية في الشهر خلال ربع السنة الحالي، أي بزيادة ٣٠٠ بالمئة عن نفس ربع السنة من العام الماضي. خلال الأشهر الستة الأخيرة، كانت البحرية العراقية مسؤولة بالكامل عن حماية واحدة من منصتي النفط الاثنتين. علاوة على ذلك، من المقرر أن

تصل في أواخر هذا الصيف أولى مراكز خفر السواحل الـ ١٥ الجديدة المبنية في الولايات المتحدة كما أن خمسين بحاراً عراقياً الذين يشكلون الطواقم الأولى لتلك المراكب كانوا يخضعون للتدريب في لويزيانا خلال ربع السنة الحالي.

لوزارة الداخلية حوالي ٤١٠,٠٠٠ ضباط وهي قد بدأت عملية الانتقال إلى إعطاء الشرطة الأولوية للأمن الداخلي. ذكرت القوات الأميركية في العراق ان الشرطة أصبحت لها كفاءات متزايدة على كافة المستويات.^(٣٠٣)

التدريب

يأتي الدعم الأميركي لقوات الأمن العراقية أكثر فأكثر على شكل نصح ومساعدة وتجهيز - خلافاً للفترات الزمنية السابقة، عندما كان يقوم بالتدريب الموظفون والمقاولون الأميركيون وعندما كانت المهام الأمنية بقيادة القوات الأميركية.



القوات الأميركية تنصح رجال الكوماندوس العراقيين بالقرب من بغداد، في ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠١٠. (الصورة للجيش الأميركي)

وزارة الداخلية

وزارة الداخلية مسؤولة بالدرجة الأولى عن تدريب الشرطة العراقية الذي يجري في ٢٣ مركز للتدريب في أنحاء البلاد. (انظر الشكل ٢-٢٢). بتاريخ ٢٩ حزيران/يونيو كان الدعم الأميركي مقدماً من جانب أكثر من ٣٢٠ مستشار شرطة دوليين (IPAs) ممولين من الولايات المتحدة، والذين كانوا يقدمون التدريب والنصح في المراكز، والأكاديميات والحصون الحدودية وموانئ الدخول، وفي وزارة الداخلية. علاوة على ذلك، يواصل المستشارون الأميركيون تقديم التدريب المتخصص في المختبرات الشرعية، وفرق الكلاب، ومكافحة المتفجرات، والمهارات الأخرى.^(٣٠٧)

خلال ربع السنة الحالي، واصل مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية، التخطيط العملائي واللوجستي لبرنامج تطوير الشرطة (PDP). من المتوقع ان يبدأ هذا البرنامج عندما ستتولى وزارة الخارجية المسؤولية الكاملة للدور الأميركي في تدريب الشرطة العراقية في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١١. يتوقع المخططون ان يكون التخطيط العملائي واللوجستي لبرنامج تطوير الشرطة أصغر نطاقاً وحجماً من البرنامج الحالي الذي يقوده العسكريون.^(٣٠٨) لمزيد من التفاصيل حول نقل المسؤولية، انظر القسم الفرعي المعنون "إدارة مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها" في هذا التقرير.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

في ٢٦ نيسان/أبريل ٢٠١٠، ناقشت وزارة الخارجية مع الحكومة العراقية برنامجاً ممدداً للمساعدة الأمنية وحكم القانون مدته ثلاث إلى خمس سنوات. تدعو الخطط المؤقتة إلى أكثر من ٣٢٠ مستشار أميركي للعمل مع وزارة الداخلية لأجل تطوير المؤسسات القضائية والقانونية العراقية. وسوف تركز البرامج على التدريب الشرعي وعلى دعم مستشاري مدراء وزارة الدفاع ووزارة الخارجية، ونشاطات حكم القانون الأخرى. تتواصل المناقشات حول إطلاق هذا الجهد التعاوني الكبير في محافظات بغداد وأربيل والبصرة^(٣١٠) خلال ربيع السنة القادم، سوف يرفع المفتش العام تقريراً حول قضايا الإدارة المتعلقة بالبرنامج الأميركي لدعم تدريب الشرطة العراقية.

وزارة الدفاع

وزارة الدفاع لها المسؤولية الأساسية في تدريب الجيش العراقي^(٣١١)، مع دعم محدود من المستشارين الأميركيين في بعثة التدريب والنصح في العراق (ITAM). بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، دعم أكبر عدد من المستشارين الأميركيين سلاح الجو العراقي، والقيادة المشتركة لوزارة الدفاع وخلية الاستخبارات القومية^(٣١٢).

الشكل ٢-٢٢

مراكز تدريب قوات الأمن العراقية



المصدر: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٥/١٥.

خلال ربع السنة الحالي، تخرج ٣٠٠،٢٠ جندي في الجيش العراقي على اثر إنهاء مجموعة متنوعة من المقررات التعليمية.^(٣١٢)

تبرز التحديات من خلال عدم قدرة وزارة الدفاع على تأسيس وصيانة بنية تحتية للوجستيات والاستدامة

ركز التدريب المتخصص على احترافية الضباط والمنظمات غير الحكومية، والمعدات الممكنة، والمدفعية والهندسة والكفاءات اللوجستية^(٣١٣). وفقاً لوزارة الدفاع، تأثر التدريب بصورة سلبية بشروط الجيش العراقي العملائية المتعلقة بالانتخابات البرلمانية وبالتأخير في تشكيل حكومة جديدة.^(٣١٤)

وافقت وزارة الدفاع أيضاً، خلال ربع السنة الحالي، على تدريب الضباط والمنظمات غير الحكومية لفرق الحراسة الإقليمية الأربعة لإقليم كردستان، بدءاً من تموز/يوليو ٢٠١٠. وابتداءً من نيسان/أبريل اعترف رئيس الوزراء المالكي بقوات البشمركة بأنها جزء من القوات الأمنية العراقية لغرض استلام والمعدات العسكرية والتدريب الأميركي.^(٣١٥)

المعدات والمشتريات العسكرية الأجنبية

تجهيز قوات الأمن العراقية لتلبية متطلبات دور الأمن الخارجي، لا يزال يُشكّل تحدّياً وبحسب المستشارين الأميركيين في بعثة التدريب والنصح في العراق (ITAM)، فإن نفقات الموازنة العراقية لمعدات قوات الأمن العراقية قد قيّدها تراجع العائدات الماضية والاعتماد على صندوق قوات الأمن العراقية للمشتريات الأساسية.^(٣١٦) وذكر المستشارون الأميركيون في بعثة التدريب والنصح في العراق (ITAM) ان هذه التحديات تبرز من خلال عدم قدرة وزارة الدفاع على تأسيس وصيانة بنية تحتية للوجستية والاستدامة- وهي كفاءة تبقى قيد الإنشاء وتبدو أنها لا تستجيب إلا هامشياً للمتطلبات الجوهرية مثل طلب الذخيرة وشراء قطع الغيار. فيما يلي بنود أساسية على قائمة "الموارد الحرجة الفريدة" التي يقول المستشارون الأميركيون في بعثة التدريب والنصح في العراق (ITAM) انها تُستخدم لمعالجة المتطلبات التجهيزية^(٣١٧):

- حدد الجيش الأميركي ٦٠٠،٠٠٠ قطعة من المعدات الفائضة لبرنامج نقل المعدات الأميركية إلى العراق (USETTI). هذا البرنامج يستوجب نقل المعدات إلى وزارة الدفاع ووزارة الداخلية وإلى القوات الخاصة. حالياً، ألزمت الحكومة العراقية ١٤٣ مليون دولار لتمويل تكاليف تجديد ونقل بنود منتقاة. المعدات الأساسية التي تم تحديدها للجيش العراقي تشمل ناقلات الجند المدرعة، وعربات الصيانة المتطورة، ومدافع هواتزر M198. من المفترض بالمعدات الفائضة تكملة مشتريات صندوق قوات الأمن العراقية والبنود المشتركة عبر برنامج المشتريات العسكرية الأجنبية (FMS) لمساعدة قوات الأمن العراقية وتحقيق متطلبات جهوزيتها.
- بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، ذكرت الحكومة العراقية ان ١٥٨ صندوق بقيمة ٥,٦ مليار دولار قد تمت الموافقة عليها بموجب كتاب عرض وقبول عبر برنامج المشتريات العسكرية الأجنبية (FMS). قيمة الصناديق التي سلّمت حتى الآن إلى الحكومة العراقية بلغت ٢,٨ مليار دولار.

- تطوير كفاءات سلاح الجو العراقي استلزم تمويلاً من كل من الحكومتين الأميركية والعراقية لمنصات الطيران ذو الأجنحة الثابتة والدوارة (المروحيات). ذكرت وزارة الدفاع الأميركية ان سلاح الجو العراقي يحتفظ بمعدل جهوزية رفيع وهو قادر على القيام بمهام عالية، غير انه يعتمد على المقاولين في ما يتعلق بالصيانة. مؤخراً، طلبت الحكومة العراقية طائرات F-16 المقاتلة عبر برنامج المشتريات العسكرية الأجنبية (FMS)، وأشارت القيادة الأميركية ان هذه الطلبات قيد التقييم.

منظمة أبناء العراق

بتاريخ تموز/يوليو ٢٠١٠، كان قد تم نقل أكثر من ٤١,٠٠٠ عضو من منظمة أبناء العراق (SOI) إلى قوات الأمن العراقية أو إلى مختلف الوزارات المدنية. في ١١ أيار/مايو ٢٠١٠، طلبت مذكرة من الحكومة العراقية رسمياً تأجيل أية انتقالات أخرى إلى حين تحسّن الوضع الأمني. كانت الحكومة العراقية تنوي استئناف نقل الأعضاء المتبقين بعد الانتخابات الوطنية بوقت قصير، لكن يبدو ان مختلف الظروف حالت دون حصول ذلك. في طليعة تلك الظروف، تجميد التوظيف الذي دعا إليه قانون موازنة الحكومة العراقية لسنة ٢٠١٠، والذي لا يزال موضع نقاش بين وزارتي المالية والداخلية.^(٣١٨)

في تلك الأثناء، لا يزال دعم منظمة أبناء العراق بمثابة مشكلة. قدمت الحكومة العراقية أكثر من ٢٧٠ مليون دولار لدفع أجور أبناء العراق سنة ٢٠٠٩ وما يقدر ب ٧٥ مليون دولار حتى الآن سنة ٢٠١٠. غير ان الدفع في الوقت المحدد لا يزال تحدي. دفع أجور آذار/مارس كان متوقع ان يبدأ في أواسط نيسان/ابريل، لكنه تأجل لغاية آخر أيار/مايو^(٣١٩). بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الحكومة العراقية قادرة فقط على توزيع الرواتب على حوالي ٨٥ بالمئة من أبناء العراق في أرجاء البلاد، حوالي ٥٠ بالمئة من أبناء العراق في بغداد لم يتلقوا أجورهم عن نيسان/ابريل وأيار/مايو. في ١٨ تموز/يوليو ٢٠١٠، هاجم عدة انتحاريين أعضاء أبناء العراق كانوا واقفين في صفوف لقبض أجورهم وقتلوا أكثر من ٤٠ وجرحوا العشرات.^(٣٢٠)

علاوة على ذلك، ذكرت التقارير الواردة من الفرق الاستشارية الأميركية المرافقة للجيش العراقي ان الحكومة العراقية تقدم الحد الأدنى من الدعم اللوجستي والأمني لمنظمة أبناء العراق. بما في ذلك الحماية غير الكافية من جانب قوات الأمن العراقية، والدعم غير الكافي في نقاط التفيتش. قاد هذا إلى شكاوى من أعضاء منظمة أبناء العراق تقول انهم يشعرون بأنهم معرضون وعزل.^(٣٢١)

سلّطت العديد من التقارير السلبية لوسائل الإعلام في العراق وفي الخارج الأضواء على فكرة ان الحكومة العراقية غير ملتزمة برنامج أبناء العراق، وذكرت وزارة الدفاع الأميركية اعتقاد هذه المنظمة الدائم بأن أعضاءها ينقلون إلى وظائف حقيرة ويُستهدفون بصورة غير عادلة للاعتقال، وقد ساهمت مشاكل دفع الرواتب المتواصلة في عدم ثقة منظمة أبناء العراق بالحكومة العراقية. وبحسب وزارة الدفاع الأميركية، لقد كانت الحكومة العراقية غير فعّالة للغاية في مقاومة تلك الرؤية وفي إبلاغ منظمة أبناء العراق التزامها عملية المصالحة.^(٣٢٢)

لدى المفتش العام تدقيق قيد الإعداد يدرس تكاليف وحصيلة برنامج منظمة أبناء العراق.

في ١٨ تموز/يوليو ٢٠١٠، هاجم عدة انتحاريين أعضاء من منظمة أبناء العراق كانوا وقافين في صفوف لقبض رواتبهم فقتلوا أكثر من ٤٠ وجرحوا العشرات.

منظمة بنات العراق

تواصل منظمة بنات العراق (DOI) دعم الشرطة المحلية العراقية عند نقاط التفتيش في الأنبار وبغداد وديالى. أفراد منظمة بنات العراق لا يحملن السلاح لكنهن يتواجدن في مواقع مع ذكور مسلحين ويعملن أزواجاً عند تفتيش الزائرين من النساء بحثاً عن الأسلحة والمتفجرات. مع مواصلة الشرطة العراقية إضافة النساء إلى صفوفها، تتراجع الحاجة إلى منظمة بنات العراق، ولا وجود لخطة لنقل عضواتها إلى وظائف دائمة في قوات الأمن العراقية.^(٣٢٣)

حكم القانون

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ١,٥٩ مليار دولار والزمّت ١,٥٥ مليار دولار وانفقت ١,٤١ مليار دولار لتحسين حكم القانون، بما في ذلك حقوق الإنسان، في العراق.^(٣٢٤)

تواصل الجهود الأميركية لتحسين الأنظمة القضائية والقضاء الجنائي التركيز على الأمن القضائي، والكفاءات والقدرات لجمع ومعالجة الأدلة الجنائية، والقدرات والإشراف على مرافق الاعتقال.^(٣٢٥) يمول مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) برنامج منسق حكم القانون (RoLC) ولديه جهود إصلاحية منفصلة، وجهود لفرض تطبيق القانون وبرامج قضائية تكمل جهود منسق حكم القانون.

النظام القضائي العراقي

في أيار/مايو ٢٠١٠، اجتمع المفتش العام مع رئيس المحكمة العليا مدحت المحمود، في بغداد وناقشا عملية المصادقة على الانتخابات العراقية، ووضعية الوكالات العراقية لمكافحة الفساد (مجلس النزاهة، المجلس الأعلى للتدقيق والمفتشون العامون للوزارات). شدّد رئيس المحكمة العليا على أهمية انتقاء المفتشين العامين الصالحين ولاحظ ان بعض الموظفين الرسميين قد استغلوا النظام لمصالحهم الخاصة.



المفتش العام مجتمعاً مع رئيس المحكمة العليا، مدحت المحمود في بغداد، في أيار/مايو ٢٠١٠

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

ووصف رئيس المحكمة العليا أيضاً "دائرة المال" التي يجري إنفاقها بين مكاتب الرئيس ورئيس الوزراء، كما في مجلس النواب. لا أحد يعرف مقدار هذه المبالغ وعلى ماذا تُنفق. وبعد ان لاحظ رئيس المحكمة العليا "ان النظام المالي السيئ يجعل الفساد ممكناً"، شدد على ان الحكومة سوف تحتاج إلى توظيف مدراء ماليين كفؤين.

بالنسبة للأمن القضائي، قال رئيس المحكمة العليا انه كانت هناك العديد من الأحداث المقلقة وليس فقط تلك التي حدثت في شباط/فبراير. ودافع عن ضرورة ان تكون للقضاة "حماية حقيقية"، على شكل مزيد من الأسلحة وتمديد الحماية إلى عائلات القضاة. وأضاف انه سيكون من مصلحة العراق جعل برنامجها للأمن القضائي على غرار نظام رؤساء الشرطة الأميركيين (U.S. Marshals).^(٣٢٦)

لقد تقدم القضاء العراقي بصورة ملحوظة كمؤسسة منذ إعادة تأسيس مجلس القضاء الأعلى (HJC) كفرع مستقل للحكومة العراقية سنة ٢٠٠٣. فقد تخرج سنة ٢٠٠٩، عدد قياسي من القضاة من معهد التدريب القضائي العراقي الذي يقدم التدريب الأساسي للقضاة والمدعين العامين. بتاريخ كانون الثاني/يناير ٢٠١٠، كان يوجد ١٢٦٣ قاض يعملون في العراق - حوالي ضعف العدد ٢٠٠٣ - بما في ذلك ٩٢٥ قاضي محكمة، و ٣٣٨ مدعي عام و ٩ قضاة في مجلس القضاء الأعلى. وأعرب رئيس المحكمة العليا عن اعتداده الخاص بالنسبة لعدد القضاة الإناث اللواتي زاد عددهن من ٧ إلى ٦٧ (بينهن ١٥ قاضية محكمة و ٥٢ مدعية عامة) خلال تلك الفترة الزمنية.^(٣٢٧)

بعض مكاتب معهد التنمية القضائية (JDI) المدعوم من مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) فتحت في كانون الثاني/يناير ٢٠١٠ كما ان العمل على ما تبقى من هذا المرفق يشرف على الإنجاز. هذا المرفق الجديد يدعم بناء قدرات مجلس القضاء الأعلى عن طريق التدريب المتقدم للقضاة والمحققين القضائيين والموظفين.^(٣٢٨)

ذكر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي ان إنشاء دار عدل جديدة في الحلة بكلفة ٧,٢ مليون دولار ممولة من الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون (INCLE) يشرف على الإنجاز، ومن المقرر ان تبدأ الحكومة تشغيل المرفق قريباً.^(٣٢٩)

مبادرات الأمن القضائي

خلال ربع السنة الحالي، تم إنجاز تقييم دام سنة ممول من الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وفرض تطبيق القانون لتقييم نقاط الضعف الرئيسية في المحاكم في أرجاء العراق. ساهمت نتائج التقييم في مناهج التدريب الأمني، ورفع مستويات أمن دور المحاكم، وفي مقررات تعليمية متخصصة لتدريب موظفي مجلس القضاء الأعلى في أداء تقييمات أمنية بصورة مستقلة. ومول مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون أيضاً المعدات لدى مجلس القضاء الأعلى لتحل محل البنود التي فقدت جراء قصف مرافق المحكمة في تشرين الأول/أكتوبر وكانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩.^(٣٣٠)

في نيسان/أبريل ٢٠١٠، وافقت وزارة الداخلية على استراتيجية تدريب لجميع موظفي المرافقة الشخصية الأمنية للقضاة، وأضافت برنامجاً للحماية الشخصية لقضاة مديريتها العامة لحماية الشخصيات الرفيعة المقام. وأصدرت المديرية بطاقات تعريف للسلاح الشخصي وللصلاحيات

الشخصي لرجال الأمن ل ٢٩٨ قاضٍ مشارك. استناداً إلى النجاح الأولي للبرنامج، قدم مزيد من القضاة طلبات، وهناك حالياً حوالي ٣٠٠ طلب مُعلق.^(٣٣١)

معالجة جداول الدعاوى في المحاكم

في حزيران/يونيو، ناقش مجلس القضاء الأعلى إمكانية دعوة اللجنة الوزارية حول حكم القانون للمعتقلين إلى الاجتماع من جديد لمعالجة أساليب تحسين التحقيق ومعالجة قضايا معتقي ما قبل المحاكمة في مرافق اعتقال الحكومة العراقية. ذكر مُنسق حكم القانون ان لدى اللجنة قدرات كبيرة لتحسين تلك العملية فور جمعها القضاة وشرطة التحقيق معاً. إضافة إلى ذلك، ونزولاً عند طلب نائب وزير الداخلية، علي حسين كامل، تخطط السفارة الأميركية في بغداد والقوات الأميركية في العراق للاجتماع ولمراجعة الممارسات والإجراءات الحالية لمعالجة قضايا معتقلي ما قبل المحاكمة.^(٣٣٢)

المحكمة الجنائية المركزية العراقية (CCC-I) تواصل العمل خارج معهد التنمية القضائية (JDL). في أيار/مايو ٢٠١٠، تولى مجلس القضاء الأعلى المسؤولية الرئيسية بالنسبة للتكاليف التشغيلية للمحاكم الجنائية المركزية العراقية، ويواصل العمل جنباً إلى جنب مع القوات الأميركية لكي يصبح مكتفي ذاتياً. وعمل مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) مع موظفي القوات الأميركية في العراق على الأرض للبدء بوضع مخطط للخروج مع تراجع ارتباط القوات الأميركية بمعهد التنمية القضائية.^(٣٣٣)



مولت الولايات المتحدة ٧,٢ مليون دولار لتصميم المحكمة في الحلة لتوفير مجمع حديث لسلطات حكم القانون في محافظة بابل. (الصورة للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)).

خلال ربع السنة الحالي، بدأت المعلومات التشغيلية تتدفق عبر نظام تعقب القضايا الجديد الممول من الصندوق الدولي للتعقب المخدرات وفرض تطبيق القانون (INCLE) والهادف إلى تسريع إصدار الأحكام القضائية في المحاكم. يتكون النظام الذي تقوم بإدارته شراكة بين مجلس القضاء الأعلى ووزارة الداخلية ووزارة العدل من ثلاثة كيانات لقواعد البيانات مبنية على أساس مشترك للبيانات تسمح لكل منظمة بمعالجة أولوياتها الخاصة لإدارة البيانات في الوقت الذي تتشارك فيه بالبيانات كما هو متفق عليه مع شركائها. تولى المجلس الأعلى للقضاء زمام القيادة في تشغيل النظام، كما ان ثمانى محاكم لديها الآن أجهزة كمبيوتر خادمة (servers) تشغل تطبيق النظام.^(٣٣٤)

في حزيران/يونيو ٢٠١٠، بدأت مجموعة العمل ما بين الوكالات التي تديرها الحكومة العراقية تتشارك في سجلات البيانات بحجم أولي يبلغ ١٥,٠٠٠ إلى ٢٠,٠٠٠ سجل. تتضمن السجلات مذكرات التوقيف ومعلومات أخرى ضرورية لضمان فعالية ودقة نقل المعلومات من وقت التوقيف الأولي حتى المحاكمة، ومن ثم، إذا كان ذلك منطبقاً، إلى الاحتجاز أو إطلاق السراح.^(٣٣٥)

لقد طبقت الحكومة العراقية بدعم من مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون نظامين إضافيين ممكنين، واحد لإدارة سجلات المجرمين التي تعالجها وزارة الداخلية والآخر لتعقب المساجين في وزارة العدل. لدى هذه الوزارات اليوم القدرة على تحديث وتوسيع وإدارة تطبيق تلك البرامج.^(٣٣٦)

السجون والمعتقلين

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان هناك في السجون التي في عهدة القوات الأميركية ١,٧٦٩ معتقل عراقي. أكثر من ٧٠ بالمئة هم من السنة و٣٠ بالمئة هم من الشيعة. تواصلت القوات الأميركية في العراق بالعمل بالتعاون مع الحكومة العراقية للحصول على مذكرات توقيف بحق المعتقلين الذين يمكن أن تُعالج قضاياهم في نظام العدل الجنائي العراقي. بالتناغم مع التزاماتها بموجب الاتفاقية الأمنية، تعمل القوات الأميركية في العراق بصورة وثيقة مع الحكومة العراقية لإطلاق سراح أولئك المعتقلين الذين لا يمكن نقل مسؤوليتهم إلى الحكومة العراقية بطريقة آمنة ومنتظمة. لقد أطلقت القوات الأميركية سراح حوالي ٨٢٠٠ معتقل منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، ونقلت مسؤولية حوالي ٥٦٠٠ معتقل إضافي إلى الحكومة العراقية مع مذكرات توقيف وأوامر اعتقال، أو إدانات قضائية أخرى.^(٣٣٧)

في ١٥ تموز/يوليو ٢٠١٠، نقلت القوات الأميركية في العراق مرفق اعتقال ساحة القتال كروبر-آخر مرفق اعتقال كبير تشغله القوات الأميركية في العراق - إلى السيطرة العراقية. بلغت الاستثمارات في البنية التحتية للمرفق ٤٨ مليون دولار، وقرابة ٥٠,٢ مليون دولار في عقود لدعم عمليات الاعتقال العراقية لغاية آخر كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ التي تم نقلها مع المرفق. عند وقت نقل المسؤولية إلى الحكومة العراقية، كان يوجد في المرفق حوالي ١٦٠٠ معتقل مع مذكرات توقيف، أوامر اعتقال، أو إدانات قضائية عراقية. اما قدرة الاستيعاب القصوى هي ٤٠٠٠ معتقل. تواصلت القوات الأميركية في العراق القيام بعمليات محدودة خاصة بالمعتقلين في المرفق دعماً لعمليات مكافحة الإرهاب وبناءً على طلب خاص من الحكومة العراقية. خلال السنة الماضية، أغلقت القوات الأميركية في العراق مرفق اعتقال ساحة القتال بوكا ونقلت مراكز الاعتقال في تاجي إلى سيطرة الحكومة العراقية.^(٣٣٨) للاطلاع على مواقع كافة السجون في العراق، انظر الشكل ٢-٢٣.

أطلقت القوات الأميركية في العراق سراح حوالي ٨٢٠٠ معتقل منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ ونقلت مسؤولية قرابة ٥٦٠٠ معتقل إضافي.

تحديث المعلومات حول حقوق الإنسان

كما هو مبين في إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية للعراق ٢٠١١-٢٠١٤ (UNDAF)، "لقد ضعفت قدرة الحكومة العراقية في ممارسة سيطرتها الشرعية عبر حكم القانون بسبب الآثار

التركيمة للعنف والتدهور العام لمؤسسات الدولة". بحسب إطار عمل الأمم المتحدة المذكور، فإن أكثر المجموعات الضعيفة في العراق – النساء، الأرمال، النساء ربات العائلات، الأطفال، الأشخاص المعوقين، المجتمعات الأهلية للأقليات، والمهجرين في الداخل – "لا يستطيعون الوصول إلى نظام العدالة الرسمية إلا بشكل محدود ولا يعربون عن الكثرة من الثقة بعمله". انهم يعتمدون على آية العدل التقليدية التي لا تتوافق أحياناً مع معايير حقوق الإنسان الوطنية والدولية.^(٣٣٩)

وفقاً لإطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية للعراق، فإن انتماء العراق إلى وتصديقه على عدة أدوات دولية لحقوق الإنسان، كما ولجوهر معاهدات منظمة العمل الدولية، لم تُترجم بصورة متوافقة مع القانون المحلي. ذكر فريق الأمم المتحدة حول البلدان (UNCT) حصول ازدياد في الإساءة إلى حقوق الإنسان، والتمييز بين الجنسين، وتهميش واستبعاد بعض المجتمعات الأهلية، والحماية غير الكافية للمجموعات الضعيفة. وعلى الرغم من ان العراق أقر قانوناً لتأسيس لجنة عليا مستقلة لحقوق الإنسان، فإن هذه اللجنة لم تؤسس بعد.^(٣٤٠)

لقد وضع إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية للعراق أولويات للتوافق مع أهداف التنمية للألفية في العالم لأجل تحسين حياة السكان الفقراء بحلول ٢٠١٥. في أساس هذا العمل هناك الحاجة إلى تلبية الحقوق الأساسية للشعب العراقي بالنسبة للتعليم، والصحة، والغذاء، والمياه الأمانة والنظيفة، والمسكن اللائق. تحسين البيئة الحمائية في العراق للأطفال والشباب هدفاً أولياً. لقد خططت الأمم المتحدة لدعم الإصلاحات في نظام العدالة الخاص بالأحداث لكي يتناسب مع المعايير الدولية.^(٣٤١) للاطلاع على مقاييس إطار عمل الأمم المتحدة حول حقوق الإنسان وأهدافه أنظر الجدول ٢-١٧.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الشكل ٢-٢٣
سجون العراق



المصدر: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤ و ٢٠١٠/٥/١٥.

الجدول ٢-١٧
أهداف إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية للعراق (UNDAF)

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
وضع سياسة قومية لاهتمام السكان بحقوق الإنسان	لا (٢٠٠٩)	نعم
عدد القوانين الجنائية والإجراءات الجنائية المتناسبة مع القانون الدولي لحقوق الإنسان،	صفر (٢٠٠٩)	٢
النسبة المئوية للتقارير الدورية المنشورة والمسلمة كما هو مطلوب من جانب معاهدات حقوق الإنسان التي صادق عليها العراق	الوثيقة الفنية للخط القاعدي (TBD) (٢٠٠٩)	١٠٠ بالمئة

المصدر: إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية للعراق، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقاييس نتائج إطار عمل الأمم المتحدة لمساعدة التنمية للعراق، ص ص ٤٣-٥٩.

البنية التحتية

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ١٢,٥٣ مليار دولار وألزمت ١٢,٠٥ مليار دولار وأنفقت ١١,٧٧ مليار دولار من الصناديق الأربعة الرئيسية لإعادة تأهيل البنية التحتية العراقية بما في ذلك مشاريع في قطاعات النفط والغاز، الكهرباء، المياه والصرف الصحي، والنقل، والاتصالات.^(٣٤٢) للاطلاع على وضعية الأموال الأميركية للبنية التحتية، أنظر الشكل ٢-٢٤ والجدول ٢-١٨.

النفقات الأميركية على مشاريع البنية التحتية بلغت ذروتها في ربع السنة الأخير من السنة المالية ٢٠٠٥ عندما تم إنفاق ٩٦٩,٤ مليون دولار. كما هو مبين في الشكل ٢-٢٥، كانت نفقات ربع السنة الحالي ٤ بالمئة من ذلك المبلغ. ومن أصل الـ ٢٨٦,٩ مليون دولار من الإلزامات غير المنفقة في نهاية ربع السنة، كانت الحصة الأكبر لقطاع الكهرباء يليه مباشرة قطاع المياه والصرف الصحي، ثم قطاع النقل وقطاع الاتصالات. حوالي ثلثي تلك الإلزامات غير المنفقة كانت من صندوق برامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).^(٣٤٣)

الخفض التدريجي للدعم الأميركي المباشر لإعادة الإعمار أتى في الوقت الذي أطلقت فيه الحكومة العراقية والأمم المتحدة خططا منسقة لمدة خمس سنوات لمواصلة أعمال التنمية الحرجة. لا تزال هناك حاجة إلى عمل الكثير في قطاع البنية التحتية:

- إنتاج النفط الخام توقف، على الأقل، عند مستوى مؤقت.
- الإنتاج المحلي من أنواع الوقود المكرر، مثل البنزين وغاز البترول المسيل (LPG)، غير كافٍ لتلبية الطلب.
- العجز في الكهرباء منتشر على نطاق واسع، وقد ساهم، إلى جانب إمدادات مياه الشرب غير الكافية، في اندلاع التظاهرات العنيفة في عدة محافظات خلال ربع السنة الحالي.
- قطاعا الطيران المدني والموانئ يتطلبان المساعدة للتقيد بالمعايير الدولية.

الآن، تعتمد الحكومة العراقية أكثر على دعم الشركاء والمنظمات الدوليين وتستكشف آليات مختلفة لجذب الاستثمارات الخاصة لمواصلة جهود إعادة البناء.


النفط والغاز

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢,٠٥ مليار دولار، وألزمت ١,٩٣ مليار دولار وأنفقت ١,٩١ مليار دولار لإعادة تأهيل قطاع النفط والغاز في العراق.^(٣٤٤)

الشكل ٢-٢٤

البنية التحتية: وضعية أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
بملايين الدولارات

الزمامات غير منفقة
المجموع: ٢٨٦,٩

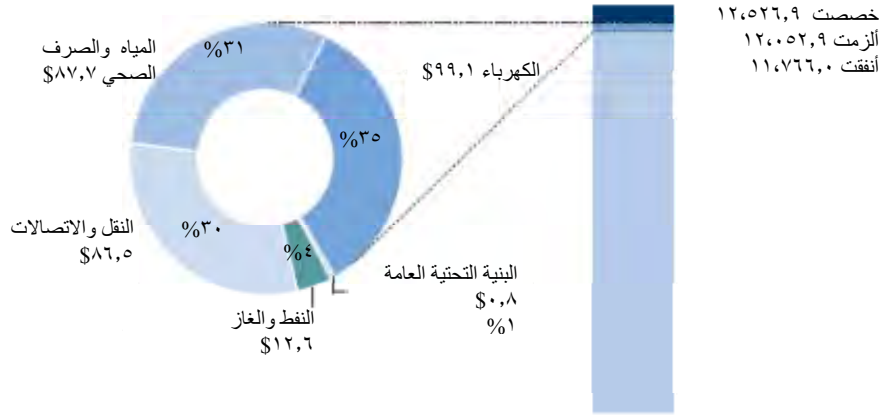


ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، القوات الأميركية في العراق (USF-I)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦؛ استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الشكل ٢-٢٥
البنية التحتية: النفقات الأميركية ربع السنوية حسب قطاعات إعادة الإعمار
بملايين الدولارات

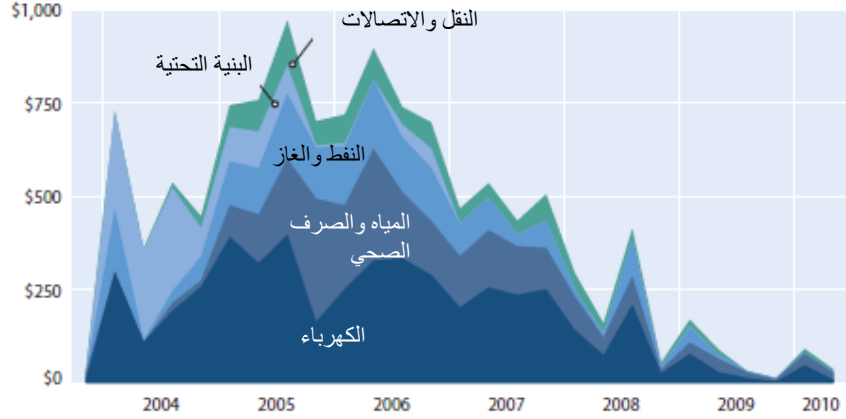

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، القوات الأميركية في العراق (USF-I)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦ و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٣ - ٢٠١٠/٤.

البنية التحتية

الجدول ٢-١٨
البنية التحتية: وضعية البرامج المنتقاة
بملايين الدولارات

البرنامج	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
	أنفقت	ألزمت	أنفقت	ألزمت
الموارد المائية والصرف الصحي- مياه الشرب (صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق)	١,٣٣٨,٤	١,٣٣٢,٥	١٥,٣ (%)	٠,٨ (%)
مشاريع النقل والاتصالات - إعادة تأهيل وترميم السكة الحديد (صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق)	١٩٦,١	١٩٦,١	١٠,٤ (%)	٠,٠ (%)
قطاع الكهرباء- النقل (صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق)	١,٠٢٣,١	١,٠١٢,٦	٦,٤ (%)	٣,١ (%)
حماية أمن البنية التحتية-الكهرباء (صندوق دعم الاقتصاد)	٢٧,٠	٢٤,١	١,٩ (%)	٤,٣ (%)
النقل (برنامج الاستجابة الطارئة للقائد)	٣٥٧,٢	٣٠٣,٩	٠,٠ (%)	٣,١ (%)
مشاريع النقل والاتصالات-أنظمة الاتصالات العراقية (صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق)	٥٢,٩	٤٠,٠	٢,٦ (%)	٠,٢ (%)
تنمية القدرات على مستوى المحطات والتدريب الفني- الاتصالات (صندوق دعم الاقتصاد)	٤,٢	٢,١	٠,١ (%)	٢,٢ (%)
الكهرباء (برنامج الاستجابة الطارئة للقائد)	٣٨١,٥	٣٣٠,٧	٠,٥ (%)	١,٣ (%)
المياه والصرف الصحي (برنامج الاستجابة الطارئة للقائد)	٦٩٠,٢	٦٢٥,٧	٠,٠ (%)	١,٨ (%)
مشاريع أخرى	٧,٩٨٢,٣	٧,٨٩٨,٢	١,٩ (%)	١٠,٣ (%)
المجموع	١٢,٠٥٢,٩	١١,٧٦٦,٠	٣٥,٣ (%)	٤,٤ (%)

ملاحظة: البرامج المدرجة في هذه القائمة كان فيها تغيير على الأقل بقيمة مليون دولار من الالتزامات والنفقات ربع السنوية مجتمعة. الملحق (ج) يبين وضعية كافة البرامج الممولة من الصناديق الأربعة الرئيسية بما فيها تلك التي في مجال إعادة الإعمار والمجموعة في الفئة المسماة "مشاريع أخرى". لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، القوات الأميركية في العراق (USF-I)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦، استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١؛ ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠٠٩/٤/١٣.

خلال ربع السنة الحالي، ولأول مرة، تضررت خطوط أنابيب النفط المحمية في منطقة الحظر حول خطوط أنابيب النفط جرّاء هجمات.

إنتاج وصادرات النفط الخام

على الرغم من التقلبات من شهر لشهر، كان إنتاج النفط الخام في العراق متساوياً نسبياً خلال السنتين ونصف الماضيتين، مع متوسط قدره ٢,٤٢ مليون برميل في اليوم سنة ٢٠٠٨، و٢,٤٠ مليون برميل في اليوم في ٢٠٠٩، و٢,٨٠ مليون برميل في اليوم لغاية الآن في ٢٠١٠. لم يتغير الإنتاج في ربع السنة الحالي بالمقارنة مع ربع السنة المنصرم وكان واحد بالمئة أدنى من الكمية المنتجة في نيسان/إبريل - حزيران/يونيو ٢٠٠٩. كان متوسط صادرات النفط الخام خلال ربع السنة الحالي ١,٨٥ مليون برميل في اليوم، أي بتراجع ٥ بالمئة عن ربع السنة المنصرم، و٢ بالمئة أقل من ربع السنة نفسه سنة ٢٠٠٩. من جملة النفط الخام الذي لم يصدر، ذهب ٠,٤٣ مليون برميل في اليوم إلى المصافي، بزيادة ١٦ بالمئة عن ربع السنة المنصرم وبزيادة ١٩ بالمئة عن ربع السنة نفسه من السنة الماضية.^(٣٤٥) للاطلاع على إنتاج النفط الخام، ومدخلات المصافي ومستويات التصدير منذ ٢٠٠٣، انظر الشكل ٢-٢٦.

الهجمات على البنية التحتية للنفط


خلال ربع السنة الحالي، ولأول مرة، تضررت خطوط أنابيب النفط المحمية في منطقة الحظر حول خطوط أنابيب النفط جرّاء الهجمات:^(٣٤٦)

- في ٢٢ نيسان/إبريل، هاجم مجهولون وأحقوا أضراراً بقسم من خط الأنابيب في محافظة نينوى الذي ينقل النفط الخام إلى محطة التصدير النهائية في كيهان بتركيا. ذكر ان الحدث أوقف تدفق النفط إلى الشمال لمدة خمسة إلى ستة أيام خلال إصلاح الخط، ونتج عنه تأخير في نقل حوالي ٢٠٠,٠٠٠ برميل من النفط، لكنه لم يؤثر على إنتاج النفط في الشمال. القيمة المقدرة للنفط المفقود، وتكاليف الإصلاح، وخسائر التوقف عن العمل، بلغت أقل من ٣٠ مليون دولار.
- في ٢٧ نيسان/إبريل، حال هجوم على خط أنابيب بايجي - بغداد المحمي في مناطق الحظر حول خطوط أنابيب النفط (PEZ) دون استلام مصفاة الدورة حوالي ٢٠,٠٠٠ برميل في اليوم (BPD) من حقول النفط في كركوك لعدة أيام. واصلت المصفاة العمل على مستوى منخفض مستخدمة النفط الخام الجنوبي للتغذية.
- في ٧ حزيران/يونيو، لحق الضرر بقسم آخر من خط أنابيب العراق-تركيا في محافظة صلاح الدين، ولم تُحدد الأسباب. نتج عن ذلك خسائر مماثلة لتلك التي نتجت عن الهجوم السابق على هذا الخط.

في ٢١ حزيران/يونيو، ألحق جهاز تفجير مرتجل أضراراً بخط الأنابيب في قيارة الغربية في نينوى لكن من غير الواضح ما إذا كان الخط ضمن حدود مناطق الحظر حول خطوط أنابيب النفط (PEZ). أنجزت عمليات الإصلاح في أقل من ثلاث ساعات.^(٣٤٧)

الشكل ٢-٢٦

إنتاج وصادرات النفط الخام، حسب الأشهر، ٢٠٠٣/١٠ - ٢٠١٠/٦
مليون برميل في اليوم

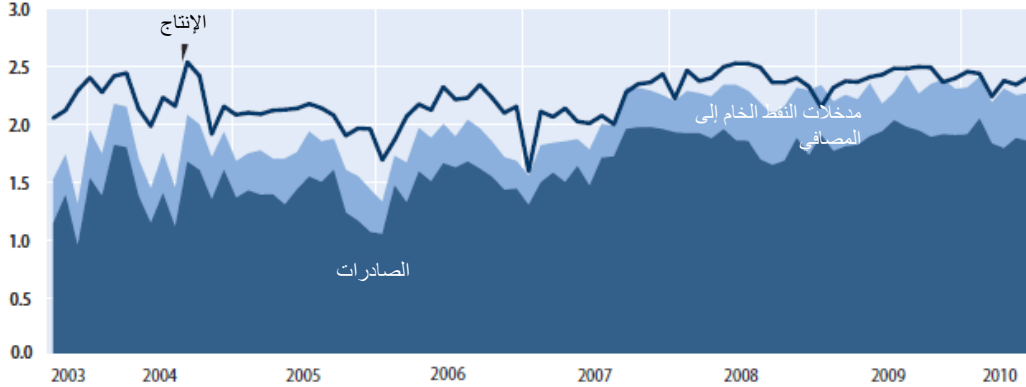

ملاحظة: معظم النفط الخام المنتج في العراق أما يُصدّر أو يُكرر إلى منتجات بترولية. المتبقي يستهلك في محطات الكهرباء، يُخزّن أو لا يُحتسب.

المصدر: استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٤ و ٢٠١٠/٧/٦.

زيادة قدرات الإنتاج الأولية

قالت وزارة النفط انها تأمل في رؤية إجمالي إنتاج النفط يزداد بحوالي ١٥٠,٠٠٠ برميل في اليوم بحلول نهاية ٢٠١٠، كنتيجة لعقود الخدمات الممنوحة في حيزران/يونيو وكانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩،^(٣٤٨) وتتوقع زيادة بحوالي ٦٠٠,٠٠٠ ألف برميل يومياً بحلول آخر ٢٠١١.^(٣٤٩) ويقال ان عقد تطوير حقل الرميلة الضخم قد تقدم إلى حدوده القصوى. تولّى كونسورتيوم لشركة بي بي البريطانية (BP)، وشركة النفط الصينية سي إن بي سي (CNPC) وشركة نفط الجنوب السيطرة الكاملة على الحقل ابتداء من الأول من تموز/يوليو. ينتج الحقل حالياً قرابة مليون برميل في اليوم وتقدر وزارة النفط ازدياد الإنتاج بحوالي ٢٠٠,٠٠٠ برميل في اليوم بحلول نهاية ٢٠١٠. بموجب شروط العقد، يتوقع ان يزداد الإنتاج إلى ٢,٨٥ مليون برميل في اليوم بحلول ٢٠١٧. الإنتاج في حقل الزبير الذي تشغله شركة "إني" (Eni) الإيطالية قد يزداد إلى ٢٥٠,٠٠٠ حتى ٣٠٠,٠٠٠ برميل في اليوم من معدله الحالي البالغ ١٨٠,٠٠٠ برميل في اليوم. وبإمكان حقل مجنون ان يزيد إنتاجه الحالي البالغ ٥٠,٠٠٠ برميل في اليوم تقريباً بأكثر من ثلاثة أضعاف بحلول نهاية ٢٠١٢.^(٣٥٠)

خلال ربع السنة الحالي، وقّعت شركة النفط الوطنية الصينية "أوف شور" (CNOOC) (حصتها ٦٣,٧٥ بالمئة) وشركة تيباو (TPAO) التركية التي تمتلكها الدولة (حصتها ١١,٢٥ بالمئة) اتفاقية نهائية مع الحكومة العراقية لرفع الإنتاج إلى ٣٥٠,٠٠٠ برميل في اليوم في حقول النفط الثلاثة في ميسان (فوقاً، أبو غراب وبوزرغان) التي عرضت في مناقصة في حيزران/يونيو ٢٠٠٩.^(٣٥١) تحتفظ شركة ميسان للنفط بحصة تبلغ ٢٥ بالمئة في هذه الصفقة.^(٣٥٢) يبلغ متوسط الإنتاج الحالي ١٠٠,٠٠٠ برميل في اليوم.^(٣٥٣) ذكرت شركة لوك أويل (Lukoil) انها خصصت ٥ مليارات دولار لمشاريع حفر آبار النفط في حقل القرنة الغربية، المرحلة الثانية، وتتوقع بدء عمليات الحفر سنة ٢٠١١. ووقّعت الشركة، بالشراكة مع

ستات أويل (Statoil)، اتفاقية خدمات مع الحكومة العراقية في كانون الثاني/يناير لرفع إنتاج الحقل.^(٣٥٤)

تتوقع وزارة النفط زيادة حوالي ٦٠٠,٠٠٠ برميل في اليوم بحلول ٢٠١١.

حيث أن شركات خدمات النفط تتوقع فرصاً مستقبلية مع الشركات التي تطور حقول النفط العراقية، فإنها تتحرك في خططها الخاصة لرفع الإنتاج. مثلاً، أعلنت شركة شلومبرغر المحدودة في آذار/مارس أنها على وشك إنجاز قاعدة التشغيل لديها في محافظة البصرة وهي تشارك في مناقصات تشمل تشغيل عدة آبار وتقديم خدمات نفطية متكاملة.^(٣٥٥)

زيادة الصادرات

من أصل الـ ١,٩٠ مليون برميل في اليوم من النفط الخام الذي صدره العراق سنة ٢٠٠٩، تم شحن حوالي ثلاثة أرباعه من مرافق ميناء البصرة الجنوبي، ونقل الربع الأخير عبر خطوط الأنابيب في الشمال إلى ميناء كيهان، وأقل من واحد بالمئة أرسل بالشاحنات إلى الأردن.^(٣٥٦)

تتولى الحكومة العراقية حالياً مشروع زيادة صادرات النفط الخام العراقي (ICOEE) بغية إعادة تأهيل وزيادة قدرات خط الأنابيب الجنوبي ومحطات الشحن خارج الساحل للتصدير. خلال ربع السنة الحالي، أعلنت شركة فوستر ويلر المحدودة للخدمات النفطية ان شركة نفط الجنوب قد منحتها عقداً للإشراف على هذا المشروع (ICOEE). سوف يشمل المشروع إنشاء خطوط أنابيب برية وخارج السواحل وتركيب ثلاث عوامات رسو أحادية النقاط ومنصة مركزية للتوزيع والقياس في الخليج الفارسي، والبنية التحتية التابعة لكل ذلك. يهدف المشروع إلى زيادة قدرة التصدير من جنوب العراق من ١,٨ مليون برميل في اليوم إلى ٤,٥ مليون برميل في اليوم بحلول ٢٠١٤.^(٣٥٧)

وقعت وزارة النفط اتفاقية أولية مع تركيا خلال ربع السنة الحالي لتمديد اتفاقية نقل النفط الخام عبر خط أنابيب العراق - تركيا لمدة ١٢ سنة أخرى.^(٣٥٨) وذكر المراقبون في الصناعة النفطية أيضاً ان الحكومة العراقية تسعى إلى استبدال خط أنابيب النفط الخام الممتد إلى سوريا. قبل غزو ٢٠٠٣، بقيت قدرة تصدير خط الأنابيب هذا عند ٢٠٠,٠٠٠ برميل في اليوم،^(٣٥٩) لكن الخط بقي عاطلاً عن العمل خلال السنوات الأخيرة بسبب الأضرار التي لحقت به أثناء التدخل العسكري وأعمال النهب التي تلت ذلك. لقد ناقش العراق وسوريا إصلاح خط الأنابيب هذا منذ ٢٠٠٧ على الأقل، لكن لم يتم بعد التوصل إلى أي اتفاق أو عمل.^(٣٦٠)

المصافي والمنتجات البترولية

بالمقارنة مع نفس الفترة الزمنية من العام الماضي، أنتجت المصافي العراقية خلال ربع السنة الحالي ٢٤ بالمئة أكثر من المازوت و٢٣ بالمئة أكثر من البنزين، و ١١ بالمئة أكثر من الكاز و ٤ بالمئة أكثر من غاز البترول المُسَيَّل.^(٣٦١) على الرغم من هذه المكاسب، فان المصافي العراقية غير قادرة على تلبية الطلب المحلي من المنتجات ذات الدرجة الأعلى مثل البنزين وغاز البترول المُسَيَّل، بسبب البنية التحتية المتقادمة للمصافي والإمدادات غير الكافية من النفط الخام المتوفرة للاستخدام كتغذية لهذه المصافي.^(٣٦٢) صحيح ان كافة إمدادات الكاز والمازوت تقريباً كانت منتجة محلياً خلال ربع السنة الحالي، إلا ان العراق اعتمد على الواردات بالنسبة لـ ٣٠ بالمئة من البنزين الذي يحتاجه و ١٧ بالمئة من غاز البترول المُسَيَّل الذي يحتاجه.^(٣٦٣) للاطلاع على

اتجاهات إنتاج واستيراد المنتجات البترولية، كما وردت في تقارير مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I)، التابع لوزارة الخارجية، أنظر الشكل ٢-٢٧.

القدرة الحالية للمصافي العراقية التي تمتلكها كلها الدولة، هي حوالي ٧٩٠,٠٠٠ برميل في اليوم.^(٣٦٤) تدعو الخطة الإستراتيجية لوزارة النفط إلى زيادة القدرة إلى ١,٥ مليون برميل في اليوم بحلول ٢٠١٧، كما ان الحكومة العراقية تسعى إلى ما يقدر بـ ٢٠ مليون دولار أو أكثر من الاستثمارات لتحقيق هذا الهدف عن طريق توسعة البنية التحتية القائمة وإنشاء مرافق جديدة.^(٣٦٥) على وجه التخصيص، تخطط الوزارة لتوسعة مصفاتي دوره والبصرة القائمتين وبناء أربع مصافي جديدة: مصفاة بقدرة ٣٠٠,٠٠٠ برميل في اليوم، في الناصرية، ومصفاة بقدرة ١٤٠,٠٠٠ برميل في اليوم، في كل من محافظتي ميسان وكركوك، ومصفاة بقدرة ١٤٠,٠٠٠ برميل في اليوم في كربلاء. لقد منحت الوزارة عقود الهندسة الأولية والتصميم لتلك المرافق الجديدة، ونظمت في ٢٦ حزيران/يونيو مؤتمراً للمستثمرين الذين يهتمهم الأمر.^(٣٦٦) في ٣ أيار/مايو، وفي محاولة لجعل الاستثمار أكثر جاذبية، وافق مجلس الوزراء (CoM) على تعديل لقانون مصافي للعام ٢٠٠٧ الذي يسمح للمستثمرين الخاصين بتلقي ٥ بالمئة حسم من سعر السوق على الإمدادات مضمونة من النفط الخام لمدة ٥٠ سنة. غير ان التعديلات لا تزال بحاجة إلى موافقة مجلس النواب.^(٣٦٧)

تتمية قدرات قطاع النفط

علاوة على تحسين البنية التحتية المادية لقطاع النفط، تحتاج الحكومة العراقية إلى زيادة كبيرة لاعداد العمال الكفوئين لشركاتها في قطاع النفط لإدارة الإنتاج الحالي والمستقبلي. لهذه الغاية، واصلت الولايات المتحدة تقديم التدريب والمشورة إلى وزارة النفط عبر برنامج "تطوير" التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي يركز على تطوير خبرات الإدارة العامة في الوزارات العراقية الأساسية.^(٣٦٨)

في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٠، أكملت شركة نفط الجنوب أول تقرير للتقييم الذاتي التنظيمي والمعلمي، حيث قيم هيئتها المالية بموجب برنامج "تطوير" للتقييم الذاتي التنظيمي والتحويلي. قيم التقرير الأداء التنظيمي بالمقارنة مع أفضل الممارسات والعمليات الدولية في الشؤون المالية، وإدارة المعارف، والقيادة، والموارد البشرية.^(٣٦٩) وعمل برنامج "تطوير" أيضاً منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩ لدعم شركة نفط الشمال وشركة مصفاة الشمال وشركة توزيع المنتجات النفطية بطلب من وزارة النفط.^(٣٧٠)

الغاز الطبيعي

بحسب وزارة النفط، كان متوسط إنتاج الغاز الطبيعي المرافق ١,٣٧٣ مليون قدم مكعب (MCF) في اليوم خلال الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠١٠، وأكثر قليلاً من نصف هذه الكمية من الغاز (٧١٠ مليون قدم مكعب في اليوم) كان يتم إشعاله.^(٣٧١) مصادر أخرى قدرت ان الإشعال بلغ ما يقرب من ١٠٠٠ مليون قدم مكعب في اليوم.^(٣٧٢)

في ٢٩ حزيران/يونيو، سمح مجلس الوزراء لوزارة النفط بمواصلة المفاوضات مع كونسورتيوم "رويال داتش شل" (Shell) و"متسوبيشي" (Mitsubishi) حول مشروع استخدام غاز الجنوب. غير ان مجلس الوزراء لم يوافق بعد على العقد النهائي. سوف تؤسس الاتفاقية شركة غاز البصرة بملكية نسبتها ٥١ بالمئة لشركة غاز الجنوب المملوكة من وزارة النفط، و ٤٤ بالمئة، لشل و ٥ بالمئة لمتسوبيشي. ائتلاف الشركات الجديد سوف يطور الغاز المرافق للنفط من

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها


أربعة حقول رئيسية في محافظة البصرة: الرميلة، الزبير، القرنة الغربية ١، ومجنون. فبدلاً من إشعاله، سوف يُلتقط الغاز ويوزع للاستخدام المحلي والتصدير.^(٣٧٣)

خلال ربع السنة هذا، أعلنت الوزارة انها سوف تنظم مناقصة في الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، لتطوير ثلاثة حقول للغاز غير المرافق للنفط: حقل عكاس في محافظة الأنبار على مقربة من الحدود السورية، وحقل المنصورية في ديالى، وحقل سييا جنوب محافظة البصرة. لقد عُرض كل من حقلي عكاس والمنصورية في أول جولة مناقصات كانت قد عقدت في حزيران/يونيو ٢٠٠٩، لكن الوزارة رفضت العرض الوحيد المقدم حول حقل عكاس، ولم تتلقَ عروضاً حول حقل المنصورية. شركات الطاقة الدولية التي تأهلت مسبقاً للمشاركة في الجولتين السابقتين مؤهلة لتقديم عروض في الجولة الثالثة.^(٣٧٤)


الشكل ٢-٢٧

النفط المكرر - إنتاج ومستوردات الوقود المكرر حسب الأشهر ٢٠٠٤ - ٢٠١٠


غاز البترول المُسيّل
أطنان مترية في اليوم



وقود الديزل
مليون ليتر في اليوم




الكاز
مليون ليتر في اليوم



البنزين

مليون ليتر في اليوم



المصادر: استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٤ و ٢٠١٠/٧/٦

الكهرباء

بتاريخ ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ٥,١٩ مليار دولار، وألزمت ٥,٠٥ مليار دولار، وأنفقت ٤,٩٦ مليار دولار لتحسين توليد ونقل وتوزيع الكهرباء. حوالي ٤٠ بالمئة من النفقات كانت لتجديد أو لتوسعة محطات إنتاج الكهرباء.^(٣٧٥)

إمداد الكهرباء على شبكة العراق القومية في حزيران/يونيو ٢٠١٠ كانت أعلى متوسط عرفه العراق حتى الآن.

الإنتاج والمستوردات

كنتيجة للرقم القياسي للإنتاج في محطات الكهرباء العراقية، وبالتوافق مع الرقم القياسي للاستيراد الكهربائي، كان إمداد الكهرباء من شبكة العراق الوطنية عند أعلى متوسط شهري له - ٦,٧٢١ ميغاواط (MW)، أو ١٦١,٣٠٤ ميغاواط/ساعة (MWh) في اليوم. لكن، كما هو مبين في الشكل ٢-٢٨، كان إمداد الكهرباء في نيسان/إبريل أدنى بنسبة ١٥ بالمئة من هذا المستوى، أولاً بسبب التوقف عن العمل المخطط لأجل الصيانة وبسبب النقص في الوقود والمياه. بالنسبة لربع السنة بأكملها، كان متوسط الإمداد اليومي ٦,٢٠٢ ميغاواط. شكل هذا تراجعاً بنسبة ٢ بالمئة عن ربع السنة المنصرم، وكانت هذه المرة الأولى منذ ٢٠٠٤ التي انخفض فيها إجمالي الإمداد، كما حدث لإنتاج محطات الكهرباء أيضاً، بين ربعي السنة الأول والثاني من هذا العام.^(٣٧٦)

كان متوسط إنتاج الكهرباء من محطات الإنتاج في العراق خلال ربع السنة الحالي ٥,٤٣٥ ميغاواط، أي تراجع بنسبة ٤ بالمئة عن ربع السنة المنصرم و ٦ بالمئة أدنى من أعلى إنتاج سابق ربع سنوي الذي بلغ ٥,٧٧٠ ميغاواط في تموز/يوليو - أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. بالمقارنة مع ربع السنة نفسه من العام الماضي، ازداد الإنتاج ٢٣٨ ميغاواط، أو حوالي ٥ بالمئة. لكن، خلال السنة الماضية، ازدادت قدرة محطات إنتاج الكهرباء الاسمية أكثر من ٩٠٠ ميغاواط.^(٣٧٧) فكما هو مبين في الشكل ٢-٢٩، هذه الزيادة في القدرة الإنتاجية قد قلت بسبب التوقفات عن العمل غير المخططة والنقص في الوقود والمياه:

- التوقف عن العمل غير المخطط أفقدت الإنتاج أكثر من ٧٠٠ ميغاواط، أو حوالي ١٧,٠٠٠ ميغاواط/ساعة في اليوم (٧٨ بالمئة) أعلى مما كان خلال ربع السنة نفسه العام الماضي. بالمتوسط، فقد ١٦٢٥ ميغاواط من القدرة خلال ربع السنة الحالي بسبب مشاكل فنية، وعيوب ميكانيكية، وظروف الطقس القاسية. مثلاً، تسببت المشاكل التي


مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

خلت خلال ربع السنة الحالي باثنتين من أصل أربع وحدات توليد في محطة الإنتاج العاملة بالغاز في أربيل (إحدى أحدث المحطات في العراق) في ان يكون متوسط إنتاج المحطة حوالي ٩٠ ميغاواط أدنى مما كان عليه قبل سنة، و ١٢٠ ميغاواط أدنى مما كان خلال ربع السنة المنصرم. (٣٧٨)

- خلال السنة الماضية، فقد ٢٦٥ ميغاواط إضافية من القدرة بسبب النقص في الوقود والمياه لتوليد الكهرباء. حوالي ٤٢ بالمئة من الخسائر الإضافية هذه نتجت عن المياه غير الكافية في محطات الإنتاج الكهرومائية، و ٥٣ بالمئة كان عائداً إلى غياب الوقود في توربينات الإشعال الداخلي. بالحصيلة، فقد خلال ربع السنة هذا حوالي ١٥٦١ ميغاواط من القدرة بسبب النقص في الوقود والمياه. (٣٧٩)

الشكل ٢-٢٨

إمدادات الكهرباء حسب الأشهر وأرباع السنة، ٢٠١٠/٦ - ٢٠١٠/١
ميغاواط

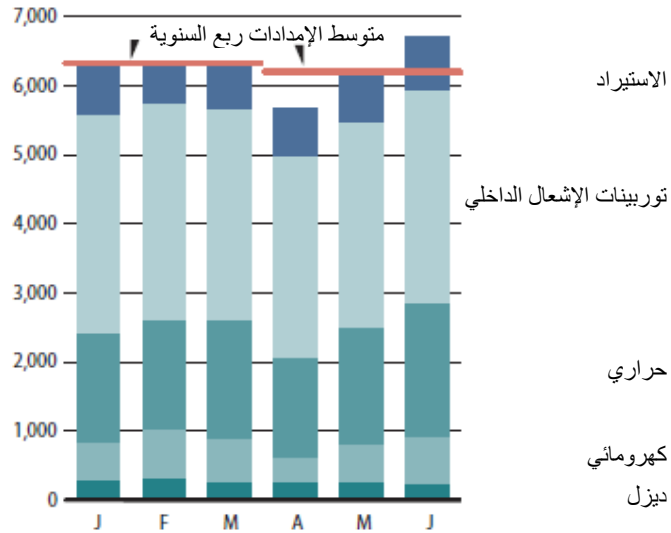

المصادر: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق/قسم الخدمات البيئية (ITAO/ESD)، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، ٢٠١٠/٦/٣٠ - ٢٠١٠/١/١.

كان متوسط استيراد الكهرباء خلال ربع السنة الحالي ٧٦٧ ميغاواط (MW) أو ١٨،٤٠٩ ميغاواط ساعة (MWh) في اليوم. كان الاستيراد ١٠ بالمئة أعلى مما كان عليه خلال ربع السنة المنصرم، وحوالي ١٣ بالمئة مما كان عليه خلال ربع السنة نفسه من ٢٠٠٩. الكهرباء المولدة في إيران شكلت ٧٨ بالمئة من الكهرباء المستوردة وحوالي ١٠ بالمئة من إجمالي إمدادات العراق. (٣٨٠)




محطة سفينة دوغان باي لإنتاج الكهرباء راسية الآن في ميناء أم قصر لتوفير الطاقة الكهربائية إلى منطقة البصرة

المستوردات المتبقية أنتجت في محطات إنتاج الكهرباء التي تملكها "كارتت" (Kartet)، وهي شركة مستقلة لإنتاج الكهرباء ولتجارة الطاقة مقيمة في تركيا. ابتداء من ٢٠٠٣ ولغاية ربع السنة الحالي، جرى استيراد الكهرباء من تركيا عبر خطوط نقل عابرة للحدود العراقية. في نيسان/إبريل سلمت "كارتت" سفينة الكهرباء دوغان بي وهي محطة لإنتاج الكهرباء عائمة بقدرة إنتاجية تبلغ ١٢٦,٥ ميغاواط. تشغل المحطة العائمة وتقوم بصيانتها شركة "وارتسيلا" (Wartsila)، وهي شركة فنلندية متعاقدة مع كارتت. خلال حزيران/يونيو، أول شهر خدمة كامل للمحطة، كان متوسط إنتاج هذه المحطة العائمة لمنطقة البصرة حوالي ٥٦ ميغاواط. يتوقع تسليم محطة عائمة ثانية هذه السنة إلى الزبير، في البصرة أيضاً. ^(٣٨١)

الشكل ٢-٢٩

العوامل التي تحدّ من إنتاجية محطات إنتاج الكهرباء في العراق، حسب الأشهر، ٢٠٠٩/٤ - ٢٠١٠/٦
ميغاواط

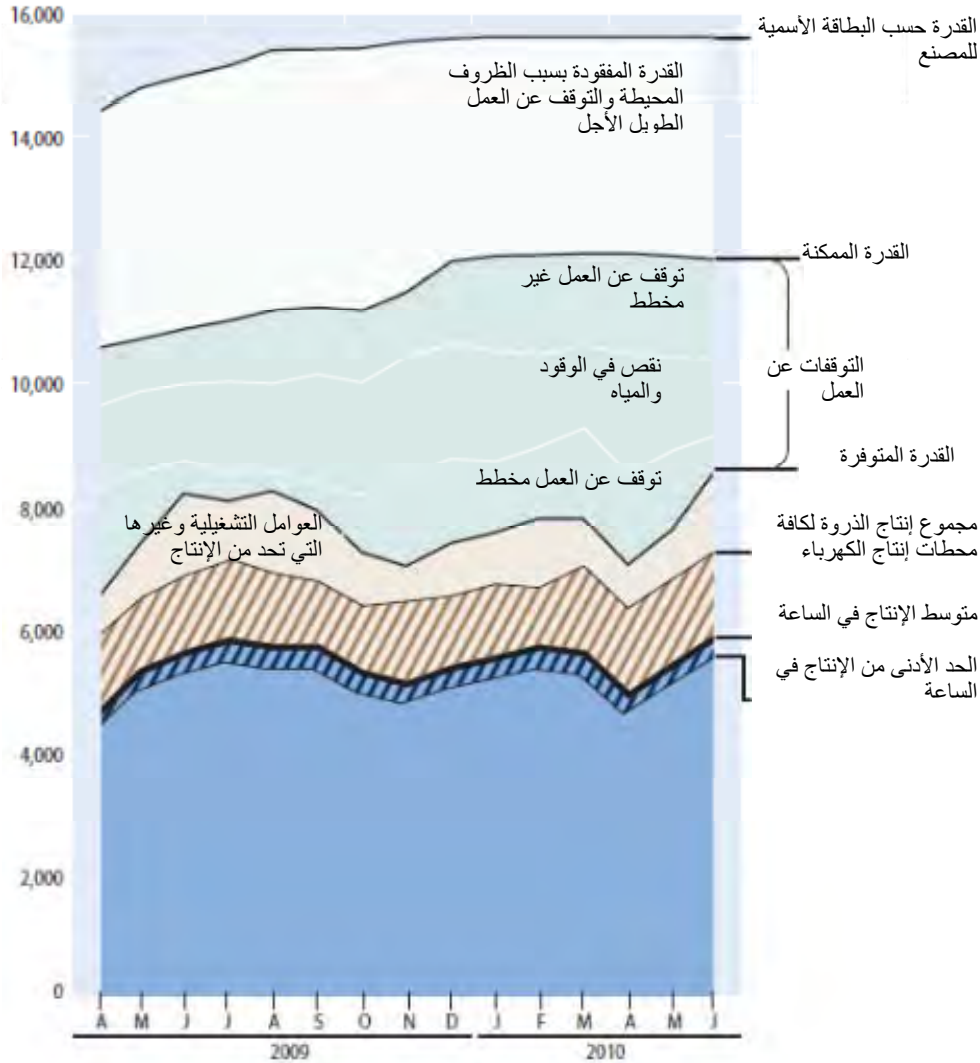


ملاحظة: القصد من هذا الشكل تقديم صورة عامة عن العوامل التي تحدّ من إنتاج الكهرباء في محطات إنتاج الكهرباء العراقية. انه مستند إلى بيانات قدمتها وزارة الكهرباء وذكرت في تقارير الأداء اليومي للكهرباء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق/ESD. بيانات الإنتاج والقدرة الاسمية، والقدرة الممكّنة، والفئات الثلاث للتوقف عن العمل مأخوذة مباشرة من تلك التقارير. لكن، وبسبب الشكوك حول دقة بعض البيانات، وكذلك التعقيدات الفنية لإنتاج الكهرباء، لا يجوز النظر إلى الشكل على انه تمثيل دقيق لإنتاج الكهرباء في العراق، القدرة الاسمية هي الإنتاج الأقصى لكافة وحدات توليد الكهرباء على الشبكة عندما تعمل تحت ظروف مُعيّنة قصوى محددة من جانب مُصنّع تلك الوحدات. القدرة الممكّنة هي الإنتاج الأقصى المقدر الذي يُمكن توقعه من وحدات توليد الكهرباء مع الأخذ بعين الاعتبار الظروف الفعلية في محطات الكهرباء. القدرة المفقودة بسبب الظروف المحيطة هي الفارق بين القدرة الاسمية والقدرة الممكّنة، انها ليست فئة في التقارير لكنها مُبيّنة هنا للمساعدة في تفسير لماذا القدرة الممكّنة أدنى من القدرة الاسمية. في هذا السياق، تشمل الظروف المحيطة الطقس، ونوع الوقود المستخدم، والظروف المادية في المحطة، والعوامل الأخرى التي تحدّ من إنتاج الوحدات. القدرة المتوفرة والعوامل الأخرى التي تحدّ من الإنتاج ليست هي أيضاً فئة في تلك التقارير؛ انها الكمية التي تبقى بعد طرح الكمية المنتجة من القدرة المتوفرة. العامل المرشح أكثر للتسبب بالفارق بين القدرة المتوفرة ومتوسط الإنتاج هو ان الوحدات لا يمكن تشغيلها دائماً بالقدرة الكاملة ولو بحد. مع تقلبات الطلب خلال اليوم، (الذي يبلغ الذروة في

ساعة متأخرة من بعد الظهر)، يرصد مشغلو النظام ويصحّون الإنتاج الفعلي من وحدات التوليد. وهكذا، وفي أي وقت كان، يمكن ان يكون الإنتاج أقرب ما يمكن أو أكثر من القدرة المتوفرة المشار إليها في خط متوسط الإنتاج في الساعة، في هذا الشكل. عندما تجمع الإنتاج اليومي الأقصى من كافة وحدات التوليد، تنخفض الهوة بين القدرة المتوفرة ومتوسط الإنتاج في الساعة. حجم خط الإنتاج الأعلى (إنتاج الذروة) يستند إلى اليوم في كل شهر يكون فيه حجم إنتاج الذروة من محطات الكهرباء في مستواه الأعلى.

المصدر: تحليل المفتش العام اعتماداً على تقارير الأداء اليومي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق.

الشكل ٣٠-٢

متوسط إمدادات الكهرباء العراقية والطلب المقدر، حسب أرباع السنة، ٢٠٠٤/١ - ٢٠١٠/٦ ميغاواط

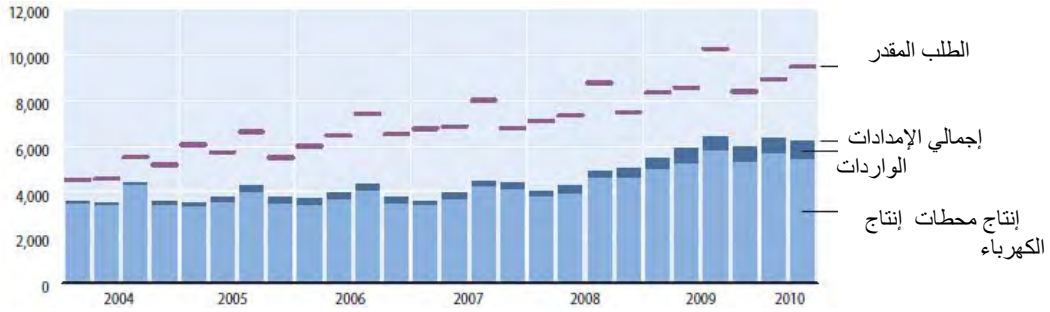

المصادر: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) / ESD، تقارير الأداء اليومي للكهرباء، ٢٠١٠/٦/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠، وزارة الخارجية، تقارير وضعية العراق، ٢٥/١٠/٢٠٠٦، الشريحة ١١، و٢٠٠٧/٥/٩، الشريحة ١١.

بالنسبة لربع السنة الحالي، لبّ الإمداد ٦٦ بالمئة من الطلب المقدر -
أدنى من نسبة ال ٧١ بالمئة في ربع السنة المنصرم ومن نسبة ال ٦٨
بالمئة في ربع السنة نفسه من العام المنصرم.

اللاتوازن بين الإمداد والطلب

في الوقت الذي كان فيه إمداد الكهرباء في حزيران/يونيو عند الذروة، كان الطلب كذلك، مرتفعاً إلى ما يقدر بـ ١٠,٨٠٠ ميغاواط (٢٥٩,٢٢٢ ميغاواط/ساعة في اليوم)، جزئياً، بسبب الارتفاع الموسمي لدرجات الحرارة. نتيجة لذلك، لبّ إمداد حزيران/يونيو ٦٢ بالمئة من الطلب المقدر. استناداً إلى بيانات وزارة الكهرباء، كان متوسط الطلب خلال كامل ربع السنة ٩,٤٤١ ميغاواط، أي بزيادة ٦ بالمئة عن ربع السنة المنصرم، ولكن حوالي ٨ بالمئة أدنى من الرقم القياسي ربع السنوي البالغ ١٠,٢٢٧ ميغاواط في تموز/يوليو - أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩. بالنسبة لربع السنة، لبّ الإمداد ٦٦ بالمئة من الطلب المقدر - أدنى من نسبة ال ٧١ بالمئة في ربع السنة الأخير ومن نسبة ال ٦٨ بالمئة في ربع السنة نفسه من العام المنصرم. (٣٨٢) بسبب اللاتوازن بين الإمداد والطلب، ذُكر ان عدة مناطق في العراق تلقت فقط أربع ساعات من الكهرباء في اليوم.

العديد من العراقيين لا قدرة لهم على استخدام مولدات كهرباء خاصة لتكملة الإمداد المحدود من الكهرباء الذي يصلهم من الشبكة، أما الذين لديهم مولدات، فيجدون صعوبة في العثور على الوقود. في جنوب العراق، حيث بدأت درجة الحرارة في حزيران/يونيو تصل إلى ١٢٠ درجة فهرنهايت أو أكثر، أثار النقص في الكهرباء ومياه الشرب احتجاجات غاضبة ورشق بالحجارة.

في ١٩ حزيران/يونيو، قتلت قوات الأمن متظاهرين في البصرة وجرحت اثنين آخرين. بعدها بيومين، في الناصرية، أصيب ١٤ شخصاً على الأقل بجروح. في نفس اليوم، قدم وزير الكهرباء استقالته. في ٢٢ حزيران/يونيو، عُيّن وزير النفط، الشهرستاني، وزيراً للكهرباء بالوكالة^(٣٨٣)، وأعلن لاحقاً أنه سوف يضع حداً لامتيازات الكهرباء الخاصة للمسؤولين الحكوميين في بغداد وأنه أمر بزيادة الإنتاج في عدة محطات لإنتاج الكهرباء.^(٣٨٤)

للاطلاع على المتوسط الشهري للإنتاج المحلي والواردات، بالنسبة للطلب المقدر، منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤، أنظر الشكل ٢-٣٠.

الهجمات على البنية التحتية للكهرباء

عدد الهجمات على خطوط نقل الكهرباء ازداد "بحسب التقارير" ثمانية أضعاف خلال ربع السنة الحالي، من ٢ في الفترة الزمنية كانون الثاني/يناير - آذار/مارس إلى ١٦ في نيسان/إبريل - حزيران/يونيو. ألحقت أجهزة تفجير مرتجلة أضراراً بـ ١٨ برج نقل وسببت سقوط ١٤ منها، لكن وبحسب القوات الأميركية في العراق، كان لهذه الهجمات أثر في حده الأدنى أو لا أثر على توفر الإمداد على الشبكة القومية. كافة هذه الهجمات حصلت في العراق الأوسط والشمال مع حدوث نصفها في محافظتي نينوى وصلاح الدين. (أنظر الشكل ٢-٣١).^(٣٨٥)

الجهود لزيادة قدرة الإنتاج

لقد منحت وزارة الكهرباء الآن عقود للهندسة، والمشتريات، والإنشاء (EPC) لكافة مواقع محطات إنتاج الكهرباء المترافقة مع "صفقة المسار السريع" (Fast Track Deal) المعقودة مع جنرال إلكتريك (GE). هذه المحطات مخططة لتاجي، والحلة، وكربلاء وسيكون لها قدرة شركة اسمية مجتمعة تبلغ ٦٦٠ ميغاواط. وفقاً للسفارة الأميركية في بغداد، تقوم وزارة الكهرباء بالدفع الجاري إلى جنرال إلكتريك لثمانية توربينات إشعال، كما ان كتاب الاعتماد لعقود الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) لموقع تاجي ممول بنسبة ٥٠ بالمئة وكتاب الاعتماد للموقعين الآخرين هما في طور التمويل. يتوقع ان يبدأ العمل في موقع تاجي قريباً.^(٣٨٦)

الشكل ٢-٣١

الهجمات على خطوط نقل الكهرباء، ٢٠١٠/٤/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠



المصدر: استجابة القوات الأميركية في العراق لطلب المقتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١

التمويل جار أيضاً لمشتريات "الصفقة الكبرى" (Mega Deal) من التوربينات من جنرال إلكتريك (٥٦ توربين تصل قدرتها الاسمية الإجمالية إلى ٧٠٠٠ ميغاواط) والمشتريات المنفصلة من سيمنز (١٦ توربين بقدرة إجمالية تبلغ ٣١٦٠ ميغاواط). غير ان عملية وزارة الكهرباء لانتقاء مقاولي عقود الهندسة والمشتريات والإنشاء (EPC) لهذه المشاريع لا تزال متأخرة عن موعدها.^(٣٨٧)

لقد حددت وزارة الكهرباء الآن أي من مواقع "الصفقة الكبرى" أي من مواقع جنرال إلكتريك وسيمنز ستخطط لتسليمها إلى منتجين مستقلين للكهرباء (IPPs)، لكنها لم تمنح حتى الآن أية عقود إلى منتجين مستقلين للكهرباء. لقد تلقت اللجنة الوطنية للاستثمار (NIC) ووزارة الكهرباء خطابات اهتمام من منتجين مستقلين للكهرباء محتملين، كما صدرت في ٢١ حزيران/يونيو مناقصة لثمانية مواقع إلى مقدمي عروض مؤهلين مسبقاً. مؤتمر مقدمي العروض حول مناقصة المنتجين المستقلين للكهرباء المقرر في ٧ و ٨ تموز/يوليو ألغي. بدلاً من ذلك، نظمت وزارة الكهرباء ورشة عمل في ١٠ تموز/يوليو ٢٠١٠ لأجل تفسير التغييرات التي يجري إدخالها على مناقصة المنتجين المستقلين للكهرباء. وبحسب ما أكده نائب الوزير، سلام كزاز، سوف يجري تحديد العملية بصورة أكثر اكتمالاً في أواخر الصيف.^(٣٨٨)

المشاريع الممولة من الولايات المتحدة التي أنجزت مؤخراً أو الجاري تنفيذها ذكر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) ان إعادة تأهيل المحطة الفرعية ١٣٢ كيلو فولت في الفلوجة أنجزت في حزيران/يونيو، حوالي ثلاث سنوات بعد تاريخ الإنجاز المخطط لها أصلاً. كلف المشروع ١٦ مليون دولار وتم تمويله من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF). بالإجمال، تم إنجاز ١٤ مشروع كهرباء بقيمة إجمالية بلغت حوالي ٢٢ مليون دولار، خلال ربع السنة الحالي. المشروع الثاني الأكبر المنجز قدم معدات الاختبار والإصلاح لورشة

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

إصلاح المحوّلات لوزارة الكهرباء بكلفة ١,٩ مليون دولار (من أموال صندوق دعم الاقتصاد (ESF)). المشاريع الـ ١٢ الأخرى تم تمويلها من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، وكان متوسط قيمة هذه المشاريع حوالي ٣٣٨,٠٠٠ دولار وكلفت جميعها أقل من ٥٠٠,٠٠٠ دولار. (٣٨٩)

لقد حددت وزارة الكهرباء الآن أي من مواقع "الصفقة الكبرى" العائدة لجنرال إلكتروك وسيمنز تخطط لتسليمها إلى منتجين مستقلين للكهرباء

في أيار/مايو، ذكر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) انه سلم آخر اثنتين من ست محطات تحويل نقالة ١١/٣٣ كيلو فولت إلى وزارة الكهرباء في محافظة الأنبار. حوالي ١٠ ملايين دولار من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) تم إنفاقها على هذه الوحدات الست القادرة كل واحدة منها على توزيع الكهرباء على ٣٠٠٠ منزل. (٣٩٠) أول أربع محطات تحويل سُلمت في ٢٠٠٨، وفي عملية تفتيش أجراها في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٩، وجد المفتش العام محطات التحويل موضوعة خارج مستودع لوزارة الكهرباء في الرمادي وهي غير مستخدمة. (٣٩١) ذكرت السفارة الأميركية في بغداد ان اثنتين من هذه المحطات أصبحت في الخدمة الآن (في السقلاوية والفلوجة) وان اثنتين من المبرمج ان توضع في الخدمة لاحقاً هذا الصيف (في حديثة وإسكان) وان الاثنتين المتبقيتين سوف يتم تركيبها في أماكن لم تحدد بعد. (٣٩٢) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) أدرج تسليم محطات التحويل لسنة مشاريع منفصلة وقد أُشير انها أنجزت جميعها في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. (٣٩٣)

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان هناك ٤٩ مشروع كهرباء بقيمة مجمعة تبلغ حوالي ١٤٤ مليون دولار قيد التنفيذ. (٣٩٤) الجدول ٢-١٩ يقدم وضعية المشاريع الخمسة الكبرى الجاري تنفيذها.

الجدول ٢-١٩
مشاريع الكهرباء الجاري تنفيذها الممولة من الولايات المتحدة

عنوان المشروع	الكلفة	مصدر التمويل	المحافظة	الإنجاز المتوقع	الوضعية
ET/ET-900 محطة التحويل ١٣٢ كيلو فولت بجميلة، الفارابي	٥٢,٣	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	بغداد	٢٠١٠/٧	هذا المشروع القائم على أساس تسليم المفتاح لإنشاء محطتي تحويل في مدينة الصدر كان منجزاً بنسبة ٩٩ بالمئة في نهاية ربيع السنة. عندما منح العقد في تموز/يوليو ٢٠٠٦، كان تاريخ الإنجاز المخطط له ٢٠٠٧/٧/٢٦.
ET/ET-900 محطة التحويل ١٣٢ كيلو فولت بالرمادي	٣١,٥	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	الأنبار	٢٠١٠/٨	إنشاء محطة التحويل التي كانت مصممة لخدمة كامل مدينة الرمادي متأخر عن مواعده. مُنح العقد في ٢٠٠٦/٨ مع الإنجاز المخطط في ٢٠٠٧/٩. يعمل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي مع وزارة الكهرباء لتأمين التدريب في مكان العمل.

الجدول ١٩-٢ (تابع)

عنوان المشروع	الكلفة	مصدر التمويل	المحافظة	الإنتاج المتوقع	الوضعية
شراء قطع غيار جنرال الكتريك الطارئة	٧,٥	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	بابل	٢٠١٠/٩	مُنح العقد في ٢٠١٠/٥/٢٢ لتزويد وتسليم قطع غيار طارئة ومعدات للاستخدام الوقائي والطارئ في محطة إنتاج الكهرباء العاملة على الغاز في المُسيب.
مول صندوق دعم الاقتصاد خط ٣٢ كيلو فولت لنقل الكهرباء إلى العباسية والحرية	٥,٩	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	النجف	٢٠١٠/٧	هذا المشروع لإنشاء خطوط النقل الهوائية وتحت الأرض كان منجزاً ٩٩% في نهاية ربع السنة. ذكر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي ان هناك خلاف مع وزارة الكهرباء يتعلق بالتنشغيل النهائي للخط عند نهايته في النجف. لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي مخاوف حول ممارسات السلامة لدى المقاول.
منحة لتحضير وحدتي المسبب ٩ و ١٠ للتنشغيل	٤,٣	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	بابل	٢٠١٠/١٢	مُنح عقد في ٢٠١٠/٦/٢ لتحضير وبدء تشغيل توربينين إشعال جنرال الكتريك LM6000 ٥٠ ميغا واط في محطة إنتاج كهرباء المسيب العاملة على الغاز. سوف يقدم المشروع أيضاً الإدارة، والخبرات الفنية، وقطع الغيار، وتدريب موظفي وزارة الكهرباء.

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، المعيار العالمي، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٣.

المياه والصرف الصحي

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ٢,٨٥ مليار دولار، والزمتم ٢,٦٩ مليار دولار، وأنفقت ٢,٦١ مليار دولار لإعادة تأهيل قطاعات المياه والصرف الصحي في العراق^(٣٩٥). وفقاً للسفارة الأميركية في بغداد، توفر مشاريع المياه الممولة من الولايات المتحدة ما مجموعه ٢,٤٥ مليون متر مكعب من مياه الشرب في اليوم وتخدم ٩٨ بالمئة من أصل ٩ ملايين عراقي حصلوا على إمكانية الوصول إلى مياه الشرب منذ ٢٠٠٣. مشاريع المجاري الصحية الممولة من الولايات المتحدة مكنت معالجة ١,٢ مليون متر مكعب من مياه الصرف الصحي كل يوم، أي ما يبلغ ٤٦ بالمئة من كافة مياه الصرف المعالجة، والمستفيد منها ٥,٣ مليون إنسان^(٣٩٦). ذكرت وزارة الدفاع ان حوالي ٢٢ مليون عراقي لهم الآن إمكانية الوصول إلى مياه الشرب من أصل ١٣ مليار عراقي في ٢٠٠٣، وان أكثر من ١١,٥ مليون عراقي أصبح لهم الآن إمكانية وصول إلى معالجة مياه الصرف، مقابل ٦,٢ مليون إنسان سنة ٢٠٠٣^(٣٩٧).

وفقاً للسفارة الأميركية في بغداد، مشاريع المياه الممولة من الولايات المتحدة تخدم ٩٨% من أصل ٩ ملايين عراقي كسبوا إمكانية الوصول إلى مياه الشرب منذ العام ٢٠٠٣.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

ذكرت السفارة الأميركية في بغداد انه يتوقع ان يتلقى ٣٢٧،٥٠٠ عراقي إضافي مياه الشرب عندما تنتجز مشاريع المياه الجاري تنفيذها الممولة من الولايات المتحدة. أما مشاريع المجاري الصحية الأميركية الجاري تنفيذها فمن المتوقع ان تخدم ٣٩،٠٠٠ عراقي إضافي عند إنجازها.^(٣٩٨)



وحدة نموذجية لمعالجة المياه متواجدة في محافظة البصرة.

ذكرت وزارة الدفاع الأميركية ان وزارة البلديات والأشغال العامة العراقية وهيئة المياه في بغداد طبقاً لعمليات معالجة المياه التي ساعدت في حماية العراقيين من الكوليرا كما لم يظهر أي تفش للمرض منذ أواخر العام ٢٠٠٨. إضافة إلى ذلك، باشرت الوزارة بمشاريع لإنشاء بنية تحتية للمياه ومياه الصرف الصحي، وتركيب وحدات معالجة، وتصليح الشبكات، والمباشرة ببرامج اختبار لنقاط الاستخدام.^(٣٩٩)

لا زال الوصول غير الكافي للمياه لأجل الاستخدام الأسري والزراعي مُزمنًا، وبنوع خاص في المناطق الريفية ومناطق البلاد التي لا تزال تعاني من الجفاف^(٤٠٠). أنظمة التوزيع المدمرة، والمشاكل الإدارية، والتراجع الحاد في مستويات خزانات المياه تواصل عرقلة توفّر مياه الشرب.^(٤٠١)

في محافظة الأنبار، خُفض بناء السدود في القسم الأعلى من نهر الفرات في سوريا وتركيا، تدفق المياه من النهر إلى ٢٩٠ متر مكعب في الثانية، وهو أدنى مستوى منذ ست سنوات. ولم يتعدى التدفق ١٠٠٠ متر مكعب في الثانية سوى مرة واحدة. لمعالجة هذه المشكلة، وظفت فرقة إعادة إعمار محافظة الأنبار ٣ ملايين دولار لتعديل ١١٣ من منشآت مأخذ للمياه على طول النهر. وتوظف فرقة إعادة إعمار المحافظات وحكومة المحافظة أيضاً ٧ ملايين دولار لإنشاء تسعة مرافق جديدة مصغرة لمعالجة المياه.^(٤٠٢)

أحد أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) هو خفض نسبة الناس الذين ليس لديهم وصول مستدام إلى مياه الشرب الآمنة والصرف الصحي الأساسي بمعدل النصف

بحلول ٢٠٢٠. وتسعى الأمم المتحدة أيضاً إلى إنشاء استراتيجية قومية للإدارة المستدامة للمياه بحلول ٢٠١٤^(٤٠٣). بالنسبة لنظرة عامة حول مقاييس إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية وأهدافها المتعلقة بمياه الشرب والصرف الصحي، وقضايا المياه الأخرى، أنظر الجدول ٢-٢٠.

المشاريع المنجزة مؤخراً أو الجاري تنفيذها الممولة من الولايات المتحدة
خلال ربع السنة هذا، تم إنجاز تسعة مشاريع مياه ومياه صرف صحي ممولة من الولايات المتحدة بكلفة إجمالية قدرها ٥ ملايين دولار. كان أكبرها مشروع بقيمة ١,١ مليون دولار ممول من صندوق دعم الاقتصاد لتوسعة شبكة لتوزيع المياه في السليمانية. وتم تمويل مشروعين آخرين من صندوق دعم الاقتصاد، وتم تمويل خمسة مشاريع من صندوق الاستجابة الطارئة للقائد^(٤٠٤).

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان هناك ١٥٠ مشروع مياه ممول من الولايات المتحدة مقدرة بأكثر من ٢١٦ مليون دولار قيد التنفيذ.

أنظمة التوزيع المدمرة، والمشاكل الإدارية، والتراجع الحاد في مستويات خزانات المياه تواصل عرقلة توفر مياه الشرب.

تم تمويل ثلاثة أرباع تلك المشاريع تقريباً من جانب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، لكنها، بكلفة متوسطة اقل من ٣٠٠,٠٠٠ دولار، تمثل ١٥ بالمئة من إجمالي كلفة المشاريع الجاري تنفيذها. بكلفة مجمعة قدرها ١٠٦ مليون دولار، يُشكّل ١٢ مشروعاً ممولاً من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق حوالي نصف كلفة المشاريع الجاري تنفيذها. المشاريع الـ ٢٧ المتبقية ممولة من صندوق دعم الاقتصاد^(٤٠٥). بالنسبة لنظرة إجمالية حول مشاريع للمياه منتقاة قيد التنفيذ ممولة من الولايات المتحدة، أنظر الجدول ٢-٢١.

الجدول ٢-٢٠
أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) للمياه

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
النسبة المئوية لمياه الصرف المعالجة	٢٥% (٢٠٠٩)	٤٠%
الخطة القومية المصممة والمطبقة لتخفيف آثار الجفاف	لا (٢٠٠٩)	نعم
النسبة المئوية للأسر التي تستخدم مصادر مياه شرب محسنة	٧٩,٢% (٢٠٠٩)	٨٧%
النسبة المئوية للأسر التي لديها مرافق للصرف الصحي محسنة	٩٢,٣% (٢٠٠٩)	الوثيقة الفنية للخط القاعدي (TBD)
النسبة المئوية للأسر التي لديها مرافق للتخلص من النفايات الصلبة	٤٥% (٢٠٠٩)	٧٥%
استراتيجية قومية تشاركية نصف فصلية متفق عليها وممولة بصورة كافية للإدارة المستدامة للموارد المائية.	صفر (٢٠٠٩)	١

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الجدول ٢-٢٠ (تابع)

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
الهيكلية ما بين الوزارات حول الموارد المائية العابرة للحدود التي أقيمت بمشاركة الأمم المتحدة	لا (٢٠٠٩)	نعم
عدد المختبرات التي ترصد جودة المياه والتي تم تحسين مستواها	صفر (٢٠٠٩)	٧
النسبة المئوية لمخصصات الموازنات المحلية المنفقة على الخدمات الضرورية الأساسية	الوثيقة الفنية للخط القاعدي (٢٠٠٩)	١٠٠

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، ٢٠١٤/٢/١١، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقاييس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) ص ص ٤٣-٥٩.

الجدول ٢-٢١

مشاريع المياه ومياه الصرف المنتقاة الممولة من الولايات المتحدة والجاري تنفيذها بملايين الدولارات

عنوان المشروع	الكلفة	مصدر التمويل	المحافظة	تاريخ الإنجاز	الوضعية
تصريف مياه شرق الفرات	٣٨,٥	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	المتنى	٢٠١٠/٢٠	بوشر هذا المشروع سنة ٢٠٠٦ لاستصلاح أكثر من ٥٨,٠٠٠ هكتار من الأراضي الزراعية. شمل المشروع إنشاء قناة بطول ٤٤ كيلو متر يشمل ١٦ إنبوب ري و٣ أنابيب نفط و٧ نقاط عبور لأنابيب الشرب، و٤ جسور للمشاة و٤ جسور للسيارات، وبناء مدرسة ابتدائية جديدة تحل محل المدرسة القديمة التي نقلت من مكانها جراء المشروع. يتوقع أن ينتهي المشروع بعد حوالي ٢١ شهراً من موعده الأصلي المخطط للإنجاز.
نظام المجاري الصحية في الفلوجة، محطة معالجة المياه ومياه الصرف	٣١,٧	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	الأنبار	٢٠١٠/٨	منح هذا العقد لتصميم وبناء وتسليم محطة معالجة المياه هذه سنة ٢٠٠٦. المشروع منجز بنسبة ٩٥ بالمئة لكن بتأخير ثلاث سنوات عن الموعد المبرمج. التكاليف ازدادت بنسبة ٢٦ بالمئة.
مشروع إمدادات المياه في مشكاب	٢٣,١	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)	النجف	٢٠١٠/١٠	هذا المشروع لتصميم وبناء محطة جديدة لمعالجة المياه الذي كان مخططاً للإنجاز في نيسان/أبريل ٢٠٠٩ منجز بنسبة ٩٥ بالمئة. يبدو ان موعد الإنجاز المبرمج قد تأجل من جديد، من حزيران/يونيو ٢٠١٠ إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠.
شبكة العباس للصرف الصحي	١٢,٠	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	البصرة	٢٠١٠/١٢	تركيب ٢٦ كيلو متر من أنابيب تجميع الصرف الصحي ومضختي ضخ أنجزت بنسبة ٦٨ بالمئة ويبدو انه سوف ينجز في الموعد المحدد.

الجدول ٢-٢١ (تابع)

عنوان المشروع	الكلفة	مصدر التمويل	المحافظة	تاريخ الإنجاز	الوضعية
شبكة القبلة للمجري الصحية وتصريف مياه الأمطار	١٢,٤	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	البصرة	٢٠١١/٣	المشروع منجز بنسبة ٤٢ بالمئة وهو متأخر بما يقدر بستة أشهر عن الموعد المحدد.
التغذية الاستراتيجية لمياه الغرمة	١٠,٩	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	البصرة	٢٠١٠/٨	مشروع رفع مستوى نظام معالجة المياه متأخر ١٥ شهراً عن الموعد الأصلي المبرمج لكنه منجز بنسبة ٩٩ بالمئة. تأجل العمل بسبب مشاكل مع الطاقة الكهربائية المزودة للموقع لكن ذكر ان المشاكل قد صححت.
برنامج التشغيل والصيانة المتكامل لشبكة المياه في دوكان –السليمانية	٩,٣	صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	السليمانية	٢٠١٠/٩	من خلال إنشاء حزمة شاملة للتشغيل والصيانة لاجل زيادة عمر البنية التحتية وتحسين استدامة النظام التشغيلي، يهدف هذا المشروع إلى ضمان ان تتلقى مدينة السليمانية الإمدادات الكافية من مياه الشرب الآمنة. تأجل العمل لان المقاول لم يطلب قطع الغيار الضرورية.
محطة ضخ مياه المجاري الصحية في الفلوجة F1 وF2	٧,٢	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)	الأنبار	٢٠١٠/٨	نطاق هذا المشروع يشمل إنشاء نظام لثلاث محطات ضخ لمياه الصرف الصحي.

للمصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤. كلفة الأشغال الإجمالية في نظام معالجة مياه الصرف في الفلوجة مقدر ب ٩٨ مليون دولار، المشاريع المتضمنة هنا مكونات لإجمالي الجهود.

النقل والاتصالات

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ١,٢٠ مليار دولار، والزمتم ١,١٤ مليار دولار وأنفقت ١,٠٥ مليار دولار لإعادة تأهيل قطاعي النقل والاتصالات في العراق.^(٤٠٦)

الموانئ

حدد إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) هدف جعل كافة الموانئ العراقية في توافق مع المعايير الدولية في سنة ٢٠١٤^(٤٠٧). قوة المهمة المشتركة الأميركية بين الوكالات (JIATF) - وهي تعاون بين وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، ووزارة الأمن الوطني الأميركي (DHS) ووزارة النقل الأميركية (DoT) وفريق قوة المهمة المشتركة بين الوكالات (JIATF) للجمارك والهجرة - التي تهدف إلى جعل ميناء ام قصر العراقي يتناغم مع تلك المعايير عن طريق تبسيط الإجراءات لاستيراد السلع ومعاملة المسافرين^(٤٠٨) غير ان وزارة الدفاع الأميركية ذكرت خلال ربع السنة هذا ان عدد الوزارات العراقية التي تعمل في الميناء يجعل التنسيق الفعال لعمليات الميناء صعباً كما ان الغياب المنتظم للكهرباء يسبب فترات من التعتل عن العمل ويخفض الحركة التجارية. علاوة على ذلك، لا زال هناك نقص خطير في القدرات على اكتشاف المتفجرات، والتي تعمل القوات الأميركية والحكومة العراقية على تحسينه عن طريق شراء

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

تجهيزات معاينة غير اقتحامية من أموال صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) والأموال العراقية^(٤٠٩)

ذكرت اللجنة الوطنية للاستثمار (NIC) أن هناك حاجة إلى مزيد من التدريب على ممارسات تشغيل الموانئ كما ان تحديث مرافق الموانئ لمناولة الحمولات الحالية والمستقبلية سوف يتطلب توظيف ٢٥٠ إلى ٥٠٠ مليون دولار.^(٤١٠) بالنسبة لمواقع الموانئ العراقية، انظر الشكل ٢-٣٢.

الشكل ٢-٣٢

الموانئ الرئيسية في العراق



المصدر: قائد القيادة الوسطى للقوات البحرية الأمريكية، "موجز حول ميناء ام قصر"، مؤتمر مارلو، ٢٠٠٩/١٢/١٣، الشريحة ١٢.

ميناء أم قصر

استمر إنشاء مشروع الرصيف والجدار البحري الممول من الحكومة العراقية بقيمة ٥٣ مليون دولار خلال ربع السنة الحالي. ذكر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي ان المقاول يدير حالياً مرافق الخدمات العامة للرصيف ويعمل على إنشاء طريق من الخرسانة المسلحة التي باتت منجزة بنسبة ٧٨ بالمئة. تعود المخاطر الخاصة بالسلامة، التي ذكرت خلال ربع السنة الماضي، إلى كون السفن البحرية العراقية كانت تمر عبر موقع الإنشاء، ولم تعد تشكل مشكلة خلال ربع السنة الحالي.^(٤١١)

كجزء من جهوده لجعل الموانئ العراقية تتوافق مع المعايير الدولية، ركزت قوة المهمة المشتركة بين الوكالات (JIATF) جزئياً على تقديم الدعم للعراقيين في أم قصر في نفس الوقت الذي يعملون فيه على تحسين تفتيش الحاويات المشتبه بحملها مواد مهربية، مثل السيارات المخبأة أحياناً كثيرة خلف جدران زائفة أو داخل صناديق معبأة بكثافة. يأمل فريق المهمة أيضاً بتركيب برامج كمبيوتر تساعد العراقيين في تعقب الشحنات والمدفوعات، لكن الخطة تتطلب رفع مستوى شبكة الأسلاك الكهربائية ومن ثم توفير خدمات الإنترنت والتدريب عليها.^(٤١٢)

ميناء الفاو

ميناء الفاو، حيث أعلن كونسورتيوم أعمال إيطالي خلال ربع السنة الماضية انه يخطط لبدء الإنشاء. قد يصبح أكبر ميناء عراقي. يخطط الكونسورتيوم لإنشاء مرفق مؤلف من فئة رصيف

تحميل في هذا الميناء الواقع في أقصى الجنوب. أعلن وزير النقل العراقي خلال ربع السنة الحالي ان المبادرة البالغة قيمتها ٤,٦ مليار دولار سوف تكون أكبر مشروع للبنية التحتية في العراق منذ ٣٠ سنة. من المنوي ان يكون المشروع جزءاً من "قناة جافة" مصممة لنقل السلع بين شمال العراق وجنوبه. تخطط المجموعة الإيطالية لتقديم التدريب حول تصميم وإنشاء وإدارة الميناء، وكذلك المساعدة الفنية وتخطيط المناطق الصناعية.^(٤١٣)

الطرق والجسور

وفقاً للجنة الوطنية للاستثمار (NIC)، لدى العراق أكثر من ٤٤,٠٠٠ كلم من الطرق السريعة المرصوفة ونظام واسع من الطرق الريفية غير المرصوفة. معظم الطرق بُنيت في أواخر السبعينات من القرن الماضي مع متوسط عمر يقدر بعشرين سنة وهي الآن بحاجة إلى إعادة التأهيل. تُقدّر اللجنة ان العراق بحاجة إلى أكثر من ٤٠ مليار دولار لإعادة تأهيل او استبدال الطرق القديمة بكلفة مليون دولار للكيلو متر الواحد.^(٤١٤)

المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) كانت قيد التنفيذ في محافظة صلاح الدين خلال ربع السنة هذا وهي تشمل قسمين من الطريق السريع بغداد-كركوك، الأول بقيمة ٧,٩ مليون دولار، والثاني بقيمة ٥,٨ مليون دولار، وجسر الشارقة بكلفة ٨ مليون دولار. طريق بغداد-كركوك السريع، وهو قسم من طريق تمتد لمسافة ٤٠ كيلو متراً مبرمج لإنجازه في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، بتأخير ثلاث سنوات عن الموعد المحدد. جسر الشارقة، الواقع في منطقة زراعية حيث لا يتوفر سوى الحد الأدنى من خدمات العبارات، مبرمجاً لإنجازه في حزيران/يونيو. بدلاً من ذلك، كان قسماً طريق بغداد-كركوك السريع مكتملين بنسبة ٧٥ بالمئة و ٨٥ بالمئة خلال ربع السنة الحالي بينما كان جسر الشارقة منجزاً بنسبة ٧٧ بالمئة.

سكك الحديد

واصلت الحكومة الأميركية خلال ربع السنة الحالي تمويل مشروع إنشاءات يجري تنفيذها في سكة الحديد بما في ذلك التدريب على التشغيل والصيانة لشبكة اتصالات رقمية ميكروية تمتد على طول أكثر من ١٠٠٠ كيلو متر من خطوط سكة الحديد، ومشروع للتحكم بالقطارات قائم على الاتصالات يقع في المحطة المركزية في بغداد. المرحلة الأولى من مشروع التشغيل والصيانة تم تمويله بمبلغ ٨٢٦,٠٠٠ دولار بين أيلول/سبتمبر ٢٠٠٩ وأذار/مارس ٢٠١٠. المرحلة الثانية ممولة بمبلغ ٣,٧١ مليون دولار ومن المتوقع ان يتواصل العمل فيها لغاية آخر أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. إجمالي كلفة المشروع الجديد للنظام الرقمي الذي كان ممولاً أصلاً من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق دعم الاقتصاد بقيمة ٤٣,٥ مليون دولار، يُقدّر ب ٤٨,١ مليون دولار.^(٤١٦)

يوفر مشروع بناء نظام للتحكم بالقطارات قائم على الاتصالات مكتباً مركزياً للإرسال واقع في المحطة المركزية في بغداد، مع لوحة لأجهزة الكمبيوتر والراديوهات على القطارات، وقاعدة بيانات رقمية للمسار، وبطاقات لنقل الإشارات فوراً على طول سكة الحديد. المشروع الممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مُنح في أيار/مايو ٢٠٠٥ ومبرمج للإنجاز في أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ بكلفة ١٧ مليون دولار.^(٤١٧)


واصلت الحكومة العراقية خلال ربع السنة هذا العمل على خطط ذات نطاق واسع لتوسعة مسار سكك الحديد العراقية. وفقاً للحكومة العراقية، أعربت أكثر من ٦٠ شركة أجنبية عن اهتمامها

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

بهذا العمل الذي يشمل بناء خط عالي السرعة حول بغداد (الشكل ٢-٢٣). خلال ربع السنة الحالي، أعلنت الوزارة انها بصدد انتقاء افضل الشركات لهذه العملية.^(٤١٨)

وفقاً للجنة الوطنية للاستثمار (NIC) ولشركة الجمهورية العراقية لسكك الحديد، يواصل العراق مفاوضات متقطعة لإنشاء روابط بواسطة خط لسكة الحديد مع تركيا، والكويت، والمملكة العربية السعودية لاجل إكمال خط سكة الحديدي بين أوروبا والخليج.^(٤١٩)

الشكل ٢-٣٣
خط سكة الحديد المقترح حول بغداد

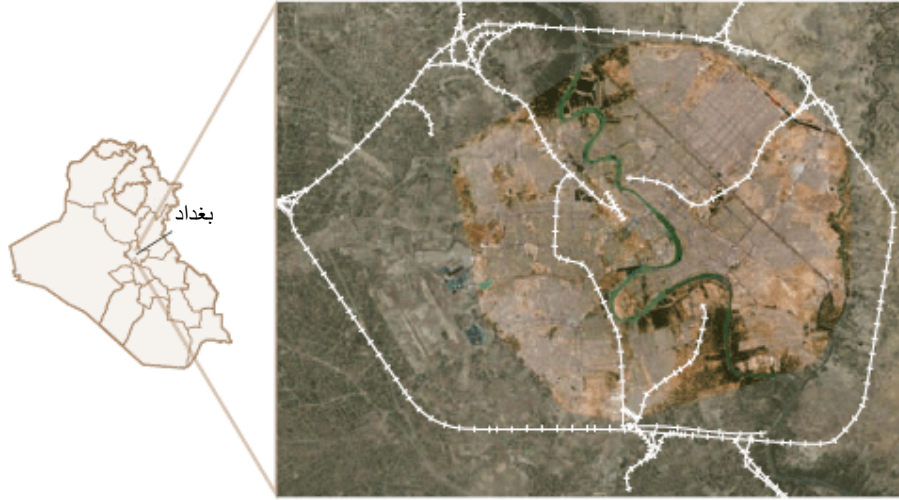

المصدر: الحكومة العراقية، شركة الجمهورية العراقية لسكك الحديد
www.iraqrailways.com/private/prjen.htm، تم التوصل إليه في ٢٠١٠/٦/٢٨.

الطيران

أعلنت الخطوط الجوية العراقية التي تمتلكها الدولة خلال ربع السنة الحالي عن خطط لحل الشركة في غضون ثلاث سنوات بينما تحاول الإدارة درس خيارات الخصخصة^(٤٢٠). في نهاية أيار/مايو، أعلنت وزارة النقل انها ستلغي كافة رحلات الخطوط الجوية العراقية، وهو قرار سوف ينفذ فوراً ويعلن إفلاس الشركة.^(٤٢١)

أعلنت شركة الخطوط الجوية العراقية عن خطط لحل الشركة في غضون ثلاث سنوات بينما تتابع الإدارة درس خيارات الخصخصة.

جاءت هذه الإعلانات في أعقاب محاولة قام بها راسميون كويتيون في لندن لإقناع السلطات البريطانية بمصادرة طائرة تجارية تابعة للخطوط الجوية العراقية حطت في إنكلترا، وهي المرة الأولى التي يحدث ذلك منذ ٢٠ سنة. صادرت السلطات البريطانية مستندات سفر المدير العام للخطوط الجوية العراقية، ومنعته مؤقتاً من مغادرة لندن. تطالب الكويت ب ١,٢ مليار دولار كتعويضات من الشركة الناقلة العراقية ناجمة عن نزاع يعود تاريخه إلى غزو العراق للكويت سنة ١٩٩٠^(٤٢٢). سنة ٢٠٠٤، حصلت الكويت على أمر قضائي من محكمة في بريطانيا ضد

شركة الخطوط الجوية العراقية، وسعت الشركة إلى تجنب الإذعان للحكم عن طريق استئجار الطائرات. قبل أسبوع تقريباً من الحادث، كانت الشركة قد أوصت على ٦٥ طائرة جديدة.^(٤٢٣)

بدأ العراق تحركه نحو خصخصة صناعة الطيران، ومنح السنة الماضية امتيازاً لأول شركة طيران خاصة، خطوط النصر الجوية. بدأت النصر رحلات هذه السنة إلى دبي. تتوقع هيئة الطيران المدني العراقية الموافقة على ثلاث شركات طيران خاصة أخرى بحلول نهاية ٢٠١٢.^(٤٢٤) في هذه الأثناء، أعلنت مزيد من شركات الطيران الأجنبية خططاً لبدء الرحلات إلى بغداد. الخطوط الجوية الاتحاد، الناقل الوطني للإمارات العربية المتحدة، قالت انها قد تبدأ خمس رحلات نظامية في الأسبوع إلى العاصمة العراقية. الطائرة الأولى ذهبت في ٢٧ نيسان/أبريل.^(٤٢٥) الناقل الألمانية دويتشه لوفتهانزا أعلنت انها ستعاود خدمة رحلاتها الأسبوعية من ميونيخ إلى بغداد في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. إعادة إحياء الرحلات ستضع حداً ل ٢٠ سنة من انقطاع للرحلات الجوية من ألمانيا إلى العاصمة العراقية.^(٤٢٦)

تحركت الحكومة العراقية خلال ربع السنة الحالي باتجاه سيطرة أوسع على حركة الطيران مع ١٣ مراقب رادار يديرون حركة مرور الطائرات وفق برنامج تدريب في مكان العمل تشرف عليه شركة أميركية. ويتابع ٢٨ طالب إضافي دورات تدريب للرقابة الجوية.^(٤٢٧) لا تزال القوات الأميركية في العراق تقدم خدمات الرقابة على حركة الطيران (ATC) على ارتفاع دون ٢٤,٠٠٠ قدم، كما ان انتقال هذا المجال الجوي من القوات الأميركية في العراق إلى هيئة الطيران المدني العراقية (ICAA) لا يزال مجدولاً لإتمام الانتقال المحدد بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠١١.^(٤٢٨) وفقاً لوزارة الدفاع، هناك خطة مؤقتة لنقل السيطرة العراقية إلى الطائرات التي تحلق ما فوق ١٥,٠٠٠ قدم بحلول الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠١٠.^(٤٢٩) يقدر ان هيئة الطيران المدني العراقية متأخرة ما بين سنتين وأربع سنوات عن ان يكون لها قوة عاملة عراقية بالكامل للرقابة على حركة الطيران (ATC)، وستين إلى ثلاث سنوات للتقيد بالكامل بقوانين المنظمة الدولية للطيران المدني.^(٤٣٠)

الاتصالات السلكية واللاسلكية

يقدر ان تاريخ إنجاز مركز اتصالات (مبدل) المأمون للهاتف والاتصالات في بغداد سيكون في كانون الثاني/يناير ٢٠١١. هذا المشروع الممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) والذي بوشر به في العام ٢٠٠٦ والمقدرة قيمته بحوالي ٢٣ مليون دولار، تم إيقاف عقد العمل فيه سنة ٢٠٠٨ بسبب غياب التقدم بعد ان تم إنفاق ١٣,٦ مليون دولار. أعيد منح عقد المشروع في تموز/يوليو ٢٠٠٩ مع توقع تاريخ إنجازه في أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، لكن حصلت تأخيرات خلال مرحلة التصميم. خلال ربع السنة الحالي، كان يقدر ان المركز منجز بنسبة ٣٨ بالمئة. يتكون المرفق من ثلاثة مبان: مرآب لموقف السيارات منجز بنسبة ٦٥ بالمئة، مكتب للبريد منجز بنسبة ٥٤ بالمئة، وبرج من سبعة طوابق وواجهة زجاجية منجز بنسبة ٣٣ بالمئة. قيمة المشروع الحالي ١٨,٩ مليون دولار، مما يرفع إجمالي الكلفة إلى ٣٢,٥ مليون دولار.^(٤٣١)

سوف يخدم البرج كمركز أساسي للاتصالات لوزارة الاتصالات العراقية. انه مصمم لاستضافة المعدات اللازمة لتحسين الإرسال اللاسلكي والخليوي، وخطوط الهاتف الأرضية، وخدمات الإنترنت البالغة السرعة لمنطقة بغداد.^(٤٣٢)



صورة بواسطة الأقمار الصناعية لمركز المأمون للاتصالات أخذت في ٣ تموز/يوليو ٢٠١٠.

المبادرات الأخرى للاتصالات السلكية واللاسلكية

في أيار/مايو، وافق مجلس الوزراء على خطة لمنح رخصة وطنية رابعة للهاتف النقال. وفقاً للتقارير، سوف تحتفظ وزارة المواصلات بحصة ٣٥ بالمئة من الشركة صاحبة الرخصة او ان الشركة ستدفع ٣٥ بالمئة من عائدتها للحكومة العراقية كرسوم للترخيص. كانت الوزارة بصدد مناقشة رخصة رابعة كطريقة لمعاقبة حاملي الرخص الحاليين بدعوى انهم خالفوا شروط جودة الخدمة. المزودان الرئيسيان: شركة زين التي تملكها الكويت وآسيا سيل المملوكة من الأكراد تم تغريمهما. الشركة الثالثة، كورك، لم تغرم. في حزيران/يونيو، أعلنت آسيا سل انها تجري تمديد تغطيتها إلى محافظة الانبار، وتتوقع تغطية ٩٠ بالمئة من سكان المحافظة بحلول نهاية السنة.^(٤٣٣)



صورة الفنان لمركز المأمون للاتصالات السلكية واللاسلكية.

عملت السفارة الأميركية في بغداد مع الحكومة العراقية ومجلس النواب لمراجعة التشريعات القائمة ووجدت ان قانوناً جديداً للاتصالات من شأنه ان يؤسس قاعدة للنمو بإدارة القطاع الخاص ولتنمية قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.^(٤٣٤)

نظام الحكم

تواصل البرامج الممولة من الولايات المتحدة دعم تشكيلة متنوعة من النشاطات الهادفة إلى تنمية قدرات العراق في الحكم الذاتي. بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ٧,٦٥ مليار دولار، والزممت ٧,٤٨ مليار دولار وانفقت ٦,٨٢ مليار دولار، بالدرجة الأولى عبر برامج صندوق دعم الاقتصاد، لاجل تنمية قدرات العراق في الحكم على المستويات القومية، والإقليمية، والمحلية^(٤٣٥). بالنسبة للتمويل الأميركي لمشاريع وبرامج نظام الحكم، انظر الشكل ٢-٣٤ والجدول ٢-٢٢.

بلغت النفقات لنظام الحكم الذروة في ٢٠٠٥ و ٢٠٠٨ لكنها بقيت، بخلاف ذلك، ثابتة نسبياً، كما هو مبين في الشكل ٢-٣٥. في سنة ٢٠٠٩، أنفقت الولايات المتحدة على برامج نظام الحكم ضعفي ما أنفقته على مشاريع البنية التحتية والاقتصاد مجتمعة. شكلت برامج نظام الحكم ٧٢ بالمئة من كافة التزامات صناديق إعادة الإعمار الأميركية الرئيسية خلال ربع السنة الحالي و٢٩ بالمئة من النفقات الجديدة^(٤٣٦).

الديمقراطية والمجتمع المدني

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الحكومة الأميركية قد خصصت ٢,٢٣ مليار دولار وألزمت ٢,١٩ مليار دولار وأنفقت أكثر من ١,٩٣ مليار دولار – بالدرجة الأولى عبر برنامج الحكم المحلي وبرنامج عمل المجتمع المدني التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، لتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وبناء قدرات حكومات المحافظات، وتمويل مبادرات بناء المجتمعات الأهلية في أرجاء العراق^(٤٣٧).

الدعم لحكومات المحافظات


منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، ركز برنامج الحكم المحلي المرحلة الثالثة، (LGP-III)، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية على تنمية قدرات حكومات المحافظات على صياغة وتنفيذ الموازنة، والقيام بتنفيذ التواصل الواسع مع عامة الناس، وأداء الوظائف الضرورية الأخرى. ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان عدة محافظات قد حققت أهداف علامات الاهتداء خلال ربع السنة هذا مع دعم من برنامج الحكم المحلي المرحلة الثالثة. انظر الجدول ٢-٢٣ لملخص عن تلك الإنجازات^(٤٣٨). ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية انه تم بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠ إلزام أكثر من ٧٥ بالمئة من مبلغ ٢٤٠ مليون دولار المخصصة لهذا البرنامج. من المبرمج ان ينهي برنامج الحكم المحلي في مرحلته الثالثة عملياته في حزيران/يونيو ٢٠١١^(٤٣٩).

الشكل ٣٤-٢

نظام الحكم: وضعية الأموال في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).

بملايين الدولارات

إلزامات غير منفقة
المجموع: \$٦٦٢,٨

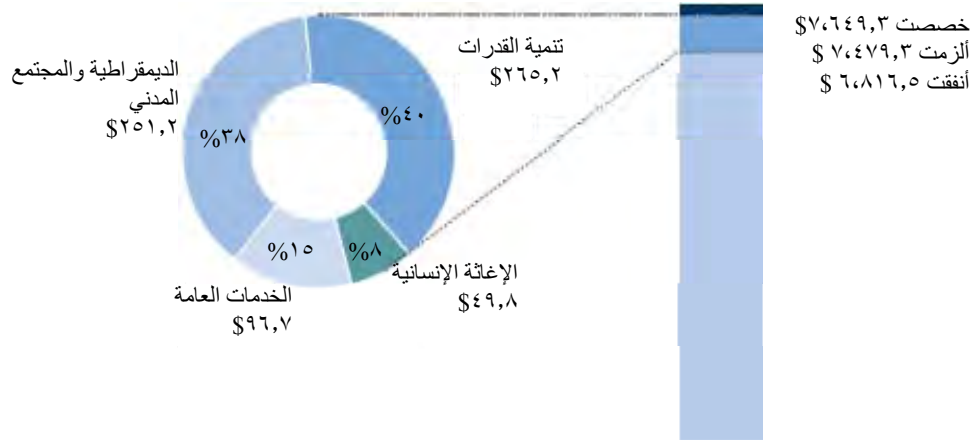

خصصت \$٧,٦٤٩,٣
ألزمت \$٧,٤٧٩,٣
أنفقت \$٦,٨١٦,٥


ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات فئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، القوات الأميركية في العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨.

الشكل ٣٥-٢

نظام الحكم: النفقات الأميركية ربع السنوية، حسب قطاعات إعادة الإعمار

بملايين الدولارات

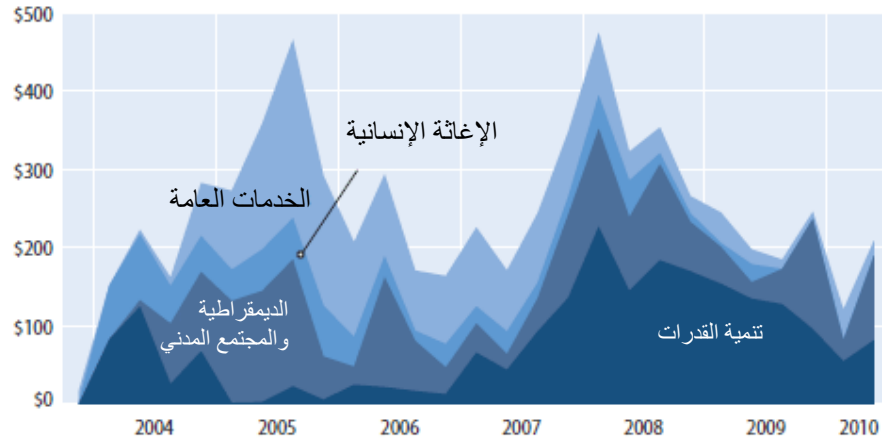

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات فئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره،

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، القوات الأميركية في العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٨، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٨، المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤-٢٠١٠/٤/٣.

الجدول ٢-٢٢

نظام الحكم: وضعية برامج منتقاة

بملايين الدولارات

البرنامج	وضعية الأموال		التغيير ربع السنوي	
	الزمت	أنفقت	أزمت	أنفقت
صندوق الاستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار المحافظات (صندوق دعم الاقتصاد)	٢٦٦,٤	٢٠٩,٦	٥٧,٥ (%٢٨)	٤٥,٨ (%٢٨)
مشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات/فرق إعادة إعمار المحافظات (صندوق دعم الاقتصاد)	٥٤٨,٥	٤٦٨,١	٤٠,٠ (%٨)	٣٢,١ (%٧)
برنامج الحكم المحلي (صندوق دعم الاقتصاد)	٤١٠,٥	٣٤٤,٣	٣,٠ (%١)	٤٩,٨ (%١٧)
برنامج عمل المجتمع الأهلي (صندوق دعم الاقتصاد)	٣٨٨,٩	٣٠٢,٦	٦,٨ (%٢)	٣٤,٤ (%١٣)
العناية الصحية - تحسينات المستشفيات والعيادات على المستوى القومي (صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق)	٤٥٢,٦	٤٤٢,١	١٦,٩ (%٤)	١٧,٩ (%٤)
الديمقراطية والمجتمع المدني (صندوق دعم الاقتصاد)	٢٣٨,٠	١٧٨,٨	٣,٨ (%٢)	٢٣,٢ (%١٥)
أخرى	٥,١٧٤,٥	٤,٨٧١,٠	٨,١ (%٠)	٥,٣ (%٠)
المجموع	٧,٤٧٩,٣	٦,٨١٦,٥	١٣٦,٢ (%٢)	٢٠٨,٦ (%٣)

ملاحظة: البرامج المدرجة في هذا الجدول قد تغيرت على الأقل بنسبة ٥ مليون دولار من الالتزامات والنفقات ربع السنوية مجتمعة. الملحق (ج) يُظهر وضعية كافة البرامج الممولة من جانب الصناديق الأربعة الرئيسية، بما فيها تلك التي في مجال إعادة إعمار نظام الحكم والتي جُمعت في الفئة المسماة "أخرى" هنا. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى التي عثر عليها في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٤/٥، نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، القوات الأميركية في العراق، تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٤/٨، استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢ و ٢٠١٠/٤/١، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣ و ٢٠١٠/٧/٨.

التواصل الواسع مع المجتمعات الأهلية

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نشطة أيضاً على المستوى المحلي عبر برنامج عمل المجتمع الأهلي الثالث (CAP III) الذي يعمل لتوفير الفرصة للمجتمعات الأهلية لتجنييد الموارد لمعالجة الأولويات التي تحددها هذه المجتمعات. يُسهل البرنامج إنشاء وتدريب مجموعات عمل المجتمع الأهلي (CAGs) المسؤولة عن تحديد المشاريع وعن رصد التنفيذ. ويبني البرنامج أيضاً قدرات أدنى مستويات الحكومات المحلية لجذب موارد الحكومة العراقية لتلبية حاجات المجتمعات الأهلية. يساعد أيضاً برنامج عمل المجتمع الأهلي الثالث (CAP III) ضحايا العمليات العسكرية العراقيين عبر موارد صندوق "مارلا روزيكا" لضحايا الحرب، ويقدم التدريب والوظائف والرساميل للشركات الجديدة لمشاريع الأعمال الصغيرة وأنواع المساعدات الأخرى.^(٤٤٠)

الجدول ٢-٢٣

إنجازات برنامج عمل المجتمع الأهلي الثالث، ٢٠١٠/٤/١-٢٠١٠/٦/٣٠

المحافظة	علامات الاهتداء
الانبار، بابل، بغداد، البصرة، ديالى، ميسان، النجف، صلاح الدين	حكومة المحافظة تولت مهمات قانون سلطات المحافظات (PPA) المعهودة اليها.
الانبار، بغداد، البصرة، ديالى، ميسان، النجف، نينوى، صلاح الدين، ذي-قار	قامت مجالس المحافظات بصورة فعالة بالأعمال الرسمية المتعلقة بوظائف قانون سلطات المحافظات
الانبار، بابل، بغداد، البصرة، ديالى، كربلاء، ميسان، المثنى، النجف، نينوى، صلاح الدين	نفذت المحافظات عملية مراجعة ومعانبة لخطط تنمية المحافظات باستخدام عمليات تشاركية
الانبار، بابل، بغداد، البصرة، كربلاء، ميسان، النجف، صلاح الدين، ذي-قار، واسط	أسست المحافظات عمليات وضع الموازنات الرأسمالية بصورة شفافة وشاملة
الانبار، بابل، بغداد، البصرة، ديالى، ميسان، المثنى، النجف، القادسية.	مكاتب المحافظين أدت بصورة فعالة ووظائف الإشراف
الانبار، بابل، بغداد، البصرة، ديالى، ميسان، النجف، صلاح الدين	مجالس المحافظات رصدت بصورة فعالة النشاطات الرئيسية للحكومة العراقية عبر اللجان المختصة

المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٢/٧

الدعم الأميركي والدولي للعملية الانتخابية

عمل برنامج الديمقراطية والمجتمع المدني التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع الحكومة العراقية خلال ربع السنة الحالي لضمان نجاح تنفيذ وإنجاز العملية الانتخابية لمجلس النواب، بما في ذلك جهود الهيئة العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) لضمان ان ينظر الشعب العراقي إلى هذه الانتخابات على انها جديرة بالثقة وشفافة^(٤٤١). واصلت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقديم الدعم التقني لمجلس النواب، وعملت بصورة وثيقة مع أمانة المجلس على تخطيط الانتقال وعلى تطوير برنامج توجيهي للبرلمانيين المنتخبين حديثاً. علاوة على ذلك، عملت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع أعضاء المجتمع الدولي المانحين لتسهيل مزيد من تنسيق النشاطات دعماً لمجلس النواب الجديد.^(٤٤٢)

ونظم مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) التابع لوزارة الخارجية الأميركية برامج لدعم الديمقراطية، وإرساء حكم القانون، وتنمية قدرات نظام الحكم في العراق. خلال ربع السنة الحالي، اصدر المفتش العام تدقيقاً راجع فيه هبة بقيمة ٥٠ مليون دولار من وزارة الخارجية الأميركية إلى المعهد الجمهوري الدولي (IRI) تشجع تطوير الأحزاب السياسية القابلة للحياة، ومنظمات المجتمع المدني وشبكات دعم الحكومة العراقية عبر التدريب وبعثات الدراسة، والدعم المادي للشركاء ومبادرات أخرى. حدّد المفتش العام ان ضعف إشراف وزارة الخارجية

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

والتقيد غير الكافي للمعهد الجمهوري الدولي بالشروط الفدرالية تركت الحكومة الأميركية عرضة لمدفوعات زائدة ولم تترك للحكومة المعلومات الكافية لتحديد ما الذي تحقق بالضبط، غير تنظيم ٢٧١ جلسة تدريب لأكثر من ٥٠٠٠ عراقي مشارك على مدى سنتين.^(٤٤٣) انظر القسم ٣ لمزيد من المعلومات حول هذا التدقيق.

مع تراجع المساعدة الأميركية للعراق تدريجياً خلال السنوات القادمة، يتوقع ان تلعب الموارد الدولية دوراً بارزاً أكثر من أي وقت مضى في دعم المؤسسات الديمقراطية للحكومة العراقية. إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) هو أحد الأمثلة للدور المتزايد للمجتمع الدولي في قطاع نظام الحكم في العراق. فكما يظهر ذلك من الجدول ٢-٢٤، هناك خمسة مقاييس وأهداف لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية على صلة بالانتخابات المحلية والقومية. وللمقارنة، فإن مشاركة الناخبين في الانتخابات القومية في العراق، في ٧ آذار/مارس ٢٠١٠، كانت بنسبة حوالي ٦٢ بالمئة، وان ٨٢ مقعداً من أصل ٣٢٥ مقعداً في مجلس النواب هي للنساء حالياً.^(٤٤٤)

الجدول ٢-٤

أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) للاقتراع والانتخابات

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
نسبة المقترعين في انتخابات المحافظات	٥١% (٢٠٠٩)	٥٥%
لدى الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سجل دائم للناخبين مع إجراءات وقائية لمنع التزوير، وآلية لإدخال جميع العراقيين في الانتخابات.	لا (٢٠٠٩)	نعم
النسبة المئوية للنساء اللواتي انُخبِن لمجالس المحافظات	٢٦% (٢٠٠٩)	٣٠%
النسبة المئوية للنساء النائبات، وللنساء الوظائف الكبيرة والمديرات العامات	٢٢,٤% (٢٠٠٩)	٣٠%
النسبة المئوية للمهجرين الذين شاركوا في الانتخابات	الوثيقة الفنية للخط القاعدي (٢٠٠٩)	٦٠%

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، العراق، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقاييس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، ص ص ٤٣-٥٩.

تنمية القدرات

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الحكومة الأميركية قد خصصت ٢,٤٨ مليار دولار والزمّت قرابة ٢,٤٠ مليار دولار وأنفقت ٢,١٣ مليار دولار، بالدرجة الأولى عبر برامج صندوق دعم الاقتصاد لاجل تنمية قدرات العراق على الحكم على المستويات القومية والإقليمية والمحلية.^(٤٤٥) انظر الجدول ٢-٢٥ للاطلاع على مقاييس وأهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) التي سترشد المساعدات الدولية لاجل تحقيق المزيد من تنمية قدرات نظام الحكم في العراق لغاية آخر ٢٠١٤.

ضعف إشراف وزارة الخارجية والتقيد غير الكافي للمعهد الجمهوري الدولي بالشروط الفدرالية تركت الحكومة الأميركية عرضة لمدفوعات زائدة ولم تتوفر لها المعلومات الكافية لتحديد ما الذي تحقق بالضبط

التنمية الوطنية

برنامجان منفصلان، واحد تديره الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والثاني تديره وزارة الخارجية، يواصلان تنمية القدرات على المستوى الوطني:

- برنامج تنمية القدرات الوزارية (MCD) يشرف عليه مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) التابع لوزارة الخارجية. بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان لدى برنامج تنمية القدرات الوزارية (MCD) ثلاثة عقود نشطة. كان العقد الأكبر مشروعاً بقيمة ٥ ملايين دولار لدعم وزارة الكهرباء، منجز بنسبة ٥٠ بالمئة تقريباً. يقدم المشروع الثاني المقدر بحوالي مليوني دولار الخبراء والمستشارين إلى وزارة النقل، وحوالي نصف تمويله قد انفق. المبادرة الثالثة هي عبارة عن مشروع هبة بقيمة ٣٥٩,٠٠٠ دولار لتقديم التدريب على مهارات اللغة الإنكليزية، ومهارات البروتوكولات الحكومية، وكتابة الأبحاث والسياسات لمكتب نائب رئيس الوزراء (خدمات) والى مركز التخطيط المشترك تحت قيادة لجنة الأمن الوطني.^(٤٤٦)

الجدول ٢-٢٥

أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) لتنمية القدرات

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
تأسيس لجنة الخدمات العامة	لا (٢٠٠٩)	نعم
تبنى استراتيجية تحديث القطاع العام	لا (٢٠٠٩)	نعم
تبنى استراتيجية شاملة لاصلاح الخدمة المدنية	لا (٢٠٠٩)	نعم
النسبة المئوية للمحافظات التي تنشر رسمياً العقود والمناقصات	صفر (٢٠٠٩)	٦٠%
النسبة المئوية للمحافظات التي تنشر الموازنات والأصول	٢٠% (٢٠٠٩)	٦٠%
النسبة المئوية للموظفين الحكوميين الذين يتلقون رشاوى قد انخفضت منذ ٢٠١٠	الوثيقة الفنية للخط القاعدي (٢٠٠٩)	خفض بنسبة ٢٥%
عدد المحافظات التي تقوم بتخطيط تشاركي للتنمية المحلية	صفر (٢٠٠٩)	١٠
عدد التشريعات المتعلقة بالسكان التي سلمتها اللجان البرلمانية	صفر (٢٠٠٩)	الوثيقة الفنية للخط القاعدي (٢٠٠٩)

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، العراق، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقياس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، ص ص ٤٣-٥٩.

- برنامج تنمية القدرات الوطنية، أو برنامج "تطوير"، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، ساعد وزارة التخطيط والتعاون التنموي (MoPDC) في جمع خطة التنمية الوطنية للحكومة العراقية التي صيغت بشكل نهائي في نيسان/أبريل ٢٠١٠.^(٤٤٧) وفر برنامج "تطوير" ورشة عمل حول السياسة العامة إلى المجلس الاستشاري لرئيس الوزراء، وعمل مع وزارة الصحة لتدريب المدربين في وزارة الكهرباء، وأدار ورشة عمل حول الاتصالات الدولية للمهندسين وكبار المدراء في وزارتي النفط والكهرباء. ورعى برنامج تطوير شراكة بالنيابة عن اللجنة الوطنية للاستشارات، ورشة عمل حول التحكيم الدولي للأعضاء، وكبار الموظفين

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الرسميين في الحكومة وغيرهم. إجمالاً، ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان البرنامج وفر ٢١٦ فصل دراسي إلى ٣٢٤٧ متدرب.^(٤٤٨)

تنمية المحافظات

على المستوى المحلي، تساعد الولايات المتحدة عبر صندوق الاستجابة السريعة (QRF) الذي يقدم آلية تمويل مرّن لتمكين فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) من مواصلة الدعم لحكومات المحافظات وغيرها عبر مشاريع قصيرة الأمد (مدتها أقل من سنة). خلال ربع السنة الحالي، دعم صندوق الاستجابة السريعة مبادرة الحكومة الإلكترونية في محافظة النجف، وبرنامج لتنمية القدرات في مجال تكنولوجيا المعلومات في محافظة بابل، ونشر مجلة للمحافظة في محافظة الأنبار.^(٤٤٩) للاطلاع على نظرة عن قرب على إنفاق صندوق الاستجابة السريعة حسب أنواع المشاريع والمستفيدين، انظر القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير.

مشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRDCs) تستخدم تمويل إضافي من صندوق دعم الاقتصاد لزيادة إمكانية الوصول إلى الخدمات الأساسية مثل التعليم والنقل ومعالجة النفايات الصلبة. بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان قد أنفق مبلغ ٤٦٨ مليون دولار من أصل ٥٤٨ مليون دولار مخصصة لمشاريع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات.^(٤٥٠)


التقدم نحو الاعتماد على الذات

خلال ربع السنة الحالي أصدرت فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) تقييمها المحدث للتقدم الذي تحقّقه كل حكومة في المحافظات باتجاه الاعتماد على الذات في مجالات نظام الحكم، وحكم القانون، والوحدة الوطنية، والتنمية الاقتصادية والسياسية. التقرير المُسمى "التقييم ربع السنوي لنموذج النضوج" (MMQA) يحدد ترتيب أو مستوى التقدم أو التراجع في كل واحدة من الفئات أو المراتب الخمس القائمة على تقييمات ذاتية أعدها موظفو فرق إعادة إعمار المحافظات. الترتيب الأدنى هو "في البداية"، وتشمل المراتب الأخرى المتعلقة بمدى التقدم: "تنطور"، و"في الاستدامة"، و"تقوم بالأداء"، أما المرتبة الأعلى فهي "معتمدة على نفسها".

أنجز آخر تقييم في نيسان/أبريل، وغطى الفترة الزمنية من الأول من كانون الثاني/يناير لغاية ٣٠ آذار/مارس ٢٠١٠. إجمالاً كان هناك تحسن في عدة محافظات رئيسية كانت قد مرّت بصعوبات، من ضمنها الأنبار وصلاح الدين. تراجعت محافظة ديالى في مراتب نظام الحكم والتنمية الاقتصادية. أما مراتب التصنيف لنصف المحافظات تقريباً بقي دون تغيير فيما يخص "التقييم ربع السنوي لنموذج النضوج" (MMQA) السابق^(٤٥١). للاطلاع على نظرة عامة حول "التقييم ربع السنوي لنموذج النضوج" (MMQA) في كل محافظة، انظر الشكل ٢-٣٦.

الشكل ٢-٣٦

تقييمات النضوج لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs) ٢٠١٠/١ مقابل ٢٠١٠/٤




■ تقييم ٢٠١٠/١ ■ تقييم ٢٠١٠/٤

GOV: نظام الحكم، PD: التنمية السياسية، NV: الوحدة الوطنية، ECON: التنمية الاقتصادية، RoL: حكم القانون.

المصدر: استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.

تحسنت محافظة الأنبار في مراتب التنمية السياسية، والتنمية الاقتصادية، وحكم القانون، خلال ربع السنة الحالي. درجة التنمية السياسية ازدادت مع مشاركة ٦١ بالمئة من السكان في التصويت في الانتخابات الوطنية نزولاً عند إبحاح الكيانات القبلية والدينية. ذكرت فرقة إعادة إعمار المحافظات في الأنبار أيضاً حصول تحسينات اقتصادية في التدريب على الوظائف وتنمية مشاريع الأعمال الصغيرة، إضافة إلى حصول تحسينات في حكم القانون وفي احترافية الشرطة. وذكرت فرقة إعادة إعمار محافظة صلاح الدين ان السياسيين ابدوا مؤشرات عن الاعتدال بالنسبة لمشاركة نسبة ٧٤ بالمئة خلال الانتخابات الوطنية التي جرت وسط غياب فعلي للعنف. التحسن في فئة حكم القانون أعزى إلى تشغيل أكثر فعالية لسجون المحافظة. ترتيب ديالى تراجع في تلك الأثناء بسبب الحملة المتواصلة لاستهداف المسؤولين السنة مع اعتقالات وصدور مذكرات توقيف بحجة جرائم مزعومة لها علاقة بالإرهاب. ذكرت فرقة إعادة إعمار محافظة ديالى ان عمليات مجلس المحافظة "قد باتت متوقفة تقريباً" لان الأعضاء أعربوا عن مخاوفهم من ان يتم اعتقالهم.^(٤٥٢)

الشكل ٣٧-٢
علاقات العراق الدبلوماسية



البلدان التي يحتفظ فيها العراق بحضور دبلوماسي
البلدان التي لها حضور دبلوماسي في العراق وحيث يحتفظ العراق فيها بحضور دبلوماسي

المصدر: استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.

الانخراط الدبلوماسي

في ٢٣ أيار/مايو ٢٠١٠، وصل سفير العراق الجديد لدى مصر إلى القاهرة. وفقاً لوزارة الخارجية، إنه أول سفير عراقي لدى مصر منذ العام ١٩٩٠^(٤٥٣). كجزء من جهوده المتواصلة لإعادة الاندماج في المجتمع الدولي، يحتفظ العراق حالياً بسفارة او قنصلية في ٦٨ بلداً مع تركيز على المشاركة مع الدول الأوروبية والعربية^(٤٥٤). بتاريخ ٢ تموز/يوليو ٢٠١٠، ذكرت وزارة الخارجية الأميركية ان لدى ٣٥ بلداً سفارة في العراق. عدة دول أخرى لديها قنصلية أو أكثر في العراق بما فيها إيران التي لها خمس قنصليات، أعلى رقم من أي بلد آخر. الشكل ٣٧-٢^(٤٥٥). يبين خريطة العلاقات الدبلوماسية العراقية مع الدول الأخرى.

مكافحة الفساد في العراق

عمل المجتمع الدولي والحكومة الأميركية مع الحكومة العراقية لمحاولة إنشاء وتطوير مؤسسات شرعية لمكافحة الفساد في العراق. كما هو مبين في الجدول ٢-٢٦، قدم إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) ثلاثة مقاييس لتقييم ما إذا كان الفساد في العراق سينحسر بين الآن والعام ٢٠١٤ وما إذا كانت الحكومة العراقية تتخذ الخطوات للحد من خطر تعرضها للفساد.

البرامج الأميركية لمكافحة الفساد

يوصل مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميركية ببغداد (ACCO) العمل مع شركائه الأميركيين والحكومة العراقية لتحسين قدرات العراق على منع، واكتشاف، ومعاينة الفساد. ابتداءً من منتصف حزيران/يونيو ٢٠١٠، أصبح مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميركية ببغداد يرفع التقارير إلى رئيس مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) في بغداد التابع لوزارة الخارجية الأميركية. في السابق، كان مكتب تنسيق مكافحة الفساد في السفارة الأميركية ببغداد يرفع التقارير مباشرة إلى مساعد رئيس البعثة، السفير جوزيف ستافورد الذي

قاد هذا المكتب منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، وانهى مهمته كمدير للمكتب في ٢٢ حزيران/يونيو ٢٠١٠، وحل محله أندرو دودي.^(٤٥٦)

في ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠، انتهى "مشروع العدالة العالمي: العراق" الذي قاده جامعة يوتاه^(٤٥٧). بدأ المشروع سنة ٢٠٠٨ بتمويل بقيمة مليوني دولار على شكل هبة من وزارة الخارجية الأميركية. شملت أهدافه مساعدة الحكومة العراقية في مكافحة الفساد، وحماية الاستقلال القضائي، وإصلاح الإجراءات الجنائية، وإدارة الانتخابات، وإعطاء الأولوية لوضع التشريعات^(٤٥٨). جمع المشروع تشكيلة واسعة ومنوعة من المستندات القانونية العراقية الأولية وجعلها متوفرة باللغتين الإنكليزية والعربية. تخطط جامعة يوتاه لنشر تحليل شامل يُدرج عدداً من نتائج المشروع والمواد الإعلامية ذات الصلة.^(٤٥٩)

الجدول ٢-٢٦

أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) لمكافحة الفساد وحكم القانون

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
النسبة المئوية للموظفين الرسميين الذين تلقوا رشاوى قد انخفض منذ ٢٠١٠	الوثيقة الفنية للخط القاعدي (٢٠١٠)	انخفاض ٢٥%
حق التصويت ودرجة المساءلة في البنك الدولي، مؤشرات "مسائل نظام الحكم"	١,٢٦- (٢٠٠٨)	٠,٥١-
النسبة المئوية للمحافظات التي تنشر رسمياً الموازنات والأصول	٢٠% (٢٠٠٩)	٦٠%

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، العراق، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقاييس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، ص ص ٤٣-٥٩.

نشاطات الحكومة العراقية في مكافحة الفساد

في أيار/مايو ٢٠٠٩، تم اعتقال وزير التجارة بتهمة الفساد وهو في طريقه إلى الإمارات العربية المتحدة^(٤٦٠). كان متهما باختلاس الأموال من نظام التوزيع العام^(٤٦١). خلال ربع السنة الحالي، برأت المحكمة الجنائية في الرصافة (شرق بغداد) وزير التجارة السابق من تهمة الفساد، ولا تزال على الأقل تهمة إضافية واحدة معلقة. هيئة النزاهة (COI) وواحد على الأقل من مجلس النواب السابق قد أعلننا نيتهما الاستئناف ضد قرار المحكمة.^(٤٦٢)


محققو هيئة النزاهة مسؤولون عن النظر في مزاعم الفساد
المقامة على أي من موظفي الحكومة العراقية البالغ عددهم
ثلاثة ملايين موظف. بتاريخ تموز/يوليو ٢٠١٠، وظفت هيئة
النزاهة ١٣٥ محقق.

لدى العراق ثلاثة كيانات رئيسية لمكافحة الفساد: هيئة النزاهة (COI)، المجلس الأعلى للتدقيق (BSA) ونظام المفتشين العامين للوزارات (IGs). تعمل هيئة النزاهة من ١٦ مكتباً في ١٥ محافظة خارج إقليم كردستان.^(٤٦٣)

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الشكل ٣٨-٢

إصدار الأحكام القضائية في قضايا مكافحة الفساد في إقليم كردستان




المصدر: تحليل المفتش العام لوثائق واتصالات الحكومة العراقية وحكومة إقليم كردستان (KRG)

عندما تتلقى هيئة النزاهة شكوى، يدرس محققوها- أحياناً كثيرة بالتعاون مع المفتش العام في الوزارة او مع المجلس الأعلى للتدقيق - المزاعم ويحددوا ما إذا كان يجب تحويل الشكوى هذه إلى قاضي تحقيق لمواصلة العمل^(٤٦٤). محققو هيئة النزاهة مسؤولون عن النظر في مزاعم الفساد المقامة ضد أي من موظفي الحكومة العراقية البالغ عددهم ثلاثة ملايين موظف^(٤٦٥). للاطلاع على ملخص عن القضايا التي فتحتها هيئة النزاهة بين الأول من كانون الثاني/يناير و٣٠ نيسان/أبريل ٢٠١٠، انظر القسم الأول من هذا التقرير.

فكما هو مبين في الشكل ٣٨-٢، تحتفظ حكومة إقليم كردستان بمؤسسات موازية لمكافحة الفساد- مجلس الحقوق العامة ولجنة النزاهة في برلمان كردستان - التي تحقق في القضايا عبر عملية مشابهة.

الشكل ٢-٣٩

المفتشون العامون للحكومة العراقية: تواريخ تعيين المفتشين العامين الحاليين (لمدة خمس سنوات)

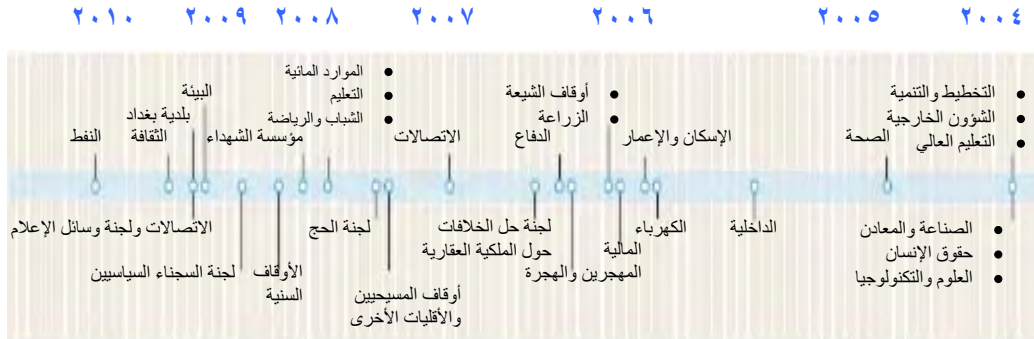

ملاحظة: المفتش العام لوزارة الصحة عين أصلاً سنة ٢٠٠٤ لكنه أخذ إذنًا لعدة أشهر قبل ان يُعاد تعيينه في مطلع العام ٢٠٠٥. تواريخ التعيين لم تكن متوفرة بالنسبة للمفتشين العامين لوزارات العمل، العدل، النقل والتجارة أو لمكتب مكافحة الإرهاب.

المصدر: تحليل المفتش العام لمستندات واتصالات الحكومة الأميركية والحكومة العراقية.

بتاريخ تموز/يوليو ٢٠١٠، وظفت هيئة النزاهة ١٣٥ محققاً، ٨٧ في مكاتب الهيئة في بغداد و٤٨ في المواقع الأخرى في أرجاء العراق. العبء الكبير من القضايا لهيئة النزاهة تتطلب منها الاعتماد على المفتشين العامين ليس فقط لاحالة القضايا بل أيضاً لإكمال متابعة التحقيقات.

خلال السنة القادمة، سوف تنتهي مدة الخمس سنوات بالنسبة لعدة مفتشين عامين^(٤٦٦). رغم ان المفتشين العامين مؤهلين للتجديد في مناصبهم لمدة خمس سنوات أخرى، إلا انه من غير المؤكد كم هو عدد الذين سوف يعينون من جديد من جانب الحكومة الجديدة. مثلاً، خلال ربع السنة الحالي، ابلغ مجلس الوزراء المفتشين العامين لوزارتي حقوق الإنسان والتعليم العالي انه لن يتم التجديد لهم.^(٤٦٧) الشكل ٢-٣٩ يعرض تواريخ تعيين ٣٠ من اصل ٣٦ مفتش عام في العراق.

تفرض هيئة النزاهة أيضاً الشروط بموجب الأمر ٥٥ لسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) بأن يُنجز الموظفون الرسميون المتوسطون والكبار في الحكومة العراقية بيانات الكشوفات المالية السنوية.^(٤٦٨) خلال ربع السنة الحالي، ذكرت هيئة النزاهة ان ٥٨٧٨ موظف رسمي ملأوا استمارات كشوفاتهم المالية المطلوبة لسنة ٢٠١٠، أي بزيادة ٧٥ بالمئة عن ٢٠٠٩ عندما فعل ذلك ٣٣٦٤ منهم.^(٤٦٩)

الإحصاء الوطني

لقد أجلت الحكومة العراقية بصورة متكررة تنظيم الإحصاء الوطني بسبب مخاوف من انه قد يثير توترات بين الأكثرية العربية والأقلية الكردية، خاصة في المناطق المختلطة في محافظة التأميم. آخر موعد للإحصاء كان ٢٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، ولكن الحكومة العراقية قامت في آب/أغسطس بتأجيل هذا الموعد إلى أجل غير مسمى بسبب القلق من تأثيره على العلاقات بين المجموعات العراقية السياسية والاثنية^(٤٧٠). وفي أوائل هذا العام، أعلنت الحكومة العراقية نيتها في إجراء إحصاء وطني في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠، لكن وزارة الدفاع الأميركية تقول ان الإحصاء قد يؤجل حتى ٢٠١١. في أواخر ٢٠٠٩، أكدت الأمم المتحدة استعدادها لتوفير المساعدة الفنية إلى الحكومة العراقية في التخطيط للإحصاء وإدارته.^(٤٧١)

سوف تقود وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة العراقية (MoPDC) التحضيرات لإحصاء الحكومة العراقية. تدعو الخطط الحالية إلى إجراء الإحصاء خلال يوم واحد بمساعدة المعلمين والموظفين الرسميين الآخرين الذين يجوبون البلاد لتعداد السكان. العاملون في الإحصاء سوف يطرحون أسئلة أساسية حول عدد الأشخاص المقيمين في كل عنوان، وكذلك مهنتهم وانتماءهم الديني والاثني – لكنهم لن يسألوا إذا كان المواطنون سنة أو شيعة.^(٤٧٢)

آخر إحصاء في العراق أجري سنة ١٩٩٧ لم يشتمل على معلومات عن المحافظات الثلاث في إقليم كردستان حيث كانت قوات الائتلاف تسيطر على الأمن.^(٤٧٣) في ذلك الوقت، كان حوالي ١٥ مليون عراقي يعيشون في المحافظات الـ ١٥ التي تم فيها التعداد وكان يقدر ان ثلاثة ملايين آخرين يعيشون في إقليم كردستان.

لم يجر العراق أي إحصاء قومي صحيح منذ ١٩٨٧^(٤٧٤)، كما ان الأحداث قد بدلت ديموغرافيته منذ ذلك الحين. الغياب الحالي للبيانات الإحصائية الدقيقة بصورة معقولة يحد من قدرة الحكومة العراقية على حل عدة قضايا حيوية بما فيها^(٤٧٥):

- وضعية الحدود الداخلية المتنازع عليها، ولا سيما في محافظتي تميم (كركوك) ونيوى.
- انتخابات المحافظات في التأميم - المحافظة الوحيدة التي لم تجر فيها هذه الانتخابات.
- توزيع المقاعد في الانتخابات المستقبلية لمجلس النواب.
- أهلية الناخبين للانتخابات في الأفضية والأفضية الثانوية المستقبلية.
- مخصصات الموازنة العامة لحكومة إقليم كردستان (التي تبلغ الآن ١٧%).

في نيسان/أبريل ٢٠١٠، أرسل صندوق السكان التابع للأمم المتحدة (UNPF) بعثة رفيعة المستوى إلى العراق لاستكشاف إمكانية تشكيل لجنة مستقلة لمراقبة الإحصاء المقبل. صندوق السكان التابع للأمم المتحدة و وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي في الحكومة العراقية (MoPDC) يناقشان حالياً تأليف مثل هذه اللجنة ومسؤولياتها.^(٤٧٦)

الإغاثة الإنسانية

الأمن المتحسن سنة ٢٠١٠ جعل من الأسهل على المنظمات الإنسانية مساعدة المهجرين في الداخل (IDPs) والمجموعات الأخرى المعرضة للعنف في العراق.^(٤٧٧) ذكرت الأمم المتحدة خلال ربع السنة الحالي ان أكثر من ٥٠٠٠ عراقي قد عادوا من البلدان المجاورة وان أكثر من ٣٠،٠٠٠ مهجر في الداخل قد عادوا إلى أماكنهم الأصلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من ٢٠١٠. معظم العائدين كانوا من محافظات بغداد وديالى، لكن محافظة البصرة شهدت هي أيضاً تدفقاً للعائدين من المنفى في إيران، وقد بنت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) ١٨٠ مسكناً جديداً لهم.^(٤٧٨) في المناطق التي استقرت فيها الأحوال، تحولت الوكالات الإنسانية نحو "نشاطات التعافي المبكرة" التي حددها برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) كعملية متعددة الأبعاد مُصممة لإعادة الخدمات الأساسية، والوظائف والمساكن الانتقالية والأمن في أوضاع ما بعد النزاع.^(٤٧٩) الجدول ٢-٢٧ يقدم مقاييس (UNDAF) المنتقاة لتقييم المساعدة للعراقيين المهجرين في الداخل.

لا يزال قرابة مليون لاجئ عراقي في سوريا والأردن وحوالي ١,٥٥ مليون إنسان مهجرين داخل العراق.

على الرغم من التحسن الأمني، لا يزال قرابة مليون لاجئ عراقي في سوريا والأردن وحوالي ١,٥٥ مليون شخص مهجرين في الداخل، في العراق. (٤٨٠)

ذكرت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة في حزيران/يونيو ان ١٠٠,٠٠٠ عراقي مقيمين خارج العراق قد أحيلوا إلى بلدان ثالثة لإعادة توطينهم. بحلول أيار/مايو، كان نصف هؤلاء قد ذهبوا إلى البلدان المضيفة، وان كان التفنيش الأمني الطويل وأوقات المعاملات قد أدت إلى تأخير كبير. حوالي ٤٥ بالمئة من اللاجئين الذين قدموا طلبات للاستيطان يعيشون في سوريا. (٤٨١) حذرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، بعد ان تحدثت عن العنف المتواصل في العراق، البلدان الأوروبية من ترحيل اللاجئين إلى العراق بعد ان سرت أخبار تقول ان هولندا والنرويج وأسوج والمملكة المتحدة تحضر لإعادة قسرية للمواطنين العراقيين. (٤٨٢)

الجدول ٢-٢٧

أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية (UNDAF) للمهجرين في الداخل

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
النسبة المئوية للسكان المهجرين الذين يشاركون في الانتخابات	الوثيقة الفنية للخط القاعدي (٢٠٠٩)	٦٠%
عدد الأشخاص المهجرين في الداخل، واللاجئين والعائدين وطالبي اللجوء الذين تم رصدهم ومساعدتهم في الوصول إلى حقوقهم الأساسية	٧١٣,٣٤٩ (٢٠٠٨)	٤٢٨,٠٠٩

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية (UNDAF)، العراق، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقاييس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية (UNDAF)، ص ص ٤٣-٥٩.

ذكرت الأمم المتحدة خلال ربع السنة الحالي ان أكثر من ٥٠٠٠ مسيحي عراقي قد هُجروا في كانون الثاني/يناير على أثر هجمات ضد طائفتهم نتج عنها ١٢ وفاة. عملت الأمم المتحدة والسلطات العراقية لتقديم المساعدات الإنسانية إلى تلك العائلات، ودُكر في أيار/مايو ان قرابة ثلثي أولئك المهجرين بسبب العنف قد عادوا إلى ديارهم. (٤٨٣)



لاجئ عراقي في عمان، الأردن

المساعدات الأميركية للمهجرين في الداخل واللاجئين

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الحكومة الأميركية قد ألزمت أكثر من ٨٩٥ مليون دولار من المساعدات الإنسانية للعراق بما في ذلك قرابة ١٢،٢ مليون دولار من مكتب مساعدة الكوارث الأجنبية (OFDA) التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية لدعم المهجرين في الداخل، واللاجئين، والمجتمعات المضيفة والسكان الآخرين المعرضين للعنف^(٤٨٤). برامج مكتب مساعدة الكوارث الأجنبية (OFDA) منتشرة في أرجاء العراق علماً أن معظم الأشخاص المهجرين في الداخل الذين تطالبهم خدمات البرامج هم في إقليم كردستان وفي محافظات بغداد، وديالى، وميسان^(٤٨٥).

أكثر من ٥١،٥٠٠ لاجئ عراقي وحامل تأشيرة الهجرة الخاصة (SIV) قد أعيد توطينهم في الولايات المتحدة منذ السنة المالية ٢٠٠٨.

مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM) التابع لوزارة الخارجية الأميركية (DoS) دعم عمل المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNCHR) في إعادة تأهيل وإعمار المساكن، والمساعدة في الحماية وتقديم المواد غير الغذائية وأدوات النظافة الجسدية للسكان المعرضين جداً للعنف^(٤٨٦). وواصل مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM) تمويل برنامج الأمن والاستقرار الإنساني الذي تُنفذه المنظمة الدولية للهجرة (IOM). هذه المبادرة مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة التهجير والهجرة (MoDM) تخدم محافظات بغداد، ديالى، نينوى، الأنبار، بابل، البصرة، أربيل والسليمانية. حيث مُنق اللاجئيين الأول في السفارة الأميركية في بغداد الحكومة العراقية على زيادة موازنتها للسكان المهجرين في العراق^(٤٨٧).

إعادة التوطين في الولايات المتحدة

أكثر من ٥١،٥٠٠ لاجئ عراقي وحامل لتأشيرة الهجرة الخاصة (SIV) قد أعيد توطينهم في الولايات المتحدة منذ السنة المالية ٢٠٠٨، عبر برنامجين منفصلين: ٤٧،٩٢٥ أعيد توطينهم كلاجئين و٣٥٩٢ على الأقل أعيد توطينهم بتأشيرة الهجرة الخاصة (تتعقب وزارة الخارجية الأميركية فقط حاملي تأشيرة الهجرة الخاصة الذين اختاروا إعادة التوطين وفوائد التمركز عبر مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM)).^(٤٨٨)

البرنامج الأميركي لقبول اللاجئين (USRAP) ينفذه مكتب السكان واللاجئين والهجرة (PRM) ويديره قسم شؤون اللاجئين والأشخاص المهجرين في الداخل، في السفارة الأميركية في بغداد بالتنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة. برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة يديره شراكة قسم شؤون اللاجئين والأشخاص المهجرين في الداخل والقسم القنصلي في السفارة الأميركية في بغداد. يزود قسم شؤون اللاجئين والأشخاص المهجرين في الداخل رئيس البعثة بخطابات القبول في حين يعطي القسم القنصلي التأشيرات. الفارق الرئيسي بين البرنامجين يتعلق بمن بإمكانه تقديم طلب للحصول على وضع اللجوء. يقبل البرنامج الأميركي لقبول اللاجئين المواطنين العراقيين الذين عملوا لحساب الحكومة الأميركية كموظفين مباشرين، ومقاولين، ومستقيدين مؤهلين من الهبات، وموظفين لدى شركاء اتفاقيات تعاون جرى تمويلها من جانب الحكومة الأميركية، والذين تم توظيفهم بعد ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٣، بصرف النظر عن طول مدة خدمتهم. برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة يقبل أي مواطن عراقي قدم خدمة "مخلصة وقيمة" خلال فترة توظيفه لدى أو بالنيابة عن الحكومة الأميركية، على الأقل مدة سنة بعد ٢٠ آذار/مارس ٢٠٠٣. يحصر برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة إمكانية الحصول على التأشيرة بأفراد العائلة المؤهلين الذين هم

الزوجة والأولاد غير المتزوجين دون الحادية والعشرين، بينما يمنح البرنامج الأميركي إمكانية قبول اللجوء أيضاً إلى الأيوين، والأخوة، وأفراد عائلاتهم المباشرين.^(٤٨٩)

مساعدة الحكومة العراقية للمهجرين في الداخل واللاجئين

خلال ربع السنة الحالي، واصلت الحكومة العراقية جهودها لإعادة دمج أعضاء المجتمعات الأهلية الإثنية المذهبية عبر عملية سُميت "مبادرة ديبالي". المشروع الذي بدأه رئيس الوزراء، نوري المالكي، في تموز/يوليو ٢٠٠٩، تنسقه المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة وتسعى إلى عودة وإعادة دمج السكان المهجرين. تشاركت الحكومة الأميركية وعدة وكالات دولية، مثل برنامج الغذاء العالمي، وصندوق الأمم المتحدة للطفولة (UNICEF)، مع الحكومة العراقية لتقييم مدى تعرض القرى العراقية للأخطار، وتوفير الحماية للعائدين، وتقديم المساعدة القانونية، وإعادة تأهيل المساكن وكذلك شبكات المياه، وإنشاء نشاطات تنتج دخلاً، وإعادة تأهيل المدارس والمرافق الصحية، ووضع برامج تغذية، والمباشرة بحملات توعية صحية للمجتمعات الأهلية.^(٤٩٠) منذ ٢٠٠٣، وزعت وزارة التهجير والهجرة (MoDM) حوالي ٢٠٠٠ قطعة أرض للاجئين في جنوب العراق، وبدأت مؤخراً ببناء المنازل عليها كجزء من برنامج حكومي يهدف إلى مساعدة لاجئي ما قبل ٢٠٠٣ لإعادة توطينهم في البلاد.^(٤٩١)

الخدمات العامة

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الحكومة الأميركية قد خصصت ٢,٠٤ مليار دولار، وألزمت ٢,٠٠ مليار دولار وأنفقت أكثر قليلاً من ١,٩٠ مليار دولار على الخدمات العامة – بالدرجة الأولى على مشاريع العناية الصحية والتعليم.^(٤٩٢)

العناية الصحية

يواصل العراق مواجهة النقص في الأطباء والممرضات وموظفي الدعم المساندين لهما. ازداد عدد الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة العائدين إلى الوطن بصورة كبيرة سنة ٢٠٠٩، لكن لا يزال هناك نقص في عدد الأطباء في العراق وتواصل الحكومة العراقية جهودها لتدريب وتوظيف وإشغال الوظائف الشاغرة.^(٤٩٣) وفقاً لتقرير إحصاءات سنة ٢٠١٠ لمنظمة الصحة العالمية، ٤١ بالمئة من سكان العراق هم دون سن الخامسة عشرة، ويقدر ان ٤٥ طفل من كل ١٠٠٠ طفل مولود سوف يموتون قبل سن الخامسة. متوسط العمر المتوقع هو ٦٣ سنة (٥٩ للرجال و٦٩ للنساء)، أي على نفس مستوى اليمن وهو الأدنى في المنطقة. علاوة على ذلك، تعاني العناية الصحية من سياسات وإستراتيجية مرّ عليها الزمن ومن نقص في الأطباء والممرضات المؤهلين، ومن الفقر، والبنية التحتية المتداعية وغير الكافية للعناية الصحية، والمناهج الدراسية الطبية التي مرّ عليها الزمن.^(٤٩٤)

ازداد عدد الأطباء وأطباء الأسنان والصيدلة العائدين إلى الوطن بصورة كبيرة سنة ٢٠٠٩، لكن لا يزال هناك نقص في عدد الأطباء في العراق.

لقد وضع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) عدة أهداف لمواصلة تطوير قطاع العناية الصحية بما في ذلك دعم الحكومة العراقية لوضع التشريعات حول حصول الجميع على ضمان صحي بحلول ٢٠١١ ولإقامة نظام للعناية الصحية الأولية لضمان الخدمات الأساسية لجميع العراقيين.^(٤٩٥) المقاييس والأهداف مُدرجة في قائمة في الجدول ٢-٢٨.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الجدول ٢-٢٨

أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) للعاية الصحية

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
عدد الأفضية التي تطبق مقارنة العناية الصحية الأولية	١٩ (٢٠٠٩)	١١٤
النسبة المئوية للأطفال البالغين من العمر سنة واحدة المحصنين ضد الحصبة	٧٠% (٢٠٠٩)	٩٥%
معدل الأطباء لكل ١٠٠٠ نسمة	٦ (٢٠٠٩)	١٠
معدل الممرضات لكل ١٠ آلاف نسمة	١٣,٢ (٢٠٠٨)	٤٠
النسبة المئوية لحالات السل المكتشفة والتي شُفيت بعد معالجة تحت رقابة مباشرة ولوقت قصير	٤٣% (٢٠٠٨)	٧٠%
النسبة المئوية للنساء الحوامل المصابات بفقر الدم	٣٧,٩% (٢٠٠٧)	١٩%
النسبة المئوية للمحافظات التي لديها على الأقل خطة تطبيق واحدة لخفض فيروس نقص المناعة المكتسبة (HIV) بين الشبان والشابات	٠% (٢٠٠٩)	٤٠%

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، العراق، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقياس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، ص ٤٣-٥٩.



مراسلة عراقية تجري مقابلة صحفية مع تلامذة حول مدرستهم الجديدة في محافظة القادسية

مشاريع العناية الصحية الممولة من الولايات المتحدة

على الرغم من تلك التحديات، قدر سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) انه بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، مكّنت مشاريعه المستشفيات العراقية من معالجة ٦,٦ مليون مريض داخل المستشفى و٤,٦ مليون مريض خارج المستشفى كل سنة. بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان قد تم تسليم ١٣٣ مركزاً للعناية الصحية الأولية (PHCs) مُمولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) إلى وزارة الصحة العراقية، كما تم تجديد ٥٣ مستشفى؛ وهناك مستشفيات قيد التجديد.^(٤٩٦)

ما لم تحصل زيادة في إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي نو نوعية جيدة، في المدى القريب، فان هناك خطر ان يتحول الجيل الشاب إلى عائق بوجه السلم، والاستقرار، والنمو الاقتصادي

خلال ربع السنة الحالي، تم إنجاز ٨ مشاريع للعناية الصحية بقيمة تزيد عن ٦١ مليون دولار، تم تمويل ستة منها من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) وتم تمويل الاثنين الباقيين من صندوق دعم الاقتصاد (ESF). أكبر مشروع للعناية الصحية أنجز خلال ربع السنة الحالي كان المرحلة الأخيرة، الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) بقيمة ٣٨ مليون دولار، من مستشفى الأطفال في البصرة، وهو مرفق يحتوي على ٩٤ سرير لطب الأطفال في محافظة البصرة. كان متوقعاً أن تكلف هذه المنشأة أصلاً ٥٠ مليون دولار بموعد للإنجاز مخطط لكانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥. في الوقت الذي أنجز فيه المستشفى في ٢٠١٠، كان إجمالي الكلفة قد بلغ أكثر من ثلاثة أضعاف ذلك المبلغ، فقد أنفق حوالي ١١٠ مليون دولار من الأموال الأميركية لبناء المستشفى. لقد ساهمت الحكومة العراقية وأسبانيا ومشروع الأمل (هوب) بـ ٦١ مليون دولار إضافية.^(٤٩٧) مستشفى الطوارئ في أربيل أنجز أيضاً خلال ربع السنة الحالي. هذا المشروع الممول من صندوق دعم الاقتصاد والذي كلف ١٣،٦ مليون دولار زود ١٠٠ سرير إضافي للمرفق وزاد قدرات الحالات الطارئة في المحافظة أكثر من الضعفين.^(٤٩٨) في نهاية ربع السنة الحالي، كان هناك ٢٦ مشروع لإنشاء مراكز للعناية الصحية قيد التنفيذ بقيمة ٣٤ مليون دولار مُمولة من الولايات المتحدة.^(٤٩٩)

أدار برنامج تعزيز القطاع الصحي العراق (HPP-I)، التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، أربع ورش عمل خلال ربع السنة الحالي مُصممة لتدريب الموظفين الرسميين في وزارة الصحة، من الحكومة المركزية وحكومات المحافظات. بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان قد أنفق مليون دولار من الخمسة ملايين دولار المخصصة للمشروع.^(٥٠٠)

للاطلاع على نظرة إجمالية حول مرافق وبرامج العناية الصحية المُمولة من الولايات المتحدة، أنظر الشكل ٢-٤٠.

التعليم


منذ ٢٠٠٣، مولت الحكومة الأميركية إصلاح أو إنشاء أكثر من ٤٠٠٠ مدرسة، وقدمت تدريب معلمين لأكثر من ٣٣،٠٠٠ مدرس، ووزعت ملايين الكتب المدرسية.^(٥٠١)

ومع هذا، لا يزال الفتيان في العراق (على غرار أولئك الذين في اليمن ومصر) بين أكثر الناس الأميين في الشرق الأوسط. كان يُنظر فيما مضى إلى نظام التعليم في البلاد على أنه الأفضل في الشرق الأوسط الناطق بالعربية، وكان قد حقق تقدماً نحو تأمين التعليم الأساسي للجميع في الستينات والسبعينات من القرن الماضي. لكن، منذ أواسط الثمانينات، تدهور النظام التعليمي. إن تقديم خدمات التعليم الكافية أصبح مهدداً بالتهجير، والفقر، والتمييز ضد النساء، والبنية التحتية المتداعية، والصفوف المزدحمة، والمناهج ذات النوعية المتردية والتي مرّ عليها الزمن. بحسب السفارة الأميركية في بغداد، فقد أثر غياب الأمن – الحقيقي والمتوقع منه – على التسجيل والحضور ومعدلات النجاح.^(٥٠٢) حذرت السفارة الأميركية في بغداد أنه ما لم تحصل زيادة كبيرة في إمكانية الحصول على التعليم الابتدائي والثانوي ذو نوعية جيدة في المدى القريب، فإنه يوجد خطر أن يتحول الجيل الشاب إلى عائق بوجه السلم والاستقرار والنمو الاقتصادي.^(٥٠٣) أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) لقطاع التعليم في العراق مدرجة في الجدول ٢-٢٩.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الشكل ٢-٤٠

مرافق العناية الصحية الممولة من الولايات المتحدة
قيمة المشاريع المنجزة ومواقع المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها والتي لم تبدأ بعد

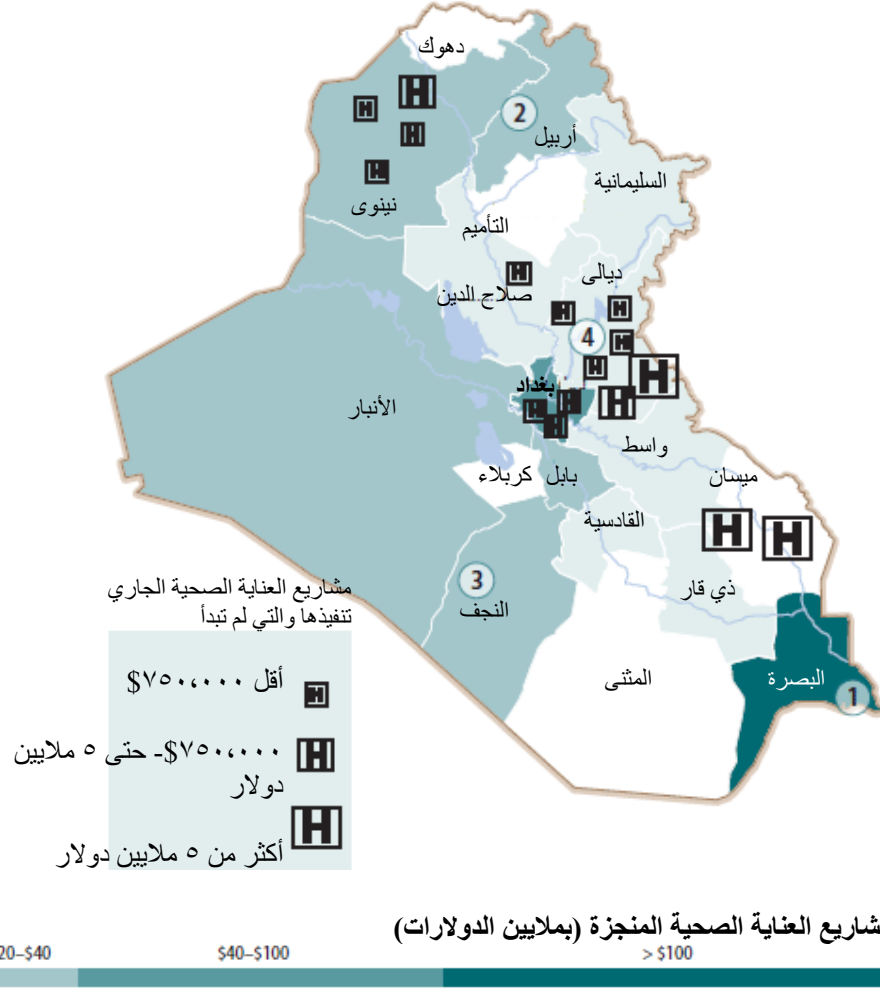

مستشفى الأطفال في البصرة



هذا المستشفى العيادي والتدريبي المؤلف من طبقتين و ٩٤ سرير يشمل مرافق للمرضى الخارجيين، وغرف عمليات، وتصوير بالأشعة، وتنظير باطني، ومعالجة فيزيائية. أنجز المشروع في ١٥ ايار/مايو ٢٠١٠، قرابة ٥ سنوات بعد الموعد المحدد أصلاً وبكلفة أكبر بكثير من التقديرات الأصلية.

مستشفى أربيل لحالات الطوارئ



هذا المشروع البالغة قيمته ١٣,٤ مليون دولار والممول من صندوق دعم الاقتصاد كان الغرض منه ضمان ان تتماشى العناية الصحية في محافظة أربيل بكردستان مع الاتجاهات الديمقراطية والنمو السكاني العام. مُنح العقد في تموز/يوليو ٢٠٠٨ وأنجز في ٣ حزيران/يونيو ٢٠١٠.

المستشفى التعليمي في النجف



بدأت الإصلاحات والتجديدات في المستشفى التعليمي في النجف في تموز/يوليو ٢٠٠٥ وأنجزت في نيسان/أبريل ٢٠٠٧. المشروع البالغة كلفته ١٠,٨ مليون دولار، والممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق والذي أدارته فرقة منطقة الخليج، رفع مستوى المطبخ الصناعي في المستشفى، وحجرة غسل الملابس والحجرات الميكانيكية، وجدد الطبقات الثانية حتى السابعة وعدة مبانٍ خارجية في حرم المستشفى.

مستشفى بعقوبة العام




هذا المشروع البالغة كلفته ٨,٨ مليون دولار الممول من صندوق دعم الاقتصاد لإنشاء مركز صحي جراحي جديد موسع في مستشفى بعقوبة العام، في محافظة ديالى، سيكون منشأة مستقلة مع ٢٥٠٠ متر مربع للطابق الأرضي والخدمات الملحقة، بما في ذلك ٢٠ سرير لغرفة الطوارئ. انه مبرمج للإنجاز في آب/أغسطس ٢٠١٠.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخدماتها

نشاطات العناية الصحية الممولة من الولايات المتحدة
بملايين الدولارات

المجموع	لم تبدأ	قيد التنفيذ	أنجزت	
٣٠٥,٩٢	٠,٩٣	٠,٢٦	٣٠٤,٧٣	مراكز العناية الصحية الأولية/العيادات
٢٤٥,٨٩	٠,٠٣	١٢,٤٩	٢٣٣,٣٧	مرافق متنوعة
٢٣٧,٤٣	٠,٠٠	٢٠,٤٧	٢١٦,٩٦	مستشفيات
١٥٢,٨٢	٠,١٩	٢,٤٢	١٥٠,٢١	برامج وتجهيزات صحية
٢٧,٣٦	٠,٧٨	٠,٠٠	٢٦,٥٨	الاستدامة (التشغيل والصيانة)
١٦,٦٦	٠,٤٠	٠,٠٠	١٦,٢٦	بناء القدرات
٢,٧٦	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٧٦	سد النقص في قطع الغيار
٠,٤٠	٠,٠٠	٠,٠٢	٠,٣٨	أمن البنية التحتية
٩٨٩,٢٥	٢,٣٣	٣٥,٦٥	٩٥١,٢٦	المجموع

التمويل الأميركي لنشاطات العناية الصحية
بملايين الدولارات

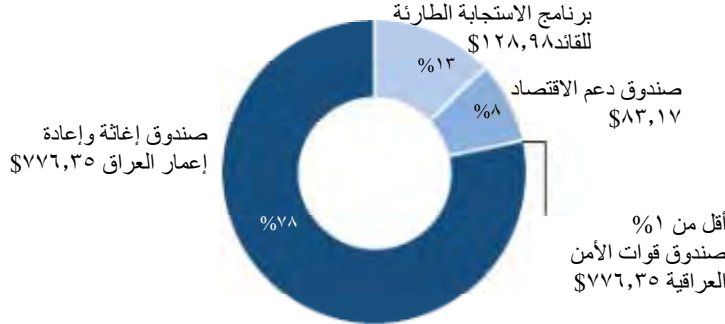

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. قائمة مشاريع الإعمار هذه مستندة إلى بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق التي ليست دقيقة تماماً أو كاملة. لذلك فإن إجمالي المشاريع لا تتوافق مع الزامات الخط الأعلى وبيانات النفقات المقدمة من الوكالات.

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، علامات الاهتداء العالمية، ٢٠١٠/٧/٢.

خلال السنة المالية ٢٠١٠، أقام قسم الشؤون العامة في السفارة الأميركية في بغداد روابط رسمية بين أربع جامعات عراقية وجامعات أميركية بكلفة أولية بلغت ٦ مليون دولار كما ان روابط مع جامعة خامسة هي قيد التحضير. البرنامج الذي مدته ٣ سنوات سوف تستفيد منه جامعات بغداد، وصلاح الدين (في أربيل)، والبصرة، والكوفة (في النجف)، وتكريت، مما سيساعد في تعديل المناهج الدراسية وإنشاء مقررات تعليمية على شبكة الإنترنت، من جملة الفوائد الأخرى. يهدف البرنامج أيضاً إلى زيادة عدد العراقيين الذين يدرسون في الجامعات الأميركية. درّب برنامج منفصل المعلمين العراقيين في كافة أنحاء العراق على آخر تقنيات تعليم اللغة الإنكليزية كلغة ثانية.^(٥٠٤)

خلال ربع السنة الحالي، أصبحت الجامعة الأميركية في العراق – السليمانية، أول مؤسسة للتعليم العالي في العراق تتلقى الاعتماد الأكاديمي من وكالة اعتماد أكاديمي معترف بها في الولايات المتحدة.^(٥٠٥)



مكتبة الكونغرس تدرّب مسؤولي المكتبات العراقيين في محافظة السليمانية كجزء من جهود التدريب في كافة أنحاء البلاد.

مشاريع التعليم الممولة من الولايات المتحدة

خلال ربع السنة الحالي، تم إنجاز ١٨ مشروع ممول من الولايات المتحدة لبناء مرافق تعليمية تبلغ قيمتها أكثر من ١٥ مليون دولار. تم تمويل عشرة مشاريع من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وتم تمويل الباقي بواسطة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). أكبر مشروع إنشائي أنجز خلال ربع السنة الحالي كان مدرسة الغادر، وهي مشروع بقيمة ١,٤ مليون دولار ممول من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) لبناء مدرسة ابتدائية من ١٢ حجرة تدريس في محافظة ذي - قار. وفقاً لنظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، كان هناك ١٧٧ مشروع تعليمي قيد التنفيذ بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠. أغلبية المشاريع الجاري تنفيذها تم تمويلها من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، لكنها كانت صغيرة نسبياً، فقد كان هناك ١٤ مشروع كلفتها ما بين مليون و٤,٨ مليون دولار يتم تمويلها من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF).^(٥٠٦)

في إقليم كردستان، نظم فريق إعادة إعمار الإقليم زيارة للأخصائيين من مكتبة الكونغرس الذين درّبوا العراقيين المسؤولين عن المكتبات كجزء من برنامج تدريب خاص بهم من كافة أنحاء البلاد. فرّق إعادة الإعمار المرافقة (ePRT) في بغداد دعمت برنامجاً لتعليم البالغات من النساء القراءة والكتابة يهدف إلى تعليمهن القراءة والكتابة الأساسية ومهارات الرياضيات. فرقة إعادة إعمار محافظة القادسية وجّهت الدعوى إلى فريق من الصحفيين إلى مدرسة في المحافظة للمساهمة في التشديد على التعليم الريفي. وفي السنة الماضية، دعمت فرقة إعادة إعمار المحافظة إنشاء ٥٤ مدرسة في القادسية.^(٥٠٧)

للاطلاع على نظرة إجمالية على مشاريع إنشاء مدارس منتقاة مُمولة من الولايات المتحدة، أنظر الشكل ٤١-٢.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها


الجدول ٢-٢٩
أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) للتعليم

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
معدل الإنجاز للصف الخامس	٨١,٨ (٢٠٠٩)	١٠٠%
معدل متوسط معرفة القراءة والكتابة	٨٠,٩ (٢٠٠٧)	زيادة ١٠%
معدل معرفة القراءة والكتابة للنساء	٧٣,٦% (٢٠٠٧)	٩٠%
التسجيل الصافي: التعليم الابتدائي	٩٠,٦% (٢٠٠٩)	٩٨%
التسجيل الصافي: التعليم المتوسط	٤٠,٥% (٢٠٠٩)	٥٠,٥%
التسجيل الصافي: التعليم الثانوي الأعلى	٥٦,٦% (٢٠٠٩)	٦٦,٦%
معدل ترك المدرسة: التعليم الابتدائي	٢,١% (٢٠٠٧)	خفض ٥٠%
معدل ترك المدرسة: التعليم المتوسط	٣,١% (٢٠٠٧)	خفض ٥٠%
معدل ترك المدرسة: التعليم الثانوي الأعلى	١,٧% (٢٠٠٧)	خفض ٥٠%
الفجوة بين الجنسين في التعليم الثانوي	٣٣,١% (٢٠٠٧)	١٥%
النسبة المئوية للمحافظات التي لديها على الأقل خطة تطبيق محلية واحدة لزيادة التسجيل في المدارس، متطورة بمشاركة الأولاد والشباب (بعمر ١٠-٢٤ سنة)	الوثيقة الفنية للخط القاعدي (٢٠٠٩)	١٠٠%

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، العراق، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقياس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، ص ص ٤٣-٥٩.

الشكل ٢-٤١

المرافق التعليمية الممولة من الحكومة الأميركية
قيمة المشاريع المنجزة وأماكن المشاريع الرئيسية الجاري تنفيذها والتي لم تبدأ بعد

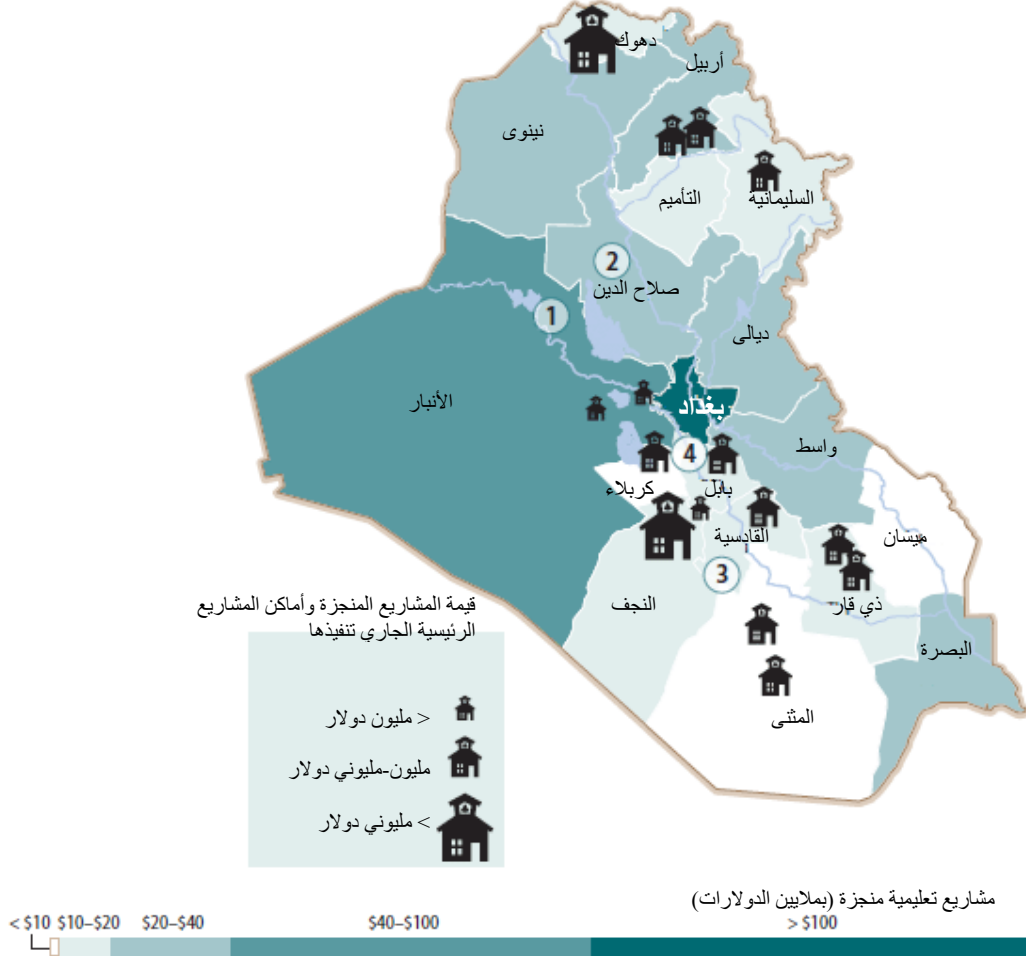

مدرسة الفارابي في محافظة الأنبار



مدرسة الفارابي المتوسطة الممولة من صندوق دعم الاقتصاد بقيمة ١,١ مليون دولار أنجزت خلال ربع السنة الحالي وسلمت إلى دائرة التعليم في حديثة في محافظة الأنبار. كان المشروع - ١٢ حجرة تدريس - واحداً من أصل تسعة مشاريع إنشاء مدارس جاري تنفيذها في المحافظة بإدارة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

المدرسة المعيارية في محافظة صلاح الدين



هذه المدرسة المعيارية النموذجية بناها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي للمساعدة في تخفيف الازدحام في المدارس الابتدائية والثانوية العراقية. كل واحد من المبنىين يحتوي على أربع غرف، ثلاث حجرات تدريس ووحدة تستخدم كغرفة ليحضر فيها المعلم الدروس وللإجتماعات.

مدرسة حسن البصري الابتدائية في محافظة القادسية



يهدف هذا المشروع الممول من صندوق دعم الاقتصاد بقيمة ١,٢ مليون دولار في محافظة القادسية إلى إنشاء ١٢ حجرة تدريس لتحل محل المدرسة القديمة المهتمة التي تعتبر غير آمنة لكي يؤمها الطلاب. بدأ الإنشاء في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ والموعد النهائي لإنجاز المدرسة هو آذار/مارس ٢٠١١.

مدرسة الشوملي الثانوية في محافظة بابل




يهدف هذا المشروع الممول من صندوق دعم الاقتصاد بقيمة ١,٣ مليون دولار إلى إنشاء مدرسة ثانوية من ١٢ حجرة تدريس في محافظة بابل. عانى الإنشاء الذي بدأ في حزيران/يونيو ٢٠٠٨ من عدة مشاكل متعلقة بالجودة جعلت موعد الإنجاز يتأخر. من المتوقع الآن ان يُنجز المشروع في تموز/يوليو ٢٠١٠. سوف تخدم المدرسة الطلاب من الشوملي، وهي منطقة تعد حوالي ٢٥,٠٠٠ نسمة.

النشاطات التعليمية الممولة من الولايات المتحدة بملايين الدولارات

المجموع	لم تبدأ	قيد التنفيذ	أنجزت	
٤٨٣,٤٥	١٦,٨٤	٢٩,١٣	٤٣٧,٤٨	مرافق مدارس
٢٢٤,١٦	١٨,٩١	٨,٢٦	١٩٧,٠٠	البرامج التعليمية والتجهيزات
١٧٣,٣٨	٠,١٤	٧,٦٥	١٦٥,٥٩	مرافق مختلفة
٨٨١,٠٠	٣٥,٨٩	٤٥,٠٤	٨٠٠,٠٧	المجموع

التمويل الأميركي لنشاطات التعليم بملايين الدولارات

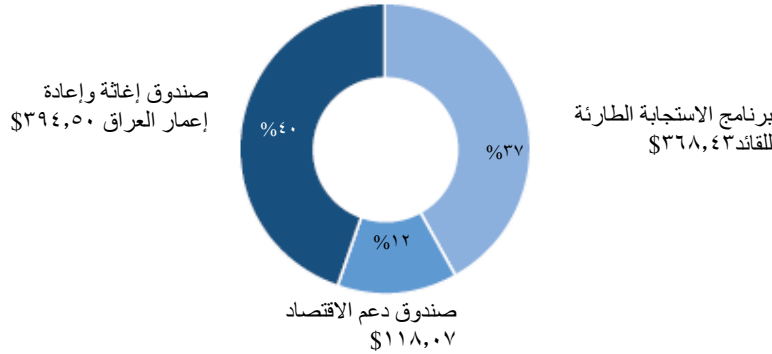

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. قائمة مشاريع الإعمار هذه مستندة إلى بيانات نظام إدارة إعادة الإعمار التي ليست دقيقة تماماً أو كاملة. كذلك فإن إجمالي المشاريع لا تتوافق مع بيانات الزامات الخط الأعلى والنفقات المقدمة من الوكالات.

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، علامات الاهتداء العالمية، ٢٠١٠/٧/٢.

يبين الجدول ٢-٣ المقاييس وأهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) لزيادة تنمية قطاع الإسكان في العراق.

الجدول ٢-٣ أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، للإسكان

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في مباني غير دائمة	حضرين: ٣% (٢٠٠٧) ريفين: ٢٥%	حضرين: ١% ريفين: ١٥%
النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون في أقل من ٩ أمتار مربعة للشخص الواحد	حضرين: ١٩% (٢٠٠٩) ريفين: TBD	حضرين: ١٠% ريفين: ١٠%
النسبة المئوية من السكان الذين يعيشون مع تهوئة غير كافية	١٥% (٢٠٠٩)	١٠%

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، العراق، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقياس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، ص ص ٤٣-٥٩.

إعادة تأهيل المساكن

تشير بيانات إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) انه بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان هناك على الأقل ٣ ملايين دولار في مشاريع أميركية للإسكان قيد التنفيذ، وحوالي ١٣,٠٠٠ دولار من المشاريع المخططة لم تبدأ بعد.^(٥٠٨)

أعلن وزير التعليم العالي العراقي خلال ربع السنة الحالي عن خطط لبناء ٦٠٠٠ وحدة سكنية لموظفي الوزارة في قرية كهن بني سعد في محافظة ديالى.^(٥٠٩) علاوة على ذلك، وافقت الهيئة الوطنية للاستثمار على رخصتي استثمار لبناء مجمع سكني في العامرية، أحد أحياء بغداد. المجمع المكون من ٢٠٠٠ وحدة سكنية يتوقع إنجازه في غضون ثلاث سنوات ليستخدم من جانب المعلمين في الوزارة.^(٥١٠) وذكر ان شركات من الإمارات العربية المتحدة تفكر في بناء ١٥٠ ألف وحدة سكنية في مختلف أرجاء العراق.^(٥١١)

الاقتصاد

بتاريخ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كانت الولايات المتحدة قد خصصت ١,٦٧ مليار دولار، وألزمت ١,٦٢ مليار دولار وأنفقت ١,٤٨ مليار دولار لدعم نظام الحكم الاقتصادي في العراق وتنمية القطاع الخاص.^(٥١٢) للاطلاع على وضعية التمويل الأميركي لدعم التنمية الاقتصادية، أنظر الشكل ٤٢-٢.

كما هو مبين في الشكل ٤٣-٢، ظلت النفقات ربع السنوية أدنى بكثير منها في مجالات إعادة الإعمار الثلاثة الأخرى. في نهاية ربع السنة، كانت أكبر البرامج الجاري تنفيذها برامج التنمية الاقتصادية في المحافظات (ESF) مع ٢٩,٧ مليون دولار من الإلزامات غير المنفقة وبرنامج تنمية القطاع الخاص التابع لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) مع ٢٥,١ مليون دولار من الإلزامات غير المنفقة.^(٥١٣) الجدول ٣١-٢ يبين توزيع فئات الإنفاق التي عرفت أكبر زيادة من الإلزامات والإنفاقات خلال ربع السنة الحالي.

الاتجاهات والتطورات الاقتصادية الأساسية

خلال ربع السنة الحالي، تلقى العراق ما مجموعه ١٢,٦٦ مليار دولار من عائدات تصدير النفط الخام، ٠,٦٣ مليار (٥%) احتفظ بها كتعويضات حرب للكويت، ما ترك ١٢,٠٣ مليار دولار من إيرادات صادرات النفط لتمويل الحكومة العراقية. يُشكّل هذا الرقم انخفاضاً بنسبة ٢ بالمئة عن ربع السنة المنصرم.^(٥١٤)


للاطلاع على مقارنة بين إجمالي الناتج المحلي العراقي (GDP) وبين موازنة الحكومة العراقية وما يتلقاه العراق سنوياً من عائدات النفط، أنظر الشكل ٤٤-٢.

معدلات التضخم الجديدة

بدأ البنك المركزي العراقي (CBI) نشر أرقامه الجديدة عن التضخم خلال ربع السنة الحالي، المستندة إلى بيانات سعر الاستهلاك المجمع كجزء من "المسح الاجتماعي الاقتصادي للأسر لسنة ٢٠٠٨" الذي أجراه المكتب المركزي للإحصاءات (COSIT). في السابق، كان البنك المركزي العراقي يستخدم البيانات من ١٩٩٣ لاحتساب معدلات التضخم.^(٥١٥) البيانات الجديدة تهدف إلى عكس معدلات التضخم الحقيقية بصورة أكثر دقة، إذ إن بيانات العام ١٩٩٣ حول عادات الشراء استنتجت إقليم كردستان وتم جمعها خلال فترة من الانعزال الاقتصادي نتيجة للعقوبات الدولية. كان التغيير شرطاً لأحدث اتفاقية ترتيبات للقروض الاحتياطية (SBA) مع صندوق النقد الدولي (IMF) التي جرى تمديدها خلال ربع السنة المنصرم.^(٥١٦)

الشكل ٤٢-٢

الاقتصاد: وضعية الأموال في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) بملايين الدولارات




ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى المذكورة في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦ و ٢٠١٠/٧/٨، استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.

الشكل ٤٣-٢

الاقتصاد: النفقات الأميركية ربع السنوية في قطاع إعادة الإعمار بملايين الدولارات

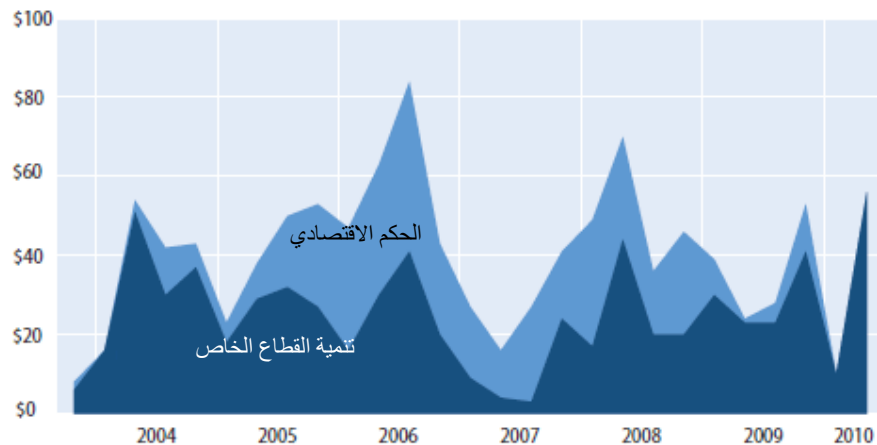

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

ملاحظة: البيانات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. الرسم البياني لا يشمل ٣٥٢ مليون دولار من ديون العراق المعفاة، الممولة من صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق في ربع السنة المالي الثاني من العام ٢٠٠٥، غير أن هذا المبلغ مشمول في قيم الخط الأعلى للاقتصاد في هذا التقرير. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى المذكورة في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، القوات الأميركية في العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٣٠، استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/٦ الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢، المفتش العام، التقارير ربع السنوية ونصف السنوية إلى كونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤-٢٠١٠/٤-٣.

بموجب مجموعة البيانات السابقة، كان في العراق معدل تضخم سلبي من سنة لسنة. ففي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، كان الانخفاض في التضخم - ٤,٤ بالمئة. الأرقام الجديدة لسنة ٢٠١٠ التي نشرت خلال ربع السنة الحالي تظهر تضخماً بقي مستقراً وبلغ قرابة ٣ بالمئة، أقل من المدى البالغ ٥% - ٦% الذي وافقت وزارة المالية العراقية (MOF) والبنك المركزي العراقي على العمل باتجاهه بموجب أحكام آخر اتفاقية ترتيبات للقروض الاحتياطية (SBA).^(٥١٩)

الأرقام الجديدة للعام ٢٠١٠ تُظهر تضخماً بقي مستقراً وبلغ قرابة ٣ بالمئة

الجدول ٢-٣١
الاقتصاد: وضعية برامج منتقاة
بملايين الدولارات

التغيير ربع السنوي	وضعية الأموال		البرنامج
	أنفقت	الزمت	
أنفقت ٣٢,٧ (٤٠%)	١١٥,٣	١٢٤,٠	"إنماء" لتنمية التصنيع الزراعي (صندوق دعم الاقتصاد)
أنفقت ١٨,٠ (٤٧%)	٥٦,١	٨٥,٨	التنمية الاقتصادية في المحافظات (صندوق دعم الاقتصاد)
أنفقت ٥,٥ (١٨%)	٣٦,٩	٥٧,٤	برنامج التنمية المحدد الأهداف (صندوق دعم الاقتصاد)
أنفقت ١,٥ (١%)	١٠٩,٥	١٢٢,٣	الزراعة (برنامج الاستجابة الطارئة للقائد)
أنفقت ٠,٢ (٠%)	١,١٦٦,٨	١,٢٢٥,٦	أخرى
أنفقت ٥٦,٥ (٤%)	١,٤٨٤,٦	١,٦١٥,١	المجموع

ملاحظة: البرامج المدرجة في هذا الجدول قد تغيرت على الأقل بنسبة مليون دولار في الالزامات والنفقات ربع السنوية مجتمعة. الملحق (ج) يظهر وضعية كافة البرامج الممولة من جانب الصناديق الأربعة الرئيسية، بما في ذلك تلك التي في مجال إعادة إعمار الاقتصاد المجموعة في الفئة المسماة "أخرى" هنا. لم يذكر مكتب وزير الدفاع بيانات مخصصات والزامات ونفقات لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لكافة مخصصات السنة المالية. سحب المفتش العام بيانات مخصصات والزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد من نظام إدارة إعادة إعمار العراق الذي يتأخر مدة ربع سنة في إصدار تقاريره، لذلك فإن مجاميع الفئات المذكورة في القسم الفرعي "مصادر التمويل" في هذا التقرير قد لا تتوافق مع قيم الخط الأعلى المذكورة في الأقسام الفرعية الأخرى.

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، القوات الأميركية في العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، تقرير الفئات، ٢٠١٠/٧/٢، استجابة مكتب الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦ و ٢٠١٠/٧/٨، استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.

إعادة تقييم فئات الدينار

أعلن البنك المركزي العراقي (CBI) انه ينوي تطبيق إعادة تقييم، مخطط منذ زمن، لفئات الدينار العراقي عن طريق إلغاء ثلاثة أصفار من القيمة الاسمية للأوراق النقدية. هذه العملية يقصد منها تسهيل الصفقات التجارية عن طريق الحدّ من الأخطاء والفوضى التي تسببها أحياناً كثيرة العملات البالغة التضخم. الآن، بعد ان حقق معدل التضخم في العراق مستوى من الاستقرار، فان هذا التحرك قد يخدم تعزيز الثقة بعملة البلاد. من المقرر ان تبدأ إعادة التقييم في أواخر ٢٠١٠ وتأخذ سنتين للإنجاز.^(٥٢٠)

لقد ثبت البنك المركزي العراقي سعر الصرف منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ على أساس ١١٧٠ دينار للدولار الأميركي الواحد^(٥٢١) وجعل معدلات الفائدة تستقر على ٦ بالمئة منذ نيسان/إبريل ٢٠١٠.^(٥٢٢) الشكل ٢-٤ يظهر الميول ربع السنوية الأخيرة للتضخم، والتضخم الأساسي، ومعدلات سعر صرف العملة.

الحكم الاقتصادي

الأهداف الاقتصادية لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)
يضع إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للعراق (UNDAF) للفترة ٢٠١١-٢٠١٤، أولوية عالية لتشجيع النمو الاقتصادي "الشامل، والعاقل، والقابل للاستدامة" ويتبنى الأهداف التالية:^(٥٢٣)

- زيادة النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى ٩,٣٨ بالمئة سنوياً.
- تنويع الاقتصاد العراقي وزيادة الإنتاجية في كافة القطاعات الاقتصادي.
- خلق وظائف مستدامة وتوليد المداخيل، وبنوع خاص، لدى الشباب والنساء.
- خفض مستويات الفقر بنسبة ٣٠ بالمئة.
- تعزيز دور القطاع الخاص في عملية التنمية القومية.
- زيادة مساهمة الزراعة في إجمالي الناتج المحلي.


للاطلاع على مقاييس وأهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية المُعيّنة للتنمية الاقتصادية، أنظر الجدول ٢-٣٢.

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الشكل ٢-٤٤

الاقتصاد العراقي، ٢٠٠٤ - ٢٠١٠

سعر النفط، إيرادات النفط العراقي والنتائج الوطني الإجمالي

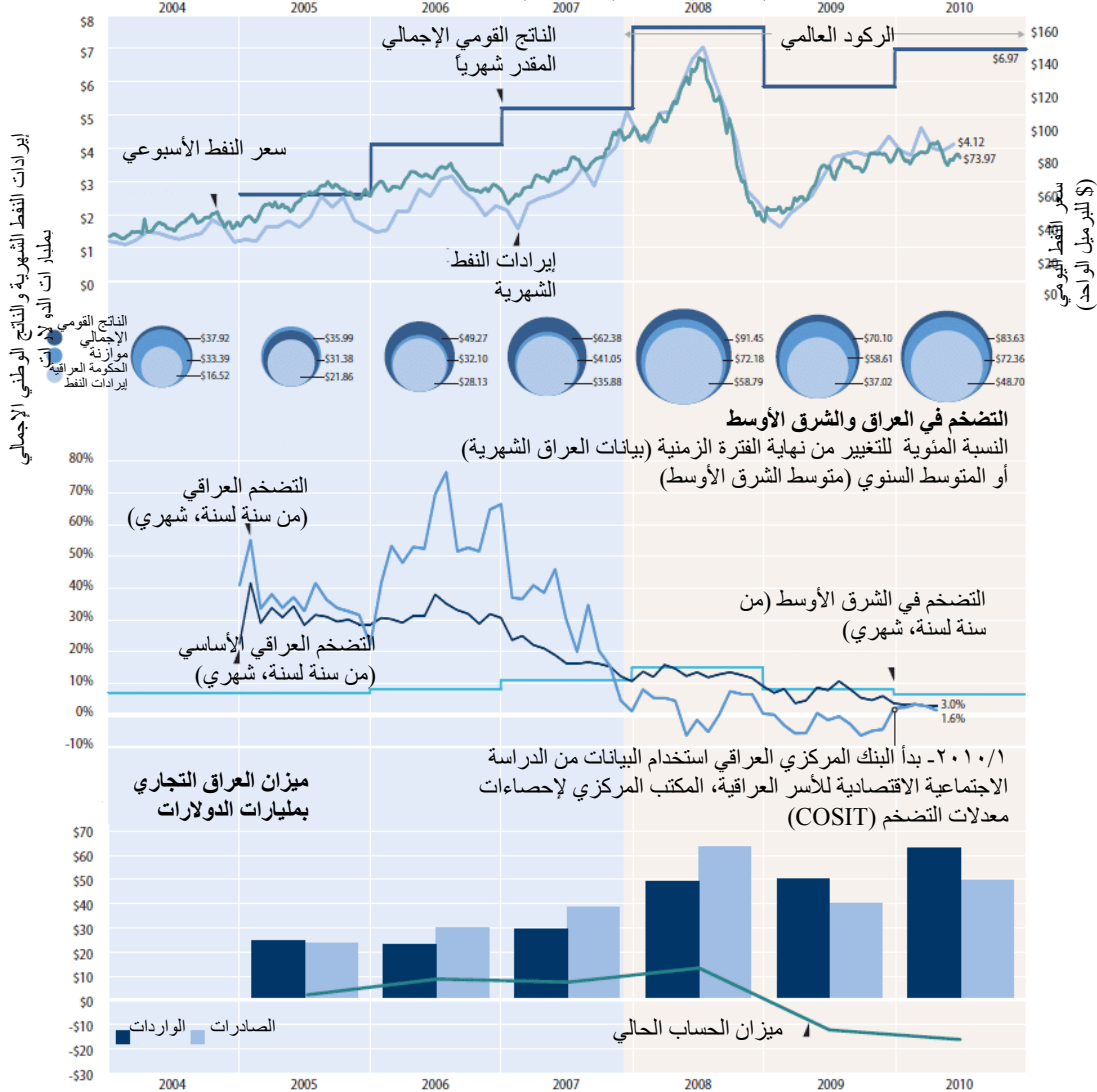

ملاحظة: البيانات لم تدقق. الأرقام تتأثر بالتدوير. أسعار النفط اليومية الممثلة بالسعر الأسبوعي الصافي لنفط كركوك العراق المستخدم أميركياً في الخليج، بتاريخ ٢٠١٠/٧/٩. الناتج القومي الإجمالي غير متوفر من صندوق النقد الدولي لسنة ٢٠٠٤، أرقام الناتج القومي الإجمالي ٢٠٠٨-٢٠١٠ وإيرادات النفط لسنة ٢٠١٠ هي تقديرات. الميزان التجاري لسنة ٢٠١٠ مقدر من جانب صندوق النقد الدولي.

المصادر: استجابة الملحق المالي في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣، صندوق النقد الدولي، "المسوحات الاقتصادية والمالية العالمية": قاعدة بيانات التوقعات الاقتصادية العالمية، ٢٠٠٩/١٠، www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2009/02/weodata/index.aspx، تم الوصول إليها في ٢٠٠٩/٧/٨، أسعار النفط اليومية الممثلة بالسعر الأسبوعي الصافي لنفط كركوك العراق المستخدم أميركياً في الخليج، "LeafHandler.ashx?n=PET&s=WEPCKIRK&f=W"، www.eia.gov/dnav/pet/hist، الحكومة العراقية، البنك المركزي العراقي "المؤشرات المالية الأساسية"، ٢٠١٠/٦/٢٣، www.cbi.iq/documents/key_financial.xls، تم الوصول إليه في ٢٠١٠/٧/٨.

أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) للتنمية الاقتصادية

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
ترتيب العراق في تقرير البنك الدولي حول "ممارسة الأعمال"	١٥٣ (٢٠٠٩)	٩٩
النسبة المئوية للتوظيف في القطاع الخاص	٢٢% (٢٠٠٨)	٣٥%
النسبة المئوية للقوة العاملة الاقتصادية النشطة	٤٦,٤٨% (٢٠٠٩)	٥٥%
النسبة المئوية للعاملات المهنيات والفتيات	٦١,٨% (٢٠٠٨)	< ٩٠%
متوسط الدخل الشهري للفرد بالدينار العراقي	١٢٥,١٠٠ (٢٠٠٧)	١٥٠,١٢٠
كلفة التصدير لكل حاوية من الموانئ العراقية	\$٣٩٠٠ (٢٠٠٩)	\$٣٥١٠
النسبة المئوية للسكان الذين يعيشون تحت خط الفقر	٢٢,٩% (٢٠٠٧)	١٦%
النسبة المئوية للتحويلات الاجتماعية المشروطة	٢٢% (٢٠٠٩)	٧٠%
النسبة المئوية للفقراء الذين لا يتلقون مساعدات اجتماعية عبر شبكة السلامة الاجتماعية	٩٦% (٢٠٠٧)	٦٠%

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، العراق، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الملحق (أ): مقياس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، ص ص ٤٣-٥٩.

تم تطوير إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) بالتفاهم مع خطة التنمية الوطنية (NDP) للحكومة العراقية والبالغة قيمتها ١٨٦ مليار دولار، والتي تعطي الأولوية لاستثمارات البلاد في قطاعات الإسكان، الاتصالات، الزراعة، الصحة والنقل.^(٥٢٤) عمل المستشارون الأميركيون عن كثب مع الحكومة العراقية لتطوير خططها الخمسية التي أعلنت في ٤ تموز/يوليو ٢٠١٠ ولكنها غير متوفرة حتى الآن باللغة الانكليزية.^(٥٢٥) من جملة الأهداف العديدة لخطة التنمية الوطنية، يقال ان الحكومة العراقية قد استهدفت البرامج والمشاريع لتوفير أكثر من ٣ ملايين وظيفة في القطاع الخاص.^(٥٢٦)

التوصيات السابقة للمفتش العام لم تتم معالجتها وأكثر من ٣٠ مليون دولار من أموال صندوق تنمية العراق (DFI) لا تزال في حسابات وزارة الدفاع الأميركية والمقاولين.

صندوق تنمية العراق

خلال اجتماعها نصف السنوي في نيسان/أبريل الماضي، تلقت الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB)، الجهاز التابع للأمم المتحدة والمكلف الإشراف على صندوق تنمية العراق (DFI)، أول تقرير ربع سنوي للحكومة العراقية حول خططها لترتيبات تعيين خلف لصندوق تنمية العراق. سلمت لجنة الخبراء الماليين (COFE) التقرير، وأعلنت ان الحكومة العراقية تنوي إبقاء حساباتها الحالية في صندوق تنمية العراق (DFI) في بنك الاحتياط الفدرالي لمدينة نيويورك (فدرال ريزرف بنك أوف نيويورك) وان الترتيبات الخاصة بالخلف سوف تشمل تأسيس تنوع أكبر للأصول. تحدث التقرير بإسهاب عن نجاحات العراق الأخيرة في ضمان اتفاقيات خفض الدين مع أكثر من ٦٠ بلداً، علماً ان العراق لا يزال يسعى إلى الحصول على تنازلات من قبل الدائنين التجاريين حول دين إضافي يبلغ حوالي ٦٠٠ مليون دولار.^(٥٢٧) تناولت اللجنة أيضاً التأخيرات الجارية في جمع ونشر الملخصات الشهرية للتدفقات المالية نحو

الداخل ونحو الخارج، وقد نتجت هذه التأخيرات عن التفجيرات في وزارة المالية في آب/أغسطس ٢٠٠٩.^(٥٢٨)

من الميرمج ان تتولى لجنة الخبراء الماليين التي يرأسها رئيس المجلس الأعلى للتدقيق، مسؤوليات الإشراف الكامل على صندوق تنمية العراق عندما تنتهي صلاحيات الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق (IAMB) في نهاية ٢٠١٠.^(٥٢٩) التقرير العراقي ربع السنوي القادم حول الترتيبات المخططة الخاصة بخلف صندوق تنمية العراق (DFI) كان مفترض صدوره في تموز/يوليو. للاطلاع على تدفق عائدات صندوق تنمية العراق (DFI) المالية، أنظر الشكل ٤٥-٢.

استخدم صندوق تنمية العراق لتمويل كل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وبرنامج الاستجابة الإقليمية السريعة، كما ان وزارة الدفاع حافظت على الإشراف على هذه الأموال إلى حين وضعت الحكومة العراقية حداً للترخيص للحكومة الأميركية لإدارة أموال صندوق تنمية العراق (DFI) في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧. غير ان بعض أموال صندوق تنمية العراق (DFI) بقيت في حسابات الحكومة الأميركية بعد هذا التاريخ.^(٥٣٠) خلال ربع السنة الحالي، اختتم المفتش العام تدقيقاً حول الرقابة المالية والإدارية على أموال صندوق تنمية العراق (DFI) التي جعلت متوفرة لوزارة الدفاع الأميركية، ووجد ان التوصيات السابقة للمفتش العام لم تتم معالجتها وأن أكثر من ٣٠ مليون دولار من صندوق تنمية العراق (DFI) لا تزال في حسابات وزارة الدفاع الأميركية والمقاولين. للاطلاع على ملخص أكثر تفصيلاً حول النتائج التي توصل إليها التدقيق والتوصيات، أنظر القسم ٣ في هذا التقرير.


تنمية القطاع الخاص

الزراعة

يوظف قطاع الزراعة في العراق حوالي ١٢,٣ بالمئة من إجمالي القوة العاملة،^(٥٣١) ويشكل ٤,٨ بالمئة من الناتج القومي الإجمالي (GDP)^(٥٣٢) ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) ان القطاع لا يزال يعاني من الانقطاعات بين المستهلكين والموردين، ومن التدخلات التنظيمية للحكومة التي تأتي على شكل إعانات تعرقل عمل السوق. ويعاني هذا القطاع أحياناً كثيرة، من البنية التحتية البالية للإنتاج، والتصنيع، والتسويق.^(٥٣٣) يكافح قطاع الزراعة العراقي للمنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية، بمنوجات تعاني من الكلفة العالية للنقل من المزارع إلى الأسواق، ومن مشاكل النوعية. إلى جانب عدم فاعلية قطاعه الزراعي يُجبر تزايد السكان السريع والطقس السيء، العراق على الاعتماد على المستوردات لتلبية حوالي ٨٠ بالمئة من استهلاكه الغذائي المحلي.^(٥٣٤) مقاييس وأهداف برنامج (UNDAF) الخاصة بالقطاع الزراعي مُدرجة في الجدول ٢-٣٣.

في حزيران/يونيو، أصدرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) طلباً للحصول على عروض لمشروع جديد لدعم قطاع الزراعة يهدف إلى معالجة المشاكل التي حالت دون تنمية الزراعة في العراق طيلة عقود – الإدارة السيئة، والتدخل المفرط للدولة في هذا القطاع.^(٥٣٥) المشروع الذي يُقدر كلفته بـ ٣٥ – ٤٥ مليون دولار، يتوقع ان يبني قدرة الحكومة العراقية على اتخاذ وتطبيق خيارات السياسة الزراعية المناسبة لأجل الفهم الأفضل والاستجابة للمحركات الاقتصادية للقطاع، ولتطوير مؤسسات محلية لتوليد تقييمات وتحليل موضوعية للسياسات الزراعية الفعلية والمستقبلية.^(٥٣٦)

الشكل ٤٥-٢
تدفق عائدات النفط لحكومة العراق

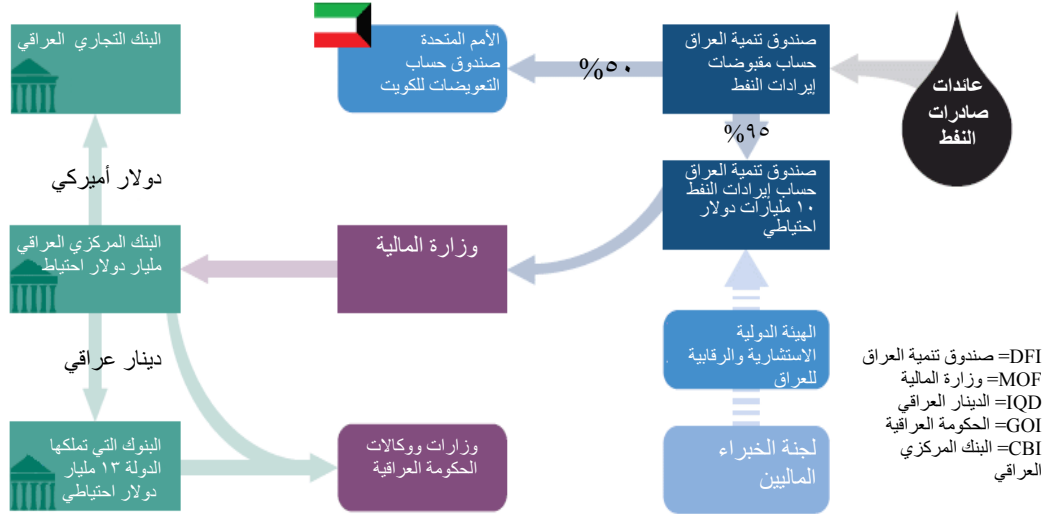

المصادر: تحليلات المفتش العام المستندة إلى قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR) (١٩٠٥، مستندات الهيئة الدولية الاستشارية والرقابية للعراق، استجابة الملحق المالي في السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٧، كبير المستشارين لحاكم البنك المركزي العراقي، مقابلة مع المفتش العام، ٢٠١٠/٥/٢٥.

البعثة التجارية

خلال ربع السنة الحالي، زارت البعثة التجارية الزراعية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية (USDA) بغداد، وجاءت بممثلين من ١٨ شركة زراعية أميركية لاستكشاف فرص الاستثمار في العراق. استضافت البعثة التي تبلغ مدتها ثلاثة أيام حلقات دراسية حول قوانين الاستيراد، والظروف الأمنية، والمالية التجارية، وعقدت ٢٥٠ اجتماع بين ممثلي الشركات الأميركية والعراقية^(٥٣٧) وفقاً للسفارة الأميركية في بغداد، كان أحد أهداف البعثة التجارية توسعة التجارة الخاصة لتوفير مدخلات زراعية حرجة يحتاجها القطاع الزراعي مثل علف الحيوانات، والبنار، ومعدات الري^(٥٣٨). العراق الذي استورد ١٦٧ مليون دولار من السلع الزراعية الأميركية خلال الأشهر الخمسة الأولى من ٢٠١٠، يجري تسويقه لدى مؤسسات الأعمال من جانب الوكالات الأميركية كمنطقة للنمو متزايدة الأهمية ومربحة^(٥٤٠).

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

الجدول ٢-٣٣

أهداف إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF) للزراعة

المقاييس	الخط القاعدي	هدف العام ٢٠١٤
خطة التخفيف من آثار الجفاف تمت صياغتها وطُبقت	لا (٢٠٠٩)	نعم
هيئة ما بين الوزارات للموارد المائية العابرة للحدود أُقيمت مع مشاركة الأمم المتحدة	لا (٢٠٠٩)	نعم
النسبة المئوية للغذاء المصنّع محلياً في العراق والخاضع لقوانين سلامة الغذاء	٥٨% (٢٠٠٩)	٩٥%
النسبة المئوية للزيادة في عدد العراقيين الذين يستلمون بذوراً جيدة النوعية	١٥% (٢٠٠٩)	٢٥%
النسبة المئوية للزيادة في الخدمات المتوفرة للمزارعين للتخصيب الاصطناعي للمواشي والعلف والتلقيح	٢٠ إلى ٢٥% (٢٠٠٩)	٥٠%
النسبة المئوية لمساحة الأراضي المصابة بالتصحّر	٩% (٢٠٠٩)	٩%

المصدر: فريق الأمم المتحدة المقيم في البلاد (UNCT)، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، العراق، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١١/٥/١١، الملحق (أ): مقياس النتائج لإطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية (UNDAF)، ص ص ٤٣-٥٩.

محاصيل القمح الشتوي

نهضت محاصيل القمح الشتوي في العراق هذه السنة^(٥٤١) ويقدر حصاد العراق من القمح سنة ٢٠١٠ بمليونين إلى ٢,٢ مليون طن متري، وهو نفس متوسط السنوات الخمس، وأكبر إلى درجة كبيرة من حصاد السنة الفائتة البالغ ١,٣ طن متري^(٥٤٢) وفقاً لمصلحة الزراعة الخارجية التابعة لوزارة الزراعة الأميركية، هطول الأمطار الموسمي الكافي والحرارة المعتدلة في المناطق الشمالية خلال فصل الشتاء ساعدت في الإنتاج المتزايد هذه السنة. لقد عاشت المحافظات في الشمال، مثل نينوى ودهوك، موسماً زراعياً مثالياً على العموم على الرغم من أن الأراضي التي تغذى بالري على طول نهري دجلة والفرات استمرت بالمعاناة من النقص في المياه^(٥٤٣). هطول الأمطار الأعلى وإن كان يفيد المحاصيل التي تغذيها الأمطار، قصر في تحسين مستويات المياه بصورة كبيرة في الخزانات^(٥٤٤).

الطقس المثالي الذي سمح بمكاسب كبيرة في محاصيل الحبوب الشتوية في أرجاء مناطق إنتاج الحبوب - من سوريا الشرقية إلى جنوب تركيا وشمال العراق - قد سبب أيضاً بانتشار موجة جديدة من "الصدأ الأصفر"^(٥٤٥) وهي آفة زراعية فطرية قادرة على تدمير ٥٠ بالمئة أو أكثر من المحاصيل المصابة^(٥٤٦). ففي الوقت الذي تعاني فيه سوريا من وطأة هذا الانتشار، حملت الرياح الغربية القوية "البوغات" إلى أجزاء من محافظات نينوى، وأربيل، والتأميم في العراق. من المتوقع الآن أن تعاني هذه المناطق من خسارة تبلغ ١٠ إلى ١٥ بالمئة من المحاصيل التي سجلت في إجمالي حصيلتها العراق المقدر للسنة هذه^(٥٤٧).

خطط مشتريات القمح لمجلس الحبوب العراقي (IBG)

مجلس الحبوب العراقي (IBG)، الهيئة التابعة للحكومة العراقية والتي تدير إمدادات البلاد من القمح، أعلن عن نيته، خلال ربع السنة الحالي، مضاعفة مشترياته من القمح المنتج محلياً، من ٧٥٠,٠٠٠ طن متري السنة الماضية إلى ١,٥ مليون طن متري، أو حوالي ٦٨ بالمئة من محاصيل العراق المتوقعة للسنة ٢٠١١/٢٠١٠^(٥٤٨). وفقاً لتقرير صدر مؤخراً لوزارة الزراعة الأميركية، كان مجلس الحبوب العراقي ينيو أصلاً شراء فقط القمح المنتج محلياً من الدرجة


الأولى (درجات القمح العراقية على سُلّم ١ إلى ٣، مع الدرجة ١ قابلة للاستهلاك البشري والدرجة ٣ قابلة للاستهلاك كعلف للحيوانات)^(٥٤٩) لكن، وبالمتوسط، فإن ثلث الإنتاج العراقي فقط هو من هذا المستوى من الجودة، مما يعني ان أغلبية مشتريات مجلس الحبوب العراقي هذه السنة ستكون، على الأرجح، من القمح ذي الدرجة المتدنية.^(٥٥٠)

وفقاً لوزارة الزراعة الأميركية، من المُرجح ان السياسة الجديدة سوف ترضي المنتجين الذين انتقدوا قرار مجلس الحبوب العراقي هذه السنة بخفض السعر الرسمي الذي سيدفعه للقمح المحلي. غير ان مشتريات مجلس الحبوب العراقي من القمح سوف يعاد توزيعها إلى العراقيين عبر نظام التوزيع العام (PDS) الذي تديره وزارة التجارة. لما كان مجلس الحبوب العراقي سيخبط طحين نظام التوزيع العام مع قمح من نوعية دون المتوسط، فان مثل هذا التحرك قد يسبب تدمراً بين المستفيدين من المساعدات الغذائية. تاريخياً، يبيع الذين يتلقون حصص الطحين الرديئة ويستخدمون الأموال لشراء القمح المستورد العالي النوعية. النسبة بين القمح المستورد والقمح الموزع عبر نظام التوزيع العام التي كان متوسطها حوالي ١:٥ في السنوات الأخيرة، سوف يهبط إلى ١:٣٠٢ في حال طبق مجلس الحبوب العراقي السياسة الجديدة. هذا يعني ان على العراقيين شراء المزيد من الطحين المستورد العالي النوعية على حسابهم – أو ربما لن يشتروه أصلاً.^(٥٥١)

كبدل لذلك، قد يضع مجلس القمح العراقي كميات كبيرة من القمح المحلي في المستودعات، ظاهرياً لبناء احتياطي إستراتيجي من القمح كأسلوب لعزله عن الاستخدام المحلي.^(٥٥٢) وقد يسمح ذلك لمجلس القمح العراقي بمواصلة استخدام نسبة مئوية أعلى من القمح المستورد في حصص نظام التوزيع العام وإنتاج طحين أكثر قبولاً من جانب المستهلكين.^(٥٥٣) مع تأثر إنتاج القمح بصورة حادة "بالصدأ الأصفر" هذه السنة، في تركيا وإيران، المنتجان الرئيسيان للقمح في المنطقة، قد يستفيد منتجو القمح الأميركيون في حال قاد استياء العراقيين من طحين نظام التوزيع العام ذو النوعية المتدنية إلى مزيد من الاستهلاك الفردي للمستورادات الأجنبية.^(٥٥٤) للاطلاع على التفاصيل حول إمدادات القمح في العراق، بما في ذلك المستورادات من الولايات المتحدة، أنظر الشكل ٤٦-٢.

الشكل ٢-٤٦

إمدادات القمح العراقية، ٢٠٠٧ - ٢٠١١
بآلاف الأطنان المترية

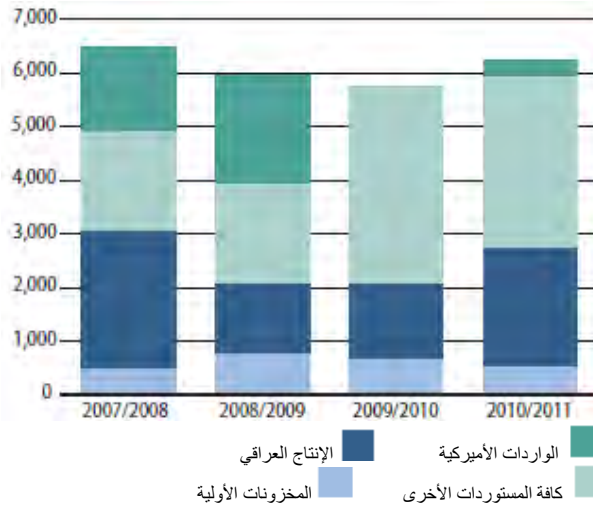

المصادر: وزارة الزراعة الأميركية، (FAS)، تحديث المعلومات حول القمح- مشتريات مجلس القمح" ، تقرير غاين: العراق، ٢٠١٠/٦/١٣، gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wheat%20Update%20%20Grain%20Board%20Purchasing_Baghdad_Iraq_6-13-2010.pdf، تم الوصول إليها في ٢٠١٠/٦/٣٠، وزارة الزراعة الأميركية، النظام العالمي لتجارة القمح، www.fas.usda.gov/gats/default.aspx، تم الوصول إليها في ٢٠١٠/٧/٣.

البرامج الممولة من الولايات المتحدة

واصلت برامج إعادة الإعمار الأميركية دعم القطاع الزراعي في العراق خلال ربع السنة الحالي. ففي أيار/مايو، أهدى لواء من فرقة المشاة الثانية ١١ بقرة هولشتاين إلى كلية الزراعة بجامعة بغداد، و ١١ بقرة أخرى إلى كلية البيطرة في الجامعة مع المعدات المخصصة للتلقيح الاصطناعي.^(٥٥٦) كانت هذه الهبات جزءاً من برنامج بقيمة ٨٣,٠٠٠ دولار لتدريب الطلاب على تقنيات إدارة المواشي ولتقديم دخل بسيط إلى الكليات من بيع منتجات الحليب من القطيع.^(٥٥٧)

في محافظة نينوى، زوّدت القوات الأميركية المزارعين بحظائر لعلف الماشية وساعدت في بناء مرفقين لتنقية البذار مُمولة بالتساوي من مساهمات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) والحكومة العراقية. وقدمت أيضاً أنظمة الري بالتنقيط للمزارعين في المحافظة إلى جانب حوالي ٧٥,٠٠٠ صوص و ٤٥٠٠ خروف.^(٥٥٨) المبادرة جزء من جهد كبير تقوده الولايات المتحدة لتزويد المنطقة بالمرفق معالجة السلع الزراعية بصورة نظيفة وفعالة وللحدّ من الاعتماد على الغذاء المستورد من البلدان المجاورة.^(٥٥٩)

**قد يستفيد منتجو القمح الأميركيون في حال قاد استيلاء العراقيين
من طحين نظام التوزيع العام ذو النوعية المتدنية إلى مزيد من
الاستيراد الخارجي.**

تواصل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) دعم القطاع عبر برنامج "إنماء" لتنمية التصنيع الزراعي. ذكرت الوكالة عدة إنجازات خلال ربع السنة الحالي: (٥٦٠)



أبقار وهبتها القوات الأميركية في العراق إلى كلية زراعية في بغداد.

- تهجين أنواع منتقاة من الأسماك التي أنتجت حوالي ١٢٠ مليون سمكة صغيرة لكي تنمو وتباع سنة ٢٠١٠.
- المساعدة لـ ٤٢ شركة وجمعية مزارعين في وضع وتطبيق خطط أعمال لانتقال الزراعة العراقية باتجاه الإنتاج المستند إلى السوق.
- تدريب ٦٨٠ مزارع في إنتاج الفواكه وافتتاح خمسة مراكز تدريب في الحقول المكشوفة مُركزة على إنتاج البطيخ والخضار.

القطاع المصرفي

عرف القطاع المصرفي الفوضى في نشاطاته خلال ربع السنة الحالي كنتيجة لهجمات المقاتلين على المقرات الرئيسية للبنك المركزي العراقي (CBI) وبنك العراق التجاري (TBI) وكذلك بسبب فضيحة احتيال طالبت بنوكاً تمتلكها الدولة وزبائنها من القطاع الخاص.

قضية الاحتيال في بنوك تمتلكها الدولة

سحب موظفون في بنك الرافدين والبنك الزراعي أموالاً وحولوها إلى كيانات خاصة كقروض غير مسجلة. لقد تم استثمار الأموال لصالح فرقاء من القطاع الخاص، الذين قاموا لاحقاً بإعادة الأموال إلى موظفي بنوك متواطئين معهم لإياداعها من جديد. حوالي ٩ تريليون دينار عراقي (٧،٧ مليار دولار) من التحويلات خلال فترة من الوقت، وعلى الرغم من ان معظم الأموال قد أعيدت، بقي هناك ٧٥ مليون دولار من البنك الزراعي و ٣٠٠ مليون دولار من بنك الرافدين دون احتساب لها. (٥٦١)

قامت هيئة النزاهة بعمليات التحقيق ومقاضاة القضايا القانونية بالتعاون مع المجلس الأعلى للتدقيق، والمفتش العام لوزارة المالية. (٥٦٢) لقد وجهت الاتهامات إلى مدراء أربعة فروع مصرفية وتلقى هؤلاء أحكاماً بالسجن. (٥٦٣)

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

٧٥ مليون دولار من البنك الزراعي و ٣٠٠ مليون دولار من بنك الرافدين
لا تزال دون محاسبة.

الهجمات على البنك المركزي العراقي وبنك العراق التجاري

في حزيران/يونيو، كان البنك المركزي العراقي وبنك العراق التجاري أهدافاً لهجمات أفراد الميليشيات. في ١٣ حزيران/يونيو هاجم مسلحون يرتدون بزات الجيش العراقي المقر الرئيسي للبنك المركزي العراقي في وسط بغداد، وأشعلوا النيران في عدة طبقات من المبنى وقتلوا ٢٦ شخصاً. اكتشفت جثث سبعة مهاجمين عندما دخلت القوى الأمنية المبنى في وقت لاحق من ذلك اليوم.^(٥٦٥) كان البنك المركزي قد بدأ إعادة تأهيل مُجمعة المتداعي قبل أسبوعين من هجمات حزيران/يونيو.^(٥٦٦)

في ٢٠ حزيران/يونيو، قام انتحاريان في سيارة مفخخة بمحاولة فاشلة لدخول محيط بنك العراق التجاري. قتلوا أنفسهم و ١٨ شخصاً آخرين خلال العملية.^(٥٦٧)

مبادرة "بنوك على القواعد"

خلال ربع السنة الحالي، أدت مبادرة "بنوك على القواعد"، وهي برنامج تابع لوزارة الدفاع الأميركية لاستبدال استخدام الدولار بالقواعد الأميركية لصالح الدينار ولزيادة استخدام التحويلات الإلكترونية، إلى فتح المجال أمام مكتب لفرع جديد لبنك بغداد في معسكر الحرية (كامب ليبرتي). الفرع سيكون الثاني الذي يُفتتح في مجمع "قاعدة النصر" المجاور لمطار بغداد الدولي.^(٥٦٨) افتتحت المبادرة فرعين آخرين على قواعد أميركية أخرى، مع ثمانية فروع أخرى مخططة في أماكن أخرى.^(٥٦٩)

الاستثمارات الخارجية المباشرة والخصخصة

يواصل المجتمع الدولي تقييم العراق كمكان يتضمن مخاطر أساسية لممارسة الأعمال. مثلاً، منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) التي تحتفظ بنظام لتصنيف أخطار الائتمان للصادرات المعروف بـ "حزمة كنيبن"، أعادت خلال ربع السنة هذا تقييمها لبلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.^(٥٧٠) يحدد النظام مراتب البلدان ضمن ثماني فئات للمخاطر حيث فئة الصفر تمثل المخاطر الأدنى والفئة ٧ تمثل المخاطر الأعلى. يؤثر ترتيب المخاطر في البلدان على العلاوات وعلى معدلات الفائدة التي يوافق أعضاء منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) على فرضها على بلد معين، والتي تغطي مخاطر عدم إعادة دفع اعتمادات الصادرات.^(٥٧١) تلك البلدان التي لديها أرقام أعلى تواجه تكاليف استقرار أكبر أو هي ممنوعة من الاستقرار تماماً. درجة ٧ للعراق لم تتغير منذ ١٩٩٩.^(٥٧٢)

واصلت كل من الحكومتين العراقية والأميركية جهودهما الخاصة خلال ربع السنة الحالي لجعل العراق مكاناً أكثر جاذبية بالنسبة للشركات الأجنبية للاستثمار في العراق. فنظمت السفارة الأميركية في بغداد – بالتعاون مع فرقة إعادة إعمار المحافظات (PRT) في بغداد، ومع شركة تسويق خاصة – معرضاً للكتالوجات في حزيران/يونيو قدمت فيه للشركات الأميركية فرصة لعرض المعلومات حول خدماتها ومنتجاتها ومقابلة الزبائن المحتملين. جذب الحدث ١٢٠ شركة أميركية و ١٠٠ شركة عراقية.^(٥٧٣)

أعلنت قوة المهمة للاستثمار وإعادة إعمار العراق التابعة لوزارة التجارة الأميركية (IIRTF)، خلال ربع السنة الحالي، أنها سترسل بعثة تجارية رسمية إلى بغداد مبرمجة مؤقتاً في تشرين

الأول/أكتوبر ٢٠١٠. وفقاً لقوة المهمة للاستثمار وإعادة إعمار العراق التابعة لوزارة التجارة الأميركية (IIRTF)، سوف تساعد البعثة الشركات الأميركية المشاركة في موضوعة نفسها لأجل الدخول أو لتوسعة حضورها في قطاعات مستهدفة بما فيها النفط والغاز، والإعمار، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات.^(٥٧٤) البعثة التجارية هي آخر حدث تنظمه قوة المهمة للاستثمار وإعادة إعمار العراق التابعة لوزارة التجارة الأميركية (IIRTF) التي عملت لتوسعة وتعميق العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة والعراق.



رئيس وزراء إقليم كردستان الدكتور برهام صالح يلقي الخطاب الرئيسي في مؤتمر التجارة والاستثمار الكردي الذي عُقد في لندن في ٥ حزيران/يونيو ٢٠١٠. (الصورة لحكومة إقليم كردستان)

في حزيران/يونيو، عقدت حكومة إقليم كردستان (KRG) المؤتمر الكردي للتجارة والاستثمار ٢٠١٠ في لندن. ألقى رئيس وزراء حكومة إقليم كردستان، برهم صالح، الخطاب الرئيسي، وأعلن عدة مبادرات جديدة، وشدد على خطة الإقليم لجذب الاستثمارات الأجنبية عن طريق إلزام موارد كبيرة لتعليم وتدريب المواطنين. في محاولة للدلالة على التزامها المعلن بجعل الإقليم مقصداً مضيافاً أكثر بالنسبة للرساميل الأجنبية. تعهدت حكومة إقليم كردستان تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية - ١٠٠ مليون دولار - لإرسال الطلاب الموهوبين لمتابعة الدراسات المتقدمة في الجامعات حول العالم، كما أسست صندوق إسكان بقيمة ١٧٠ مليون دولار لبناء ٧٠٠٠ وحدة سكنية وشقق جديدة في أنحاء إقليم كردستان.^(٥٧٥) أشار د. صالح أيضاً إلى مصادقة مجلس الوزراء في حكومة إقليم كردستان على اقتراح لإنشاء هيئة لمكافحة الفساد، وتشجيع الحكم الجيد، وإدخال قانون سلوك للموظفين الرسميين.^(٥٧٦)

قوة المهمة للأعمال و علميات إرساء الاستقرار

في أيار/مايو، أبلغت قوات الجيش الأميركي - القيادة الوسطى لقوات الجيش الأميركي (ARCENT) فريق العمل لتحسين الأعمال وإرساء الاستقرار (TFBSO) الممولة من وزارة الدفاع، ان كافة عمليات تحويل التمويل إلى عمليات فريق العمل لتحسين الأعمال وإرساء الاستقرار (TFBSO) سوف تُجمد بسبب مخاوف من انها غير مؤهلة لتمويل العمليات الطارئة الخارجية (OCO) لقيادة الوسطى للجيش الأميركي. غير أن وزارة الدفاع حددت لاحقاً ان الخيار القانوني الأصلي كان غير صحيح، وقد رُفِع تجميد التمويل في أيار/مايو الماضي. يشمل فريق العمل لتحسين الأعمال وإرساء الاستقرار (TFBSO) حالياً ٢٠٨ مقاول و ٣٧ موظف مدني وضابطين عسكريين، ولديه مكاتب في بغداد والبصرة. يتوقع فريق العمل لتحسين الأعمال وإرساء الاستقرار اختتام عملياته في العراق في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠١١.^(٥٧٧)

مصادر تمويل إعادة الإعمار واستخداماتها

من أصل ١٠٠ مليون دولار من المخصصات مجتمعة للسنة المالية ٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٨، ذكر فريق العمل لتحسين الأعمال وإرساء الاستقرار انه ألزم ٨٦ مليون دولار وأنفق ٤٩,٩ مليون دولار، بتاريخ حزيران/يونيو ٢٠١٠، لدعم إعادة العراق إلى التصنيع عبر إعادة تجهيز المؤسسات التي تمتلكها الدولة. وفقاً للفريق المذكور (TFBSO)، أصبحت ٤١ مؤسسة قادرة على الافتتاح من جديد أو زيادة الإنتاج بمساعدة استثمارات برنامج فريق العمل (TFBSO). مشيراً إلى الهواجس الأمنية ومتطلبات السرية، لم يفصح فريق العمل (TFBSO) عن تفاصيل مشاريعه الجاري تنفيذها.^(٥٧٨)

مشيراً إلى الهواجس الأمنية ومتطلبات السرية، لم يفصح فريق العمل لتحسين الأعمال والاستقرار (TFBSO) عن تفاصيل مشاريعه الجاري تنفيذها.

روح المبادرة في الأعمال

في حزيران/يونيو، أعلن برنامج النمو الاقتصادي في المحافظات "تجارة" عن افتتاح، مكتب الفرع المئة للتمويل الجزئي في نينوى الذي سوف يُموّل عبر البرنامج. وأعلن "تجارة" أيضاً عن مبادرة جديدة، خلال ربع السنة الحالي، تهدف إلى تزويد العراقيين التي تتراوح أعمارهم بين ١٨ و٣٥ سنة بالمهارات التجارية الأساسية، وفرص إنشاء المشاريع، وفرص التأهل للحصول على القروض للبدء بمشاريعهم الخاصة. البرنامج مُموّل بـ ١٢ مليون دولار من برنامج السفير للتنمية المحددة الأهداف.^(٥٧٩)

قطاع التمويل الجزئي العراقي الذي تلقى دعماً كبيراً من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، يضم ١٤ مؤسسة تمويل جزئي (MFIS) تعمل في ١٨ محافظة. اثنتان من المؤسسات تعملان دولياً، وتخدمان مع المؤسسات الـ ١٢ الداخلية، أكثر من ٦٢,٠٠٠ زبون مع محفظة استثنائية تبلغ ٨٤ مليون دولار.^(٥٨٠)

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

عمليات التدقيق الشرعية لإنفاقات الوكالات ومبادرة التدقيقات/التحقيقات التفاعلية.

عمليات التدقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

عمليات التقييم للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

خط الاتصال المباشر للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

موقع المفتش العام على شبكة الإنترنت

تحديث التشريعات

القسم

٣

عمليات التدقيق الشرعية لإنفاقات الوكالات ومبادرة التدقيقات/التحقيقات التفاعلية.

مديريات التدقيق والتحقيق التابعة لمكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق منخرطة في مجموعة من مبادرات التدقيق والتحقيق الاستباقية الشرعية مصممة لتحديد عمليات الاحتيال والهدر وإساءة الاستعمال. عملية التحليل مصوّرة في الشكل ٣-١.

يفرض القانون العام P.L. 108-106، كما تم تعديله، بأن يُعدّ المفتش العام تقرير تدقيق شرعي حول كافة التمويلات المخصصة لإعادة إعمار العراق التي بلغ مجموعها لتاريخه أكثر من ٥٣ مليار دولار. خلال السنتين الماضيتين، أجرى المفتش العام سلسلة من ١٨ تدقيق ل عقود إعادة الإعمار الرئيسية التي كانت تهدف، جزئياً، إلى تحديد نقاط الضعف في الرقابة الداخلية. ولأن مثل نقاط الضعف هذه توفر الفرص للاحتيال، والهدر، وإساءة الاستعمال، استخدم المفتش العام نتائج هذه التدقيقات لتطوير مقاربات تدقيق شرعية محددة الأهداف للتعرف على الحالات المحتملة للسلوك الخاطئ.

التدقيق القانوني الشرعي هو دراسة نظامية للرقابة الداخلية على نفقات البرامج أو البيانات المالية الأخرى لتحديد الحالات الشاذة في المعاملات الفردية التي يمكن ان تشير إلى الاحتيال، الهدر أو إساءة الاستعمال. مجموعة التدقيق لدى المفتش العام، تعمل حالياً على مشاريع خاصة بوزارة الدفاع (المشروع رقم ٩٠٠٥، الذي بدأ في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨) وبوزارة الخارجية (المشروع رقم ٩٠١٢، الذي بدأ في آذار/مارس ٢٠٠٩)، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) (المشروع رقم ٩٠١٣، الذي بدأ في آذار/مارس ٢٠٠٩). الهدف من هذه المشاريع هي فحص سلامة نفقات مشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراق. صدرت أربع تقارير مرحلية حتى تاريخه، وهي كانت قد لخصت عدد المعاملات المالية التي جرت مراجعتها إضافة إلى الأموال المستعادة والتدقيقات والتحقيقات الناتجة. وقد زودت مجموعة التدقيق الشرعي أيضاً بمعلومات جُمعت خلال عمليات البحث عن البيانات الشرعية دعماً لعمليات التدقيق والتحقيق التي يجريها المفتش العام حالياً.

خلال ربع السنة الحالي، أنجزت مجموعة التدقيق الشرعي لدى المفتش العام مراجعتها للمدفوعات التي يُحتمل أن تكون مكررة خلال المعاملات المالية لوزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والمتعلقة بمشاريع إغاثة وإعادة إعمار العراق. ونتيجة لهذا المجهود، استعادت وزارة الدفاع ١٤٢ ألف دولار من المدفوعات الزائدة. وفيما يخص المدفوعات المكررة المحتملة، خلال المعاملات المالية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أكدت المجموعة الشرعية وجود مدفوعات زائدة أو مكررة، وتعديلات في المدفوعات والمحاسبة بقيمة ٤٨,٦ مليون دولار. وحددت هذه المراجعة أيضاً ان الوكالة الأميركية للتنمية الدولية قد حددت المعاملات المالية العديدة وانها استعادت الأموال أو أجرت تعديلات في "دفتر الأستاذ" المحاسبي لجميع هذه الأموال. تواصل مجموعة التدقيق الشرعي تدقيقها للمدفوعات المحتمل ان تكون مكررة خلال المعاملات المالية لوزارة الخارجية والمتعلقة بالبرامج الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار

العراق (IRRF) وصندوق دعم الاقتصاد (ESF). جرى تحديد ٧٧ معاملة مالية، بلغت قيمتها الإجمالية ٥٣,٥ مليون دولار، لكي تتم مراجعتها وتحليلها بشكل عميق.

الشكل ٣-١

عملية التدقيق القانوني الشرعية



مقاربة المفتش العام تجمع بين استخراج البيانات الممكنة وبين تقنيات التدقيق والتحقيق المعيارية لاكتشاف الصفقات المشكوك فيها وتطوير الأدلة المرتبطة بها لاستخدامها في الإجراءات الإدارية أو القضائية المدنية أو الجنائية بسبب الاحتيال. المسائل التي عالجها القرار الإداري بالطريقة الأنسب، مثل طريقة "نقض التكلفة واستردادها"، سوف تُحال عبر تقارير التدقيق إلى مسؤولي التعاقد في الوكالات المعنية لأجل اتخاذ الإجراءات الملائمة.

تواصل مديرية التدقيقات ومديرية التحقيقات في مكتب المفتش العام توسيع نشاطها الاستباقي المشترك الذي بدأ في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. يُركز هذا الجهد على برامج إعادة وإعادة إعمار العراق التي تؤمن الوصول السهل إلى الأموال النقدية المرتبطة بالرقابة الضعيفة على النفقات. لتاريخه، فتح المفتش العام ٤٩ تحقيقاً جنائياً جراء هذا الجهد. ورمز المشروع أيضاً الدعم للتحقيقات الجنائية التي كانت جارية.

عمليات تدقيق المفتش العام

من ١ أيار/مايو ٢٠١٠ حتى ٣٠ تموز/يوليو ٢٠١٠، أصدر المفتش العام خمسة تدقيقات تناولت مجال واسع من مسائل إعادة الإعمار، وقد شملت:

- تقريراً يصف وضع تخصيصات صندوق دعم الاقتصاد.
- تقريراً يصف المدى الذي وصلت إليه منظمات وزارة الدفاع فيما خص مساءلتها عن الأموال التي تلقتها من صندوق تنمية العراق.
- تقريراً حول إدارة وزارة الخارجية لهيات الديمقراطية إلى المعهد الجمهوري الدولي.
- تقريراً يقوم بتحديث جهود التدقيق الشرعي التي يبذلها المفتش العام.
- تقريراً حول وضع مخططات الوكالة الأميركية لحفظ ملفات عقود وبرامج إعادة الإعمار.

للإطلاع على قائمة بمنتجات التدقيق راجع الجدول ١-٣.

لدى المفتش العام حالياً ١٣ تدقيقاً جاري تنفيذها. وهناك تدقيقات أخرى من المتوقع أن يبدأ تنفيذها في ربع السنة الحالي. ينقذ المفتش العام أعمال التدقيق بظل معايير التدقيق المقبولة حكومياً.

الجدول ١-٣

منتجات تدقيق المفتش العام اعتباراً من ٢٠١٠/٤/٣٠.

رقم التقرير	عنوان التقرير	تاريخ الإصدار
10-018	معظم تخصيصات صندوق دعم اقتصاد العراق جرى إلزامها وإنفاقها	٢٠١٠/٧
10-019	صندوق إعادة إعمار العراق: التدقيقات الشرعية تحدد الاحتيال والهدر وسوء الاستخدام- التقرير المرحلي رقم ٤	٢٠١٠/٧
10-020	صندوق تنمية العراق: على وزارة الدفاع تحسين رقاباتها المالية والإدارية.	٢٠١٠/٧
10-021	مخططات حفظ سجلات عقود وبرامج إعادة إعمار العراق تحتاج إلى التحسين.	٢٠١٠/٧
10-022	الإشراف المحسن مطلوب لهيات وزارة الخارجية إلى المعهد الجمهوري الدولي	٢٠١٠/٧

تدقيقات المفتش العام النهائية لربع السنة الحالي

معظم أموال دعم اقتصاد العراق جرى إلزامها وإنفاقها

(تقرير لمفتش العام 10-018, ٢٠١٠/٧)

المقدمة

منذ العام ٢٠٠٦، تلقت كل من وزارة الخارجية (DoS) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ووزارة المالية، ووزارة العدل، من بين آخرين، مبلغ ٤٥٢٧ مليون دولار في صندوق دعم الاقتصاد (ESF) خاصة لبرامج في العراق. صندوق دعم الاقتصاد هو مساعدة اقتصادية مزدوجة مخصصة

عمليات تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

لاستخدام حلفاء الولايات المتحدة والبلدان الموجودة في مرحلة الانتقال إلى الديمقراطية من أجل الترويج لأهداف السياسة الخارجية الأميركية. تخصيصات صندوق دعم الاقتصاد، هي تخصيصات لسنتين بظل سلطة قانون المساعدة الأجنبية الصادر عام ١٩٦١. لكن التمويل يبقى متوفراً لإلغاء الإلزام وبالتالي إعادة الإلزام من جديد لفترة أربع سنوات بعد انتهاء صلاحية التخصيص. هناك مبالغ محددة لصندوق دعم الاقتصاد (ESF) بالدولار مطلوب ذكرها في موازنة الرئيس المقدمة إلى الكونغرس ومصادقة هذا الأخير عليها في حساب موازنة العمليات الأجنبية للشؤون الدولية لدى وزارة الخارجية وتمويل الصادرات والبرنامج المتعلقة.

واعتباراً من منتصف العام ٢٠٠٦، أصبحت تعتبر وزارة الخارجية، عبر مدير المساعدات الأجنبية، مسؤولة عن قرارات برمجة صندوق دعم الاقتصاد. الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وعدة مكاتب لدى وزارة الخارجية سلّمت مخططات إنفاق للنشاطات المقترحة في العراق، وبعد المراجعة، يقوم مدير المساعدة الأجنبية بتخصيص الأموال.

نظرت مراجعة المفتش العام بشكل خاص في مبلغ ١٣٩٧ مليون دولار المخصص لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) ومبلغ ٢٣٣٧ مليون دولار المخصص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

النتائج

مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)

بين السنتين الماليين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٨، تلقى مكتب المساعدة الانتقالية للعراق ١٣٩٧ مليون دولار كتمويل في صندوق دعم الاقتصاد (ESF) وجرى إلزام مبلغ ١٣٧٨ مليون دولار منها (ما يقرب من ٩٩%).

من أصل مبلغ ال ١٣٧٨ مليون دولار هذا، واعتباراً من ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠، جرى إنفاق حوالي ١٠٣٠ مليون دولار (٧٥ بالمئة تقريباً)، ويبقى حوالي ٣٤٧ مليون دولار منها (أكثر من ٢٥ بالمئة) بحاجة إلى الإنفاق.

حوالي ٢٠ مليون دولار (١ بالمئة تقريباً) من الأموال المخصصة لم تكن قد ألزمت خلال فترة تفويضها وبالتالي فهي أصبحت منتهية الصلاحية، ولا يمكن استخدام هذه الأموال المنتهية الصلاحية لإلزامات جديدة ولكن يمكن استخدامها لتغطية تعديلات يجري إدخالها على إلزامات سابقة. وإذا لم تكن هنا حاجة لهذه الأموال من أجل تغطية تعديلات محتملة، فإن الأموال المنتهية الصلاحية لكل سنة مالية تبقى في حسابات مكتب المساعدة الانتقالية للعراق لأربع سنوات قادمة.

حل مكتب الشراكة الاستراتيجية العراقية (ISPO) مكان مكتب المساعدة الانتقالية للعراق في ٧ أيار/مايو ٢٠١٠. وبحسب موظفي السفارة الأميركية في بغداد، فإنه أثناء تحضير إغلاق مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، راجع موظفو السفارة الأميركية في بغداد كل المشاريع وألغوا بعضها. ولذلك جرى إلغاء الإلزام المشاريع الملغاة. وبحسب الموظفين أنفسهم، تجري الآن إعادة برمجة هذه الأموال لبرامج مساعدات أخرى في العراق. لن يمول مكتب الشراكة الاستراتيجية العراقية (ISPO) أية مشاريع جديدة وسوف يراقب فقط المشاريع المتبقية والبالغ عددها ١١٤ مشروعاً.

الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)

بين السنتين الماليتين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٩، تلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية حوالي ٢٣٣٢ مليون دولار من صندوق دعم الاقتصاد لأجل مشاريعها في العراق. من هذه الأموال جرى تلزيم ٢٢١٣ مليون دولار (٩٥%) وبقي مبلغ ١٢ مليون دولار من تخصيصات السنتين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧ متوفر لإلزامات جديدة لأن هذه الأموال جرى إلغاء إلزامها من سنواتها التي كانت ألزمت فيها. يقوم حالياً مكتب المدير المالي الرئيسي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بالعمل مع مكتب الإدارة والموازنة على توفير هذه الأموال للبرمجة. حوالي ١٠٨ مليون دولار من تخصيصات السنة المالية ٢٠٠٩ بقيت متوفرة لإلزامات جديدة حتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. من أصل ال ٢٢٣ مليون دولار الملزمة اعتباراً من ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠، جرى إنفاق ١٨٤١ مليون دولار (٨٣ بالمئة تقريباً). حوالي ٣٧١ مليون (١٧ بالمئة تقريباً) من الأموال الباقية للالزام بحاجة إلى تصفية.

التوصيات

لم يقدم المفتش العام أية توصيات خاصة بهذا التقرير، فهو تقرير معلوماتي فقط.

تعليقات الإدارة

لأن تقرير التدقيق هذا لا يتضمن توصيات، لم تكن تعليقات الإدارة مطلوبة.

أموال إعادة إعمار العراق: التدقيقات الشرعية تحدد احتيال وهدر وسوء استخدام- التقرير المرحلي رقم ٤
(تقرير المفتش العام 10-019، ٢٠١٠/٧)

المقدمة

القانون العام 106-108، كما جرى تعديله، يفرض ان يقوم المفتش العام بتحضير تقرير تدقيق شرعي نهائي حول كل الأموال المخصصة لإعادة إعمار العراق، التي بلغت حتى تاريخه أكثر من ٥٣ مليار دولار. يقدم التقرير المرحلي هذا نتائج برنامج التدقيق الشرعي الذي يجري تنفيذه حالياً، إضافة إلى التحديث لجهود تحديد النشاطات المالية المشكوك بأمرها والتحديث المتعلق بمراجعة المفتش العام لنفقات الوكالات. ويقدم التقرير أيضاً معلومات حول طريقة المفتش العام للبحث عن البيانات. يقدم المفتش العام أيضاً معلومات حول طريقة المفتش العام في البحث عن البيانات. يقدم المفتش العام تقارير النتائج دورياً، إضافة إلى تقرير نهائي تراكمي يتناول بنهاية الأمر كل أموال إعادة الإعمار.

لخص تقرير المفتش العام الأول نتائج سلسلة من تدقيقات عقود إعادة الإعمار الرئيسية. وكانت هذه التدقيقات تستهدف، في جزء منها/ تحديد نقاط ضعف الرقابة الداخلية. ولأن نقاط الضعف هذه تتيح الفرصة لحصول عمليات احتيال وهدر وسوء استخدام، استخدم المفتش العام نتائج تلك التدقيقات لتطوير مقاربات تدقيق شرعية مستهدفة من أجل تحديد حالات المخالفات المحتملة.

يوصل المفتش العام المراجعة الشرعية لنفقات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. تتحصى هذه المراجعات بشكل منهجي نفقات برامج إعادة إعمار العراق لتحديد الشذوذ في بيانات المعاملات المالية التي يمكن ان تشير إلى احتيال، أو هدر، أو سوء استخدام. تجمع مقارنة المفتش العام

عمليات تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

عمليات البحث الآلي عن البيانات مع التقنيات المعيارية للتدقيق والتحقق المستخدمة لكشف العمليات المالية المشكوك بأمرها من أجل تطوير أدلة ذات صلة يمكن استخدامها لاتخاذ إجراءات إدارية أو ملاحقات جنائية أو مدنية بسبب اتهامات بالاحتيال.

يوصل المفتش العام المراجعة لمجالات برامج إعادة إعمار العراق المعروف أنها تحوي نقاط ضعف في الرقابة الداخلية. الجهد هذا المعروف باسم مبادرة التدقيقات/التحقيقات للمفتش العام، هو جهد يركز على البرامج التي تتيح الوصول بسهولة إلى الأموال النقدية بسبب ضعف الرقابة على الإنفاق.

النتائج

وجه كبير من أوجه جهد التدقيق الشرعي الذي يجريه المفتش العام، هو الذي يشمل مبادرة تدقيق وتحقيق مشتركة بدأت في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. هذا الجهد، الذي عُيّن له موظفو التدقيق والتحقق لدى المفتش العام، ركز على البرامج التي تتيح الوصول بسهولة إلى الأموال النقدية بسبب ضعف الرقابة على الإنفاقات. وتواصل هذه المبادرة تحديد حالات من النشاطات المشكوك بأمرها. منذ آخر تقرير للمفتش العام (SIGIR 10-017)، جرى فتح أربعة تحقيقات جنائية إضافية، مما جعل العدد الإجمالي للتحقيقات التي نتجت عن المبادرة يبلغ ٤٩ تحقيق.

وجه كبير آخر من أوجه جهد المفتش العام هو التدقيق المفروض من الكونغرس لإنفاقات وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. ومنذ آخر تقرير للمفتش العام، جرت مراجعة ٢٥ ألف معاملة مالية إضافية بلغت قيمتها ٣,٨ مليار دولار، مما جعل العدد الإجمالي للمعاملات المالية التي جرت مراجعتها يصل إلى ١٠٨ آلاف معاملة بلغت قيمتها الإجمالية ٣٥,٨ مليار دولار.

أنجز المفتش العام مراجعته للمدفوعات التي من المحتمل ان تكون مكررة في المعاملات المالية المتعلقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) التي حصلت في السنوات المالية من ٢٠٠٣ حتى ٢٠٠٨. وكما أُشير إليه في تقرير المفتش العام المرحلي الشرعي رقم ٣، تقرير المفتش العام (SIGIR 10-017)، كان المتوقع ان يثبت ان العديد من المعاملات المشكوك بأمرها والمنقاة للمراجعة صالحة فور مراجعة المستندات. وقد ثبتت صحة هذا التوقع. وفي تقرير المفتش العام رقم (SIGIR 10-017)، دُكر انه من بين ما يقارب من ألف معاملة مالية جرى انتقاؤها للمراجعة، لم يبق قيد التحقيق إلا ٢٠ معاملة مشكوك انه يُحتمل ان تكون المدفوعات فيها مكررة، بلغت قيمتها ٣٠٠ ألف دولار. تبين من خلال تحقيق المفتش العام بأمر ٢٠ معاملة ان ١٢ معاملة هي مدفوعات مكررة بلغت قيمتها حوالي ١٤٢ ألف دولار.

نتيجة لهذا العمل، طلبت وزارة الدفاع استرداد الأموال من المقاولين واستعادت كل المبالغ المدفوعة زيادة عن اللازم.

أنجز المفتش العام مراجعة للمدفوعات التي يمكن ان تكون مكررة من خلال معاملات مالية تعود للوكالة الأميركية للتنمية الدولية وعلى علاقة بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) وصندوق دعم الاقتصاد (ESF). راجع المفتش العام ٥٤ من المدفوعات المشكوك في انها مكررة والتي يبلغ مجموعها ٦٤ مليون دولار، ووجد أنها مكررة أو مدفوعة زيادة عن اللازم، وان هناك تعديلات دفع ومحاسبة جرت في ٣٦ من هذه المعاملات المالية. وتبين من خلال المراجعة أيضاً ان الوكالة الأميركية للتنمية

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الدولية حددت هذه المعاملات المالية الضخمة وانها إما استعادت الأموال او أجرت تعديلات في دفتر الأستاذ المحاسبي لكل هذه المبالغ.

يواصل المفتش العام تدقيقه الشرعي للمدفوعات المحتمل ان تكون مكررة من خلال معاملات مالية تعود لوزارة الدفاع وعلى علاقة ببرامج مموله من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وصندوق دعم الاقتصاد. انتقى المفتش العام ٧٧ معاملة مالية للمراجعة وطلب كل المعلومات المتعلقة بها من وزارة الدفاع. وقد بلغ مجموع هذه المعاملات ٥٣,٥ مليون دولار.

يواصل المفتش العام مراجعته لأعمال مقاولين مشكوك بأمرهم يعملون لصالح وزارة الدفاع عبر صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق وفي برامج يمولها صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) وبرامج يمولها كل من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRFF) وصندوق دعم الاقتصاد (ESF) لدى وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). يقوم فريق للتدقيق الشرعي لدى المفتش العام بالتركيز على ١٢٤ مقالٍ محتمل ان يكونوا مشبوهين. وكما في أعمال المدفوعات المكررة، تجري أبحاث مفصلة لتحديد ما إذا كان هؤلاء المقاولين شرعيين او منخرطين في مخططات احتيالي على الحكومة الأميركية. من المتوقع ان يثبت ان العديد من هؤلاء المقاولين هم شرعيين بعد إنجاز المراجعة. سوف يعتمد على فحص للمستندات الرئيسية مثل العقود والفواتير والتقارير المستلمة ورخص الأعمال ومعلومات المدفوعات من أجل دعم الاستنتاجات المتعلقة بصلاحيه البائعين المشكوك بأمرهم.

التوصيات

لم يقدم المفتش العام أية توصيات في هذا التقرير لانه تقرير معلومات فقط.

تعليقات الإدارة

لأن هذا التقرير لا يتضمن أية توصيات، لم تكن تعليقات الإدارة مطلوبة.

صندوق تنمية العراق: يجب ان تحسن وزارة الدفاع الرقابات المالية والإدارية
(تقرير المفتش العام 10-020، ٢٠١٠/٧)

المقدمة

جرى إنشاء صندوق تنمية العراق (DFI) في أيار/مايو ٢٠٠٣ على يد المدير الإداري لدى سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) واعترف به قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم ١٤٨٣. كانت أموال صندوق تنمية العراق من المفترض ان تستخدم بطريقة شفافة لمصلحة الشعب العراقي. بعد حل سلطة الائتلاف المؤقتة في حزيران/يونيو ٢٠٠٤، جرى تفويض حكومة الولايات المتحدة من جانب الحكومة العراقية لإدارة أموال صندوق تنمية العراق التي كانت قد جعلت متوفرة لمشاريع إعادة الإعمار. قامت وزارة الدفاع بإدارة أموال صندوق تنمية العراق نيابة عن الحكومة الأميركية. وقد جرى سحب ذلك التفويض في ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧.

إن أهداف تقرير المفتش العام هي تحديد ان منظمات وزارة الدفاع استخدمت بشكل سليم الأموال التي تلقتها من صندوق تنمية العراق. ومن اجل المساعدة في تحقيق هذا الهدف قام المفتش العام بمراجعة انتقائية لسجلات ثمانية من منظمات وزارة الدفاع كانوا قد تلقوا أموال من صندوق تنمية العراق.

النتائج

إن الضعف الموجود في الرقابات المالية والإدارية لوزارة الدفاع يجعل هذه الأخيرة غير قادرة على المتابعة والمساءلة فيما يتعلق بمبلغ ٨,٧ مليار دولار من أصل ٩,١ مليار دولار تلقاها صندوق تنمية العراق من أجل نشاطات إعادة الإعمار في العراق. إن الانهيار الحاصل في الرقابات جعل الأموال عرضة للاستخدامات غير السليمة ولفقد غير القابل للكشف. حصل هذا الوضع بسبب ان معظم منظمات وزارة الدفاع التي تتلقى أموال صندوق تنمية العراق لم تنشئ حسابات وزارة المالية المطلوبة، ولم تجر تسمية أية منظمة لدى وزارة الدفاع بأنها الوكالة التنفيذية لإدارة استخدام أموال صندوق تنمية العراق (DFI).

وضعت وزارة المالية إرشادات للمحاسبة حول الأموال غير الأميركية عندما تعمل الوكالات الأميركية كقيم على هذه الأموال، لكن وزارة الدفاع لم تنفذ هذه الإرشادات بوقتها المحدد. والأهم من ذلك لم تتقيد معظم منظمات وزارة الدفاع التي تتلقى أموال من صندوق تنمية العراق بهذه الإرشادات. فقط واحدة من هذه المنظمات أنشأت الحساب المطلوب ونتيجة لذلك، لم يجر فتح حسابات لأموال بلغت ٨,٧ مليار دولار (٩٦ بالمئة) من أموال صندوق تنمية العراق التي جعلت متوفرة لوزارة الدفاع.

إرشادات وزارة الدفاع أمرت المنظمات التي تتلقى أموال من صندوق تنمية العراق مطابقة كل المعاملات المالية التي جرت قبل إصدار الإرشادات. مع ذلك، لم تجر عمليات المطابقة. وبسبب النقص في السجلات والموظفين العارفين بالقرارات المالية والإدارية، لم يستطع المفتش العام تحديد سبب عدم التقيد بالإرشادات. وبسبب عدم مطابقة الحسابات، على وزارة الدفاع ان تعتمد على سجلات حسابات منظماتها لتحديد وضع أموال صندوق تنمية العراق. تبين المراجعة الانتقائية للمفتش العام ان السجلات لم تكن دائماً كاملة. فمثلاً، لم تتمكن وزارة الدفاع من تقديم الوثائق التي تبرر إنفاقها لمبلغ ٢,٦ مليار دولار.

وجد فريق تدقيق المفتش العام أيضاً فروقات في ممارسات التعاقد لوزارة الدفاع اثرت في إعادة أموال صندوق تنمية العراق إلى الحكومة العراقية. القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان تعاقدت نيابة عن الحكومة العراقية، بينما تعاقد نيابة عن الحكومة الأميركية كل من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) ومركز القوات الجوية للامتياز البيئي (AFCEE)، مما جعل هذه الوكالات مسؤولة بطريقة محتملة عن المدفوعات. نتيجة لذلك لم يستطع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي ولا مركز القوات الجوية للامتياز البيئي إنهاء عقود كل منهما وإعادة ما تبقى من أموال صندوق تنمية العراق، عندما طلبت الحكومة العراقية ذلك من وزارة الدفاع بنهاية العام ٢٠٠٧.

النقص في الإشراف والإرشاد أدى إلى مواصلة وكالات لدى وزارة الدفاع الاحتفاظ بأموال من صندوق تنمية العراق. وجد المفتش العام وكالات لديها عقود لا زالت مفتوحة وبالتالي محتفظة بأموال، إضافة إلى إنفاق أموال في بعض الحالات. سلاح الهندسة في الجيش الأميركي وأحد مقاوليه والقيادة الوسطى للجيش الأميركي (ARCENT) لا زالوا يحتفظون بحوالي ٥,٤ مليون دولار و ٢٨,٩ مليون دولار، على التوالي. في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩، أوصى المفتش العام بأن تزود وزارة الدفاع إرشادات إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي حول استخدام بنهاية المطاف من الأموال التي لا يزال يحتفظ بها والتخلص منها. غير ان وزارة الدفاع لم تصدر بعد هذه الإرشادات، وبالتالي فإن الأموال التي لا زالت لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي والقيادة الوسطى للجيش الأميركي هي في خطر ان يتم إنفاقها. وبينما

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

اتخذت وزارة الدفاع خطوات لتزويد إرشادات للعمليات الطارئة في المستقبل، لا تغطي هذه الإرشادات المحاسبة ورفع التقارير عن هذه الأموال كما حصل مع صندوق تنمية العراق (DFI) في العراق.

التوصيات

يوصي المفتش العام ان يقوم وزير الدفاع بإصدار توجيهات إلى:

- ١- وكيل وزير الدفاع (المراقب المالي) بأن يقوم بتحديث قانون الإدارة المالية لوزارة الدفاع لتحديد أنظمة إجراءات المحاسبة ورفع التقارير لكامل الأموال غير الأميركية التي جعلت متوفرة إلى ومنظمات وزارة الدفاع ومنظماتها للاستخدام في العمليات الطارئة في المستقبل. ويجب ان تتضمن هذه الإرشادات أيضاً تسمية وكالة تنفيذية من ضمن وزارة الدفاع لتكون مسؤولة عن وضع والإشراف على سياسة استخدام هذه الأموال.
- ٢- وكيل وزير الدفاع (المراقب المالي) بأن يضع علامات اهداء محددة لإصدار إرشادات متناسبة مع توصياتنا الصادرة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٩
- ٣- أمناء الخدمة والقائد في القيادة الوسطى الأميركية، لتحديد مبالغ أموال صندوق تنمية العراق (DFI) التي تلقتها منظماتهم، وما إذا كانوا لا زالوا محتفظين بأي من هذه الأموال.

تعليقات الإدارة

تعليقات الإدارة موجودة في التقرير النهائي، الذي يمكن العثور عليه على موقع المفتش العام على شبكة الإنترنت www.sigir.mil.

مخططات حفظ سجلات عقد وبرامج إعادة إعمار العراق بحاجة إلى تحسين (تقرير المفتش العام 10-021، ٢٠١٠/٧)

المقدمة

يذكر التفويض القانوني للمفتش العام، في جزء منه، بأن يقوم هذا الأخير بتدقيقات للبرامج والعمليات والعقود التي استخدمت أموال إعادة الإعمار من أجل أن تتضمن صيانة السجلات المتعلقة بكيفية استخدام هذه الأموال، وذلك من أجل تسهيل أعمال التدقيق والتحقق في المستقبل. سوف يتم إصدار هذا التقرير لتناول هذه المتطلبات. فمذ العام ٢٠٠٣، خصص الكونغرس ٥٣,٣١ مليار دولار لنشاطات إغاثة وإعادة إعمار العراق. يقوم كل من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والمدير لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإدارة هذه النشاطات وإنتاج سجلات تتعلق ببرامج هذه النشاطات. هؤلاء يتحملون مسؤولية حفظ سجلات نشاطات إعادة إعمار العراق من الفقدان أو التلف المبكر. يبلغ عدد سجلات وزارة الدفاع أكثر من ١٠٠ ألف سجل برامج وعقود. أما وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية فيبلغ عدد سجلات إدارة البرامج والهبات والعقود لديهما أكثر من ٢٦٥٠ سجل.

الهدف من هذا التقرير هو تحديد مدى مخططات حفظ السجلات لدى الوكالات الأميركية الرئيسية المسؤولة عن إدارة نشاطات إعادة إعمار العراق.

النتائج

لدى وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية سياسات وإجراءات لإدارة السجلات، لكنها لم تنفذ هذه الإجراءات بالكامل لحفظ سجلاتها المتعلقة بإعادة إعمار العراق. يجعل هذا الوضع الحكومة الأميركية عرضة للهدر والسرقة إذ أنها قد لا يكون لديها المعلومات الضرورية لملاحقة قضايا الاحتيال و/أو لإجراء تدقيقات لنشاطات إعادة الإعمار. إضافة إلى ذلك، لم تتم مراجعة السجلات بالنسبة لمدى أهميتها التاريخية، وبالتالي قد تضع مستندات هامة إذا لم تتخذ الإجراءات المناسبة.

بيّنت مراجعة المفتش العام مجال واسع من التقدم الحاصل لحفظ السجلات. فبعض المنظمات كانت قد شحنت بالفعل العديد من سجلاتها إلى مرافق التخزين، بينما لم تقم بذلك منظمات أخرى.

وهناك منظمات أخرى كانت قد فقدت سجلات ولم تعرف وضع السجلات التي شحنتها إلى مرافق التخزين، وأخيراً، بعض المنظمات لا تملك مرافق تخزين ذات سعة مناسبة، أو مخططات سليمة لحفظ السجلات أو القدرة على إيجاد السجلات في الوقت المطلوب.

وبيّنت مراجعة المفتش العام أيضاً أنه في بعض الحالات، قد توزعت سجلات مشاريع إعادة الإعمار المشتركة بين مختلف المنظمات الحكومية ولم يجر تنسيق تخزين تلك السجلات لضمان اكتمالها وتوفيرها. إن تعرض حفظ السجلات للخطر بهذا الشكل يبيّن أكثر ان قلق المفتش العام المزمّن حيال الطبيعة الموقّنة لإدارة نشاطات إعادة إعمار العراق. حددت دراسة مشتركة لموظفي وزارة الدفاع أنجزت حديثاً، مشاكل هامة في كل مراحل إدارة سجلات وزارة الدفاع في العراق، وأكد عمل المفتش العام الحالي وجود هذه المشاكل، لكنه وجد أيضاً تقدماً في حل هذه المشاكل. جرت الدراسة المشتركة للموظفين في نيسان/أبريل ٢٠١٠. ولحظت هذه الدراسة مشاكل مثل وجود عالم غير محدود من السجلات، ونقص في الإرشادات الكافية والإجراءات التشغيلية المعيارية، والخطوط غير الواضحة لمسؤولية إدارة السجلات.

تبيّن من خلال عمل المفتش العام الحالي أن سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، الذي يحتفظ بنسبة مئوية كبيرة من سجلات وزارة الدفاع، يسير على الطريق الصحيح لحفظ سجلاته، ولكن منظمات وزارة الدفاع الأخرى لا تزال تركز على تطوير المخططات، وتجميع السجلات ومراجعتها للتأكد من اكتمالها، وتوسيع سعة مرافق التخزين، وضمان القدرة على الحصول على المطلوب منها. المفتش العام قلق بشكل خاص إزاء عدم حصول تقدم في حفظ سجلات صندوق قوات الأمن العراقي (ISFF) وسجلات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). في هذا الوقت، لم يحصل الكثير من التقدم في حفظ سجلات إدارة برنامج قوات الأمن العراقية (ISFF)، وقد تبيّن من خلال العمل الحالي والسابق للمفتش العام أن سجلات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد غير مكتملة أو أنه لا يمكن العثور عليها.

تقوم وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتنظيم سجلاتهما، ولكنهما لم تتخذا الخطوات اللازمة لإعادة هذه السجلات إلى الولايات المتحدة من أجل تخزينها. يبدو أن هاتان المنطمتان تسيطران على سجلات إعادة الإعمار ولكن ينقصهما الإرشادات حول كيف يجب أن يقوموا بالتخطيط لحفظ هذه السجلات.

التوصيات

- ١- يوصي المفتش العام بأن يقوم وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتعيين مكتب لتحمل مسؤولية ضمان حفظ سجلات إعادة الإعمار لتوفير الشفافية والمساءلة على مستوى الوزارات. بالحد الأدنى، يجب ان تقوم هذه المكاتب بتنسيق وضع قائمة شاملة للسجلات من اجل (١) ضمان اكتمال السجلات، (٢) ربط البرامج والعقود المرافقة والتمويلات سوية، (٣) تطوير سياسات حفظ متناسقة مع حاجات منظمات التحقيق والتدقيق. ويجب ان يقوم هذا المكتب أيضاً باستشارة مؤرخي الوكالة لتحديد أي من السجلات قد يتطلب أرشفة دائمة.
- ٢- يوصي المفتش العام أن يقوم القائد في القيادة الوسطى الأميركية، خلال تنفيذ توصيات الموظفين المشتركة، بتضمين الإرشادات الجديدة المحددة إرشاد يتعلق بنقل وحفظ سجلات إعادة الإعمار ويجب ان يحتوي هذا الإرشاد على طرق متابعة السجلات وتحديد البرنامج وتمويله وموقع التخزين النهائي.
- ٣- يوصي المفتش العام أن يقوم القائد في القيادة الوسطى الأميركية، بتوجيه قيادة التعاقد لدى قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM) لمراجعة الجهود التي بذلتها قيادة العقود المشتركة السابقة في العراق وأفغانستان (JCC-I/A) لتحديد المسائل المتبقية التي تحتاج إلى تناولها في عملية تخطيط حفظ السجلات، مثل اكتمال سجلات التعاقد، والسجلات المفقودة، وتعقب السجلات، وسلامة مرافق التخزين.
- ٤- يوصي المفتش العام بأن يقوم القائد العام للقوات الأميركية في العراق، بإعطاء توجيهات لتطوير مخططات لحفظ سجلات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). هذه المخططات يمكن ان تأخذ شكل إجراءات تشغيلية معيارية للمساعدة في ضمان ان السجلات الموجودة مكتملة والسجلات المفقودة محددة.
- ٥- يوصي المفتش العام، بأن يقوم القائد العام في القيادة الوسطى لقوات الجيش (ARCENT) بمراجعة العملية الجارية اعتمادها لتخزين وتحديد مواقع سجلات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.
- ٦- يوصي المفتش العام أيضاً بأن يزود وزير الخارجية السفارة الأميركية في بغداد بالإرشادات المفصلة الواجب استخدامها للتخزين النهائي لسجلات إعادة الإعمار، وبأن تقوم السفارة الأميركية في بغداد بتطوير مخططات لحفظ سجلات إعادة الإعمار وفقاً لهذه الإرشادات.
- ٧- يوصي المفتش العام بأن يقوم مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بتزويد الإرشادات إلى بعثته في العراق حول حفظ سجلات إعادة الإعمار وبأن يقوم مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق بتطوير خطط لحفظ سجلات إعادة الإعمار وفقاً لهذه الإرشادات.

عمليات تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الدروس المكتسبة

إن التخطيط والإرشاد لنقل وتخزين السجلات الناشئة خلال العمليات الطارئة يجب ان يكون قيد التنفيذ في بداية العملية ولا يتركها حتى نهايتها. يجب تطوير سياسات شاملة تتضمن تحديد واضح للسلطة على يد فريق موظفين مشترك بالنسبة لكل القيادات القتالية. خلال نشاطات إعادة الإعمار الطارئة، من الأهمية بمكان ان تقوم كل الوكالات بالتخطيط لإنهاء العملية عن طريق وضع إجراءات شاملة لحفظ السجلات منذ البداية. يجب تنفيذ هذا الدرس المكتسب فوراً لكل العمليات الطارئة الجارية حالياً، مثل عملية أفغانستان.

تعليقات الإدارة

توجد تعليقات الإدارة في التقرير النهائي، الذي يمكن العثور عليه في موقع المفتش العام على شبكة الإنترنت www.sigir.mil.

هناك حاجة لتحسين الإشراف على هيئات وزارة الخارجية إلى المعهد الجمهوري الدولي
(تقرير المفتش العام 10-022/10/2010)

الخلفية

يتناول هذا التقرير إدارة وزارة الخارجية لهبة الخمسين مليون دولار المقدمة إلى المعهد الجمهوري الدولي (IRI) لنشاطات بناء الديمقراطية في العراق. هذه الهبة هي الأكبر الممنوحة إلى المعهد الجمهوري الدولي من مكتب إدارة الامتلاكات (AQM) نيابة عن مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) وهي مقصودة لدعم جهود الولايات المتحدة لدعم الديمقراطية، وحكم القانون، وبرامج نظام الحكم في العراق. مهمة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان هي قيادة جهود الولايات المتحدة في الترويج للديمقراطية، والحقوق الدينية الدولية، وتقديم حقوق العمال عالمياً. وبما ان مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل ليس لديه موظفين مخصصين للهبات، فهو يعتمد على مكتب إدارة الامتلاكات لمنح وتعديل هباتها. خلال تدقيق سابق وجد المفتش العام ان كلفة الأمن للجهة التي تتلقى الهبات عالية، ولم يكن لدى مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل مستندات تفيد ما إذا كانت هبة المعهد الجمهوري الدولي (IRI) تحقق أهدافها وما إذا كانت أموال الهبة تستخدم بالطريقة الأكثر فعالية والأكثر كفاءة (تقرير المفتش العام 10-012 SIGIR). بظل القانون العام 106-108، تقع على عاتق المفتش العام، من بين مسؤوليات أخرى، مسؤولية مراجعة إنفاق أموال إعادة الإعمار في العراق، بما في ذلك الإشراف على تنفيذ البرامج والمحاسبة والمساءلة التمويلية.

في تدقيق المتابعة هذا، أهداف المفتش العام هي إجراء فحص لهبة الخمسين مليون دولار لمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل، لناحية معقوليتها، وإمكانية تخصيصها، وجواز الأكلاف التي ادعى بها المعهد الجمهوري الدولي، والمدى الذي وثق فيه الطرف الذي تلقى الهبة نجاحه في تحقيق نظام الحكم، والمشاركة السياسية، وأهداف المجتمع المدني وغاياته.



مثال حول التدريب المتعلق بالانتخابات للمعهد الجمهوري الدولي

النتائج

الضعف الحاصل في الإشراف لدى وزارة الخارجية وفي التزام المعهد الجمهوري الدولي بالمتطلبات الفدرالية ومتطلبات وزارة الخارجية المفروضة للهيئات، تركا وزارة الخارجية عرضة لدفع اكلاف زائدة عن اللزوم، وعدم حصولها على معلومات دقيقة كافية حول ما تحقق، باستثناء ٢٧١ جلسة تدريب لاكثر من ٥ آلاف مواطن عراقي خلال سنتين. لم تستطع آليات الرقابة، الموجودة لدى وزارة الخارجية حالياً، كشف الاكلاف المشبوهة والتخصيصات الناتجة عن الإجراءات الأمنية والمصاريف غير المباشرة مقابل الهيئة. لم يكن موظفي الهيئة لدى وزارة الخارجية منخرطين بفعالية في الإشراف على الهيئة او القرارات التي يتخذها متلقي الهيئة. ولم تزود التندقيقات السنوية وتقارير تقدم العمل المطلوبة إلا توفير نظرة محدودة على ممارسات متلقي الهيئة. ولم تجر استشارة موظفي الهيئة حول سلامة ممارسات متلقي الهيئة، علماً انهم المسؤولين الرسميين الوحيديين في الوزارة المفوضين لاتخاذ هكذا قرارات. أفاد موظفو الهيئة انهم كانوا يعملون بإخلاص، ولم يقصدوا المطالبة بأكلاف غير سليمة، وهم سعوا لضمان الملاءمة في مقاربتهم بالمحافظة على الاتصال المنتظم بمكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان لاطلاعه على كيف تصرف الأموال. لكن موظفي مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل لم يكونوا مفوضين للموافقة على هكذا إجراءات. ان هذا المزيد من التقصير في الإشراف والمعرفة المنقوصة للقوانين والإرباك فيما يخص السلطة المسؤولة، والأدوار، والمسؤوليات لموظفي وزارة الخارجية، سمح لعدد كبير من القرارات الخاطئة بالاستمرار دون التحقق منها. طرحت معاينة المفتش العام، بشكل خاص، عدد من الأسئلة حول المعقولية وإمكانية التخصيص وجواز السماح ببعض أكلاف الإجراءات الأمنية والمصاريف غير المباشرة. فد وجد المفتش العام ان بعض اكلاف وتخصيصات المعهد الجمهوري الدولي تحتاج إلى:

- مستندات المشتريات الكافية، مما منعنا من تحديد معقولية كلفة الإجراءات الأمنية.
- طريقة منهجية لتخصيص كلفة الإجراءات الأمنية تضمن توزيع معقول للكلفة على مختلف الهيئات.
- طريقة ملائمة للمساءلة الصحيحة لتحديد مبالغ المصاريف غير المباشرة.

عمليات تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

- الموافقة المسبقة من موظفي الهيئات لشراء آليات بلغت كلفتها ما يقارب ٦٩٠ ألف دولار.

يستطيع متلقي الهبة بسهولة توثيق النشاطات التي أدت إلى تنمية الأهداف الديمقراطية في العراق، لكنه لم يتمكن تقييم، بشكل منتظم مدى نجاحه في تحقيق أهداف وغايات الهبة، كما هو مطلوب في اتفاقية الهبة. ولتبيان ذلك، فقد قام متلقي الهبة باستقصاء المرشحين الذين حضروا جلسات التدريب ووجد ان المتدربين كانت حظوظهم بالفوز أكثر مرتين من الذين لم يحضروا. من ناحية ثانية، لم يتم تلقي الهبة بتقييم المدى الذي ساهمت فيه جهوده في الترويج لهدف من أهداف الهبة في مساعدة النساء ليصبحن أكثر تكاملاً مع منظمات الأحزاب السياسية كموظفات أو مرشحات أو متطوعات. لم يتضمن مخطط تقييم الهبة دائماً علامات اهداء ومؤشرات لقياس التقدم، وهذه معايير مهمة لقياس التأثير.

ذكر مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أن المعهد الجمهوري الدولي لم يقدم تقييمات شاملة للتأثير، علماً ان ممثلة موظف الهبة أعلنت ان لديها معلومات كافية من مصادر أخرى للاستنتاج بأن متلقي الهبة قد حقق الأهداف. ولاحظ مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل أيضاً أنه اتخذ مؤخراً خطوات لتحسين رصد وتقييم الهيئات المستقبلية. فمن دون تقييم شامل، من الصعب على صناع القرار تحديد التغييرات الضرورية المطلوبة لضمان بأفضل ما يمكن، ان النشاطات مصممة ومنفذة لتحقيق أهداف البرنامج.

التوصيات

لتحسين إدارة هبات إعادة إعمار العراق، يوصي المفتش العام بأن تقوم وزيرة الخارجية الأميركية بتوجيه المكاتب التي تراها مناسبة اتخاذ الإجراءات التالية:

- ١- تقييم كفاءة عدد من موظفي الهيئات المعنيين لإدارة هبات مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل في العراق.
- ٢- مطالبة موظفي الهيئات تنفيذ التقييم في العمق لطرق تخصيص محاسبة الاكلاف الواردة في هذا التقرير. يجب ان يحدد هذا التقييم مستوى الاكلاف المشبوهة وما إذا كان يتوجب استعادة الأموال.
- ٣- مطالبة موظفي الهيئات إصدار تعليمات إلى المعهد الجمهوري الدولي باتباع إرشادات مكتب الإدارة والموازنة (OMB) حول المعقولية وإمكانية التخصيص وجواز الأكلاف والعقود اللاتنافسية.
- ٤- مطالبة موظفي الهيئات ضمان ان يقوم المعهد الجمهوري الدولي بتضمين تدقيقه التالي A- 133 تدقيقاً شاملاً للاكلاف غير المباشرة وتدقيق توافق لهبة كبرى واحدة على الأقل للمعهد الجمهوري الدولي.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

- ٥- المطالبة بأن يكون ممثلي موظفي الهيئات مدربين على مذكرات مكتب الإدارة والموازنة A-110 و 1-122 و a-123، إضافة إلى توجيهات سياسة الهيئات لدى وزارة الخارجية لضمان معرفتهم التامة بمسؤوليتهم وحدودهم.
- ٦- المطالبة بأن يفرض ممثلو موظفي الهيئات احتياجات الهيئات المتعلقة بتقديم المعهد الجمهوري الدولي مؤشرات قابلة للقياس حول نجاحه في تحقيق أهداف وغايات الهيئة.

تعليقات الإدارة

توجد تعليقات الإدارة في التقرير النهائي الذي يمكن العثور عليه على موقع المفتش العام على شبكة الإنترنت www.sigir.mil.

عمليات التدقيق الجارية وتلك المخطط لها

يجري المفتش العام أولاً تدقيقات إزاء تقييم الاقتصاد، والكفاية، والفعالية، ونتائج برامج إعادة إعمار العراق، وغالباً مع التركيز على دقة الرقابات الداخلية واحتمالات الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام. يشمل ذلك سلسلة من عمليات التدقيق الكبيرة تركز على عقود إعادة إعمار العراق الرئيسية والتي ستدعم استجابة المفتش العام لتوجيهات الكونغرس فيما خص "التدقيقات الشرعية" لإنفاقات الولايات المتحدة على عملية إعادة إعمار العراق.

عمليات التدقيق الجارية

يعمل المفتش العام حالياً على التدقيقات التالية:

- المشروع 1016: إجراءات وكالات الحكومة الأميركية للمحاسبة حول الأصول المحجوزة والأموال المكتسبة الأخرى.
- المشروع 1015: تدقيق الرقابة على صندوق الاستجابة السريعة.
- المشروع 1014: تدقيق وضع الأموال المخصصة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.
- المشروع 1013: تدقيق اتفاقيات التعاون الممنوحة إلى كوبرا تيف هاوسينغ فوندايشن انترناشونال
- المشروع 1012: تدقيق وضعية الأموال المخصصة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق.
- المشروع 1009: تدقيق عقد خدمات التخزين والتوزيع في أبو غريب ومرفا أم قصر.
- المشروع 1008: تدقيق وضعية عقود خدمات الأمن الداخلي لمجمل ساحات القتال لوزارة الدفاع.
- المشروع 1004: تدقيق برنامج منظمة أبناء العراق
- المشروع 9028: تدقيق ممارسة إدارة برنامج تدريب الشرطة العراقية
- المشروع B-9023: التقرير النهائي حول جهود القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) لتطوير قوات العمليات الخاصة العراقية.
- المشاريع 9005، و9012، و9013: تدقيقات بيانات المعاملات المالية للتخصيص، والإلزام، والإنفاق المتعلقة بإغاثة وإعادة إعمار العراق لوزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

عمليات تدقيق المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق

عمليات التدقيق المخطط لها

- إن مخطط التدقيق للمفتش العام متناظر مع ثلاثة أهداف رئيسية مشمولة في خطته للتدقيق الاستراتيجي:
- تحسين ممارسات الأعمال والمساءلة في إدارة العقود والمنح المرتبطة بإعادة إعمار العراق.
 - تقييم وتقوية الاقتصاد، والكفاية، والفعالية للبرامج والعمليات لتسهيل عملية إعادة إعمار العراق.
 - توفير قيادة مستقلة وموضوعية وتوصيات حول السياسات المصممة لمعالجة العيوب في جهود إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار في العراق.

تدرك خطة المفتش العام الاستراتيجية التفويض القانوني لإنجاز تقرير تدقيق شرعي على كل المبالغ المخصصة وتلك التي جُعلت متوفرة بطرق أخرى لعملية إعادة إعمار العراق. وكجزء من ذلك المجهود، أنجز المفتش العام ١٨ عملية تدقيق مركزة على العقود وتناولت الناتج والكلفة والإشراف بالنسبة لعقود إعادة إعمار العراق الرئيسية، إضافة إلى مدى كونها عرضة للاحتيال والهدر وسوء الاستخدام. وتجري أيضاً تدقيقات عقود إضافية وأخرى مخطط لها. عمليات التدقيق هذه سوف تزيد من التركيز على العقود الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية وصندوق دعم الاقتصاد.

ويتابع المفتش العام أيضاً تكريس موارده التدقيقية أيضاً نحو مبادرة التدقيق الشرعي وقد نشر تقريره الرابع حول هذا الجهد. أكثر من ذلك، ولمواصلة توفير القيادة أو التوصيات حول السياسات المصممة لتناول العيوب في جهود إعادة إعمار العراق وإرساء الاستقرار فيه، سوف يتناول المفتش العام المسائل المتعلقة بخفض حجم وجود وزارة الدفاع في العراق ونقل نشاطات إعادة الإعمار إلى مسؤولية وزارة الخارجية.

عمليات تدقيق المفتش العام: ٢٠٠٣-٢٠١٠

منذ العام ٢٠٠٣ نشر المفتش العام ١٧١ تدقيقاً تناولت مجال واسع من المواضيع، مثل الإشراف على العقود وبرامج إعادة إعمار محددة، كما الكلفة والإشراف على مقاولي الأمن الخاص. خلال كامل عهده، حددت عمليات تدقيق المفتش العام عيوب خطيرة في إدارة عقود ونشاطات إعادة الإعمار، كما قدم المفتش العام أيضاً توصيات لتحسين الاقتصاد والكفاءة في عمليات الولايات المتحدة وجعل النشاطات أقل عرضة للاحتيال والهدر وسوء الاستخدام، وأيضاً قدم دروساً مكتسبة للاستخدام في عمليات إعادة إعمار كبرى أخرى.

الكثير من نتائج تدقيق المفتش العام يمكن إرجاعها إلى وجود المنظمة الدائم في العراق وأهمية هذا الوجود. مكن هذا الوجود المفتش العام من تقديم تدقيقات بالوقت الفعلي – غالباً يبدأ وينتهي خلال ستة أشهر- تتناول مسائل إعادة إعمار حرجة. كما ان تدقيقات المفتش داخل البلاد تمكن هي أيضاً إجراء اتصالات وجهاً لوجه وبناء علاقة مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والموظفين الرسميين العراقيين، وتزويد معرفة عميقة وتاريخية لبرنامج إعادة الإعمار في البلاد. عمل المفتش العام بشكل تفاعلي مع السفير الحالي للولايات المتحدة والقادة العسكريين، موفراً لهم تبصراً حول المسائل التي تحتاج إلى معالجة. فمثلاً، في آب/أغسطس ٢٠٠٩ حدد المفتش العام للقائد العسكري العام وللوزير الأميركي المجالات التي تحتاج إلى معالجتها لضمان انتقال سلس مع انتقال إدارة أعمال إعادة الإعمار من وزارة الدفاع إلى وزارة الخارجية مع انخفاض حجم التواجد الأميركي، ومع تزايد القدرات الوزارية للحكومة العراقية.

عمليات التدقيق تناولت مسائل رئيسية وأوصت بإدخال تحسينات عديدة على إدارة نشاطات إعادة الإعمار

في مسار عمله، حدد المفتش العام مسائل متكررة واسعة كانت من الأسباب الرئيسية المساهمة في العيوب التي لاحظها المفتش العام خلال تدقيقاته، والدروس المكتسبة التي يمكن تطبيقها في عمليات إعادة الإعمار الأخرى الطارئة. أكثر من ذلك، قدم المفتش العام ٤٢٨ توصية لتحسين نشاطات إعادة الإعمار في العراق تتضمن مجموعة واسعة من المسائل الإدارية. وافقت الإدارة على ونفذت ٢٦٣ توصية من هذه التوصيات، وقد جرى إغلاق ٣١ توصية لا تغير الظروف جعلها غير قابلة للتطبيق. ويواصل المفتش العام مراقبة التوصيات المفتوحة والبالغ عددها ١٣٤ توصية وهي التي تنتظر تنفيذ الإجراءات التصحيحية في الوقت المحدد على يد الوكالات. لدى أخذها بالاعتبار معاً، فإن هذه المعلومات تُشكل نقطة انطلاق لإدارة نشاطات إعادة الإعمار في حالات الطوارئ.

لتبيان ذلك، اصدر المفتش العام في تموز/يوليو ٢٠٠٨ تقرير تدقيق حدد أربعة مسائل دائمة تؤثر في إدارة نشاطات إعادة الإعمار في العراق، وهذه المسائل هي:

- الحاجة إلى فهم أفضل للمشاكل المرتبطة بتنفيذ برامج إعادة الإعمار في بيئة غير مستقرة أمنياً. فمثلاً، المسائل الأمنية وأكلافها لم تكن في كثير من الأحيان تؤخذ بما يكفي من الاعتبار أثناء تصميم وتنفيذ نشاطات إعادة الإعمار ولدى تقدير اكلافها.
- تأثير عدم امتلاك هيكلية إدارية متكاملة لتوفير خطوط واضحة للسلطة على تنسيق البرامج والتسليم الناجح للمشاريع. غياب الأحادية في القيادة أدى إلى حالات منعت حكومة الولايات المتحدة الأميركية من تحديد المدى الكامل لكل نشاطات الوكالات فيما يخص أي مسألة واحدة بعينها، مثل مكافحة الفساد أو تنمية القدرات.
- أهمية التوقع لحجم الحاجة إلى الموظفين وخفض معدل استبدالهم.
- إدراك كيف ان العمل عن قرب مع الحكومات المضيفة مهم جداً لنجاح الاستثمارات الأميركية في مشاريع إعادة الإعمار على المدى الطويل.
- إضافة إلى ذلك، حددت تدقيقات المفتش العام للعقود مجالات عديدة جداً حيث كانت إدارة العقود بحاجة إلى التحسين لتأمين اقتصاد وكفاءة أفضل وجعل هذه العقود أقل عرضة للفساد، والهدر، وسوء الاستخدام.
- استجابة لذلك، قدم المفتش العام توصيات للتعامل مع المشاكل الإدارية هذه. وفي عدد من الحالات، تناولت توصية واحدة أكثر من مسألة واحدة من تلك المذكورة أعلاه. وللبيان، قدم المفتش العام ما يلي:
- أكثر من ١٥٠ توصية لتحسين إدارة البرامج، بما في ذلك الحاجة إلى عدد كافٍ من مكاتب الموظفين وخفض معدل تبديل الموظفين.

عمليات تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

- أكثر من ٧٠ توصية لتحسين التعاون والتنسيق والتكامل بين الوكالات، إضافة إلى تأمين المشاركة الأفضل في المعلومات.
- أكثر من ١٧٠ توصية لتحسين الإشراف على العقود والمقاولين لتشجيع الاقتصاد والكفاءة وخفض احتمال حصول فساد، وهدر، وسوء استخدام.
- أكثر من ١٦٠ توصية لتحسين المساءلة وضعف الرقابة الداخلية، مثل المراجعة غير الكافية لفواتير المقاولين، والإشراف غير الكافي للمقاولين ونقص مستندات نشاطات العقد أو فقدانها والعدد غير الكافي من الموظفين.
- أكثر من ٣٠ توصية للعمل عن كثب أكثر مع الحكومة العراقية في مجالات مثل تصميم ونقل ملكية المشاريع لتحسين التوقعات في ان تقوم الحكومة العراقية باستدامة المرافق والبرامج الممولة من الولايات المتحدة بحيث لا تضع جهودات الولايات المتحدة.

إضافة إلى ذلك، قدم المفتش العام توصيات لتحسين الإدارة والكفاءة ونتائج البرامج المهمة والعالية الكلفة بشكل خاص التي سوف تستمر حتى ولو تراجع جهودات الولايات المتحدة في إعادة الإعمار، فمثلاً:

- أصدر المفتش العام ٩ تقارير وقدم ٢٤ توصية تناولت الحاجة إلى تحسين إدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). هذا البرنامج البالغة قيمته ٣,٨٢ مليار دولار فوّض القادة الميدانيين الأميركيين استخدام هذه الأموال للاستجابة إلى المتطلبات الإنسانية ومتطلبات الإغاثة وإعادة الإعمار الطارئة التي تساعد فوراً السكان الأصليين وتحقق تأثير ذو تركيز محدد. خلال ربع السنة الحالي، حدد المفتش العام الحاجة إلى تخطيط أفضل لحفظ سجلات برامج وعقود إعادة الإعمار.
- اصدر المفتش العام، بدرجات متفاوتة، أكثر من ٢٥ تقرير حول الجهود الأميركية لتطوير قوات الأمن العراقية (ISF) العاملة. يكتسب هذا المجهود أهمية متزايدة مع الزوال التدريجي للأثر العسكري الأمريكي. ومع بدء إدراج الوكالة الأميركية الرئيسية، التي جرى تكوينها الآن لتنفيذها الهدف، أي القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، في القوات الأميركية في العراق (USF-I). حتى تاريخه قدم المفتش العام ٥٤ توصية تتعلق بتطوير القدرات الوزارية، والإشراف على الأسلحة المزودة إلى قوات الأمن العراقية، ونقل الأصول، واستخدام أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP)، وجهود مكافحة الفساد، ومواضيع أخرى، بما فيها اللوجستيات ومسؤوليات الصيانة وتدريب موظفي قوات الأمن. خلال ربع السنة الحالي، كما كان الأمر بالنسبة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، أوصى المفتش العام ان تتخذ القوات الأميركية في العراق الخطوات الضرورية لتطوير الخطوط من أجل حفظ سجلات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF).

مع تنفيذ توصيات تدقيق المفتش العام، أحرزت الوكالات تقدماً في تحسين عملياتها. فمثلاً، منذ التقرير نصف السنوي الفائت، اتخذت وزارة الدفاع عدداً من الأعمال التصحيحية لتنفيذ تسعة من توصياتنا

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

المتعلقة بتحسين إدارة برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. هذه الأعمال شملت أموراً متنوعة مثل تغيير السياسة من أجل فرض تنسيق أكبر لمشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ومن أجل التدريب الأفضل لموظفي هذا البرنامج. إضافة إلى ذلك، ومن أجل خفض الكلفة، وافقت وزارة الخارجية على توصية المفتش العام بشأن إلغاء عقد رفع مستوى نظام قاعدة بيانات الكمبيوتر الذي حدد المفتش العام أنه لن يستخدم.

غير أنه لا يزال على الوكالات تنفيذ عدد من توصيات المفتش العام التي تتناول مساعلاً مهمة. فمثلاً، لا يزال على وزارة الدفاع تنفيذ عدد من التوصيات لتحسين إدارة صندوق قوات الأمن العراقية من أجل تطوير قوات الأمن العراقية. في تشرين الأول ٢٠٠٦، لاحظ المفتش العام عيوباً في تخطيط وتنفيذ برامج تدريب الجيش والشرطة العراقية وأوصى بأن تحدد وزارة الدفاع متطلبات موظفي لوجستيات قوات الشرطة المحلية والقومية ومتطلبات موظفي لوجستيات الجيش العراقي ووضع صيغة لمخطط تدريب هؤلاء الموظفين.

يمكن العثور على تقارير تدقيق المفتش العام على موقع المفتش العام على شبكة الإنترنت www.sigir.mil.

أحدثت عمليات تدقيق المفتش العام تأثيرات رئيسية

أحدثت عمليات تدقيق المفتش العام تأثيرات مالية وغير مالية رئيسية في تحسين إدارة برامج إعادة إعمار العراق. فحتى ٣٠ تموز/يوليو ٢٠١٠، وقرت تدقيقات المفتش العام وأعدت أموال بلغت حوالي ١٥١,٤١ مليون دولار وحسنت استخدام أموال بقيمة ٦٧٨,٣٢ مليون دولار (أنظر الشكل ٣-٢). واشتبه المفتش العام أيضاً بمدفوعات بقيمة ٣٨,٦٥ مليون دولار بما فيها مدفوعات يحتمل أن تكون مكررة أو زائدة عن اللزوم أو بدل أعمال غير منجزة. ثلثنا الأموال الموقرة جاءت من التوصيات المتعلقة بالمعدات المشتراة لمراكز العناية الصحية الأولية والحاجة إلى مراجعة فواتير برنامج تدريب الشرطة العراقية. حدد المفتش العام أيضاً أن ما يقارب ٢٠٠ مليون دولار من تمويلات برنامج تدريب الشرطة كان يمكن استخدامها بشكل أفضل في مكان آخر. يتابع المفتش العام توثيق طرق لتوفير أموال إضافية.

عمليات تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الشكل ٢-٣
تأثير تدقيقات المفتش العام
بملايين الدولارات



عمليات التحقيق للمفتش العام

استمرت تحقيقات المفتش العام في متابعة ادعاءات الاحتيال، والهدر، وإساءة الاستخدام في العراق من خلال ١١٢ عملية تحقيق مفتوحة. خلال فترة التقرير الحالي كان لدى المفتش العام ٤ موظفي تحقيق معينين للعمل في بغداد، و١٢ في المركز الرئيسي للمفتش العام في أرلنغتون، بولاية فيرجينيا، و١٦ في مكاتب المفتش العام في ولايات بنسلفانيا، نورث كارولينا، فلوريدا، تكساس، أريزونا، أوهايو، وميشيغن ونيويورك، وكاليفورنيا. حتى تاريخه، أدى عمل محققي المفتش العام إلى توقيف ٢٩ فرداً، وصدور لوائح اتهام بحق ٤٣ فرداً، وإدانات بحق ٣٤ فرداً، وفرض غرامات، ومصادرات، واستعادات، وإعادةات ونتائج مالية أخرى بحوالي ٧٠,٧ مليون دولار.

خلال ربع السنة هذا، واصل المفتش العام إجراء عدد من التحقيقات الجنائية الهامة المتعلقة بإعادة إعمار العراق، والعمل عن كثب مع المدعين العامين ووكالات التحقيق الأميركية الشريكة ومحققي الشركاء في الائتلاف. نتيجة لتحقيقات المفتش العام، ينتظر متهمان لائحة الاتهام على أساس شكاوى توقيف، ومنتظر ٨ متهمون محاكمتهم، كما ينتظر ٩ متهمون إضافيون الأحكام في عدد من القضايا. للاطلاع على قائمة شاملة للإدانات التي جمعتها وزارة العدل، أنظر الجدول ٣-٢ في نهاية هذا القسم.

يشير المفتش العام إلى نتائج التحقيقات التي تمّ التوصل إليها خلال ربع السنة الحالي:

- موظف سابق لدى وزارة الخارجية جرى توقيفه واتهامه بمخطط احتيال بقيمة ١٤٧ ألف دولار.
- نقيب في الجيش الأميركي حكم ب ٣٠ شهر في سجن فدرالي بعد إقراره بذنب سرقة ممتلكات الحكومة المتعلقة بعقود لوزارة الدفاع لدعم عملية حرية العراق.
- معلومات جنائية استخدمت لرفع دعوى اتهامية بخصوص مؤامرة رشوة في أعمال إعادة إعمار العراق.
- نقيب في الجيش الأميركي أتهم وأقرّ بذنب تلقي رشوة لمنح عقود في العراق.
- رقيب أول في سلاح مشاة البحرية الأميركية أدين بالرشوة والابتزاز لمنح وإدارة عقود في العراق.
- رائد في سلاح مشاة البحرية الأميركية اتهم بجرائم مالية.
- نقيب في سلاح مشاة البحرية الأميركية أقرّ بذنب اختلاس ١,٧ مليون دولار من عقود عسكرية.

موظف سابق لدى وزارة الخارجية جرى توقيفه واتهامه بمخطط احتيال

في ٢١ تموز/يوليو ٢٠١٠ جرى اتهام موظف سابق لدى وزارة الخارجية في ٥ اتهامات لدى محكمة المقاطعة الجنوبية لولاية تكساس، وتناولت هذه التهم احتيال بريدي وتحويل أموال من خلال مخطط احتيال على حكومة الولايات المتحدة والعراق. جرى توقيف الموظف السابق لدى وزارة الخارجية في ٢٢ تموز/يوليو ٢٠١٠ في مدينة تمبل، بولاية تكساس. وفقاً للائحة الاتهام كان هذا الموظف من نيسان/أبريل ٢٠٠٥ حتى أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦، معيناً في مكتب إدارة عملية إعادة إعمار العراق

عمليات التحقيق للمقتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

كمسؤول عن إعطاء نصائح ومشورة لمدير مرفأ أم قصر بالعراق. وكان مدير المرفأ موظفاً رسمياً في وزارة النقل العراقية.

ادّعت لائحة الاتهام انه في أواخر العام ٢٠٠٥ وبداية العام ٢٠٠٦، خطط المتهم لنقل ما يقارب ٦٠ عربة كارافان للسكن ومعدات أخرى من موقع مشروع محطة كهربائية ممول من الولايات المتحدة في الزُبَيْر بالعراق إلى المرفأ، وكان ذلك على ما يبدو نيابة عن مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO). استخدم هذه الكرافانات كخرف للسكن ومكاتب لموظفي الحكومة والشركات الخاصة، ولكن منذ انتهاء أعمال إنشاء محطة الكهرباء لم تعد هذه الكرافانات لازمة في ذلك الموقع.

ووفقاً للائحة الاتهام لم يكن لدى موظف وزارة الخارجية هذا أي سلطة او تفويض للتفاوض حول نقل أي معدات أو توقيع أوراق نيابة عن مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ولقبول هكذا معدات، وهذا ما اتهم بفعله في ١١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥. عندما ابغاه الموظفون الأميركيون ان مكتب إدارة إعادة إعمار العراق ليس لديه الهيكلية الضرورية لإدارة الممتلكات، وبالتالي لا يستطيع استلام المعدات، قام بحسب الاتهام بتوجيه موظف عراقي في وزارة النقل بالتوقيع وقبول المعدات نيابة عن الحكومة العراقية.



منظر جوي "لمخيم بوب" في مرفأ أم قصر في البصرة بالعراق

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق



كرافانات في "مخيم بوب" في مرفأ أم قصر في البصرة بالعراق

بحسب لائحة الاتهام، الموظف الذي وقع للمعدات كان موظفاً أيضاً لدى شركة بوابة العامر (BAC)، وهي شركة خاصة عراقية تعمل في المرفأ. تقوم الشركة بتقديم خدمات أمنية، عن طريق مقاول من الباطن، إضافة إلى الإسكان، وتأمين مساحة للمكاتب وخدمات الطعام لموظفي الحكومة والشركات الخاصة. ادعت لائحة الاتهام انه من صيف العام ٢٠٠٥ حتى خريف العام ٢٠٠٦ قام الموظف السابق لدى وزارة الخارجية بإدارة العمليات اليومية لشركة بوابة العامر والتفاوض حول عقود العمل نيابة عن الشركة، وساعد في قرارات توظيف شركة بوابة العامر وأدار عمل موظفي تلك الشركة.

بحسب لائحة الاتهام وقع موظف وزارة الخارجية السابق اتفاقية إيجار مدتها ٣ سنوات في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، نيابة عن مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، تسمح لشركة بوابة العامر استخدام جزء من المرفأ وقد عُرف هذا المرفأ خلال عهده باسم "مخيم بوب". يزعم الاتهام بأن هذا الموظف لم يكن لديه التفويض للدخول في هذه الاتفاقية بصفته الرسمية في مكتب إدارة إعادة إعمار العراق كما انه لم يبحث في الاتفاقية مع رؤسائه. جزء من الكرافانات المنقولة كان قد جرى تركيبها على يد موظفي شركة بوابة العامر في "مخيم بوب".

في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦، يوم واحد قبل إعادة تعيين هذا الموظف السابق في مكتب إدارة إعادة إعمار العراق في بغداد، يزعم الاتهام انه تفاوض حول اتفاقية استئجار نيابة عن شركة بوابة العامر شملت عدة من الكرافانات المنقولة. وبحسب لائحة الاتهام، اقرّ الموظف المذكور بتحويل بدل الإيجار بالبريد إلى حساب في كونرو بولاية تكساس، الذي كان يسيطر عليه بهذه الطريقة، زعم الادعاء انه تلقى ١٤٧ ألف دولار بدلات إيجار، استخدمها كمصاريف شخصية ومصاريف أعمال.

يزعم الاتهام ان التخطيط لإعادة تعيين موظف وزارة الخارجية السابق هذا كان جزئياً بسبب فشله في تأدية واجبه كمستشار لمدير المرفأ. بنهاية المطاف، استقال هذا الموظف من وزارة الخارجية.

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

يُجري هذا التحقيق المفتش العام (SIGIR) ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) ومكتب التحقيق الفدرالي (FBI).

ضابط في الجيش الأميركي حُكم بالسجن لمدة ٣٠ شهر في سجن فدرالي لسرقة أموال من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)

في ٣ أيار/مايو ٢٠١٠ حُكم على النقيب في الجيش الأميركي مايكل دونغ نغوين، متخرج من ويست بوينت مركزه في فورت لويس بواشنطن، بالسجن لمدة ٣٠ شهر بعد إقراره بذنب ارتكاب جرائم سرقة ممتلكات الحكومة وهيكله معاملات مالية. صدرت أوامر للنقيب نغوين بتسليم نفسه إلى مكتب السجون في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. إضافة إلى السجن صدرت أوامر إلى نغوين بأن يخدم ثلاث سنوات من الإطلاق المشروط ودفع استعادات بقيمة ٢٠٠ ألف دولار ومصادرة كل ممتلكاته من ممتلكات شخصية اشتراها بالأموال المسروقة بالإضافة إلى حجز ما تبقى من أموال لدى الحكومة في وقت توقيفه.



سيارة بي أم دبليو (BMW) موديل عام ٩٤ كمادة في التحقيق وإدانة الرقيب الأول السابق تيرانس والتن.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق



ثلاث سيارات أخرى مصادرة في قضية والتن

اعترف نغوين سابقاً انه خلال وجوده في الخدمة في العراق، سرق وحوّل إلى استخدامه الخاص ما يقرب من ٦٩٠ ألف دولار أميركي. تمكن نغوين من الوصول إلى الأموال من خلال وظيفته كضابط لمشتريات المشروع في الكتيبة الأولى، فوج المشاة الثالث والعشرين في الجيش الأميركي. جاءت الأموال من أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). والجدير ذكره ان أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد هي ممتلكات للولايات المتحدة تديرها وزارة الدفاع. العملة النقدية كانت بمثابة دفعات لعقود أمنية مع منظمة أبناء العراق وبرامج للإغاثة الإنسانية والإعمار.

نقل نغوين أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) المسروقة إلى الولايات المتحدة عن طريق إرسالها إلى نفسه في منزل عائلته بولاية أوريغون قبل عودته من العراق. فتح نغوين حسابات جديدة في "بنك أوف أميركا" و "واشنطن ميوتشوال بنك" و "أميركاز كرديت يونيون" و "هريتيج بنك" وذلك بعد فترة قصيرة من عودته من العراق وما لبث ان أودع في هذه الحسابات ٣٨٧,٥٥٠ دولار أميركي من الأموال المسروقة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في أوريغون وفي أماكن أخرى. وأودع بين ٩ حزيران/يونيو ٢٠٠٨ و ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ مراراً مبالغ من الأموال المسروقة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد بطريقة كان المقصود منها التهرب من متطلبات الإبلاغ الفدرالية حول إيداع مبالغ كبيرة بالعملة النقدية.

بعد إيداع الأموال في الحسابات، اشترى نغوين سيارة بي أم دبليو (BMW) ٢٠٠٨ وسيارة هامر ٢٠٠٩ طراز H3T إضافة إلى شراء أجهزة كمبيوتر، وأسلحة نارية، وأجهزة إلكترونية، وأثاث منزل. خلال تنفيذ مذكرة تفتيش، اكتشف المحققون أكثر من ٣٠٠ ألف دولار من الأموال المسروقة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، مخبأة في عليّة منزل عائلة نغوين في بورتلند.

جرى التحقيق في هذه القضية بمشاركة كل من المفتش العام والتحقيقات الجنائية لدى مصلحة ضريبة الدخل (IRS-CI)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميركي (CID-MPFU) ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS).

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

معلومات جنائية تتهم موظف سابق بمؤامرة رشوة

في ١٤ أيار/مايو ٢٠١٠ جرى رفع دعوى بناءً على معلومات جنائية، أمام محكمة فدرالية في البوكركي بولاية نيومكسيكو، تتهم موظف سابق لدى شركة بناء مركزها في الولايات المتحدة بالتآمر للاحتيال على الحكومة الأميركية عن طريق قبول عمولة غير قانونية (رشوة) من مقاول من الباطن ساعده هذا الموظف السابق في الحصول على عقود مشاريع بناء حكومية في العراق بين نيسان/أبريل ٢٠٠٥ وأذار/مارس ٢٠٠٨.

تتهم المعلومات الجنائية انه، بين العامين ٢٠٠٤ و٢٠٠٨، منح مركز القوات الجوية للامتياز البيئي (AFCEE) سلسلة من عقود البناء المطلوب تنفيذها في العراق. الموظف السابق لدى شركة الإنشاءات متهم بتزريب منح عقود من الباطن مع شركة الإنشاءات مدفوعة كلفتها من الحكومة الأميركية وجرى تضخيمها بمبالغ الرشوة التي كان من المفترض ان يتلقاها الموظف السابق المذكور، الذي جرى اتهمه بقبول عمولات غير قانونية بلغت ٣٨٤ ألف دولار.

جرى التحقيق في هذه القضية بمشاركة كل من المفتش العام ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

إدانة رقيب أول من سلاح مشاة البحرية الأميركية بتهمة رشوة وابتزاز فيما خص منح وإدارة عقود في العراق – مصادرة أربع سيارات

في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٠، جرت إدانة الرقيب الأول تيرانس والتن بمواد محكمة عسكرية عامة بتهمة الرشوة، والابتزاز، وعدم إطاعة أمر مباشر. كان والتن اختصاصي عقود في الفلوجة بالعراق، لدى سلاح مشاة البحرية في كتيبة الإمداد الثانية، من شباط/فبراير ٢٠٠٥ حتى كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، حيث كان مسؤولاً عن منح وإدارة عقود لحربي العراق وأفغانستان. حُكم على والتن بنفس اليوم بتأنيب وإنزال رتبته من E-8 إلى E3 ودفع غرامة بقيمة ٦٥ ألف دولار واحتجاز لمدة ٦٢ يوماً.

في آذار/مارس ٢٠٠٩، جرى اتهام والتن بالرشوة والابتزاز بظل القانون الموحد للعدالة العسكرية لقبوله غير القانوني لأموال وهدايا من مقاولين في العراق. وادعت التهمة انه نتيجة للمعلومات التي ظهرت خلال التحقيق تبين ان والتن ابتز أموال مقابل منح عقود تقديم خدمات رصف وإقامة إنشاءات. وادعى الاتهام أيضاً أن أحد البائعين أعطى بطاقة ائتمان نوع فيزا فيها ٥٠ ألف دولار من أجل عدم تغريم شركته بسبب عدم تقيدها بالتواريخ القصوى لتسليم العمل في أحد العقود، بحسب إفادة خطية مقدمة في محكمة فدرالية. كما ادعى الاتهام ان العقود التي منحها والتن تجاوزت تقدير الكلفة التي حددتها الحكومة بنسبة ٤٧٩ بالمئة.

نتيجة الإدانة، تم تنفيذ مذكرة مصادرة في ٣ حزيران/يونيو ٢٠١٠، في ريتشلاندز وجاكسون فيل بولاية نورث كارولينا. صادر عملاء فدراليون على ٤ عربات: مرسيدس ١٩٩٨ طراز CLK320 تبلغ قيمتها ٥،٦١٠ دولار، وفورد ٢٠٠٣ طراز اكسكورشين تبلغ قيمتها ١٢،١٠٥ دولار، وبي أم دبليو (BMW) طراز 325I تبلغ قيمتها ١٥،٦٤٥ دولار وميتسوبيشي، ٢٠٠٨ طراز اكليبس GS تبلغ قيمتها ١٥،٢٧٥ دولار.

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

جرى التحقيق في هذه القضية بمشاركة كل من المفتش العام ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) ودائرة التحقيق الجنائية البحرية (NCIS)..

راند في مشاة البحرية اتهم بجرائم مالية

في ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٠ سلم الرائد في سلاح مشاة البحرية الأميركية نفسه إلى السلطات الفدرالية في فينكس بولاية أريزونا، بمقتضى مذكرة توقيف تتهمه بأنه أودع بطريقة غير قانونية أكثر من ٤٤٠ ألف دولار في حسابات بنوك أميركية بعد ٦ أشهر من خدمته في العراق في العام ٢٠٠٥ كضابط تعاقد. التهم الموجهة إلى الرائد مفصلة في لائحة اتهامية تتألف من ٢٢ اتهام قُدمت من هيئة محلفين فدرالية في مدينة فينكس. تتهم الهيئة بأنه قام بهيكله معاملات مالية عبر مؤسسة مالية محلية.

تدعي لائحة الاتهام ان الرائد في مشاة البحرية كان قد خدم في العراق من ١٥ شباط/فبراير ٢٠٠٥ إلى ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥ في وظيفة ضابط مشتريات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وقد كان قد عُيّن لمجموعة الشؤون المدنية الخامسة، في معسكر الفلوجة في العراق. من خلال مركزه الوظيفي هذا، حدد الرائد وانتقى مشاريع إعادة إعمار ومنحها إلى مقاولين عراقيين وفاوض بخصوص بنود العقود وأكد إنجاز المشاريع. جرى توزيع أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد على المقاولين العراقيين على شكل أوراق نقدية جديدة من فئة ال ١٠٠ دولار. بحسب لائحة الاتهام، بعد فترة وجيزة من عودته من الخدمة في العراق، بدأ الرائد بإيداع أموال نقدية بأوراق ال ١٠٠ دولار الجديدة. بين تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥ ونيسان/أبريل ٢٠٠٦ قام الرائد ب ٩١ عملية إيداع نقدي بلغ إجماليها أكثر من ٤٤٠ ألف دولار في حسابات في بنوك: "بنك اوف أمريكا"، "تشايس بنك"، و"نايفي فدرال كرديت يونيون". تدعي لائحة الاتهام أن الرائد أودع إيداعات متعددة قيمة كل منها أقل من ١٠ آلاف دولار في حسابات في بنوك مختلفة من أجل التهرب من الإبلاغ عن هذه المبالغ بحسب متطلبات القانون الفدرالي.

يمكن للإدانة بتهمة هيكله معاملات مالية ان تأتي بعقوبة قصوى تبلغ ٥ سنوات سجن او غرامة مالية بقيمة ٢٥٠ ألف دولار أو كلاهما معاً.

يجرى هذا التحقيق بمشاركة كل من المفتش العام ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) والتحقيقات الجنائية لدى مصلحة ضريبة الدخل (IRS-CIS)، ودائرة التحقيقات الجنائية في البحرية الأميركية (NCIS).

نقيب في الجيش الأميركي اتهم وأقرّ بذنبه في تلقي عمولات غير قانونية من اجل منح عقود في العراق
في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٠ جرى اتهام النقيب في الجيش الأميركي فوستينو آل. غونزالس من كايلين في ولاية تكساس بتهمة واحدة بتلقي اكراميات من موظف حكومي. غونزالس كان ضابط مشتريات في مشروع للجيش الأميركي في العراق وأقرّ انه في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٦ تأمر مع غصيب مهدي (يقوم بالأعمال تحت اسم شركة المقاولات العامة) بتلقي رشاوى نقدية لمنح عقود في برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لإعادة إعمار العراق. واعترف غونزالس كذلك ان العقود التي منحها إلى مهدي هي لمشاريع قريبة من قاعدة العمليات المتقدمة، في الرستمية بالعراق، كانت أسعارها مضخمة. وأقرّ غونزالس أيضاً ان أجزاء من أموال الرشوة كانت تودع في حسابات مصرفية موجودة في كايلين وسان انطونيو بولاية تكساس وانه استخدم بعض من أموال الرشوة هذه لشراء سيارة في كايلين.

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

في ٢٤ حزيران/يونيو ٢٠١٠، غونزالس مثل أمام قاضي مقاطعة أميركي اسمه والتر اس. سميث جونيور، في واكو بولاية تكساس، وأقرّ بذنبه في تلقي إكramيات من موظف عام. تاريخ إصدار الحكم هو ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. يواجه غونزالس حتى سنتين في سجن فدرالي وغرامة قصوى تبلغ ٢٥٠ ألف دولار.

هذه القضية تجري بمشاركة كل من المفتش العام (SIGIR) ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميركي (CID-MPFU)، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) ودائرة التفتيش البريدي الأميركية.

نقيب في سلاح مشاة البحرية الأميركية يقرّ بذنبه في اختلاس ١,٧ مليون دولار من عقود عسكرية
في ١٧ أيار/مايو ٢٠١٠ أقرّ النقيب ايريك شميدت بذنبه في محكمة فدرالية للتأمر في مؤامرة لارتكاب احتيال بريدي وإعطاء بيانات خاطئة في استثمارات ضريبة الدخل الفدرالية. شميدت وزوجته، جانيت شميدت، جرى اتهامهما بأنهما تأمرا في ٤ آذار/مارس ٢٠١٠ لاختلاس ما يقرب من ١,٧٥ مليون دولار من عقود حكومية مُنحت للبرنامج الأول للعراق أثناء عمله كممثل ضابط عقود في سلاح مشاة البحرية الأميركية.

ايريك شميدت من ميوريتا بولاية كاليفورنيا المعين في فرقة مشاة البحرية الأولى في معسكر بندلتون بكاليفورنيا كان متهماً بالتأمر لارتكاب احتيال بريدي وتعبئة استثمارات ضريبة مزورة اخفى من خلالها الدخل غير المشروع عن مصلحة ضريبة الدخل (IRS). كما جرى اتهام جانيت شميدت بنفس الجريمتين.

بحسب المعلومات الجنائية، استغل النقيب شميدت مركزه الوظيفي في عملية التعاقد من اجل توجيه العقود نحو مقاوله العراقي المفضل، شركة المثواد. كانت العقود غالباً ما تمنح بظل البرنامج الأول للعراق، الذي كان مصمماً لمنح عقود معينة إلى بائعين عراقيين لمساعدة توسع الاقتصاد العراقي والمبادرين العراقيين في الأعمال. فور منح أي عقد إلى شركة المثواد، كانت جانيت شميدت تعثر على بائعين مراكزهم في الولايات المتحدة ليقوموا بتزويد المنتجات المزعوم انها من شركة المثواد كما تنص عليه شروط العقد. جانيت شميدت اشترت المنتجات بأموال كانت تحصل عليها من شركة المثواد وغالباً ما كانت تشتري منتجات من نوعية أدنى بكثير من تلك المطلوبة بحسب شروط العقد. ثم تقوم بترتيب تسليم هذه المنتجات إلى سلاح مشاة البحرية الأميركية في العراق. فور وصول الشحنة إلى العراق كان يشهد النقيب شميدت زوراً بأن هذه المنتجات صحيحة العدد والنوع كما ينص عليه العقد وانها مزودة من شركة المثواد إلى مشاة البحرية الأميركية. متسلحين بالشهادات المزورة، كان يطالب ممثلو شركة المثواد بدفعات من الولايات المتحدة وينلقونها.

حددت التحقيقات ان شميدت وزوجته جمعوا ما يقارب ١,٧٥ مليون دولار على شكل دفعات غير قانونية خلال سنة واحدة من فترة خدمة النقيب شميدت في العراق في العام ٢٠٠٨. ولأنهما أخفقا في الإبلاغ عن أي من هذه الدفعات غير القانونية في استثمارات ضريبة الدخل للعام ٢٠٠٨، يكونا قد قللا من قيمة دخلهما بدرجة كبيرة في البيانات المقدمة إلى مصلحة ضريبة الدخل.

خلال مسار هذا التحقيق صادر العملاء الحكوميين عقارين يعودان إلى آل شميدت في كاليفورنيا – عقار يقع في بيغ بير وآخر في مارييتا – وسيارتين، وما يقارب ٤ آلاف دولار نقداً. جانيت شميدت أقرت

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

بالذنب في ١٨ آذار/مارس ٢٠١٠ بتهمة فدرالية هي تقديم بيانات مزورة حول ضريبة الدخل المتعلقة بدورها بمؤامرة عقود العراق.

عند إصدار الحكم، سيواجه كل من النقيب شميدت وزوجته عقوبة قصوى تصل إلى ٢٣ سنة في سجن فدرالي.

هذه القضية تجري بمشاركة كل من المفتش العام (SIGIR) ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميركي (CID-MPFU)، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) ودائرة التفتيش البريدي الأميركية.

راند في الجيش الأميركي يقرّ بالذنب لشحن أوراق نقدية إلى الولايات المتحدة من العراق
في ٧ تموز/يوليو ٢٠١٠ أقرّ الراند في الجيش الأميركي تشارلز إي. سوبليت بالذنب في محكمة فدرالية في ممفيس بولاية تينيسي، لتقديم تصريحات كاذبة لعميل فدرالي. سوبليت اتهم بتهمة قررتها هيئة محلفين في تموز/يوليو ٢٠١٠، بعد توقيفه في مدينة هانتس فيل بولاية الاباما. بحسب الاتهام، قام بسرقة أكثر من ١٠٠ ألف دولار نقداً مخبأً في رزمة مشحونة إلى الولايات المتحدة من العراق في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.

بحسب لائحة الاتهام، خدم سوبليت في مركز التعاقد الإقليمي في مدينة بلد، العراق بمنطقة الدعم اللوجستي (LSA) أناكوندا في العراق من آب/أغسطس ٢٠٠٤ إلى شباط/فبراير ٢٠٠٥. منطقة الدعم اللوجستي أناكوندا هي منشأة عسكرية أميركية أنشأت في العام ٢٠٠٣ بهدف دعم عمليات الجيش الأميركي في العراق. سوبليت خدم كضابط تعاقب، مسؤول عن، من بين أشياء أخرى، تقييم العقود والإشراف عليها مع الشركات التي تزود منتجات وخدمات للجيش الأميركي.

أقرّ سوبليت انه، في ١١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، أرسل رزمة من بلد في العراق إلى كايلين بولاية تكساس في الولايات المتحدة، والتي تم احتجازها على يد ضباط الجمارك وحماية الحدود في ممفيس. أقرّ سوبليت انه، على بوليصة الشحن الجوي الدولية، قام بوصف محتويات الرزمة زوراً بأنها كتباً وأوراقاً، وصندوق مجوهرات، وثياب تبلغ قيمتها الجمركية المبلغ عنها ١٤٠ دولاراً، ولكن بالواقع، كان سوبليت يعلم ان الرزمة تحتوي على ١٠٧,٩٠٠ دولار بالعملة الأميركية و١٧,١٢ مليون دينار عراقي. أقرّ سوبليت أيضاً انه اخفق في تقديم تقرير معاملة أدوات نقدية (CMIR) لنقل أوراق نقدية، كما يفرض القانون الفدرالي لدى نقل أوراق نقدية تزيد عن ١٠ آلاف دولار إلى أو من الولايات المتحدة. خلال جلسة الاستماع إلى الإقرار بالذنب أقر سوبليت انه قدم ادعاءات كاذبة إلى المحققين فيما يتعلق بمحاولته إدخال الأموال النقدية إلى الولايات المتحدة بهدف إعاقة تحقيقهم.

ينتظر سوبليت إصدار الحكم بتاريخ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠. وكجزء من اتفاقية الإقرار بالذنب وافق سوبليت على مصادرة الأموال البالغة ١٠٧,٩٠٠ دولار أميركي و١٧,٦٢ مليون دينار عراقي التي خبأها في الرزمة.

يجري هذا التحقيق بمشاركة كل من المفتش العام (SIGIR) ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميركي (CID-MPFU)، ودائرة التحقيقات الجنائية في

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

وزارة الدفاع (DCIS)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI)، ومصلة ضريبة الدخل في الولايات المتحدة (IRS)، ووكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك (ICE).

تحديث تحقيق كوكراهام

في ١٨ حزيران/يونيو ٢٠١٠ سلم قريب للرائد في الجيش الأميركي جون كوكراهام شيك شخصي بقيمة ١٠٠ ألف دولار أميركي، وذلك في تسليم طوعي إلى حساب مصادرة أصول الخدمات القتالية الأميركية. وادعى الاتهام ان قريب كوكراهام تلقى ٣٠٠ ألف دولار من شركة مقاولات مركزها الكويت. وجرى تحديد هذه الأموال على انها من مخطط رشوة أعدّه كوكراهام. قبل هذا العمل، جرى تنفيذ أمر مصادرة في ١٠ أيار/مايو ٢٠١٠، لمصادرة ٧٦,٩٨٢ دولار التي كانت موجودة في الحساب المصرفي لقريب كوكراهام نفسه. وفي ٢ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩، حُكم على جون كوكراهام بـ ٢١٠ أشهر في السجن. وقد أمر أيضاً بقضاء ثلاث سنوات من إطلاق السراح المراقب، بعد انتهاء مدة السجن، ودفع مبلغ ٩,٦ مليون دولار كاستعادة.

يجري هذا التحقيق بمشاركة كل من المفتش العام ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميركي (CID-MPFU)، ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS)، ومصلة ضريبة الدخل في الولايات المتحدة (IRS)، ووكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك (ICE)، ومكتب التحقيقات الفدرالي (FBI).

مبادرة الإدعاء العام للمفتش العام (SIGPRO)

تواصل مبادرة الادعاء العام للمفتش العام (SIGPRO) تقدمها في مجهود يهدف إلى إيجاد موارد أخرى تتناسب مع عبء قضاياها القضائية، المتوسعة. لقد طوّر المفتش العام برنامجاً عيّن من خلاله ثلاثة مدعين عامين سابقين من ذوي الخبرة العالية لدى وزارة العدل. وقد تم تشكيلهم كوحدة في قسم الفساد في القسم الجنائي في وزارة العدل، للادعاء في قضايا تحقيقات المفتش العام، حيث تناول هؤلاء أعباء قضاياهم الخاصة ضمن وزارة العدل وعملوا عن كثب مع المستشار القانوني العام للمفتش العام ومدعين عامين آخرين معيّنين لقضايا المفتش العام.

إضافة إلى ذلك، تعاون هؤلاء مع مساعدي المدعي العام في أنحاء الولايات المتحدة، كما مع المدعين العامين الأجانب، في كل قضايا الادعاء العام للمفتش العام. يتابع فريق الإدعاء العام في مبادرة الادعاء هذه في تحقيق تأثير جوهري إيجابي على إنتاجية برنامج التحقيقات الجنائية للمفتش العام. تدعم وزارة العدل هذا البرنامج بحماس، ولا يمكن للمفتش العام أن يكون أكثر اغتباطاً للطريقة الناجحة التي بدأ فيها هذا البرنامج.

التعليق والحظر

منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥، عمل المفتش العام عن كثب مع وزارة العدل ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميركي (CID-MPFU) ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع (DCIS) وقسم اكتشاف الاحتيال في المشتريات (PFB) التابع لوكالة الخدمات القانونية في الجيش المسؤولة عن تعليق التعامل وحظره مع مقاولين ومع موظفين حكوميين بسبب الاحتيال او الفساد داخل الجيش، بضمنهم المقاولين المشاركين في عقود إعادة إعمار العراق او في عقود دعم الجيش في العراق. تبرز هذه القضايا نتيجة اتهامات جنائية تحال إلى محاكم

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

فدرالية محلية وادعاءات حول مسؤولية المقاول التي تتطلب فحصاً مدعوماً بالوقائع من جانب المسؤول في دائرة التعليق والحظر في الجيش.

خلال الفترة من ١ نيسان/أبريل و ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠ اقترح الجيش حظر فرد واحد.

وحتى هذا التاريخ، علق الجيش ٩٠ فرداً وشركة متورطين في عقود الاستدامة وإعادة الإعمار الداعمة للجيش في العراق والكويت. جرى اقتراح أسماء ١٠٥ أفراد وشركة لحظر التعامل معهم، لمدة تتراوح بين تسعة أشهر و ٢٧,٥ سنة. يتابع الآن قسم اكتشاف الاحتيال في المشتريات (PFB) شركات وأفراد إضافيين شاركوا في عمليات احتيال توافقت مع عقود الجيش في العراق، والكويت، ومواقع أخرى في جنوب غرب آسيا، كما ويدرس قرارات تعليق وحظر إضافية خلال العام ٢٠١٠. تُبلغ قرارات التعليق والحظر المتعلقة بالاحتيال في عقود إعادة الإعمار ودعم الجيش في أفغانستان إلى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR). القضايا التي برزت بالأصل في أفغانستان، والتي كانت مدرجة في السابق مع القضايا التي برزت بالأصل في العراق، والكويت، ومواقع أخرى في جنوب غرب آسيا، قد تم حذفها الآن من قوائم وكالة التحقيق الفدرالية المقدمة إلى المفتش العام في الربع الثالث من سنة ٢٠٠٩ وهي الآن مشمولة في التقرير ربع السنوي الذي أعده المفتش العام لإغاثة وإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR).

أنظر الجدول ٣-٣ للحصول على قائمة كاملة لأوامر التعليق والحظر. وأنظر الملحق (و) للحصول على قائمة كاملة بأوامر التعليق والحظر.

الجدول ٣-٣
الإدانات (كما جمعتها وزارة العدل الأميركية)

الاسم	الادانات	تاريخ الإدانة	الحكم
الرائد شارلز سوبليت الولايات المتحدة	تصريحات كاذبة	٢٠١٠/٧/٧	معلق
النقيب فوستينو غونزالس، الولايات المتحدة	قبول إكراهية من موظف حكومي	٢٠١٠/٦/٢٤	معلق
الرقيب الأول تيرانس والتن، سلاح مشاة البحرية الأميركية	رشوة، ابتزاز، عدم إطاعة أمر مباشر	٢٠١٠/٥/١٧	تأنيب، إنزال رتبة من E-8 إلى E-3، غرامة ٦٥ ألف دولار، و ٦٢ يوم احتجاز.
النقيب اريك شميدت، سلاح مشاة البحرية الأميركية	احتيال بريدي، تقديم بيانات خاطئة عن ضريبة الدخل الفدرالية	٢٠١٠/٥/١٧	معلق
وليم كولنز، الولايات المتحدة - مدني	رشوة	٢٠١٠/٤/٢١	معلق
راي شايز، الولايات المتحدة	إكراهية غير قانونية، هيكلية معاملات مالية، تصريحات كاذبة	٢٠١٠/٤/٢١	معلق
ماركوس ماكلين	قبول إكراهيات غير قانونية)	٢٠١٠/٤/١٥	معلق

عمليات التحقيق للمقتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٣-٣ (تابع)

الاسم	الاتهامات	تاريخ الإدانة	الحكم
كيفن أ. دايفس	قبول إكراميات غير قانونية)	٢٠١٠/٤/١٣	معلق
جانيت شميدت، مقال وزوجة عسكري	تقديم بيانات خاطئة عن ضريبة الدخل وإحتيال	٢٠١٠/٣/١٨	معلق
تري هول، مقال	تأمر، رشوة	٢٠١٠/٢/١٧	معلق
تريزا راسل موظفة سابقة أميركية ورقيب	تبييض أموال	٢٠١٠/١/٢٨	معلق
النقيب مايكل دي نيغوين	سرقة وهيكلة معاملات مالية	٢٠٠٩/١٢/٧	٣٠ شهر في السجن، إطلاق سراح مراقب لمدة ٣ سنوات، إعادة أموال ٢٠٠ ألف دولار ومصادرة كل مصالحه من ممتلكات خاصة اشتراها بأموال مسروقة إضافة إلى الأموال المتبقية المحجوزة من الحكومة في وقت هذا التوقيف.
رونالد رادكليف	رشوة وتبييض أموال	٢٠٠٩/١٠/١٦	٤٠ شهر في السجن و ٣٠ الف دولار غرامة
جوز ليتو دومينغو	رشوة	٢٠٠٩/١١/١٩	معلق
غلوريا مارتينيز	رشوة وتأمر	٢٠٠٩/٨/١٢	٥ سنوات سجن
روبرت جيفري	تأمر وسرقة	٢٠٠٩/٨/١١	٤ سنوات سجن
وليام درايفر	تبييض أموال	٢٠٠٩/٨/٥	تحت المراقبة لمدة ٣ سنوات، بما فيها ٦ أشهر احتجاز في المنزل، إعادة ٣٦ الف دولار
نايري بيتاواي ابنة أخت الرائد جون كوكر هام	التأمر لإعاقة العدالة	٢٠٠٩/٧/٢٨	سجن ١٢ شهر ويوم واحد، سنتان إطلاق سراح مراقب، إعادة خمس ملايين دولار.
ميشال جميل	تأمر	٢٠٠٩/٧/٢٧	٤٠ شهر سجن
روبرت يونغ	تأمر وسرقة موجودات حكومية	٢٠٠٩/٧/٢٤	٩٧ شهرا سجن، ٣ سنوات إطلاق سراح مراقب، مصادرة مليون دولار وإعادة ٢٦،٢٧٦،٤٧٢ دولار
سمير عيتاني	تأمر	٢٠٠٩/٧/٢١	معلق
تيجاني سعاني	تقديم بيانات خاطئة عن ضريبة الدخل	٢٠٠٩/٦/٢٥	سجن لمدة ١١٠ أشهر، سنة واحدة إطلاق سراح مراقب، غرامة ١,٦ مليون دولار وإعادة ٨١٦،٤٨٥ دولار إلى مصلحة ضريبة الدخل
ديان دميلتا	إحتيال بريدي	٢٠٠٩/٥/٢٧	سجن لمدة ٦ أشهر، ١٢ شهر احتجاز في المنزل، سنتان إطلاق سراح مراقب، ٢٠,٠٠٠ دولار غرامة، وإعادة ٧٠,٠٠٠ دولار.
بنجامين آر. كافكا	تستر على جريمة	٢٠٠٩/٥/١٨	معلق

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٢-٣ (تابع)

الاسم	الاتهامات	تاريخ الإدانة	الحكم
إلبرت دبليو جورج الثالث	سرقة أملاك حكومية؛ تأمر	٢٠٠٩/٥/١٨	٦٠ يوم احتجاز متقطع، سنتين إطلاق سراح مراقب، مصادرة ١٠٣ آلاف دولار وإعادة مبلغ ٥٢,٢٦٦,٦٠ بمشاركة روي غرين.
روي غرين جونيور	سرقة أملاك حكومية؛ تأمر	٢٠٠٩/٥/١٨	٦٠ يوم إقامة جبرية متقطعة، سنتين إطلاق مراقب، مصادرة ١٠٣ آلاف دولار وإعادة مبلغ ٥٢,٢٦٦,٦٠ بمشاركة روي غرين.
فردريك كنفن	تأمر	٢٠٠٩/٤/٣٠	٣ سنوات مراقبة وإعادة ٢,٠٧٢,٩٦٧ دولار.
ستيفن داي	تأمر واحتيال على الحكومة الأميركية بتشويه الحقائق	٢٠٠٩/٤/١٣	٣ سنوات مراقبة وإعادة ٤١,٥٢٢ دولار وغرامة ٢٠٠٠ دولار.
جف ألكس مازون، مقال، شركة كيلوغ، براون أن روت	عمليات احتيال رئيسية ضد الولايات المتحدة واحتيال بريدي	٢٠٠٩/٣/٢٤	سنة مراقبة، ٦ أشهر احتجاز في المنزل وغرامة ٥ آلاف دولار.
كارولين بلايك، شقيقة الرائد جون كوكر هام	تأمر وتبييض أموال	٢٠٠٩/٣/١٩	سجن لمدة ٧٠ شهراً، ٣ سنوات إطلاق سراح مراقب، إعادة ٣,١ مليون دولار.
مايكل كارتر، مهندس مشاريع، فورس بروتكشن للصناعات	انتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٩/١/٢٥	سجن لمدة ٦١ شهر وإطلاق سراح مراقب بعد ٣ سنوات.
حارث الجبوي، مقال	تأمر، رشوة، وبيانات خاطئة	٢٠٠٩/١/٢٢	معلق
الرائد كريستوفر موراي، ضابط عقود أميركي	رشوة وبيانات خاطئة	٢٠٠٩/١/٨	سجن لمدة ٥٧ شهراً، ٣ سنوات إطلاق سراح مراقب، وإعادة ٢٤٥ ألف دولار
الرائد تيريزا بابكر، ضابطة عقود في الجيش الأميركي	تأمر ورشوة	٢٠٠٨/١٢/٢٢	سجن لمدة ٧٠ شهراً، وإعادة ٨٢٥ ألف دولار
العقيد كورتيس وايتفورد، مسؤول كبير في الجيش الأميركي، إدارة منطقة الجنوب الأوسط لسلطة الائتلاف المؤقتة	تأمر، رشوة واحتيال بريدي	٢٠٠٨/١١/٧	سجن لمدة ٥ سنوات، سنتان إطلاق سراح مراقب، إعادة ١٦,٢٠٠ دولار
المقدم مايكل ويلر، مستشار إعادة الإعمار، الجيش الأميركي - سلطة الائتلاف المؤقتة	تأمر، رشوة واحتيال بريدي، نقل أموال مسروقة عبر الولايات وتهريب مبالغ نقدية	٢٠٠٨/١١/٧	سجن ٤٢ شهراً، ٣ سنوات إطلاق سراح مراقب، إعادة ١٢٠٠ دولار، مئة دولار رسم تقييم خاص

عمليات التحقيق للمقتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٢-٣ (تابع)

الاسم	الاتهامات	تاريخ الإدانة	الحكم
ديفيد راميرز، مقال، شركة رديناس سابورت مانجمانت	تهريب مبالغ نقدية وهيكلة معاملات مالية	٢٠٠٨/١٠/٩	سجن لمدة ٥٠ شهراً؛ ٣ سنوات إطلاق سراح مراقب و ٢٠٠ دولار رسم تقييم خاص
لي دويوا، مقال، شركة فيوتشر سيرفيسز جنرال ترايدنغ أند كونتراكتنغ كومباني	سرقة أملاك حكومية	٢٠٠٨/١٠/٧	سجن لمدة ٣ سنوات، وإعادة دفع ٤٥٠ ألف دولار التي تمثل العائدات غير الشرعية لمخطط
جاكلين فانكهوزر	استلام ممتلكات مسروقة	٢٠٠٨/٨/٢٨	سنة تحت المراقبة، ١٨٠ يوم احتجاز في المنزل؛ ١٠٤ ساعات خدمة المجتمع الأهلي؛ ١٠,٠٠٠ دولار غرامة؛ و ١٠٠ دولار رسم تقييم خاص
روبرت بينيت، مقال شركة كيلوغ، براون أند روت	انتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٨/٨/٢٨	سنة تحت المراقبة وإعادة مبلغ ٦ آلاف دولار.
الرائد جيمس مومون جونيور، ضابط عقود لدى الحكومة الأميركية	تأمر ورشوة	٢٠٠٨/٨/١٣	معلق
المقدم ديبرا إم. هاريسون، المراقبة المالية بالوكالة لمنطقة الجنوب الأوسط لدى سلطة الائتلاف المؤقتة	تأمر، رشوة، تبييض أموال، احتيال البريدي، نقل أموال مسروقة عبر الولايات، تهريب أموال نقدية وتقديم بيانات خاطئة عن الضريبة	٢٠٠٨/٧/٢٨	سجن لمدة ٣٠ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين وإعادة ٣٦٦,٦٤٠ دولار.
النقيب سيدر لانمون، الولايات المتحدة	قبول إكراميات غير قانونية	٢٠٠٨/٧/٢٣	سجن لمدة سنة؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنة
الرائد جون لي كوكر هام، ضابط عقود أميركي	رشوة، تأمر، وتبييض أموال	٢٠٠٨/٦/٢٤	سجن لمدة ٢١٠ أشهر، ٣ سنوات إطلاق سراح مراقب، إعادة ٩,٦ مليون دولار
ميليسا كوكر هام، زوجة الرائد جون كوكر هام	تأمر وتبييض أموال	٢٠٠٨/٦/٢٤	سجن لمدة ٤١ شهراً، ٣ سنوات إطلاق سراح مراقب، إعادة ١,٤ مليون دولار
المقدم ليفوندا سيلف، ضابطة عقود أميركية	تأمر ورشوة	٢٠٠٨/٦/١٠	معلق
رامان إنترناشنال كورب	تأمر ورشوة	٢٠٠٨/٦/٣	غرامة ٥٠٠,٠٠٠ دولار؛ وإعادة ٣٢٧,١٩٢ دولار
النقيب أوستن كاي، ضابط عقود أميركي	رشوة	٢٠٠٧/١٢/١٩	معلق

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٢-٣ (تابع)

الاسم	الالتهامات	تاريخ الإدانة	الحكم
الرائد جون ريفارد، ضابط عقود في الجيش الأميركي	رشوة، تأمر وتبييض أموال	٢٠٠٧/٧/٢٣	سجن لمدة ١٠ سنوات؛ إطلاق سراح مراقب لمدة ٣ سنوات، ٥٠٠٠ دولار، وأمر مصادرة بقيمة مليون دولار
كيفين سموت، المدير الإداري، شركة إيغل غلوبال لوجستكس	انتهاك قانون مكافحة دفع العمولات وتصريحات خاطئة	٢٠٠٧/٧/٢٠	سجن لمدة ١٤ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ غرامة ٦٠٠٠ دولار؛ وإعادة ١٧،٩٦٤ دولار
أنطوني مارتن، مدير المقاولين من الباطن، لدى شركة كيلوغ، براون أند روت	انتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٧/٧/١٣	سجن لمدة سنة ويوم؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ وإعادة ٢٠٠،٥٠٤ دولار
جيسي لاين، المفوضة المالية ٢٢٣ في الجيش الأميركي	تأمر واحتيال بريدي	٢٠٠٧/٦/٥	سجن لمدة ٣٠ شهراً؛ وإعادة ٣٢٣،٢٢٨ دولار
ستيفن ميركس، مدني يعمل لدى وزارة الدفاع، مخطط دعم تشغيلي	قبول إكراميات غير قانونية	٢٠٠٧/٢/١٦	سجن لمدة سنة ويوم؛ إعادة ٢٤،٠٠٠ دولار
ببليتي جونور، ضابط صف رئيسي، استشاري خدمات الأطعمة للجيش الأميركي في الكويت والعراق وأفغانستان	رشوة وتهريب أموال نقدية	٢٠٠٧/٢/٩	سجن لمدة ٢٨ شهراً؛ وغرامة ٥٧،٥٠٠ دولار ومصادرات
جينيفر أنجكوس، المفوضة المالية ٢٢٣ في الجيش الأميركي	تأمر لارتكاب احتيال بريدي	٢٠٠٦/١١/١٣	٣ سنوات تحت المراقبة، إعادة ٨٦،٥٥٧ دولار ورسم تقييم ١٠٠ دولار
الرفيق لوميلي شافيز، المفوضة المالية ٢٢٣ في الجيش الأميركي	تأمر لارتكاب احتيال بريدي	٢٠٠٦/١١/١٣	٣ سنوات تحت المراقبة، إعادة ٢٨،١٠٧ دولار، ورسم تقييم ١٠٠ دولار
الرفيق ديريل هولبير، المفوضة المالية ٢٢٣ في الجيش الأميركي	تأمر لارتكاب احتيال بريدي	٢٠٠٦/١١/١٣	٣ سنوات تحت المراقبة، إعادة ٨٣،٦٥٧ دولار و٤٧ سنت ورسم تقييم ١٠٠ دولار
الرفيق لويس لوبيز، المفوضة المالية ٢٢٣ في الجيش الأميركي	تأمر لارتكاب احتيال بريدي	٢٠٠٦/١١/١٣	٣ سنوات تحت المراقبة، إعادة ٦٦،٨٦٥ دولار ورسم تقييم ١٠٠ دولار
بوني ميرفي، ضابطة عقود	قبول إكراميات غير قانونية	٢٠٠٦/١١/٧	إطلاق سراح مراقب لمدة سنة واحدة وغرامة ١٥٠٠ دولار

عمليات التحقيق للمقتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٢-٣ (تابع)

الاسم	الادانات	تاريخ الإدانة	الحكم
سمير محمود، موظف لدى شركة أميركية للبناء	إدلاء بتصريحات خاطئة	٢٠٠٦/١١/٣	يوم واحد تعويض لمدة البقاء في السجن وإطلاق سراح مراقب لمدة سنتين
شيفار غيز بابن، موظف مدني لدى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي	طلب وقبول عمولات غير قانونية	٢٠٠٦/١٠/١٢	سجن لفترة سنتين، إطلاق سراح مراقب لمدة سنة واحدة وإعادة ٢٨،٩٠٠ دولار
المقدم بروس هوفنغاردنر، استشاري خاص في الجيش الأميركي لدائرة منطقة الجنوب الأوسط لسلطة الائتلاف المؤقتة	تأمر، تأمر لارتكاب احتيال بريدي، تبييض أموال وتهريب عملة نقدية	٢٠٠٦/٨/٢٥	سجن لمدة ٢١ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة ٣ سنوات؛ غرامة ٢٠٠ دولار ومصادرات بقيمة ١٤٤،٥٠٠ دولار
فهميم موسى سلام، مترجم، شركة تيتان كوربوريشن	إنتهاك أحكام منع الرشوة في قانون ممارسات الفساد الدولية	٢٠٠٦/٤/٨	سجن لمدة ٣ سنوات؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ خدمة المجتمع المحلي لمدة ٢٥٠ ساعة ورسم تقييم خاص بقيمة ١٠٠ دولار
محمد شبير خان، مدير العمليات للكويت والعراق لدى شركة تميمي غلوبال المحدودة	إنتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٦/٦/٢٣	سجن لمدة ٥١ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ غرامة ١٠،٠٠٠ دولار؛ إعادة ١٣٣،٨٦٠ دولار و١،٤٠٠ دولار رسم تقييم
فيليب بلوم، مالك شركة غلوبال بزنس غروب، جي بي جي هولدنغز، وقسم اللوجستيات في جي بي جي	تأمر، رشوة وتبييض أموال	٢٠٠٩/٨	معلق
ستيفن سيمانز، مدير العقود من الباطن في شركة كيلوغ، براون أند روت	إحتيال بريدي، تبييض أموال، وتأمر	٢٠٠٦/٣/١٠	سجن لمدة ٤٦ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ مصادرات ٣,٦ مليون دولار؛ إعادة ٣,٦ مليون دولار، ٣٠٠ دولار رسم تقييم خاص
كريستوفر كحيل، نائب المدير الإقليمي للشرق الأوسط والهند لدى شركة إيغل غلوبال لوجستكس إنك	إحتيال رئيسي ضد الولايات المتحدة	٢٠٠٦/٢/١٦	سجن لمدة ٣٠ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة سنتين؛ غرامة ١٠،٠٠٠ دولار؛ ١٠٠ دولار رسم تقييم. (تسوية مدنية مع شركة إيغل غلوبال لوجستكس ناتجة عن نفس الوقائع أدت إلى تسوية بقيمة ٤ ملايين دولار)

إشراف المفتش العام لإعادة إعمار العراق

الجدول ٢-٣ (تابع)

الاسم	الالتهامات	تاريخ الإدانة	الحكم
روبرت شتاين، مراقب مالي وضابط تمويل في منطقة الجنوب الأوسط لسلطة الائتلاف المؤقتة	جرم حيازة سلاح ناري وامتلاك رشاشات ورشوة وتبييض أموال وتأمير	٢٠٠٦/٢/٢	سجن لمدة ٩ سنوات؛ إطلاق سراح مراقب لمدة ٣ سنوات؛ مصادرة ٣,٦ مليون دولار؛ إعادة ٣,٥ مليون دولار و ٥٠٠ دولار رسم تقييم خاص
غلن باول، مدير العقود من الباطن لدى شركة كيلوغ، براون أند روت	احتيال وانتهاك قانون مكافحة دفع العمولات	٢٠٠٥/٨/١	سجن لمدة ١٥ شهراً؛ إطلاق سراح مراقب لمدة ٣ سنوات؛ إعادة ٩٠,٩٧٣ دولار و ٩٩ سنت و ٢٠٠ دولار رسم تقييم

ملاحظة: لا تشمل نتائج المحاكم غير الأميركية من تحقيقات دوائر فرض القانون الأجنبي/المفتش العام.

عمليات التحقيق للمقتس العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٣-٣
قائمة الحظر

تاريخ الحظر	الاسم
٢٠١٠/٣/٢٩	جف تومسون
٢٠١٠/٣/١٧	جون كوكر هام
٢٠١٠/٣/١٧	ماليسا كوكر هام
٢٠١٠/٣/١٧	كارولين بلايك
٢٠١٠/٣/١٧	نايري بيتاواي
٢٠١٠/٣/٩	روبرت يونغ
٢٠١٠/١/٢١	ألبرت ويسلي جورج الثالث
٢٠١٠/١/٢١	روي غرين
٢٠١٠/١/٢١	أوفيليا وب
٢٠١٠/١/٢١	باتريك فوست
٢٠٠٩/٩/٣٠	علي إن جبك
٢٠٠٩/٩/٣٠	ليبرتي أي جبك
٢٠٠٩/٩/٣٠	شركة ليبرتي كونستراكتشين
٢٠٠٩/٩/٣٠	ثروت طرش
٢٠٠٩/٩/٣٠	بابوات درة العرب
٢٠٠٩/٩/٣٠	درة العرب
٢٠٠٩/٩/٣٠	حسين اليحيى
٢٠٠٩/٩/٣٠	أمينة علي عيسى
٢٠٠٩/٩/٣٠	عادل علي يحيى
٢٠٠٩/٩/١٠	ديفيد يوسف دالفي
٢٠٠٩/٩/٢٥	محمد عبد اللطيف الزاهد
٢٠٠٩/٩/١٠	جيرالد توماس كراغ
٢٠٠٩/٩/٤	اندرو جون كاسترو
٢٠٠٩/٩/٤	شركة ايرفيدان المحدودة
٢٠٠٩/٨/٢٠	كيفن ارشيس دايفس
٢٠٠٩/٨/٧	جاكلين فانكهاورز
٢٠٠٩/٨/٧	دبرا أم هاريسون، ضابطة في الجيش الأميركي
٢٠٠٩/٧/١	نزار عيد العلامة
٢٠٠٩/٧/١	شركة سان خوان
٢٠٠٩/٧/١	شركة ميسيسيبي للعقود العامة
٢٠٠٩/٦/١٧	شركة لي داينامكس إنترناشونال
٢٠٠٩/٦/١٧	شركة لي ديفانس سيرفيس
٢٠٠٩/٦/١٧	جورج ايتش لي
٢٠٠٩/٦/١٧	جاستين دبليو لي
٢٠٠٩/٦/١٧	أوي لي
٢٠٠٩/٦/١٧	مارك جاي أنطوني
٢٠٠٩/٦/١٧	ليفوندا جاي سيلف
٢٠٠٩/٦/١٧	ستاركون ليمتد، إل إل سي
٢٠٠٩/٦/٣	سيدار جاي لانمون، نقيب، الولايات المتحدة

إشراف المقتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٣-٣ (تابع)

الاسم	تاريخ الحظر
شركة دي+ جاي التجارية	٢٠٠٩/٥/١٤
جيسي دي . لاين جونيور	٢٠٠٩/١/٣٠
جنيفر انجاكوس	٢٠٠٩/١/٣٠
كارلوس ال شافيز	٢٠٠٩/١/٣٠
داريل هولبير	٢٠٠٩/١/٣٠
لويس أي لوبيز	٢٠٠٩/١/٣٠
محمد شبير خان	٢٠٠٨/١٠/١٠
كيفين أندريه سموت	٢٠٠٨/٩/٣٠
شركة الوادي الأخضر (غرين فالي)	٢٠٠٨/٩/١٧
	٢٠٠٧/٥/١٨
شركة ترياد للتكنولوجيا المتحدة	٢٠٠٨/٩/١٧
شركة ديوا أوروبا	٢٠٠٨/٩/١٧
مؤسسة ديوا التجارية	٢٠٠٨/٩/١٧
شركة الغنوم ونايبر للتجارة العامة	٢٠٠٨/٩/١٧
شركة مشاريع ديوا (خاصة) المحدودة	٢٠٠٨/٩/١٧
شركة فيوتشر AIM المتحدة	٢٠٠٨/٩/١٧
شركة AIM الأولى للتجارة والمقاولات	٢٠٠٨/٩/١٧
فاسنتا نايبير	٢٠٠٨/٩/١٧
كاي. في. غوبال	٢٠٠٨/٩/١٧
فلاح العجمي	٢٠٠٨/٩/١٧
شركة عبر الشرق للتجارة العامة (ترانز أورينت)	٢٠٠٨/٩/١٧
مؤسسة زينيت انتربرايز المحدودة	٢٠٠٨/٩/١٧
بيليتي "بيت" بيليتي، ضابط إصدار التراخيص، الولايات المتحدة	٢٠٠٨/٦/١٥
شركة السواري للتجارة والمقاولات	٢٠٠٨/٣/١٣
جون ألن ريفارد، الرائد في الجيش الأميركي	٢٠٠٨/١/١٤
سمير محمود	٢٠٠٧/١١/٢٩
روبرت غروف	٢٠٠٧/١٠/٣٠
ستيفن مركس	٢٠٠٧/٩/٢٧
بروس دي هوبفغار دنر، ملازم أول في الجيش الأميركي	٢٠٠٧/٩/٢٠
روبرت جاي شتاين جونيور	٢٠٠٧/٨/١٦
فيليب ايتش. بلوم	٢٠٠٧/٨/٨
غلوبال بزنس غروب، S.R.L.	٢٠٠٧/٨/٨
ستيفن لويل سيمانز	٢٠٠٧/٧/٢٧
غيفار غيزي باين	٢٠٠٧/٦/٢٨
فهيم موسى سلام	٢٠٠٧/٦/٢٨
شركة QAH للأشغال الميكانيكية والكهربائية	٢٠٠٧/٦/٢٧
عبد الله هادي فُصّي	٢٠٠٧/٦/٢٧
شركة الرياض للمختبرات والكهرباء	٢٠٠٧/١/٢٦
توماس نلسون بارنز	٢٠٠٧/١/٢٤
شركة الدانوب للهندسة والمقاولات العامة	٢٠٠٦/١٢/٢٨

عمليات التحقيق للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

الجدول ٣-٣ (تابع)

الاسم	تاريخ الحظر
علوان فايق	٢٠٠٦/١٢/٢٨
كريستوفر جوزيف كحيل	٢٠٠٦/١١/٩
أحمد حسن دايع	٢٠٠٦/٩/٢٦
ضياء أحمد عبد اللطيف سالم	٢٠٠٦/٥/١٤
	٢٠٠٦/٦/٢
شركة ياسمين للتجارة والخدمات الدولية	٢٠٠٩/٥/١٤
	٢٠٠٦/٦/٢
كاستر باتلز	٢٠٠٩/٣/١٧
روبرت وايزمان	٢٠٠٦/٣/٦
غلين آلن باول	٢٠٠٦/٢/١٦
عمر الخضرا	٢٠٠٦/١/١٢
دان للتجارة والمقاولات	٢٠٠٦/١/١٢
ستيفن لودفيغ	٢٠٠٥/٩/٢٩
شركة دي إكس بي إنترناشونال	٢٠٠٥/٩/٢٩

تقييمات المفتش العام

تقوم مديرية التقييمات حالياً بتنفيذ مقارنة متعددة الأوجه لتقييم البرامج الممولة من الحكومة الأميركية بهدف دعم الاستقرار وإعادة إعمار العراق. إن قدرة هذه المنظمة الجديدة سوف تساعد المفتش العام في القيام بالمسؤولية الإشرافية عن طريق استخدام مقاربات تقليدية وخالقة.

يجري تشكيل فرق للتقييم تتضمن موظفين لدى المفتش العام لديهم خبرات في التدقيق والتقييم وتحليل البرامج والتقنيش، لتصميم وتنفيذ مدى واسع من دراسات التقييم. يمكن زيادة هذه الفرق بإضافة خبرات مختصة ومستشارين تقنيين آخرين حسب الحاجة والموضوع الجاري تقييمه. ستجري دراسات التقييم في الولايات المتحدة وفي العراق، وفقاً للمعايير المقبولة عموماً لتقييم السياسات والبرامج.

يخطط المفتش العام لتقييم عينة من البرامج الممولة من حكومة الولايات المتحدة التي جرى إطلاقها لتحسين الاستقرار والأمن العراقي. إضافة إلى تطوير استنتاجات ومكتشفات وتوصيات مقدمة إلى إدارة الوكالة، نتائج ومدى تأثير الاستقرار وبرامج إعادة الإعمار في العراق لرفع تقرير بذلك.

خلال ربع السنة الحالي، اصدر المفتش العام إعلان تقييمه الثاني: "مراجعة مشاريع البنى التحتية الرئيسية الممولة من الحكومة الأميركية في العراق: "محطات معالجة المياه في الناصرية وإفراز" EV-10.002". يتوقع المفتش العام ان يصدر تقريراً حول هذا التقييم بنهاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠١٠.

خط الإتصال المباشر لدى المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

يسهل خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء الإدارة، والاسترداد في كافة البرامج المتعلقة بجهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع الضرائب الأميركي. عندما يتلقى خط الاتصال المباشر للمفتش العام قضايا ليس لها علاقة بالبرامج والعمليات الممولة بأموال أميركية مخصصة أو متوفرة بشكل آخر لإعادة إعمار العراق، يحوّل المفتش العام هذه القضايا إلى الجهات المناسبة. يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، أو اتصالات عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاكس، أو عبر شبكة الإنترنت من العراق والولايات المتحدة ومن كافة أنحاء العالم.

تقرير ربع السنة الثاني

بحلول ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠، كان خط الاتصال المباشر للمفتش العام قد بدأ التحقيق في ٨٠٣ قضايا، منها ٧٣٩ قضية أغلقت، و ٦٤ قضية لازالت مفتوحة حالياً. أنظر الجدول ٣-٤ للاطلاع على موجز القضايا.

القضايا الجديدة

خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط الإتصال المباشر للمفتش العام ١٢ شكوى جديدة ليصبح العدد المتراكم للقضايا ٨٠٣ قضايا عبر خط الإتصال المباشر. وقد صنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات التالية:

- ٦ شكاوى تتعلق بالاحتيال في العقود
- شكاويان يتعلقان بسوء الإدارة
- شكاويان يتعلقان بمسائل شخصية
- شكوى تتعلق بمسائل مختلفة
- شكوى تتعلق بالهدر

يتلقى خط الإتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير الإحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء الإدارة، والاسترداد بواسطة مواقع شبكة الإنترنت والبريد الإلكتروني. من الشكاوى الـ ١٢ الجديدة التي تلقاها خط الإتصال المباشر، جاءت ٤ شكاوى عبر البريد الإلكتروني و ٨ شكاوى عبر موقع الإنترنت للمفتش العام.

القضايا المغلقة

خلال ربع السنة الحالي، أغلق المفتش العام ١١ قضية كان قد أبلغ عنها بواسطة خط الإتصال المباشر وهي:

خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

- ٧ قضايا أحيلت إلى وكالات أخرى للمفتشين العامين.
- قضيتان صرف النظر عنهما
- قضية واحدة أغلقت بعد تدقيق من المفتش العام
- قضية واحدة أغلقت بعد تفنيش من المفتش العام

الجدول ٣-٤

موجز قضايا خط الإتصال المباشر لدى المفتش العام كما كانت بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠

القضايا المفتوحة			
العمليات تحقيق			
العمليات تدقيق			
مجموع القضايا المفتوحة			
القضايا المغلقة	الربع الأول ٢٠١٠	الربع الثاني ٢٠١٠	المجموع التراكمي*
قانون حرية الإعلام (FOIA)	٠	٠	٤
مراجعة قيادة الدعم التشغيلي (OSC)	٠	٠	٢
عمليات مساعدة	٠	٠	٤٦
قضايا صرف النظر عنها	٠	٢	١٣١
قضايا أحيلت	٩	٧	٣٤١
عمليات تفنيش	٠	١	٨٠
عمليات تحقيق	١	٠	١١٨
عمليات تدقيق	٠	١	١٧
مجموع القضايا المغلقة	١٠	١١	٧٣٩
المجموع التراكمي* للقضايا المفتوحة والمغلقة			٨٠٣

* تغطي المجاميع التراكمية الفترة منذ بدء تشغيل خط الإتصال المباشر أي من ٢٤/٣/٢٠٠٤ إلى ٣٠/٦/٢٠١٠.

الشكاوى المُحالَة

- بعد إجراء مراجعة دقيقة، أحال المفتش العام ٧ شكاوى إلى وكالات خارجية لاتخاذ الإجراء المناسب.
- شكاويان أرسلتا القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان.
 - شكاويان أرسلتا إلى مكتب المفتش العام لدى القوات الأميركية في العراق.
 - شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية.
 - شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع
 - شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى الجيش الأميركي.

موقع الإنترنت للمفتش العام لإعادة إعمار العراق


خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، سجّل موقع المفتش العام على الإنترنت (www.sigir.mil) النشاطات التالية:

- زار أكثر من ٩٩ ألف شخص موقع المفتش العام على الإنترنت، أي حوالي ١١٠٠ زائر باليوم.
- تلقى قسم اللغة العربية للموقع ٩٥٨ زيارة.
- كانت أكثر المستندات التي تم استنساخها من الموقع هي أحدث تقارير المفتش العام ربع السنوية.
- أكثر من ٢٣٠٠ إدخال إلى الموقع جرت زيارتها خلال ربع السنة الحالي. يجري تحديث المعلومات على الإدخال إلى الموقع، والتي يجري إنزالها تلقائياً إلى أجهزة كمبيوتر المشتركين ويمكن مشاهدتها بواسطة برامج قراءة الإدخال.

أنظر الشكل ٣-٣ للاطلاع على نظرة شاملة حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على الإنترنت.

الشكل ٣-٣

معدل الزوار في اليوم لموقع المفتش العام على شبكة الإنترنت كما كانت بتاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠



المصدر: استجابة وزارة الدفاع الأميركية و استجابة مركز دعم إدارة المعلومات (IMCEN) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٣٠.

تحديث معلومات التشريعات

التخصيصات التكميلية والعادية

خلال ربع السنة الحالي، بدأ الكونغرس اتخاذ الإجراءات حيال طلب الرئيس للتخصيصات التكميلية أو العادية المتعلقة بعملية إعادة إعمار العراق. للاطلاع على معلومات حول طلب الرئيس وإجراءات الكونغرس، التي لم تكن قد اكتملت أثناء تحضير هذا التقرير، انظر القسم الثاني من هذا التقرير.

قانون تفويض الدفاع القومي للسنة المالية ٢٠١١

خلال ربع السنة الحالي، أقرّ مجلس النواب قانون تفويض الدفاع القومي للسنة المالية ٢٠١١. وفي مجلس الشيوخ، يوجد مشروع قانون خرج من مناقشة اللجنة المختتمة في ٢٢ تموز/يوليو ٢٠١٠، ولم يتخذ أي إجراء بشأنه في مجلس الشيوخ مجتمعاً. سوف يصدر المفتش العام تقريراً حول مشروع القانون في مرحلة لاحقة عندما يؤخذ هذا الأخير بالاعتبار.

المثول أمام لجان الكونغرس

منذ التقرير ربع السنوي المنصرم، مثل موظفو المفتش العام أمام لجنة فرعية تشريعية واحدة ولجنة كونغرس واحدة.

- ٢٤ أيار/مايو ٢٠١٠ - لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق وأفغانستان - جلسة الاستماع بعنوان "ما مدى جودة نظامنا في ردع الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام؟" نائب المفتش العام ومساعد المفتش العام في التحقيقات شهدا أمام اللجنة الفرعية التشريعية هذه. وتناولت ملاحظتهما مسائل متعلقة بالرقابات العامة على الأموال والتعاقد في العراق ومدى الاحتيال في برنامج إعادة إعمار العراق. وقدموا إلى اللجنة ملخصاً حول الموارد والعمليات التي يستخدمها المفتش العام للتحقيق في الاتهامات بالاحتيال، والقضايا الخاصة التي كانت تجري المقاضاة فيها، والإصلاحات التي يعتقد المفتش العام انها ضرورية من اجل تجنب وكشف الاحتيال في عمليات إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار.

يمكن العثور على التصريحات الكاملة المحضرة التي أدلى بها موظفو المفتش العام أمام الكونغرس أو لجنة التعاقد في زمن الحرب على موقع شبكة الإنترنت التالي:

www.sigir.mil/publications/testimony/index.html

إشراف الوكالات الأخرى

المقدمة
تدقيق الوكالات الأخرى
تحقيق الوكالات الأخرى

القسم

٤

المقدمة

في آذار/مارس ٢٠٠٤، شكل المفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR) مجلس المفتشين العاملين العراقي (IICG) لتوفير منتدى لمناقشة عملية الإشراف في العراق وتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين العاملين التابعين للوكالات التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق. يجتمع في كل ربع سنة الممثلون عن الوكالات الأعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية وتلك المخطط لتنفيذها، ولتحديد الفرص المتاحة للتعاون وتخفيف التكرار إلى الحد الأدنى.

عُقد آخر اجتماع في ٢٥ أيار/مايو ٢٠١٠ في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بولاية فرجينيا. وقد ترأس الاجتماع، من بغداد، المفتش العام السيد "بوين"، وقد حضر الاجتماع ممثلون عن الوكالات التالية:

- وكالة التدقيق في سلاح الجو (AFAA)
- لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق وأفغانستان
- مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع (DoD OIG)
- مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية (DoS OIG)
- مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)
- المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)
- مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG)
- المفتش العام لدى وزارة الجيش (USAA)

في كل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات مُحدثة من المنظمات الأعضاء حول نشاطاتها الإشرافية المنجزة والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها. يُلخّص هذا القسم عمليات التدقيق والتحقيق التي أُبلغت إلى المفتش العام في ربع السنة الحالي من الوكالات التالية: مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع (DoD OIG)، مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية (DoS OIG)، مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)، مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG)، مكتب التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA). أنظر الملحق (ك) للإطلاع على تحديثات المعلومات المقدمة من وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA).

مع أن المفتش العام قد زود في أرباع السنة السابقة بتحديثات حول وزارة المالية ووزارة التجارة، فإن هاتين الوزارتين ليس لديهما حالياً أية نشاطات إشراف على مشاريع إعادة إعمار العراق، أو مخطط لتنفيذها في السنة المالية ٢٠١٠، وبالتالي لن يذكرهما المفتش العام بعد الآن في هذا القسم.

نص القسم ٨٤٢ من قانون التفويض للدفاع القومي للسنة المالية ٢٠٠٨ (القانون العام 101-181) على أن يقوم المفتش العام، بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين، بإعداد "خطة شاملة لتنفيذ سلسلة من عمليات التدقيق في

العقود، والعقود من الباطن، وأوامر المهمات، وأوامر التسليم للوكالات الفدرالية لأداء وظائف الأمن وإعادة الإعمار في العراق". عقب صدور القسم ٨٤٢ من القانون، عمل المفتش العام عن كثب مع مجموعة التخطيط المشتركة لجنوب غرب آسيا في مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع التي سهّلت إنتاج "خطة التدقيق الشاملة لجنوب غرب آسيا". تُلخص تلك الوثيقة، التي أعدّها المفتشون العامون المعنيون (من ضمنهم المفتش العام) عمليات التدقيق الجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها في المدى القريب للعراق والمنطقة. قامت المجموعة بعقد اجتماعها الثاني عشر في شباط/فبراير ٢٠١٠ وأصدرت تحديث السنة المالية ٢٠١٠ بحسب خطة الإشراف الشاملة لجنوب غرب آسيا في شباط ٢٠١٠. وقد جرى توسيع الخطة الشاملة إلى ما أبعد من التكليف القانوني لتشمل مناطق وظيفية أخرى معنية بدعم عملية الحرية الدائمة وعملية حرية العراق، إضافة إلى العمليات الطارئة ما وراء البحار، مثل إدارة العقود، وإعادة ضبط المعدات، والإدارة المالية، ودعم إعادة الإعمار. سوف تستمر وكالات الإشراف المشاركة في تنسيق خطط التدقيق عبر مجموعات العمل والمجالس العاملة.

عمليات تدقيق الوكالات الأخرى

يحدّث هذا القسم المعلومات المتعلقة بعمليات التدقيق التي أجرتها الوكالات الأعضاء في مجلس المفتشين العامين في العراق (IIGC) والتي أبلغتها للمفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR).

- أنظر الجدول ٤-١ للإطلاع على تقارير الإشراف المنجزة حديثاً.
- أنظر الجدول ٤-٢ للإطلاع على نشاطات الإشراف الجاري تنفيذها على يد وكالات أميركية أخرى خلال فترة إعداد هذا التقرير.
- أنظر الملحق (ز) للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وكالات أخرى بضمنها ملخصات التدقيق.
- أنظر الملحق (ح) للحصول على قائمة بتواريخ لعمليات التدقيق والمراجعة لمشاريع حول إعادة إعمار العراق التي قامت بها كافة الهيئات.

الجدول ٤-١

تقارير الإشراف المنجزة مؤخراً على يد وكالات أميركية أخرى حتى تاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠.

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-069	٢٠١٠/٦/٢١	مرفق الإصدارات المركزية في "فورت بينينغ" وسياسات الجيش المتعلقة بالأمر.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-068	٢٠١٠/٦/١٧	إشراف الحكومة على ممثل الخدمة الميدانية وخدمات المدرب دعماً لبرنامج العربات المدرعة المقاومة لكمانن الألغام.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-060	٢٠١٠/٦/١١	خفض عدد وإعادة ضبط المعدات في العراق – عملية المسح النظيف.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-067	٢٠١٠/٦/١٠	الشراكات الخاصة العامة في مستودعات الصيانة للقوات الجوية.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-066	٢٠١٠/٥/٢٨	الإشراف على عقد المعدات العسكرية الاحتياطية الحربية للقوات الجوية الوسطى.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-062	٢٠١٠/٥/٢٤	الرقابة على الأموال المخصصة لمساعدة العراق وأفغانستان المعالجة عبر شبكة المبيعات العسكرية.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-064	٢٠١٠/٥/٢١	عقود صيانة قوارب الجيش- جنوب غرب آسيا.

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٤-١ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-061	٢٠١٠/٥/٢١	مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة المتحكم بها لاسلكياً في برنامج الحرب الإلكترونية.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-059	٢٠١٠/٥/١٤	التعاقد الطارئ: إطار عمل للإصلاح.
وزارة الدفاع (DoD)	10-INTEL-04	٢٠١٠/٥/٤	مراجعة المعلومات التي شملتها قوات المهمات المشتركة في غوانتانامو عن الصحة العقلية للمحتجزين في تقارير المعلومات الاستخباراتية.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-055	٢٠١٠/٤/٢٩	عقد الشركات البائعة الأولى للمعدات الطبية/الجراحية دعماً لقوات الائتلاف في العراق وأفغانستان.
وزارة الدفاع (DoD)	SPO-2010-002	٢٠١٠/٤/٢٠	تقييم مخطط النقل ضمن مسرح العمليات والقدرات والتنفيذ لخفض القوات في العراق.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-052	٢٠١٠/٤/١٦	جهود تجنب الاعتداءات/التحرشات الجنسية في عقود وزارة الدفاع خلال العمليات الطارئة.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-051	٢٠١٠/٤/٨	وكالة إدارة عقد الدفاع، قوات العمل للتملك في جنوب غرب آسيا.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-050	٢٠١٠/٤/٢	مرفق مزامنة نظام المشتريات المعياري.
وزارة الدفاع (DoD)	D-2010-049	٢٠١٠/٤/١	استخدام سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لرسوم منح العقود في العراق وأفغانستان.
وزارة الدفاع (DoD)	مذكرة	٢٠١٠/٣/٢٥	مشتريات المواد التي جرت عبر اتفاقيات الشراكة في مستودع الجيش "كوربس كرسبي".
وزارة الخارجية (DoS)	MERO-A-10-07	٢٠١٠/٥/٤	جردة ومساءلة الممتلكات في السفارة الأميركية في بغداد.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-10-460	٢٠١٠/٤/٣٠	دعم القتال الحربي: تحسين عمليات الحاجات الطارئة لوزارة الدفاع من شأنه ان يعزز الإشراف ويعجل مجهودات تأمين الحاجات الحرجة للقتال الحربي.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-10-376	٢٠١٠/٤/١٩	عملية حرية العراق: يحتاج الأمر إلى إجراءات لتسهيل الانسحاب الكفوء للقوات الأميركية ومعداتنا من العراق.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-10-465	٢٠١٠/٤/١٦	التدريب العسكري: يحتاج الأمر إلى إجراءات لزيادة تحسين تناسق التدريب على المهارات القتالية المزودة إلى قوات دعم سلاح مشاة البحرية والجيش.

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٤-١ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-10-615T	٢٠١٠/٤/١٤	الرأس مال الإنساني: وضع الإجراءات اللازمة لتحسين التسليم بالوقت المطلوب وبالدفعة المطلوبة للتعويضات وللتقديرات الطبية إلى المدنيين الموجودين بالخدمة.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-10-357	٢٠١٠/٤/١٢	التعاقد الطارئ: يحتاج الأمر إلى تحسين إدارة عقد دعم المقاولين وإدارة الهبات في العراق وأفغانستان.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-0098-ALL	٢٠١٠/٥/٧	عمليات التراجع في جنوب غرب آسيا، التبرع بالإمدادات والمواد الزائدة وتحويلها.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-0096-ALL	٢٠١٠/٥/٧	الرقابات على مدفوعات الشركات البائعة- جنوب غرب آسيا (المرحلة الثانية)- عمليات الجيش الأميركي الطارئة.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-0097-ALL	٢٠١٠/٥/٤	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، القوات المتعددة الجنسيات في العراق، تقرير موجز.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-0094-ALA	٢٠١٠/٥/٣	عملية المبيعات العسكرية الأجنبية للعراق وأفغانستان.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-0088-ALL	٢٠١٠/٤/١٤	شهادة الإجراءات المنفوق عليها لتقييم طلبات الوقود الكبيرة لقاعدة العمليات الأمامية في "شانك" بأفغانستان.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-0082-ALL	٢٠١٠/٤/١٢	القيادة الأمنية الانتقالية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) - صندوق قوات الأمن العراقية.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-0087- ALL	٢٠١٠/٤/١٢	تدقيق متابعة حول المساءلة والرقابة على البنود الحساسة في ابو غريب.

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٤-٢ تقارير الإشراف الجاري تنفيذها على يد وكالات أميركية أخرى حتى تاريخ ٢٠١٠/٦/٣٠.

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-DIPE3-0260.000	٢٠١٠/٨/٥	تقييم برنامج مكافحة المتاجرة بالبشر (CTIP) لوزارة الدفاع.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000JB-0210.000	٢٠١٠/٥/٧	خفض وإعادة ضبط المعدات في العراق- نشاط دعم الإمداد وعمليات نقطة الشحن والاستلام الوسطى.
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000JB-0211.000	٢٠١٠/٥/٦	إعادة ترتيب دعم المقاول استجابة لخفض القوات الأميركية في العراق.
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000CE-0190.000	٢٠١٠/٣/٢٣	مشتريات المواد التي جرت عبر اتفاقيات الشراكة في مستودع الجيش في أنستون .
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000JB-0158.000	٢٠١٠/٢/١٧	التعاقد للمرافق الأميركية في العراق.
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000AE-0139.000	٢٠١٠/١/٢٩	عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة والألغام- قسم الاستجواب
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000IG-0073.000	٢٠٠٩/٧/١٢	تحديث التقرير الملخص حول التحديات، التوصيات والمبادرات التي تؤثر على عملية حرية العراق/عملية الحرية الدائمة (OEF/OIF) كما رخصتها منظمات الإشراف الفدرالية والدفاعية للسنوات المالية ٢٠٠٣ إلى ٢٠٠٩.
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000CH-0077.001	٢٠٠٩/١١/١٨	مشتريات المواد التي جرت عبر اتفاقية الشراكة مع شركة طائرات سيكورسكا في مستودع الجيش "كوربس كرستي".
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000CH-0077.000	٢٠٠٩/١١/١٧	مشتريات المواد التي جرت عبر اتفاقية الشراكة مع شركة بوينغ في مستودع الجيش "كوربس كرستي".
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000JA-0055.000	٢٠٠٩/١٠/٢٧	إدارة العمليات في مسرح عمليات التراجع، معسكر أريفيجان- الكويت.
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000JA-0054.000	٢٠٠٩/١٠/٢٧	الرقابة على التصرف بالمعدات في مكتب تسويق وإعادة استخدام المعدات الدفاعية في معسكر أريفيجان- الكويت.
وزارة الدفاع (DoD)	D2010-D000AS-0031.000	٢٠٠٩/١٠/٢٧	عقد برنامج الدعم اللوجستي المدني، المرحلة الرابعة
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FH-0292.000	٢٠٠٩/٩/٢٣	إمتثال خدمات الباعة التجاريين لمتطلبات الضريبة الفدرالية التي تفرض للإبلاغ عن الضرائب للعقود الداعمة لعمليات جنوب غرب آسيا.
وزارة الدفاع (DoD)	غير متوفر	غير متوفر	تنمية القدرات الوزارية لوزارتي الدفاع والداخلية العراقيتين والمراقبين العاملين الداخليين
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000JB-0307.000	٢٠٠٩/٩/١٦	الرقابة على المحاسبة والتصرف بالممتلكات المقدمة من الحكومة في العراق.

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٤-٢ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-DIPOE3-0306.000	٢٠٠٩/٩/١١	مراجعة استجابة الجيش للتعرض لديكرومات الصوديوم في كرمة علي بالعراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D00SPO-0310.000	٢٠٠٩/١٠/٩	تقييم مخطط النقل ضمن مسرح العمليات، والقدرات، والتنفيذ لحفض القوات في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-DOOSPO-0287.000	غير متوفر	تقييم جهود الولايات المتحدة لنقل مهمة المساعدة الأمنية الداعمة للحكومة العراقية من سلطة وزارة الدفاع إلى سلطة وزارة الخارجية.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D00SPO-0286.000	٢٠٠٩/١١/٨ ٢٠١٠/٢/١٩	تقييم جهود الحكومة الأميركية لتنمية القدرات اللوجستية لقوات الأمن العراقية.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AS-0266.000	٢٠٠٩/٧/٣١	العقود الداعمة لعمليات القواعد في الكويت
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AS-0247.000	٢٠٠٩/٧/١٠	عقود داعمة لبرنامج المسح الواسع النطاق لمراقبة المنطقة البحرية
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000CH-0244.000	٢٠٠٩/٧/٧	عقود الشركة الدولية لتجارة النفط لإمداد الوقود إلى الجيش الأميركي في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000LC-0237.000	٢٠٠٩/٦/١١	عقود الشحن الجوي دعماً لعملية حرية العراق وعمليات الحرية الدائمة
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D00SPO-0242.00	٢٠٠٩/٦/١١	تقييم الادعاءات التي وردت عبر خط الاتصال المباشر لوزارة الدفاع فيما يتعلق بنزاهة أبحاث إصابة الدماغ في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000IG-D00SPO.0226.000	٢٠٠٩/٥/١٥	تقييم الأبحاث حول عمليات الفصل الإدارية للمجندين
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AE-0210.000	٢٠٠٩/٤/٢٨	تلبية سلاح مشاة البحرية لتقديم بيانات الحاجة العالمية العاجلة لأجهزة إيهار تعمل باللايزر
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FC-0199.000	٢٠٠٩/٤/١٧	التقديمات والتفاوتات المقدمة إلى موظفي وزارة الدفاع المدنيين دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000FG-0183.000	٢٠٠٩/٤/٧	أكلاف سلاح مشاة البحرية للسنة المالية ٢٠٠٨، بالحرب العالمية على الإرهاب. معالجة عبر المحاسبة المعيارية، إعداد الموازنات ورفع التقارير
وزارة الخارجية DoS	D2009-D000FC-0176.000	٢٠٠٩/٣/١٩	الرقابة على الالتزامات غير المسددة (المصفاة) لعقود وزارة الجيش دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الخارجية DoS	D2009-D000AS-0163.000	٢٠٠٩/٣/٢	عقود صيانة القوارب الصغيرة لدى البحرية والجيش
وزارة الخارجية DoS	D2009-D000JA-0136.000	٢٠٠٩/١/٣٠	الرقابة على بطاقات الدخول المشتركة للوكالات غير التابعة لوزارة الدفاع.
وزارة الخارجية DoS	D2009-D000FB-0112.000	٢٠٠٩/١/٥	نشر نظام المشتريات القياسي في قيادة التعاقد المشتركة للعراق وأفغانستان.

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٤-٢ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الخارجية DoS	D2009-D000AE-0102.000	٢٠٠٨/١٢/٩	عقود أنظمة مكافحة أجهزة التفجير المرتجلة والألغام.
وزارة الخارجية DoS	D2009-D000CK-0100.000	٢٠٠٨/١٢/٩	صيانة ودعم العربات المدرعة المقاومة لكمائن الألغام.
وزارة الخارجية DoS	D2009-D000CF-0095.000	٢٠٠٨/١٢/١	عقود استخدام الوقت والمواد لوزارة الدفاع.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000CD-0071.000	٢٠٠٨/١١/١٢	تطبيق مذكرة قرار شراء "الطائرة بريدياتور/سكاي واريور" الصادرة بتاريخ ١٩ أيار/مايو ٢٠٠٨.
وزارة الدفاع (DoD)	D2009-D000AE-007.000	٢٠٠٨/٩/٢٩	العمليات الشرائية للجيش استجابة للتهديدات الموجهة إلى العربات التكتيكية الخفيفة ذات العجلات.
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CD-0256.000	٢٠٠٨/٨/٧	عقود الدروع البدنية لوزارة الدفاع.
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000FP-0252-000	٢٠٠٨/٨/١	الرواتب العسكرية في وزارة سلاح الجو دعماً للحرب العالمية على الإرهاب.
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000FL-0252-000	٢٠٠٧/٨/٣١	الرقابات الداخلية واعتمادية البيانات في نظام الإنفاق القابل للنشر.
وزارة الخارجية DoS	10AUD3004	٢٠٠٩/١٠/١	تدقيق إجراءات وكلفة الوقت الإضافي للسفارة الأميركية في بغداد.
وزارة الخارجية DoS	10-ISP-3013	٢٠٠٩/٩/١	برامج إزالة الألغام في العراق.
وزارة الخارجية DoS	09MERO3016	٢٠٠٩/٦/١	أمر مهمة برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني (LOGCAP) للسفارة الأميركية في بغداد.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320752	٢٠١٠/٦/١	غير متوفر
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351476	٢٠١٠/٤/١	مخطط خفض القوات في العراق لوزارة الدفاع.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351475	٢٠١٠/٤/١	انسحاب القوات العسكرية الأميركية من العراق.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320734	٢٠٠٩/١١/١	استراتيجية الولايات المتحدة ومخطط الحملة المشتركة للعراق.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	120874	٢٠٠٩/١١/١	المراجعة السنوية المفروضة للتعاقد في العراق وأفغانستان.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351388	٢٠٠٩/١٠/٢	توفر القوات المدربة والجاهزة لدعم العمليات العسكرية في العراق وأفغانستان.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320638	٢٠٠٩/١٠/١	ترتيبات التشارك في كلفة الطرق.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351376	٢٠٠٩/٩/١	جهوزية القوات الجوية المقاتلة وقوات الحملة المقاتلة.

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٤-٢ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	361123	٢٠٠٩/٨/٩	المحروقات العسكرية الأميركية للنفائات الصلبة في حفر مفتوحة في بعض المواقع في العراق وأفغانستان.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351393	٢٠٠٩/١/٨	متطلبات الموظفين الطبيين في زمن الحرب لوزارة الدفاع.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351387	٢٠٠٩/٧/٣٠	القدرة التدريبية لسلاح البحرية والجيش.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320691	٢٠٠٩/٧/٢٢	مخططات الوكالات المدنية للبرامج والأمن واللوجستيات خلال وبعد خفض القوات الأميركية في العراق.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320654	٢٠٠٩/٤/١	الجهود الأميركية والعراقية والدولية لتناول التحديات لإعادة تكامل المهجرين العراقيين.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351230	٢٠٠٩/٦/١	الإدارة الاستراتيجية للمنظمة المشتركة لإحباط أجهزة التفجير الارتجالية (JIEDDO).
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-FFP-0188.000	3Q/FY 2010	إدارة إعادة ضبط المعدات- الجيش الأميركي في المحيط الهادئ.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0480.000	3Q/FY 2010	شهادة الإجراءات المتفق عليها للقوات الأميركية- مسار عمل برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني (LOGCAP) – أفغانستان.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0086.000	3Q/FY 2010	إعادة الأصول من جنوب غرب آسيا
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-FFS-0180.000	3Q/FY 2010	أنظمة دعم الانتشار
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0260.000	3Q/FY 2010	عمليات تراجع في جنوب غرب آسيا-الإمدادات المتعددة الفئات
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALM-0394.000	3Q/FY 2010	تدقيق متابعة لإعادة الضبط الآلية.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0258.000	3Q/FY 2010	تدقيق عمليات التراجع- معدات الفئة الرابعة في العراق.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-FFF-0372.000	2Q/FY 2010	إحباط أجهزة التفجير الارتجالية (IED-D)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0364.000	2Q/FY 2010	فجوة مساءلة اكساليبر.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0338.000	2Q/FY 2010	فرق مساعدة إعادة توزيع الملكية.

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٤-٢ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0312.000	2Q/FY 2010	المعدات الأميركية المنقولة إلى العراق.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0311.001	2Q/FY 2010	التخلص من معدات ومواد الجيش في مواقع الطمر في العراق.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0311.000	2Q/FY 2010	التخلص من معدات ومواد الجيش في العراق.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALA-0294.000	2Q/FY 2010	تدقيق متابعة- دروع الوقاية الجسدية.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0103.000	2Q/FY 2010	الرقابة على مدفوعات الشركة البائعة، المرحلة الثانية-أفغانستان.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0232.000	1Q/FY 2010	إغلاقات قاعدة العمليات المتقدمة- عمليات نقل الملكية إلى الحكومة العراقية.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALC-0122.000	1Q/FY 2010	النشاطات الطارئة في العراق خلال وبعد انسحاب القوات.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0105.000	1Q/FY 2010	تدقيق متابعة حول إغلاق قاعدة العمليات المتقدمة-العراق.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALL-0087.000	1Q/FY 2010	عقود الدعم الحياتي للقوات الأميركية في البصرة-العراق.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2010-ALM-0008.000	1Q/FY 2010	التعاقد من اجل دعم الصيانة-قيادة إدارة دورة الحياة.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0593.000	4Q/FY 2010	الرقابة على المساءلة والرؤية لحاويات الشحن-العراق.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0590.000	4Q/FY 2010	عمليات حقل الوقود، معسكر "فيوهيرنغ" الكويت.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2-ALL-0571.000	4Q/FY 2009	عقد إعادة تدوير والتخلص من النفايات في معسكر سنيرل في العراق
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0531.000	4Q/FY 2009	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد - أفغانستان
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0133.000	2Q/FY 2009	حماية القوات - الإشارات الأمنية (الكويت)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A2009-ALL-0118.000	2Q/FY 2009	الرقابة على الدفعات إلى البائعين- جنوب غرب آسيا (المرحلة الثانية)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALL-0106.000	2Q/FY 2009	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للوقود في العراق وأفغانستان - جلال أباد (أفغانستان)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-FFS-0075.000	2Q/FY 2009	تدريب وحدات الاحتياط بعد حشدها

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٤-٢ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALM-00.59.000	2Q/FY 2009	استدامة المعدات غير المعيارية
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2009-ALC-0093.000	1Q/FY 2009	إغلاق عقد برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني (LOGCAP) الثالث
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0401.000	4Q/FY 2008	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان - قندهار وسالرنو (أفغانستان)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-398.000	3Q/FY 2008	الرقابة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني (LOGCAP) - ممتلكات وايت.
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0633.000	3Q/FY 2008	برنامج التأمين بموجب قانون الدفاع عن القواعد (DBA) الأولى لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0625.000	3Q/FY 2008	تدقيق متابعة لعمليات التعاقد، قيادة التعاقد للجيش الأميركي، جنوب غرب آسيا، الكويت (المرحلة الأولى)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-FFF-00044.000	2Q/FY 2008	إدارة التدريب على القتال في الأسطول المتموضع مسبقاً
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	3Q/FY 2010	تدقيق التدقيق للنشاطات المالية الصغيرة/للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) يظل برنامج النمو الاقتصادي في المحافظات.
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	3Q/FY 2010	تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/الملكية العراقية غير القابلة للتمديد.
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	2Q/FY 2010	تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/دفعات الرواتب العراقية إلى المواطنين الأجانب في الخدمة، ومواطني العالم الثالث ومقاولي الأمن الشخصي الاميركيين.
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	2Q/FY 2010	تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/نشاطات برنامج العمل الثالث للمجتمع العراقي.
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	1Q/FY 2010	تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/برنامج تطوير القطاع الزراعي الخاص- الأعمال الزراعية في العراق.
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	4Q/FY 2009	تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/تطبيق العراق لنظام معلومات الإدارة المالية العراقية.
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	غير متوفر	4Q/FY 2009	مسح الحوادث المبلغ عنها من جانب مقاولي الأمن الخاص للوكالة الأميركية للتنمية الدولية/مقاولو وماتحو العراق.

عمليات تحقيق الوكالات الأخرى

ينسق مكتب المفتش العام أعماله بصورة منتظمة مع الوكالات الحكومية الأخرى التي تقوم بالتحقيق في العراق. للإطلاع على الإحصاءات حول نشاطات التحقيق للوكالات الأميركية الأخرى، أنظر الجدول ٣-٤.

الجدول ٣-٤

نشاطات التحقيق المنفذة على يد وكالات أميركية أخرى
الوكالة

القضايا المفتوحة/الجارية*	عدد المحققين في الكويت	عدد المحققين في العراق	
١١١	٢	٦	قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميركي، وحدة كشف الاحتيال في المشتريات الرئيسية
٢٣٤	١	٥	دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع
١٥	٠	١	مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (DOS-OIG)
١٠٢	١	٥	مكتب التحقيقات الفدرالية (FBI)
٢	١	٠	التحقيقات الجنائية في سلاح البحرية (NCIS)
٥	٠	٢	مكتب التحقيقات الخاصة لدى القوات الجوية
١٤	٠	٢	الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)
٤٨٣	٥	٢١	المجموع

* تشمل الأرقام القضايا المتعلقة التي يجري العمل بها مع وكالات أخرى داخل مركز العمليات المشتركة.

- ١- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢٠؛ القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الحكومة العراقية، تحديث الاتفاقية الأمنية للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)"، ٢٠٠٩/٦/١٥.
- ٢- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٦/٢٣، الشريحة ٤.
- ٣- القانون العام ١٠٨-٧؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-106؛ P.L. 108-287؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-34؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-110؛ P.L. 111-118؛ P.L. 111-117؛ P.L. 111-32؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-137.
- ٤- القانون العام ١٠٨-١٠٦؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-287؛ P.L. 108-7؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-137؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 111-117؛ P.L. 111-118؛ P.L. 111-32؛ استجابة وزارة الخارجية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦ و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة وزارة الدفاع (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.
- ٥- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥؛ مجالات مسؤولية القيادة المركزية (USCENTCOM) FRAGO 09-1640، القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A)، ٢٠١٠/٣، القسم ٣.
- ٦- أمر تنفيذي للبيت الأبيض، "تنظيم مؤقت لتسهيل شراكة استراتيجية مع الجمهورية العراقية"، ٢٠١٠/٥/١٠.
- ٧- استجابة مكتب وكيل وزارة الدفاع (السياسات) OUSD (P) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٨- استجابة مكتب وكيل وزارة الدفاع (السياسات) OUSD (P) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٩- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "الخطة الإنمائية العراقية الوطنية للسنوات ٢٠١٠-٢٠١٤ (NDP2010-2014)"، العرض المقدم لمؤتمر برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، قصر الفاو، بغداد، ٢٠١٠/٧/٧.
- ١٠- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "الخطة الإنمائية العراقية الوطنية للسنوات ٢٠١٠-٢٠١٤ (NDP2010-2014)"، العرض المقدم لمؤتمر برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، قصر الفاو، بغداد، ٢٠١٠/٧/٧.
- ١١- فريق البلاد التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل مساعدة الأمم المتحدة الإنمائية للعراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١.
- ١٢- الحكومة العراقية، اللجنة الانتخابية العليا المستقلة (IHEC)، "نتائج انتخابات مجلس النواب العراقي"، ٢٠١٠/٣/٢٨، ihcc-iq.com/en/results.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢١.
- ١٣- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٥/١٩، الشريحة ٤.
- ١٤- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٥/١٩، الشريحة ٤.
- ١٥- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٦/٢، الشريحة ٤.
- ١٦- الدستور الأميركي، www.uniraq.org/documents/iraqi_constitution.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢١.
- ١٧- الحكومة العراقية، المجلس القضائي الأعلى، رأى المحكمة العليا الفدرالية حول المادة ٧٦ من الدستور، ٢٠١٠/٣/٢٥.

- ١٨- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٦/١٦، الشريحة ٤.
- ١٩- مقابلات مسؤولي الحكومة العراقية مع مسؤولي المفتش العام، ٢٠١٠/٥.
- ٢٠- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٥.
- ٢١- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٤.
- ٢٢- معهد بروكينغز، مؤشر العراق ٢٠١٠/٦/٣٠، الصفحات ٣ و ٤.
- ٢٣- وزارة الأمن الوطني، التقرير اليومي للبنية التحتية للموارد المفتوحة، ٢٠١٠/٦/١٥، www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٢٤- وزارة الأمن الوطني، التقرير اليومي للبنية التحتية للموارد المفتوحة، ٢٠١٠/٦/١٥، www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٢٥- استجابة الحكومة العراقية، وزارة الداخلية العراقية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٢٦- صفحة وقائع مايكل هراري، التحديث ٢: تشكيل الحكومة في العراق"، معهد دراسة الحرب، ٢٠١٠/٦/١، www.understandingwar.org/reference/factsheet-government-formation-iraq، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٢٧- وزارة الدفاع، نشرة صحفية، "موجز أخباري مع الجنرال راي اوديرنو من البنتاغون"، ٢٠١٠/٦/٤، www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4632، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٦.
- ٢٨- حوالي ١٩ قاعدة أخرى سوف تأوي كل من القوات الأميركية والقوات العراقية، ولكن الجيش الاميركي هو الذي سيديرها. الاعداد الدقيقة يمكن ان تتغير حسب الوضع الأمني.
- ٢٩- وزارة الدفاع، "موجز أخباري للبنتاغون ووزارة الدفاع مع نائب الجنرال القائد للقوات الأميركية في العراق للاستشارات والتدريب، الفريق في الجيش مايكل باربيو"، ٢٠١٠/٦/١٨، www.usf-iraq.com/news/press-briefings/pentagon-dod-newsbriefing-with-lt-gen-barbero-june-18-2010، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٦.
- ٣٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣١- وزارة الدفاع، "موجز أخباري للبنتاغون ووزارة الدفاع مع نائب الجنرال القائد للقوات الأميركية في العراق للاستشارات والتدريب، الفريق في الجيش مايكل باربيو"، ٢٠١٠/٦/١٨، www.usf-iraq.com/news/press-briefings/pentagon-dod-newsbriefing-with-lt-gen-barbero-june-18-2010، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٦.
- ٣٢- نشرة صحفية للقيادة المركزية الأميركية (CENTCOM)، "الولايات المتحدة تنهي مراقبة نقاط التفنيس في المنطقة الخضراء في بغداد"، ٢٠١٠/٦/١.
- ٣٣- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٣٤- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥. الحكومة العراقية تجمد التوظيف في عام ٢٠٠٩، عندما انتقلت منظمة أبناء العراق (SOI) من نشاط ممول من الولايات المتحدة إلى عملية للحكومة العراقية (استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٢).
- ٣٥- تحليل المفتش العام لوثائق الموارد المفتوحة باللغتين الإنكليزية والعربية، ٢٠١٠/٧.
- ٣٦- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣٧- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣٨- مقابلة المستشار الرئيسي لحاكم البنك المركزي العراقي مع المفتش العام ٢٠١٠/٥/٢٥.
- ٣٩- وحدة الاستخبارات الاقتصادية، تقرير البلدان العراق، ٢٠١٠/٦.
- ٤٠- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٤ و ٢٠١٠/٧/٦.
- ٤١- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.

- ٤٢- الحكومة العراقية، نشرة صحفية لوزارة النفط، "وزارة النفط العراقية توقع عقد نهائي مع شركات أجنبية لتطوير ثلاثة حقول نفط في ميسان"، ٢٠١٠/٥/١٧، www.oil.gov.iq/117576.php، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥؛ التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ٢١، صفحة ١٣.
- ٤٣- التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ٢٢، الصفحة ٢؛ وزارة الخارجية الأميركية، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٧/١٤، الشريحة ١١.
- ٤٤- خطاب المسؤول التنفيذي لشركة شلومبرغر في مؤتمر الطاقة الذي أقامته ويل، ٢٠١٠/٣/٢٢، www.slb.com/news/presentations/2010/2010_0322_agould_howard_weilaspx، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢؛ تحليل المفتش العام لموارد المفتوحة ذات الصلة.
- ٤٥- الحكومة العراقية، لجنة الاستثمار الوطني (NIC)، "فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي"، www.investpromo.gov.iq/index.php?id=55، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ إدارة معلومات الطاقة (EIA)، موجزات تحليل البلدان، www.eia.doe.gov/cabs/Iraq/Oil.html، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٠؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٤ و ٢٠١٠/٧/٦؛ وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٥/٥، الشريحة ١٢؛ وزارة التجارة الأميركية، إدارة التجارة العالمية (ITA)، "فريق مهمات الاستثمار وإعادة اعمار العراق"، trade.gov/iraq/، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤.
- ٤٦- وزارة الخارجية الأميركية، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٥/٥، الشريحة ١٢.
- ٤٧- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ESD/ITAO)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠١٠/١/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٤٨- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ESD/ITAO)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠١٠/١/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٤٩- وزارة الخارجية الأميركية، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٦/٢٣، الشريحة ٤.
- ٥٠- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد (ACCO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١.
- ٥١- الحكومة العراقية، استجابة هيئة النزاهة (COI) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٥٢- الحكومة العراقية، استجابة هيئة النزاهة (COI) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٥٣- الخطاب الافتتاحي لكريستوفر تشايس ومايكل ثيبولت، رئيساً لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق وأفغانستان، أمام هذه اللجنة، "ما مدى صلاحية نظامنا لاستئصال الهدر في العقود، وإساءة الاستعمال؟" ٢٠١٠/٥/٢٤، www.wartimecontracting.gov/docs/hearing2010-05-24_opening-cochairs.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/٢٣. بالإضافة إلى نائب المفتش العام لإعادة إعمار العراق، جينجر كروز، تضمنت الهيئة الأولى: جون نوفاك مساعد المفتش العام لإعادة اعمار العراق للتحقيقات، جيمس بورش، وكيل المفتش العام للتحقيقات في مكتب المفتش العام بوزارة الدفاع الأميركية، كفين بركينس مساعد مدير شعبة التحقيقات الجنائية في المكتب الفدرالي للتحقيقات ورايموند دينونزيو، مساعد المدير العام لمديرية التحقيقات الجنائية في المفتشية العامة الخاصة بإعادة اعمار أفغانستان (SIGAR).
- ٥٤- شهادة جينجر كروز، وكيل المفتش العام لإعادة أعمال العراق أمام لجنة التعاقد في زمن الحرب في العراق وأفغانستان، ٢٠١٠/٥/٢٤، www.wartimecontracting.gov/docs/hearing2010-05-24_statement-SIGIR-Cruz.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٣.
- ٥٥- استجابة الوزارة الخارجية الأميركية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ٥٦- استجابة وزارة العمل الأميركية (DoL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٧ و ٢٠١٠/٧/٩.
- ٥٧- لجنة حماية الصحفيين، www.cpj.org/killed/mideast/iraq/، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٩.
- ٥٨- لجنة حماية الصحفيين، www.cpj.org/killed/mideast/iraq/، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٩.
- ٥٩- الأمم المتحدة، "تقرير حقوق الإنسان، ١ تموز/يوليو- ٣١ كانون الأول/ديسمبر"، www.uniraq.org/documents/UNAMI_Human_Rights_Report16_EN.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٩.

- ٦٠- الحكومة العراقية، مجلس النواب العراقي، "قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/١/٢٧؛ استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣؛ الحكومة العراقية، "عائدات ونفقات موازنة ٢٠٠٣؛ تموز/يوليو - كانون الأول/ديسمبر"، ٢٠٠٣؛ الحكومة العراقية، "رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة، الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٠٥"، ٢٠٠٥؛ الحكومة العراقية، المجلس الرئاسي، "قانون الموازنة العامة الفدرالية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/٢/١٠؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١/٤ و ٢٠٠٩/٤/٩؛ المفتش العام، التقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٤، الصفحة ٢٦؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد، ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣؛ القانون العام رقم P.L. 108-106؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-287؛ P.L. 108-7؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-117؛ P.L. 110-149؛ P.L. 111-117؛ P.L. 111-118؛ P.L. 111-32؛ استجابة مجلس حكام محطات البث (BBG) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣١؛ استجابة وزارة العدل الأميركية (DOJ)، فرع الإدارة العدلية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١؛ وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، استجابة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥ و ٢٠١٠/٣/١٧؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة (OMB) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، ٢٠١٠/٤/١٩، ٢٠١٠/٧/١٣، و ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣ و ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ وزارة المالية، مكتب المساعدة الفنية (OTA)، "نظرة عامة على مكتب المساعدة الفنية"، ٢٠٠٥/١٢/٣٠،
- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١/١٢ و ٢٠٠٩/٤/٨، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/١٢، و ٢٠١٠/٧/١٣؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "القروض والهبات الخارجية الأميركية (الكتاب الأخضر)"، ٢٠٠٨، [gbk.eads.usaidallnet.gov/query/](http://gbk.eads.usaidallnet.gov/query/?do=program=eads/gbk/countryReport&unit=N) ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٤/١٥؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢. في ربع السنة هذا، غي المفتش العام منهجيته لاحتساب المساهمة الدولية (غير الأميركية) لإعادة إعمار العراق. كانت تحتسب في السابق كمجموع المساعدات وتعهدات القروض من الهيئات المانحة الثنائية والمتعددة الأطراف. لكن المبالغ المتعهد بها تبالغ في تقدير المساهمة الدولية الحقيقية لأن معدلات الالتزام المنخفضة من بعض الهيئات المانحة والمعدلات المنخفضة للاقتراض العراقي من المقرضين المتعددي الأطراف. سيخدم المفتش العام في ربع السنة هذا المبالغ الملتزم بها لاحتساب المساهمة الدولية (غير الأميركية) لإعادة إعمار العراق وسوف يستمر في استخدام المبالغ الملتزم بها في التقارير ربع السنوية في المستقبل.
- ٦١- الحكومة العراقية، مجلس النواب العراقي، "قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/١/٢٧؛ استجابة مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٣؛ الحكومة العراقية، "عائدات ونفقات موازنة ٢٠٠٣؛ تموز/يوليو - كانون الأول/ديسمبر"، ٢٠٠٣؛ الحكومة العراقية، "رئاسة الجمعية الوطنية العراقية المؤقتة، الموازنة العامة للدولة للعام ٢٠٠٥"، ٢٠٠٥؛ الحكومة العراقية، المجلس الرئاسي، "قانون موازنة العامة الفدرالية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/٢/١٠؛ استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١/٤ و ٢٠٠٩/٤/٩؛ المفتش العام، التقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٤، الصفحة ٢٦.
- ٦٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٢/٢٥، ٢٠١٠/٦/٨، ٢٠١٠/٧/١٣ و ٢٠١٠/٧/١٥.

- ٦٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٨،
٢٠١٠/٧/١٣. تم استخراج معدل أسعار النفط للعام ٢٠١٠ بقسمة العائدات الإجمالية على عدد البراميل
الأميركية المصدرة. لا تحصل الحكومة العراقية على جميع عائدات التصدير إذ ان نسبة ٥% تدفع إلى الكويت
تعويضاً عن أضرار الحرب.
- ٦٤- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥. كانت
أسعار النفط (وليس حجم التصدير) هي العامل المسيطر لتحديد مقبوضات النفط العراقي. للتفاصيل حول
العلاقة الوثيقة بين أسعار النفط، ومقبوضات النفط التي تلقتها الحكومة العراقية والنتائج المحلي الإجمالي
العراقي، انظر قسم الاقتصاد من هذا التقرير.
- ٦٥- الحكومة العراقية، مجلس النواب العراقي، "قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٠"،
٢٠١٠/١/٢٧، المادة ١-٢ و الجدول المرفق أ و ب.
- ٦٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، ملحق وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات،
٢٠١٠/٧/١٥.
- ٦٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٢/٢٥،
٢٠١٠/٦/٨، ٢٠١٠/٧/١٣ و ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٦٨- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ٦٩- وحدة الاستخبارات الاقتصادية، تقرير البلدان العراق، ٢٠١٠/٦.
- ٧٠- استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٩.
- ٧١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، ملحق وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات،
٢٠١٠/٧/١٥.
- ٧٢- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "الخطة الانمائية الوطنية العراقية"، موجز صحفي لمؤتمر برنامج
الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، قصر الفاو، بغداد ٢٠١٠/٧/٧، الشريحة ١١.
- ٧٣- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١
و ٢٠١٠/٧/١٣.
- ٧٤- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١
و ٢٠١٠/٧/١٣.
- ٧٥- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١
و ٢٠١٠/٧/١٣.
- ٧٦- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١، تتضمن
القروض المتعهد بها قروض ميسرة وتسهيلات ممكنة للقروض.
- ٧٧- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١
و ٢٠١٠/٧/١٣.
- ٧٨- فريق البلد التابع للأمم المتحدة (UNCT)، ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/٢٢.
- ٧٩- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ٨٠- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "صفحة حقائق حول الميثاق الدولي مع العراق"،
www.un.org/News/Press/docs//2007/note6078.doc.htm، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٤/٦/٢٠١٠.
- ٨١- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، الميثاق الدولي مع العراق: رؤية مشتركة والتزام متبادل
٢٠٠٧، فريق البلد التابع للأمم المتحدة، العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للعراق ٢٠١١-
٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١.

- ٨٢- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "الميثاق الدولي مع العراق: بداية جديدة، المراجعة السنوية أيار/مايو ٢٠٠٧-نيسان/أبريل ٢٠٠٨"، الصفحة ١٠-١١، ٢٠٠٨/٥، www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/36/08/dfdaeead.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٨٣- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، الميثاق الدولي مع العراق، المراجعة السنوية أيار/مايو ٢٠٠٧-نيسان/أبريل ٢٠٠٨: الملحق تظهر التقدم مقابل معايير الارتكاز، "٢٠٠٨/٥"، www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/36/08/b094ce76.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٨٤- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، الميثاق الدولي مع العراق، المراجعة السنوية أيار/مايو ٢٠٠٧-نيسان/أبريل ٢٠٠٨: الملحق تظهر التقدم مقابل معايير الارتكاز، "٢٠٠٨/٥"، الملحق ٣، الصفحة ٤، والملحق ٦، الصفحة ١، www.sweden.gov.se/content/1/c6/10/36/08/b094ce76.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠؛ التقرير ربع السنوي للمفتش العام المقدم إلى الكونغرس الأميركي، ٢٠١٠/٤، الصفحة ١٣.
- ٨٥- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ٨٦- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ١٧.
- ٨٧- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ١٦. الأرقام تتأثر بالتدوير.
- ٨٨- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٣٦.
- ٨٩- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٩٠- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "الخطة الإنمائية الوطنية العراقية، موجز حول مؤتمر برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، قصر الفاو، بغداد"، ٢٠١٠/٧/٧، الشريحة ١١؛ فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٣٦.
- ٩١- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٣٦.
- ٩٢- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٣٨.
- ٩٣- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٣٩.
- ٩٤- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٤٤.
- ٩٥- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٣٩. القائمة مقتبسة من النسخة الأصلية.
- ٩٦- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل المساعدة الإنمائية للأمم المتحدة إلى العراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٣٩. القائمة مقتبسة من النسخة الأصلية.
- ٩٧- القانون العام ١٠٨-٧؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-106؛ P.L. 108-287؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-34؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-118؛ P.L. 111-117؛ P.L. 111-32؛ P.L. 111-252؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-149؛ 137؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة مجلس حكام محطات البث (BBG) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣١؛ وزارة العدل (DOJ)، فرع الإدارة العدلية، استجابة

لمكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، ٢٠١٠/٤/١؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/١٧؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى – العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، استجابة مكتب الإدارة والموازنة (OMB) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٥، ٢٠١٠/٤/١٩ و ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ وزارة المالية، مكتب المساعدة الفنية (OTA)، "نظرة عامة حول مكتب المساعدة الفنية"، ٢٠٠٥/١٢/٣٠، ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٠٩/١٠/١٦؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١/١٢ و ٢٠٠٩/٤/٨ و ٢٠١٠/٤/١٤؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، القروض والهبات الأميركية (الكتاب الأخضر)"، ٢٠٠٨، [gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?](http://gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?program=/eads/gbk/countryReport&unit=N)، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٤/١٥.

٩٨- القانون العام ٢٠٠٧-108؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-106؛ P.L. 108-287؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-34؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-110؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 111-32؛ P.L. 111-117؛ P.L. 111-118؛ P.L. 111-137؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.

٩٩- القانون العام ٢٠٠٧-108؛ P.L. 108-11؛ P.L. 108-106؛ P.L. 108-287؛ P.L. 108-7؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-118؛ P.L. 111-117؛ P.L. 111-118؛ P.L. 111-32؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى – العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠٠٩/٧/٦ و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥ و ٢٠١٠/٣/١٧؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة (OMB) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.

١٠٠- استجابة مجلس حكام محطات البث (BBG) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣١؛ استجابة وزارة العدل (DOJ)، فرع الإدارة العدلية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/١٧؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى – العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة (OMB) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٥، ٢٠١٠/٤/١٩ و ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في

بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣؛ وزارة المالية، مكتب المساعدة الفنية (OTA)، "نظرة عامة حول مكتب المساعدة الفنية"، ٢٠٠٥/١٢/٣٠، ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٠٩/١٠/١٦؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١/١٢ و ٢٠٠٩/٤/٨، و ٢٠١٠/٤/١٤، الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، القروض والهبات الأميركية (الكتاب الأخضر)، ٢٠٠٨، gbk.eads.usaidallnet.gov/query/ do? program=/eads/gbk/countryReport&unit=N، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٤/١٥.

١٠١- وزارة الدفاع (DoD)، "طلب الموازنة للسنة المالية ٢٠١١: نظرة عامة"، ٢٠١٠/٢، الفصل ٦، صفحة ٥٩؛ وزارة الخارجية، "تبريرات الموازنة التكميلية للسنة المالية ٢٠١١"، ٢٠١٠/٢/١، صفحة ٣١؛ وزارة الخارجية، "تبريرات موازنة الكونغرس للمساعدات الخارجية للسنة المالية ٢٠١١: جداول الملخصات"، ٢٠١٠/٣/٨، صفحة ٢٣.

١٠٢- وزارة الخارجية، "تبريرات الموازنة للمساعدات الخارجية للسنة المالية ٢٠١١"، صفحة ٦٢.

١٠٣- القانون H.R 4899، كما مصاغ في المجلس، ٢٠١٠/٣/٢٤.

١٠٤- القانون H.R 4899، التعديل المصاغ في مجلس الشيوخ، ٢٠١٠/٥/٢٧.

١٠٥- القانون H.R 4899، التعديل المصاغ في مجلس الشيوخ، ٢٠١٠/٥/٢٧.

١٠٦- تقرير مجلس الشيوخ 111-188 يجب ان يرفق مع القانون H.R 4899، "إيجاد مخصصات تكميلية طارئة لحالات الكوارث والإغاثة والوظائف الصيفية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، ولأغراض أخرى"، صفحة ٦٤.

١٠٧- تقرير مجلس الشيوخ 111-188، يجب ان يرفق مع القانون H.R 4899، "إيجاد مخصصات تكميلية طارئة لحالات الكوارث والإغاثة والوظائف الصيفية للسنة المالية المنتهية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، ولأغراض أخرى"، الصفحة ٥٥-٥٤.

١٠٨- القانون H.R 4899، كما تم تعديله، ٢٠١٠/٧/١.

١٠٩- الكونغرس المائة والحادي عشر، "سجل الكونغرس- مجلس الشيوخ"، ٢٠١٠/٧/٢٢، الصفحة S6190،

frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?dbname=2010_record&page=S6190&position=all، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢٣.

١١٠- القانون العام P.L. 108-106؛ P.L. 108-111؛ P.L. 108-287؛ P.L. 108-7؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 111-117؛ P.L. 111-118؛ P.L. 111-32؛ P.L. 111-32؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ التقرير ربع ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٣، ٢٠١٠/٤. البيانات غير مدققة. الأرقام متأثرة بالتدوير. التوقعات تتضمن صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، صندوق الدعم الاقتصادي (ESF)، و برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP). التوقعات تمثل المخصصات ناقص النفقات والصناديق المنتهية الصلاحية. النفقات المتوقعة تساوي معدل النفقات لكل صندوق خلال السنة الماضية. الصناديق المتوقع انتهاء صلاحيتها تساوي الصناديق المنتهية الصلاحية اعتباراً من ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠. التوقعان يفترضان ان

الكونغرس سيخصص كامل مبلغ البليون دولار في المخصصات التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠ لصندوق قوات الأمن العراقية. يفترض التوقع الثاني أيضاً ان الكونغرس سيخصص كامل مبلغ ٢,٥٨ بليون دولار في مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، وصندوق الدعم الاقتصادي (ESF) للسنة المالية ٢٠١١. التوقع الحالي للمفتش العام هو صقل للتوقع الوارد في التقرير ربع السنوي للمفتش العام المقدم إلى الكونغرس الأميركي في تشرين الأول/أكتوبر، الذي توقع ان أموال إعادة الإعمار الأميركية ستنفذ عند نقطة خلال السنوات المالية ٢٠١٢-٢٠١٤. لا تتضمن توقعات المفتش العام للمخصصات الأميركية المتبقية لإعادة إعمار العراق تيارات التمويل الأصغر حجماً، التي ستصبح نسبياً أكثر أهمية عندما تنتقل جهود إعادة الإعمار العراقية إلى مهمة مساعدة اقتصادية وأمنية عادية أكثر.

١١١- P.L. 108-11؛ P.L. 108-106؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-252؛ خصص الكونغرس في بادئ الأمر ١٨,٦٤٩ مليون دولار إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRR-2)، لكن حدد ٢١٠ ملايين دولار لنقلها إلى حسابات أخرى لبرامج في الأردن وليبيريا والسودان. نقلت الإدارة ٥٦٢ مليون دولار أخرى للبرامج المتعلقة بالعراق الممكن تنفيذها فقط في حسابات أخرى (مثل التسامح عن الدين الثنائي). في السنة المالية ٢٠٠٦، نقل الكونغرس حوالي ١٠ ملايين دولار إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من صندوق - الدعم الاقتصادي. وفي السنة المالية ٢٠٠٨، ألغى القانون العام P.L. 110-252 ٥٠ مليون دولار.

١١٢- استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦، استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ النشرة A-11 لمكتب الإدارة والموازنة (OMB) إعداد وتقديم وتنفيذ الموازنة، ٢٠٠٩/٨، القسم ١٠، الصفحة ٣ والقسم ٢٠، الصفحات ١٥، ١٨. لا يمكن استخدام الأموال غير الملتزم بها من المخصصات المنتهية الصلاحية سوى للتعديلات التي أدخلت على المشاريع الجارية أو لإقفال العقود.

١١٣- استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢. من بين الوكالات المنفذة الرئيسية (وزارة الدفاع الأميركية، وزارة الخارجية الأميركية، وزارة المالية الأميركية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID))، لم تتمكن سوى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية من تزويد البيانات الحالية لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق رقم ١ (IRR-1). آخر تحديث تم استلامه من وزارة الخارجية يعود إلى نيسان/أبريل ٢٠٠٧ ويشير إلى مبلغ ٨,٦١ ملايين دولار ملتزم به ولكن غير منفق. يقوم المفتش العام بتدقيق صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لتحديد وضع الأموال في الصندوق.

١١٤- القانون العام P.L. 108-7؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-234؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-49؛ P.L. 110-161؛ P.L. 111-32.

١١٥- القانون العام P.L. 108-7؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-234؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 111-32؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣؛ النشرة A-11 لمكتب الإدارة والموازنة (OMB) اعداد وتقديم وتنفيذ الموازنة، ٢٠٠٩/٨، القسم ١٠، الصفحة ٣ والقسم ٢٠، الصفحات ١٥، ٢٠.

١١٦- القانون العام P.L. 108-7؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-234؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 111-32؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.

١١٧- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣؛ التقرير ربع ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٥/١٠-٢٠١٠/٤.

- ١١٨ - P.L. 111-32؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢ و ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١١٩ - استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢ و ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١٢٠ - استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢ و ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١٢١ - القانون العام P.L. 108-7؛ P.L. 109-102؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-161؛ P.L. 111-32؛ P.L. 111-116.
- ١٢٢ - القانون العام P.L. 108-7؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-28؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-32؛ P.L. 111-117؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠ و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣؛ مكتب الإدارة والموازنة (OMB)، النشرة A-11؛ إعداد وتقديم وتنفيذ الموازنة؛ ٢٠٠٩/٨؛ القسم ١٠، صفحة ٣، والقسم ٢٠، صفحة ١٥ و ٢٠. يحتسب المفتش العام الصناديق المنتهية الصلاحية كمخصصات ناقص الالتزامات، اعتباراً من تاريخ انتهاء صلاحيتها. ثم نقل بعض الأموال من صندوق دعم الاقتصاد إلى وكالات أخرى بموجب قانون المساعدة الخارجية للعام ١٩٦١، القسم ٦٣٢ (ب). لم يشر مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) إن كانت التزاماته المبلغ عنها تتضمن هذه الأموال المحولة، لذلك فإن حسابات المفتش العام قد يكون مبالغاً بها في أموال الصناديق المنتهية الصلاحية. بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) من تزويد الوضع الكامل للصناديق بالنسبة لمبلغ ٥٠ مليون دولار في مخصصات السنة المالية ٢٠٠٣ لصندوق دعم الاقتصاد. لم يُبلغ سوى عن ٩ ملايين دولار قد تم الالتزام بها وإنفاقها اعتباراً من ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠١٠. من المحتمل أن تكون الأموال الملتزم بها والمنفقة من هذه الصناديق أكثر من الأموال المبلغ عنها، مما قد يؤثر على الوضع الإجمالي للصناديق والمبالغ في الصناديق المنتهية الصلاحية.
- ١٢٣ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠ و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣؛ التقرير ربع ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤-٢٠٠٤/٤.
- ١٢٤ - استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٨، ٢٠١٠/٧/١٤، ٢٠١٠/٧/١٦ و ٢٠١٠/٧/١٦؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١ و ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١٢٥ - استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٨، ٢٠١٠/٧/١٤، ٢٠١٠/٧/١٦ و ٢٠١٠/٧/١٦؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١ و ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١٢٦ - تقرير تدقيق المفتش العام 09-011، الفرص لتحسين ادارة صندوق الاستجابة السريعة"، ٢٠٠٩/١/٢٩، الصفحة ١.
- ١٢٧ - استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦. برنامج ثانٍ ممول من صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، ويتضمن مشاريع برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)/لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRDC)، يدعم أيضاً فرق إعادة إعمار المحافظات ولكنه ينفذ من قبل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE).

- ١٢٨- تقرير تدقيق المفتش العام 011-09، الفرص لتحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، ٢٠٠٩/١/٢٩، الصفحة ١.
- ١٢٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٣٠ و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢.
- ١٣٠- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ١٣١- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢٩، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٨-١-٢، ٢٠١٠/٧/١٣؛ تقرير تدقيق المفتش العام 011-09، الفرص لتحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، ٢٠٠٩/١/٢٩، الصفحة ١.
- ١٣٢- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢٥؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ١٣٣- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ١٣٤- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١؛ تقرير تدقيق المفتش العام 011-09، "الفرص لتحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، ٢٠٠٩/١/٢٩، الصفحة ١. يمكن ان تتلقى المنظمات غير الحكومية الأميركية هبات تصل إلى ١٠٠ ألف دولار. جميع الآخرين الذين يتلقون هبات (في القسم المنفذ من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية) يمكن ان يتلقوا هبات تصل إلى ٢٠٠ ألف دولار.
- ١٣٥- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢٩.
- ١٣٦- تقرير تدقيق المفتش العام 011-09، "الفرص لتحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، ٢٠٠٩/١/٢٩، صفحة ١-٣. تقسم المشتريات إلى مجموعتين: المشتريات الصغيرة المحددة بمبلغ ٢٥,٠٠٠ دولار والمشتريات المباشرة المستخدمة لمبالغ أكبر من ٢٥,٠٠٠ دولار (لم يعد صندوق الاستجابة السريعة يدعم مشتريات تفوق ٢٥,٠٠٠ دولار). واعتماداً على طبيعة المشروع آلية والتمويل المستخدمة، يمكن توزيع الأموال بمبلغ مقطوع أو بدفعات دورية تسدد إلى المستحقين. تصرف الدفعات من صندوق تسليفات يحتفظ به لدى فريق إعادة إعمار المحافظات. صندوق التسليفات هو صندوق نقد، وعادة بمبلغ ثابت، يُنشأ بتسليف الأموال من المسؤول المالي أو مسؤول الدفع في الوكالة إلى أمين صندوق معين حسب الأصول لإنفاقه كما يلزم. تملك فرق إعادة إعمار المحافظات عادةً صندوق تسليفات للاستجابة الطارئة تتراوح قيمته من ١٠٠ ألف دولار إلى ٣٠٠ ألف دولار. عندما يصرف فريق إعادة إعمار المحافظات الأموال، يقوم أمين صندوق الفريق (ويشار إليه هنا بأمين الصندوق الفرعي) بإعداد وإرسال مجموعة من الوثائق الداعمة إلى مكتب الإدارة المالية الموجود في السفارة الأميركية في بغداد. يقوم هذا المكتب بمراجعة ومعالجة هذه الوثائق ويسمح بإعادة تزويد مبالغ الأموال المنفقة إلى أمين الصندوق الفرعي لفريق إعادة إعمار المحافظات على شكل شك مسحوب على الخزينة الأميركية.
- ١٣٧- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢٩، و ٢٠١٠/٧/٦.
- ١٣٨- مثل تقرير تدقيق المفتش العام 011-09، الفرص لتحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، ٢٠٠٩/١/٢٩، الصفحة ٢.
- ١٣٩- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥، تقرير تدقيق المفتش العام 011-09، الفرص لتحسين إدارة صندوق الاستجابة السريعة"، ٢٠٠٩/١/٢٩، صفحة ٢. قبل منع طلبات الشراء التي تزيد قيمتها عن ٢٥ ألف دولار، كانت لجنة التعليم الفني في السفارة توافق عليها قبل إرسالها إلى قيادة العقود المشتركة في العراق-أفغانستان.
- ١٤٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.

- ١٤١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥. وفقا لمكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I)، فإن قاعدة بيانات شركة مانيجمانت سيستمز انترناشيونال (MSI's) تتبع أيضاً الهبات الكبيرة التي تديرها شركة DAI.
- ١٤٢- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٦/٢٩.
- ١٤٣- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ١٤٤- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٦.
- ١٤٥- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ١٤٦- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ١٤٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ١٤٨- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٦/٢٩.
- ١٤٩- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٦.
- ١٥٠- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ١٥١- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٦/٢٩.
- ١٥٢- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٦.
- ١٥٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ١٥٤- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ١٥٥- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٦؛ تقرير مجلس النواب رقم 111-366، يجب ان يرفق مع تقرير المؤتمر القانون HR.3288، "قانون مخصصات وزارات النقل والإسكان والتطوير المدني الوكالات ذات الصلة، ٢٠١٠"، ٢٠١٠/٨/١٢، صفحة ١٤٦٦.
- ١٥٦- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١٥٧- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١٥٨- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "التقرير ربع السنوي العاشر لمشروع برنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP) (١ كانون الثاني/يناير- ٣١ آذار/مارس ٢٠١٠)"، ٢٠١٠/٤، صفحة ١١.
- ١٥٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ١٦٠- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١٦١- استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ١٦٢- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١٦٣- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ١٦٤- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ١٦٥- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ١٦٦- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ١٦٧- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ١٦٨- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١.

- ١٦٩- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ١٧٠- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ١٧١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣؛ القانون العام -108 P.L. 287؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-148؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 111-118.
- ١٧٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣؛ P.L. 111-118؛ مكتب الإدارة والموازنة (OMB)، النشرة A-11، إعداد وتقديم وتنفيذ الموازنة؛ ٢٠٠٩/٨؛ القسم ١٠، صفحة ٣، والقسم ٢٠، صفحة ١٥ و٢٠.
- ١٧٣- استجابة مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥؛ مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي)، أنظمة الإدارة المالية لوزارة الدفاع، ٢٠٠٩/١، المجلد ١٢، الفصل ٢٧، الصفحة ١١-١٣، والملحق أ. مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي) يعرف ١٢ فئة من فئات مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) في المجلد ١٢، الفصل ٢٧ من نظام الإدارة المالية لوزارة الدفاع. تفرض أنظمة مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي) على الجيش تقديم تقرير شهري حول وضع مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) إلى مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي) - منظماً وفق فئة المشروع. مع تفاصيل حول الوحدة المنفذة، الرقم المرجعي للوثيقة، عنوان الوثيقة، الفصل والموقع، والمبالغ الملتمزم بها والمنفقة. متطلبات التقارير الإضافية تتعلق بالمشاريع الأكبر.
- ١٧٤- تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/١٣/٧.
- ١٧٥- استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAQ)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣.
- ١٧٦- P.L. 111-118، القسم ٩٠٠٥.
- ١٧٧- تقرير لجنة المخصصات لمجلس النواب 111-230، قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠، ٢٠٠٩/٢٤/٧، صفحة ٣٤٩.
- ١٧٨- البيان التفسيري للجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب للقانون العام P.L. 111-118، "قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠، ٢٠٠٩/١٢/١٦، صفحة ٤٠٤. يفرض البيان التفسيري أيضاً أن يتضمن التقرير عدد الموظفين اللازمين وعدد الموظفين المنتشرين حالياً، في أفغانستان مع قيادة العقود المشتركة والقوات الأميركية في أفغانستان دعماً لبرامج الاستجابة الطارئة للقائد.
- ١٧٩- البيان التفسيري للجنة المخصصات التابعة لمجلس النواب للقانون العام P.L. 111-118، "قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠١٠، ٢٠٠٩/١٢/١٦، صفحة ٤٠٤.
- ١٨٠- وزارة الدفاع (DoD)، التقرير المقدم إلى الكونغرس وفق القانون P.L. 111-118، القسم ٩٠٠٥ و P.L. 111-84، القسم ١٢٢٢، "مراجعة وزارة الدفاع لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)"، ٢٠١٠/٧، الصفحة ii-z.
- ١٨١- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-٢، ب-٤.
- ١٨٢- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-٥.
- ١٨٣- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-١٠.
- ١٨٤- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-١١.
- ١٨٥- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-١١.
- ١٨٦- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-١٣.
- ١٨٧- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-٢، ب-١، ب-٥.

- ١٨٨- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-٧.
- ١٨٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ١٩٠- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-٨.
- ١٩١- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ١٩٢- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، المال كنظام سلاح (MAAWS)، ٢٠١٠/٣/٣١، الصفحة ب-٨.
- ١٩٣- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ١٩٤- المفتش العام، التقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٤، الصفحة ٤٤.
- ١٩٥- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ١٩٦- استجابة مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي) (OUSD (C)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ١٩٧- استجابة مجلس حكام محطات البث (BBG) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣١؛ وزارة العدل (DOJ)، استجابة فرع الإدارة العدلية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/١٧؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة (OMB) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٥، ٢٠١٠/٤/١٩، و٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣؛ وزارة المالية، مكتب المساعدة الفنية (OTA)، "نظرة عامة حول مكتب المساعدة الفنية"، ٢٠٠٥/١٢/٣٠، ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٠٩/١٠/١٦؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١/١٢، ٢٠٠٩/٤/٨، و٢٠٠٩/٤/١٤؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، القروض والهبات الأميركية (الكتاب الأخضر)، ٢٠٠٨، [gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do? program=/eads/gbk/countryReport&unit=N](http://gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?program=/eads/gbk/countryReport&unit=N)، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٤/١٥.
- ١٩٨- استجابة مجلس حكام محطات البث (BBG) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣١؛ وزارة العدل (DOJ)، استجابة فرع الإدارة العدلية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل (DRL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة مكتب الشؤون التعليمية والثقافية (ECA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/١٧؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢؛ استجابة مكتب الإدارة والموازنة (OMB) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٥، ٢٠١٠/٤/١٩، و٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣؛ وزارة المالية، مكتب المساعدة الفنية (OTA)، "نظرة عامة حول مكتب المساعدة الفنية"، ٢٠٠٥/١٢/٣٠، ustreas.gov/offices/internationalaffairs/assistance/، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٠٩/١٠/١٦؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١/١٢، ٢٠٠٩/٤/٨، و٢٠٠٩/٤/١٤؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، القروض والهبات الأميركية (الكتاب الأخضر)، ٢٠٠٨، ٢٠١٠/٤/١٤؛

- ٢٠٠٨، [gbk.eads.usaidallnet.gov/query/ do? program=/eads/gbk/countryReport&unit=N](http://gbk.eads.usaidallnet.gov/query/do?program=/eads/gbk/countryReport&unit=N)، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٤/١٥.
- ١٩٩- البيت الأبيض، "الترشيحات والتعيينات"، www.whitehouse.gov/briefing-room/nominations-and-appointments، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢٠.
- ٢٠٠- السفارة الأميركية في انقره، "جايمس جيفري: السفير الأميركي إلى تركيا"، turkey.usembassy.gov/ambassador-james-jeffrey.html، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢٢.
- ٢٠١- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، "السيرة الذاتية لجايمس جيفري"، www.state.gov/r/pa/ei/biog/56704.htm، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢٠.
- ٢٠٢- جيم غارامون، الخدمة الصحفية للقوات الأميركية، "غايتس يوصي ان يتولى ماتيس منصب القيادة المركزية"، ٢٠١٠/٧/٨، www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=59951، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٨.
- ٢٠٣- نشرة صحفية لوزارة الدفاع، "إعلانات المسؤول العام"، ٢٠١٠/٥/١٨، www.defense.gov/releases/release.aspx?releaseid=13537، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٢٠٤- الكونغرس ١١١، سجل للكونغرس - مجلس الشيوخ"، ٢٠١٠/٦/٣٠، الصفحة S5718، frwebgate.access.gpo.gov/cgi-bin/getpage.cgi?dbname=2010_record&page=S5718&position=all، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٢٠٥- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٢٠٦- مؤسسة بروكينغز، مؤشر العراق، ٢٠٢٠/٦/٣٠، www.brookings.edu/~media/Files/Centers/Saban/Iraq%20Index/index.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٦، الصفحة ١٩.
- ٢٠٧- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٢٠٨- أمر تنفيذي للبيت الأبيض، "تنظيم مؤقت لتسهيل إقامة علاقة استراتيجية مع الجمهورية العراقية"، ٢٠١٠/٥/١٠.
- ٢٠٩- أمر تنفيذي للبيت الأبيض، "تنظيم مؤقت لتسهيل إقامة علاقة استراتيجية مع الجمهورية العراقية"، ٢٠١٠/٥/١٠. القائمة مقتبسة من النسخة الأصلية.
- ٢١٠- أمر تنفيذي للبيت الأبيض، "تنظيم مؤقت لتسهيل إقامة علاقة استراتيجية مع الجمهورية العراقية"، ٢٠١٠/٥/١٠.
- ٢١١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٢١٢- استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣.
- ٢١٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٢١٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٢١٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٢١٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٧.
- ٢١٧- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦.
- ٢١٨- وزارة الخارجية (DoS)، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL)، "نشرة صحفية، مساعد وزير الخارجية لشؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون دايفيد جونسون يسافر إلى العراق"، ٢٠٢٠/٤/٢٧، www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/04/140926.htm، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٣.

- ٢١٩- استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/٢.
- ٢٢٠- استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، "تبريرات الموازنة التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/٢/١، الصفحة ١.
- ٢٢١- المفتش العام، التقرير ربع ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠١٠/١، الصفحة ٢٢-٢٣.
- ٢٢٢- وزارة الخارجية (DoS)، مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL)، "نشرة صحفية،" مساعد وزير الخارجية لشؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون دايفيد جونسون يسافر إلى العراق"، ٢٠٢٠/٤/٢٧، www.state.gov/r/pa/prs/ps/2010/04/140926.htm، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٣.
- ٢٢٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٢٢٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد (ACCO)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١.
- ٢٢٥- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد (ACCO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٢٢٦- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، "تبريرات الموازنة التكميلية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/٢/١، الصفحة ١١. للإطلاع على وضع مبلغ ١,٥٧ مليار دولار المطلوب في المخصصات التكميلية للعام ٢٠١٠ لدعم عملية الإعمار هذه، انظر قسم مصادر التمويل في هذا التقرير.
- ٢٢٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٥.
- ٢٢٨- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) مكتب شؤون المحافظات (OPA)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٥.
- ٢٢٩- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/١/٦.
- ٢٣٠- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، مكتب شؤون المحافظات (OPA)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٥. السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/١/٦.
- ٢٣١- استجابة مكتب وكيل وزارة الدفاع (للسياسات) (P) OUSD لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٢٣٢- استجابة مكتب وكيل وزارة الدفاع (للسياسات) (P) OUSD لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٢٣٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٥/١١.
- ٢٣٤- لادونا دايفيس، نشرة صحفية ل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، "مقاطعة منطقة الخليج تستقبل قائدها الثاني والأخير"، ٢٠١٠/٧/١١، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-07-11.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٢.
- ٢٣٥- فينسنت مارش ومايك شيك، نشرة صحفية لمقاطعة منطقة الخليج ل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، "سلاح الهندسة في الجيش الأميركي يتخذ خطوات للمحافظة على ارثه في العراق"، ٢٠١٠/٦/٨، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-06-08.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢١. مقاطعة منطقة الخليج هي الوجود المتبقي لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي في العراق، وقد انخفض حجمها من فرقة وثلاث مقاطعات خلال السنة الماضية.
- ٢٣٦- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/٢.

- ٢٣٧- فينسنت مارش ومايك شليك، نشرة صحفية لمقاطعة منطقة الخليج لسلح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، "سلح الهندسة في الجيش الأميركي يتخذ خطوات للمحافظة على ارثه في العراق"، ٢٠١٠/٦/٨، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-06-08.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢١.
- ٢٣٨- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥؛ مجالات مسؤولية القيادة المركزية (USCENTCOM) FRAGO 09-1640، "انتقال القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A)"، ٢٠١٠/٤، القسم ١. في ١١ حزيران/يونيو، ٢٠١٠، نقلت القيادة المركزية (CENTCOM) القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A) إلى قيادة مشتركة للعقود لدعم مسرح العمليات (JTSCC). وفقاً لوزارة الدفاع، تغير اسم القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A) إلى قيادة عقود القيادة المركزية (C3) وبهذا الانتقال، تسلمت قيادة C3 مسؤوليات: تولي رئاسة نشاطات التعاقد (HCA) في العراق وأفغانستان والعمل كمشرفة عملانية (OPCON) على جميع موظفي عقود مكونات الخدمة ناقص القيادة العملانية الخاصة للقيادة المركزية (SOCCEN) وسلح الهندسة (USACE)، وتوسيع الإشراف إلى الكويت وباكستان، بما في ذلك سلطة التنسيق، منح التصاريح لممارسة الأعمال في مسرح العمليات، (TBC) ووفد إدارة العقود (CAD). الشخص الذي كان يلقب سابقاً بالمساعد الرئيسي المسؤول عن العقود (PARC) أصبح الآن يعرف بمسؤول العقود الرئيسي (SCO)، وفقاً للوثيقة المشتركة. C3 ليست منظمة دائمة، لكنها ستكون موجودة خلال العمليات الطارئة الرئيسية الجارية في منطقة عمليات القيادة المركزية.
- ٢٣٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥؛ مجالات مسؤولية القيادة المركزية (USCENTCOM) FRAGO 09-1640، القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A)"، ٢٠١٠/٤، القسم ٣.
- ٢٤٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥؛ مجالات مسؤولية القيادة المركزية (USCENTCOM) FRAGO 09-1640، القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A)"، ٢٠١٠/٤، القسم ٣. عند إنشاء C3، سيمسّى الجيش المسؤول التنفيذي للعقود في العراق، أفغانستان، الكويت وباكستان. مساعد وزير الجيش للمشتريات واللوجستيات والتكنولوجيا (ASAALT) سوف يعين قائد C3 رئيساً لنشاطات العقود في العراق وأفغانستان. سيقدم قائد C3 سلطات تعاقدية عالية المستوى للعراق وأفغانستان، وهما بدورهما سيوفران تراخيص العقود لجميع مكاتب العقود في العراق وأفغانستان.
- ٢٤١- المفتش العام، الدروس الصعبة: تجربة إعادة إعمار العراق، ٢٠٠٩/٢، الصفحة ١٩٨-١٩٩؛ المفتش العام، التقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٩/٤، الصفحة ٧. عملية نقل الأمن في المحافظات إلى السلطة العراقية (PIC) سبقتها اتفاقية أمنية نقلت المسؤولية الأمنية الكاملة عن جميع المحافظات الـ ١٨ إلى الحكومة العراقية في ١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.
- ٢٤٢- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩.
- ٢٤٣- استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٣/٣. وفقاً لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق، سوف يغلق النظام في ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠. يخطط لتوفير إمكانية لقراءة المعلومات حتى ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠ وبعد ذلك ستوضع قاعدة البيانات على خادم الكتروني آخر لمدة ١٠ سنوات.
- ٢٤٤- تقرير تدقيق المفتش العام 10-021، "خطط الحفاظ على برنامج إعادة إعمار العراق وسجلات العقود تحتاج إلى تحسين"، ٢٠١٠/٧.
- ٢٤٥- التقرير الصادر عن مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (DoS OIG) رقم MERO-A-10-07، "تدقيق المسؤولية عن الممتلكات في السفارة في بغداد"، ٢٠١٠/٤، الصفحة ٣.
- ٢٤٦- تقرير مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (DoS OIG) رقم MERO-A-10-07، "تدقيق المسؤولية عن الممتلكات في السفارة في بغداد"، ٢٠١٠/٤، الصفحة ٣-٢٩.
- ٢٤٧- تقرير مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (DoS OIG) رقم MERO-A-10-07، "تدقيق المسؤولية عن الممتلكات في السفارة في بغداد"، ٢٠١٠/٤، الصفحة ٢٩.

- ٢٤٨- تقرير مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية (DoS OIG) رقم MERO-A-10-07، "تدقيق المسؤولية عن الممتلكات في السفارة في بغداد"، ٢٠١٠/٤، الصفحة ٩.
- ٢٤٩- وزارة الخارجية، تقرير إدارة الممتلكات للسفارة الأميركية في بغداد، ٢٠١٠/٦/١٧.
- ٢٥٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٢٥١- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب الأمن الإقليمي (RSO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١؛ استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/١؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٣.
- ٢٥٢- مساعد وكيل وزارة الدفاع لدعم البرامج (ADUSD) "دعم المقاولين المشاركين في العمليات الأميركية في مناطق مسؤولية القيادة المركزية (USCENTCOM AOR) في العراق وأفغانستان"، ٢٠١٠/٥.
- ٢٥٣- موشي شوارتز، تقرير خدمة أبحاث الكونغرس (CRS) R40764، "مقاولو وزارة الدفاع في العراق وأفغانستان: خلفية وتحليل"، ٢٠١٠/٧/٢، صفحة ٨.
- ٢٥٤- موشي شوارتز، تقرير خدمة أبحاث الكونغرس (CRS) R40764، "مقاولو وزارة الدفاع في العراق وأفغانستان: خلفية وتحليل"، ٢٠١٠/٧/٢، صفحة ٨.
- ٢٥٥- شهادة غاري موتسيك، مساعد نائب وكيل وزارة الدفاع لدعم البرامج، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب للخدمات المسلحة حول الإشراف والتحقيقات، "جلسات استماع حول هبات وعقود العراق وأفغانستان"، ٢٠١٠/٣/٢٣.
- ٢٥٦- شهادة وليام موزر، نائب مساعد وزيرة الخارجية لإدارة اللوجستيات، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب للخدمات المسلحة حول الإشراف والتحقيقات، "جلسات استماع حول هبات وعقود العراق وأفغانستان"، ٢٠١٠/٣/٢٣.
- ٢٥٧- شهادة السفير جايمس مايكل، مستشار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب للخدمات المسلحة حول الإشراف والتحقيقات، "جلسات استماع حول هبات وعقود العراق وأفغانستان"، ٢٠١٠/٣/٢٣.
- ٢٥٨- شهادة جون هاتين، مدير فريق إدارة التملك والموارد في مكتب المحاسبة الحكومية، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب للخدمات المسلحة حول الإشراف والتحقيقات، "جلسات استماع حول هبات وعقود العراق وأفغانستان"، ٢٠١٠/٣/٢٣.
- ٢٥٩- شهادة غاري موتسيك، مساعد نائب وكيل وزارة الدفاع لدعم البرامج والسفير جايمس مايكل مستشار الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب للخدمات المسلحة حول الإشراف والتحقيقات، "جلسات استماع حول هبات وعقود العراق وأفغانستان"، ٢٠١٠/٣/٢٣.
- ٢٦٠- شهادة جون هاتين، مدير فريق إدارة التملك والموارد في مكتب المحاسبة الحكومية، أمام اللجنة الفرعية لمجلس النواب للخدمات المسلحة حول الإشراف والتحقيقات، "جلسات استماع حول هبات وعقود العراق وأفغانستان"، ٢٠١٠/٣/٢٣.
- ٢٦١- وزارة الدفاع (DoD)، إدارة الخدمات العامة (GSA)، ووكالة الناسا، "نظام التملك الفدرالي (FAR)، قضية 2008-027، النظام الفدرالي لمعلومات أداء ونزاهة الفائزين بالعقود" السجل الفدرالي، المجلد ٧٥ رقم ٥٥، صفحة ١٤ و ٥٩.
- ٢٦٢- وزارة الدفاع (DoD)، إدارة الخدمات العامة (GSA)، ووكالة الناسا، "نظام التملك الفدرالي (FAR)، قضية 2008-027، النظام الفدرالي لمعلومات أداء ونزاهة الفائزين بالعقود" السجل الفدرالي، المجلد ٧٥ رقم ٥٥، صفحة ١٤ و ٥٩.
- ٢٦٣- P.L. 110-417، القسم ٨٧٢.

- ٢٦٤- وزارة الدفاع (DoD)، ادارة الخدمات العامة (GSA)، ووكالة الناسا، "نظام التملك الفدرالي (FAR)، قضية 2008-027، النظام الفدرالي لمعلومات اداء ونزاهة الفائزين بالعقود" السجل الفدرالي، المجلد ٧٥ رقم ٥٥، صفحة ١٤ و ٥٩، تم إنشاء بعض قواعد البيانات الإضافية بين صيف ٢٠٠٩ وربيع ٢٠١٠ وقد تم دمجها في هذا النظام (FAPIS).
- ٢٦٥- نظام استعادة معلومات الاداء الماضية، "النظام الفدرالي لمعلومات اداء ونزاهة الفائزين بالعقود (FAPIS)"، www.ppirs.gov/fapiis.html، تم الدخول الى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٢.
- ٢٦٦- وزارة الدفاع (DoD)، ادارة الخدمات العامة (GSA)، ووكالة الناسا، "نظام التملك الفدرالي (FAR)، قضية 2008-027، النظام الفدرالي لمعلومات اداء ونزاهة الفائزين بالعقود" السجل الفدرالي، المجلد ٧٥ رقم ٥٥، صفحة ١٤ و ٥٩.
- ٢٦٧- القانون العام P.L. 108-106؛ P.L. 108-111؛ P.L. 108-287؛ P.L. 108-7؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-110؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 111-117؛ P.L. 111-118؛ P.L. 111-32؛ P.L. 111-32؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠٢٠/٤/١٢، ٢٠٢٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، و ٢٠٢٠/٧/٨؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢. تقارير مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي)، حول مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) لم تذكر حسابات ٤٧٩ مليون دولار تقريباً في نفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي) لا يقدم بيانات حول التزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) للمشاريع أو لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لجميع مخصصات السنة المالية. يسحب المفتش العام بيانات مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة من نظام إدارة إعادة اعمار العراق المتأخر في رفع التقارير، لذلك، فإن مجاميع الفئات الواردة في قسم مصادر التمويل من هذا التقرير قد لا تتوافق مع القيم في السطر الأعلى الوارد في هذا القسم وفي الأقسام الأربعة حول مناطق إعادة الأعمار الرئيسية.
- ٢٦٨- استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠١٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، و ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/١٤؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ التقرير ربع ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٤/٣-٢٠١٠/٤.
- ٢٦٩- استجابة وزارة الخارجية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠ و ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/١٤؛ المعلومات غير مدققة. الأرقام تتأثر بالتدوير. مكتب وزير الدفاع لا يقدم بيانات حول التزامات ونفقات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

- (CERP) لفئات المشاريع على أساس ربع سنوي لجميع مخصصات السنة المالية. يسحب المفتش العام بيانات مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة من نظام إدارة إعادة اعمار العراق المتأخر في رفع التقارير بربع سنة واحدة. لذلك، فإن مجاميع الفئات الواردة في قسم مصادر التمويل من هذا التقرير قد لا تتوافق مع القيم في السطر الأعلى الوارد في الأقسام الأربعة حول مناطق إعادة الأعمار الرئيسية.
- ٢٧٠- استجابة مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي) (C) OUSD لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٩ و ٢٠٠٩/٧/٧. معظم أموال وزارة الداخلية العراقية للتدريب نقلت إلى الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE) التابع لوزارة الخارجية الأميركية.
- ٢٧١- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/١/١٧؛ "قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/١/٢٧، جدول الملحق (ب). معدلات تنفيذ موازنة وزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية غير معروفة لهذه الفترة الزمنية، ولكنها كانت منخفضة في السنوات الماضية في مخصصات الموازنة الرأسمالية.
- ٢٧٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣؛ السفارة الأميركية في بغداد، استجابة ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/١/١٧؛ الحكومة العراقية، "قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية ٢٠١٠"، ٢٠١٠/١/٢٧، جدول الملحق (ب). الدعم الأميركي للمؤسسات الأمنية العراقية يزود أيضاً بأموال أميركية غير صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، بما في ذلك برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، والصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INCLE). لكن المفتش العام ليس لديه بيانات تاريخية كافية من صناديق غير صندوق قوات الأمن العراقية لاجراء مقارنة مع مخصصات الحكومة العراقية خلال الفترة الزمنية ٢٠٠٧-٢٠١٠.
- ٢٧٣- وزارة الدفاع (DoD)، "طلب الموازنة للسنة المالية ٢٠١١: نظرة عامة"، ٢٠١٠/٢، الفصل ٦، صفحة ٥.
- ٢٧٤- وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، كتاب الحقائق العالمية، www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٦. البيانات مأخوذة من آخر سنة متوفرة. يحسب الناتج المحلي الإجمالي على أساس سعر صرف العملة وليس على أساس تعادل القوة الشرائية.
- ٢٧٥- وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (CIA)، كتاب الحقائق العالمية، www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2034rank.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٢٧٦- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣١، ٢٠٢٠/٤/١ و ٢٠١٠/٧/١٠.
- ٢٧٧- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٦/٢٣، الشريحة ٩.
- ٢٧٨- صمويل سكوت، صفحة وقائع، "تحديث للسياسات العراقية والوضع الأمني"، معهد دراسة الحرب، ٢٠١٠/٦/٢٨، www.understandingwar.org/files/FactSheet_IraqPoliticsSecurityUpdate.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٢٧٩- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٦/٢٣، الشريحة ٩.
- ٢٨٠- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٦/٢٣، الشريحة ٤.
- ٢٨١- مايكل هراري، صفحة وقائع، "التحديث ٢: تشكيل الحكومة في العراق، معهد دراسة الحرب، ٢٠١٠/٦/١٠، www.understandingwar.org/reference/factsheet-government-formation-iraq، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٢٨٢- صمويل سكوت، صفحة وقائع، "تحديث للسياسات العراقية والوضع الأمني"، معهد دراسة الحرب، ٢٠١٠/٦/٢٨، www.understandingwar.org/files/FactSheet_IraqPoliticsSecurityUpdate.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.

- ٢٨٣- القيادة المركزية (CENTCOM)، "تحذيرات اخبارية حول العراق" ٢٠١٠/٧/١.
- ٢٨٤- صمويل سكوت، صفحة وقائع، "تحديث للسياسات العراقية والوضع الأمني"، معهد دراسة الحرب، ٢٠١٠/٦/٢٨، www.understandingwar.org/files/FactSheet_IraqPoliticsSecurityUpdate.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٢٨٥- لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للخدمات المسلحة، "أسئلة عن السياسة المتقدمة للفريق للويد اوستين الثالث، الولايات المتحدة الأميركية، المرشح لأن يكون جنرال وقائد القوات الأميركية في العراق"، ٢٠١٠/٦/٢٤، armed-services.senate.gov/statemnt/2010/06%20June/Austin%2006-24-10.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠، الصفحة ٨.
- ٢٨٦- لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للخدمات المسلحة، "أسئلة عن السياسة المتقدمة للفريق للويد اوستين الثالث، الولايات المتحدة الأميركية، المرشح لأن يكون جنرال وقائد القوات الأميركية في العراق"، ٢٠١٠/٦/٢٤، armed-services.senate.gov/statemnt/2010/06%20June/Austin%2006-24-10.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠، الصفحة ٨-١١.
- ٢٨٧- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢، التقرير ربع السنوي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) حول برنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP)، ٢٠١٠/٤، الصفحة ٦.
- ٢٨٨- لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للخدمات المسلحة، "أسئلة عن السياسة المتقدمة للفريق للويد اوستين الثالث، الولايات المتحدة الأميركية، المرشح لأن يكون جنرال وقائد القوات الأميركية في العراق"، ٢٠١٠/٦/٢٤، armed-services.senate.gov/statemnt/2010/06%20June/Austin%2006-24-10.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠، الصفحة ٩.
- ٢٨٩- وزارة الدفاع، نشرة صحفية، "موجز أخباري مع الجنرال راي اوديرنو من البنتاغون"، ٢٠١٠/٦/٤، www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4632، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٦.
- ٢٩٠- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٣٢.
- ٢٩١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٢٩٢- القيادة المركزية (CENTCOM)، نشرة صحيفة، "الولايات المتحدة تنهي المراقبة على نقاط التفطيش في المنطقة الخضراء في بغداد" ٢٠١٠/٦/١ البيت الأبيض، تصريحات الرئيس باراك أوباما (كما تم إعدادها للإلقاء)، "الإنهاء المسؤول للحرب في العراق"، الذي ألقاه في كامب لجون، نورث كارولينا، ٢٠٠٩/٢/٢٧، www.whitehouse.gov/the_press_office/Remarks-of-President-Barack-Obama-Responsibly-Ending-the-Warin-Iraq/، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٦.
- ٢٩٣- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١؛ القوات الأميركية في العراق (USF-I)، وزارة الدفاع الأميركية، موجز اخباري مع قائد القوات الأميركية في العراق الجنرال راي اوديرنو، www.usf-iraq.com/news/pressbriefings/pentagon-dod-news-briefing-with-gen-rayodierno-june-4، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٤.
- ٢٩٤- اللواء لنزا، الجنرال قائد فرقة منطقة الخليج للقوات الأميركية في العراق، "موجز صحفي لعملية التسليم مع الجنرال لنزا، كوكس وبيبرنا"، ٢٠١٠/٦/١٤، www.usf-iraq.com/news/press-briefings/usf-i-turnover-press-conference-with-generals-lanza-cox-a-perna-june-14، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٢٩٥- البيت الأبيض، "استراتيجية الأمن الوطني"، موجز اخباري للقوات الأمنية في العراق"، ٢٠١٠/٥، الصفحة ٢٥؛ وزارة الدفاع الأميركية مع قائد القوات الأميركية في العراق، الجنرال راي اوديرنو، www.usf-iraq.com/news/pressbriefings/pentagon-dod-news-briefing-with-gen-rayodierno-june-4، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٤.

- ٢٩٦- وزارة الدفاع، نشرة صحفية، "موجز أخباري مع الجنرال راي اوديرنو من البنتاغون"، ٢٠١٠/٦/٤، www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4632، ثم الدخول إلى هذا الموقع في الجنرال اوديرنو، ٢٠١٠/٧/٦، رداً على سؤال حول انسحاب القوات القتالية الأميركية بحلول ١ أيلول/سبتمبر ٢٠١٠، أجاب القوات القتالية، القوات القتالية العراقية، فإني احتاج إلى ان تقوم القوات القتالية (الأميركية) بالتدريب وتقديم المشورة. لذلك سيلعبون هذا الدور وسوف نستمر في القيام بعمليات ضد الإرهاب، لذلك ستكون هناك قدرات قتالية، ومعظمها قوات العمليات الخاصة التي سوف تواصل أيضاً العمليات ضد الإرهاب.
- ٢٩٧- البيت الأبيض، "استراتيجية الأمن الوطني"، موجز أخباري للقوات الأمنية في العراق"، ٢٠١٠/٥، الصفحة ٢٥.
- ٢٩٨- ساره قطن، ألريش بترسون، موللي دونيغان، قيو بورخارت، ميغان زندر - كوتوغنو، ادوارد اوكونيل، ومايكل ويبر، *البنادق المأجورة: آراء حول المقاتلين المسلحين في عملية حرية العراق، سانتا مونيكا: راند، ٢٠١٠/٦، صفحة ١١-١٣.*
- ٢٩٩- ساره قطن، ألريش بترسون، موللي دونيغان، قيو بورخارت، ميغان زندر - كوتوغنو، ادوارد اوكونيل، ومايكل ويبر، *البنادق المأجورة: آراء حول المقاتلين المسلحين في عملية حرية العراق، سانتا مونيكا: راند، ٢٠١٠/٦، صفحة ١١-١٣.*
- ٣٠٠- وزارة الدفاع الأميركية، "دعم المقاتلين للعمليات الأميركية في منطقة مسؤولية القيادة المركزية الأميركية (USCENTCOM)، العراق وأفغانستان" ٢٠١٠/٥/٣، الصفحة ٣، www.acq.osd.mil/log/PS/p_vault/5A_May2010.doc، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٢.
- ٣٠١- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة مكتب الأمن الإقليمي (RSO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٣٠٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥؛ لجنة مجلس الشيوخ الأميركي للخدمات المسلحة، "أسئلة عن السياسة المتقدمة للفريق للويد اوستين الثالث، الولايات المتحدة الأميركية المرشح لأن يكون جنرال وقائد، القوات الأميركية في العراق"، ٢٠١٠/٦/٢٤، armed-services.senate.gov/statemnt/2010/06%20June/Austin%2006-24-10.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠، الصفحة ١١.
- ٣٠٣- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣٠٤- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣٠٥- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣٠٦- وزارة الدفاع، نشرة صحفية، "موجز أخباري مع الجنرال راي اوديرنو من البنتاغون"، ٢٠١٠/٦/٤، www.defense.gov/transcripts/transcript.aspx?transcriptid=4632، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٦.
- ٣٠٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٥/١٥؛ وزارة الخارجية الأميركية، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٣؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣٠٨- وزارة الخارجية الأميركية، استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٣٠٩- استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٣١٠- وزارة الدفاع الأميركية، "موجز اخباري لوزارة الدفاع والبنتاغون مع نائب الجنرال القائد لتقديم المشورة والتدريب، الفريق مايكل باربيرو، ٢٠١٠/٦/١٨، [www.usf-iraq.com/news/press-briefings/pentagon-](http://www.usf-iraq.com/news/press-briefings/pentagon-dod-news-briefing-with-1t-gen-barberojune-18)، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٦.

- ٣١١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١ و ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣١٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٣١٣- القوات الأميركية في العراق (USF-I)، البعثة التدريبية والاستشارية للعراق (ITAM)، "موجز للجيش"، ٢٠١٠/٤/٢٤، الصفحة ١٥-٢١.
- ٣١٤- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٣١٥- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥ و ٢٠١٠/٧/١.
- ٣١٦- هذه تتضمن أموال من صندوق قوات الشرطة العراقية (بما في ذلك المليار دولار المطلوبة للسنة المالية ٢٠١٠)، المعدات المشتراة عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، وتحويل المعدات العسكرية الأميركية الفائضة إلى العراق.
- ٣١٧- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣١٨- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥. تجميد الحكومة العراقية للتوظيف في عام ٢٠٠٩، عندما انتقلت مسؤولية "بناء العراق" من نشاط تموله الولايات المتحدة إلى عملية للحكومة العراقية، ذكر أيضاً كسبب لعدم تزويد أعضاء "أبناء العراق" بوظائف دائمة. استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/٢.
- ٣١٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٣٢٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣٢١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٣٢٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٣٢٣- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/١/٢٩، صفحة ٣٠.
- ٣٢٤- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠١٠/٧/١٤؛ استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦.
- ٣٢٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/٧.
- ٣٢٦- اجتماع رئيس القضاة مدحت المحمود مع المفتش العام، ٢٠١٠/٥.
- ٣٢٧- رئيس القضاة مدحت المحمود، مجلس القضاء الأعلى (HJC) في العراق، ٢٠١٠/١، الصفحة ١١٦؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٤١.
- ٣٢٨- موجز صحفي لسلح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، "سلح الهندسة في الجيش الأميركي ينهي اللمسات النهائية على مبنى محكمة الحلة" www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-05-20.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٦.
- ٣٢٩- موجز صحفي لسلح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، "سلح الهندسة في الجيش الأميركي ينهي اللمسات النهائية على مبنى محكمة الحلة" www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-05-20.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٦.
- ٣٣٠- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٧.
- ٣٣١- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٧.
- ٣٣٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٧.
- ٣٣٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٧.

- ٣٣٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٧.
- ٣٣٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٧.
- ٣٣٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٧.
- ٣٣٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٧؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٣٣٨- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥؛ نشرة صحفية لوزارة الدفاع الأميركية، "العراق تتولى السيطرة على آخر مرفق رئيسي للاحتجاز" ٢٠١٠/٧/١٦، www.defense.gov/news/newsarticle.aspx?id=60043، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٣٣٩- فريق البلاد التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل مساعدة الأمم المتحدة الإنمائية للعراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٢٢.
- ٣٤٠- فريق البلاد التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل مساعدة الأمم المتحدة الإنمائية للعراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٢٣.
- ٣٤١- فريق البلاد التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل مساعدة الأمم المتحدة الإنمائية للعراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٣٠، ٣٣.
- ٣٤٢- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٦، استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٨.
- ٣٤٣- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٦، استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٨.
- ٣٤٤- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٦.
- ٣٤٥- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٦/٤ و ٢٠١٠/٧/٦.
- ٣٤٦- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١؛ المفتش العام، التقرير ربع ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠٠٧/١٠-٢٠١٠/٤.
- ٣٤٧- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٣٤٨- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٦/٩، الشريحة ١٣.
- ٣٤٩- التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ٢٢، ٢٠١٠/٥/١٧، صفحة ١.
- ٣٥٠- التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ٢٢، صفحة ٢؛ وزارة الخارجية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٧/١٤، الشريحة ١١.
- ٣٥١- الحكومة العراقية، نشرة صحفية لوزارة النفط، "وزارة النفط العراقية توقع عقد نهائي مع شركات أجنبية لتطوير ثلاثة حقول نفط في ميسان"، ٢٠١٠/٥/١٧، www.oil.gov.iq/117576.php، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥؛ التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ٢١، صفحة ١٣.

- ٣٥٢- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٤.
- ٣٥٣- الحكومة العراقية، نشرة صحفية لوزارة النفط، "وزارة النفط العراقية توقع عقد نهائي مع شركات أجنبية لتطوير ثلاثة حقول نفط في ميسان"، ٢٠١٠/٥/١٧، www.oil.gov.iq/117576.php، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥؛ التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ٢١، صفحة ١٣.
- ٣٥٤- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٦/٣٠، الشريحة ١٤.
- ٣٥٥- شلومبرغر، خطاب المسؤول التنفيذي في مؤتمر ويل للطاقة، ٢٠١٠/٣/٢٢، www.slb.com/news/presentations/2010/2010_0322_agould_howard_weil.aspx، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٣٥٦- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٤.
- ٣٥٧- نشرة صحفية لشركة فوستر اينرجي ويلر، "فوستر ويلر تفوز بعقد إدارة مشروع توسيع النفط الخام العراقي"، ٢٠١٠/٧/١٣، phx.corporate-ir.net/phoenix.zhtml?c=80422&p=irol-news&nyo=0، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٣٥٨- الحكومة العراقية، وزارة النفط، www.oil.gov.iq/1547.php، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٧.
- ٣٥٩- التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ٢٠، ٢٠١٠/٥/١٧، صفحة ٢ والمجلد ٥٣، رقم ٢٧، ٢٠١٠/٧/٥/الصفحة ٤.
- ٣٦٠- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٣٦١- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٤ و ٢٠١٠/٧/٦.
- ٣٦٢- الحكومة العراقية، لجنة الاستثمار الوطني (NIC)، "فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي"، www.investpromo.gov.iq/index.php?id=55، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤؛ إدارة معلومات الطاقة (EIA)، موجزات تحليل البلدان، www.eia.doe.gov/cabs/Iraq/Oil.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٠.
- ٣٦٣- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٤ و ٢٠١٠/٧/٦.
- ٣٦٤- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٥/٥، الشريحة ١٢، استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/١٤.
- ٣٦٥- الحكومة العراقية، لجنة الاستثمار الوطني (NIC)، "فرص الاستثمار في قطاع النفط والغاز العراقي"، www.investpromo.gov.iq/index.php?id=55، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤؛ إدارة معلومات الطاقة (EIA)، موجزات تحليل البلدان، www.eia.doe.gov/cabs/Iraq/Oil.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٠.
- ٣٦٦- وزارة التجارة، إدارة التجارة الدولية (ITA)، "فرق الاستثمار وإعادة إعمار العراق"، trade.gov/iraq/، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤.
- ٣٦٧- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٥/٥، الشريحة ١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٣٦٨- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "برنامج تطوير"، www.usaid.gov/iraq/accomplishments/natgov.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١٦.
- ٣٦٩- نشرة صحفية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) /برنامج تطوير، "شركة نفط الجنوب سوف تجري تقييمًا ذاتيًا تنظيميًا في الفرع المالي"، ٢٠١٠/٥/٢٠، www.tatweer-iraq.com/index.cfm?webapp=newsitem&news_id=91، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥.

- ٣٧٠- نشرة صحفية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) // برنامج تطوير، "شركة نفط الجنوب سوف تجري تقييماً ذاتياً تنظيمياً في الفرع المالي"، ٢٠١٠/٥/٢٠، www.tatweer-iraq.com/index.cfm?webapp=newsitem&news_id=91، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥.
- ٣٧١- الحكومة العراقية، وزارة النفط، www.oil.gov.iq/DOMESTIC%20CONSUMPTION.php، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/٢٩.
- ٣٧٢- المفتش العام، التقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠١٠/٤.
- ٣٧٣- الحكومة العراقية، مركز الاعلام الوطني، "قرارات مجلس الوزراء في الجلسة رقم (٢٦) في ٢٠٢٠/٢٩/٦"، www.nmc.gov.iq/english/qararat_e/26_2010.htm، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/٣٠؛ وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٦/٣٠، الشريحة ١٤؛ التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ٢٧، ٢٠١٠/٧/٥، صفحة ٩.
- ٣٧٤- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٥/١٢، الشريحة ١٣؛ التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ١٦، ٢٠١٠/٤/١٩، صفحة ١، التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ١٩، ٢٠١٠/٥/١٠، الصفحة ١٤.
- ٣٧٥- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/١٠؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦؛ المفتش العام، التقرير ربع ونصف السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠١٠/٤.
- ٣٧٦- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO/ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٦/٦/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠؛ مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٦/١٠/٢٥، الشريحة ١١، و ٢٠٠٧/٥/٩، الصفحة ١١.
- ٣٧٧- تحليل المفتش العام المستند إلى مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO/ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠؛ وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠٠٦/١٠/٢٥، الشريحة ١١، و ٢٠٠٧/٥/٩، الشريحة ١١.
- ٣٧٨- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO/ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٩/٤/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٣٧٩- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO/ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٩/٤/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٣٨٠- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO/ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠، تتضمن احصائيات الاستيراد الواردة هنا الكهرباء المنتجة بواسطة "سفينة الطاقة" في ام قصر.
- ٣٨١- نشرة صحفية لشركة وارنسيلا، "وارنسيلا تحصل على اتفاقية تشغيل وصيانة لمحطات الكهرباء العراقية العائمة"، ٢٠١٠/٥/١٢،
- هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١١؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO/ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠١٠/٦/٣٠ - ٢٠١٠/٤/١.
- ٣٨٢- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO/ESD)، تقارير الأداء الكهربائي اليومي، ٢٠٠٩/٤/١ - ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٣٨٣- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٦/٢٣، الشريحة ٤، مراجعة المفتش العام للمصادر المفتوحة باللغتين الإنكليزية والعربية.
- ٣٨٤- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٠١٠/٦/٣٠، الشريحة ١٦.

- ٣٨٥- استجابة القوات الأميركية في العراق (USF-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٣/٣١ و ٢٠١٠/٧/١.
- ٣٨٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٣٨٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢ و ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٣٨٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢ و ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٣٨٩- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٣؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٣٩٠- نشرة صحفية لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي، "سلاح الهندسة في الجيش الأميركي يزود المزيد من الطاقة إلى سكان الأنبار"، ٢٠١٠/٥/٢٧، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-05-27.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٠.
- ٣٩١- تقرير تدقيق المفتش العام PA-09-191، محطة التحويل الكهربائي ١١/٣٣ كيلو فولت، القيم، العراق"، ٢٠١٠/٤.
- ٣٩٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٣٩٣- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٣٩٤- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠١٠/٧/٢. استخدمت فئة المعيار "الكهربائي" لنظام إدارة اعمار العراق لتحديد عدد وقيمة المشاريع الكهربائية الجارية. تتضمن هذه الفئة بعض المشاريع التي لا تقع ضمن قطاع "الكهرباء" للمفتش العام.
- ٣٩٥- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦.
- ٣٩٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٣٩٧- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/١/٢٩، صفحة ٢٥.
- ٣٩٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٣٩٩- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٢٥.
- ٤٠٠- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، "تقرير الأمين العام وفق الفقرة ٦ من القرار ١٨٨٣ (٢٠٠٩)، ٢٠١٠/٥/١٤، صفحة ٩.
- ٤٠١- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة vii.
- ٤٠٢- السفارة الأميركية في بغداد، "فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) سوف توفر مياه الشرب إلى ٩٧% من سكان الأنبار"، ٢٠١٠/٥/٢٥، iraq-prt.usembassy.gov/prt-anbaris-052510.html، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٠.
- ٤٠٣- فريق البلاد التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل مساعدة الأمم المتحدة الإنمائية للعراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحات ٢٩-٤٨.
- ٤٠٤- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠١٠/٧/٢. استخدمت فئة المعيار "PW ومياه" في نظام إدارة اعمار العراق "لتحديد عدد وقيمة المشاريع الكهربائية الجارية. تتضمن هذه الفئة بعض المشاريع التي لا تقع تحت قطاع "المياه والصرف الصحي" للمفتش العام.
- ٤٠٥- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠١٠/٧/٢.

- ٤٠٦- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦.
- ٤٠٧- فريق البلدان التابع للأمم المتحدة (UNCT) في العراق، إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للعراق للأعوام ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، صفحة ٢٥.
- ٤٠٨- نشرة صحفية لوزارة الدفاع، فريق الإطفاء السابع عشر، "المستشارون الأميركيون يساعدون في تحسين مرفأ المياه العميقة الوحيد في العراق"، ٢٠١٠/٣/٢٢، newsblaze.com/story/20100322091732zmil.nb/topstory.html، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/٢٣.
- ٤٠٩- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٥٧.
- ٤١٠- الحكومة العراقية، لجنة الاستثمار الوطني (NIC)، "فرص الاستثمار في قطاع النقل"، www.investpromo.gov.iq/index.php?id=72، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/٢٣.
- ٤١١- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ نشرة صحفية لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي، "سلاح الهندسة في الجيش الأميركي سيسلم أحدث مرافق لرسو السفن التابعة للبحرية العراقية"، ٢٠٠٩/١٢/١٣، www.grd.usace.army.mil/news/releasesNR09-12-13.pdf.
- ٤١٢- نشرة صحفية لوزارة الدفاع، فريق الإطفاء السابع عشر، "المستشارون الأميركيون يساعدون في تحسين مرفأ المياه العميقة الوحيد في العراق"، ٢٠١٠/٣/٢٢، newsblaze.com/story/20100322091732zmil.nb/topstory.html، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/٢٣.
- ٤١٣- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٤/٧، الشريحة ١٥.
- ٤١٤- الحكومة العراقية، لجنة الاستثمار الوطني (NIC)، "فرص الاستثمار في قطاع النقل"، www.investpromo.gov.iq/index.php?id=72، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/٢٣.
- ٤١٥- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٣.
- ٤١٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/٢؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤١٧- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، المعيار العالمي، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤١٨- الحكومة العراقية، وزارة الداخلية العراقية، أظهرت (٦٠) شركة أجنبية استعدادها لتنفيذ الطريق الدائري للسكة الحديدية"، www.motrans.gov.iq، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٥/٨.
- ٤١٩- الحكومة العراقية، لجنة الاستثمار الوطني (NIC)، "فرص الاستثمار في قطاع النقل"، www.investpromo.gov.iq/index.php?id=72، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/٢٣. الحكومة العراقية، شركة السكة الحديدية العراقية الصفحة الرئيسية للموقع، www.iraqrailways.com، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٨.
- ٤٢٠- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٢/٦، الشريحة ١١.
- ٤٢١- وحدة استخبارات الايكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠١٠/٦، الصفحة ١٣.
- ٤٢٢- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٥/٥، الشريحة ١٦.
- ٤٢٣- وحدة استخبارات الايكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠١٠/٦، الصفحة ١٣.

- ٤٢٤- وحدة استخبارات الايكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٦، /٢٠١٠، الصفحة ١٣.
- ٤٢٥- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٢٨/٤/٢٠١٠، الشريحة ١٤.
- ٤٢٦- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضعية العراق، ٦/٢/٢٠١٠، الشريحة ١١.
- ٤٢٧- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٩/٤/٢٠١٠، صفحة ٢٦.
- ٤٢٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠.
- ٤٢٩- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٩/٤/٢٠١٠، صفحة ٢٦.
- ٤٣٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠.
- ٤٣١- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠.
- ٤٣٢- سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، "سلاح الهندسة في الجيش الأميركي يعيد برنامج المأمون للاتصالات إلى العمل"، ١١/٤/٢٠١٠، www.grd.usace.army.mil/news/releases/NR10-04-11.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٥/٥/٢٠١٠.
- ٤٣٣- وحدة استخبارات الايكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٦، /٢٠١٠، الصفحة ١٢-١٣.
- ٤٣٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠.
- ٤٣٥- استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٥/٤/٢٠٠٧؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢/٧/٢٠١٠؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠٢٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ٣٠/٦/٢٠٢٠، ٦/٧/٢٠١٠، و٨/٧/٢٠٢٠؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/٧/٢٠١٠؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٧/٢٠١٠، و٨/٧/٢٠١٠.
- ٤٣٦- استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٥/٤/٢٠٠٧؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢/٧/٢٠١٠؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/٤/٢٠١٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ٣٠/٦/٢٠٢٠، ٦/٧/٢٠١٠، و٨/٧/٢٠٢٠؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات، ١٠/٤/٢٠٠٩، ١٢/٤/٢٠١٠، و١٣/٧/٢٠١٠؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩، ٨/٤/٢٠١٠، ٧/١٤/٢٠١٠، و١٦/٧/٢٠١٠؛ استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/٧/٢٠١٠؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ١٣/٤/٢٠٠٩، ٨/٧/٢٠١٠، و١٣/٧/٢٠١٠؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠٠٩.
- ٤٣٧- استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٥/٤/٢٠٠٧؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢/٧/٢٠١٠؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٤/٢٠١٠، ١٢/٤/٢٠٢٠، ١٤/٤/٢٠٢٠، ٣٠/٦/٢٠١٠، و٨/٧/٢٠٢٠؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ١٢/٧/٢٠١٠؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٨/٧/٢٠١٠.
- ٤٣٨- استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠.
- ٤٣٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠.
- ٤٤٠- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/٧/٢٠١٠.

- ٤٤١- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، التقرير ربع السنوي لبرنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP)، ٢٠١٠/٤، الصفحة ١٤-٢٢.
- ٤٤٢- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤٤٣- تقرير تدقيق المفتش العام 0-022، "هناك حاجة لتحسين الاشراف على منح وزارة الخارجية إلى المعهد الجمهوري الدولي"، ٢٠١٠/٧.
- ٤٤٤- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٣؛ المفتش العام، التقرير ربع السنوي لكونغرس الولايات المتحدة، ٢٠١٠/٤/٣٠، الصفحة ٥.
- ٤٤٥- استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠٢٠/٤/١٤، ٢٠٢٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠٢٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨.
- ٤٤٦- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢ و ٢٠٢٠/٧/١٤.
- ٤٤٧- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٤٤٨- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤٤٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤٥٠- استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠١٠/٤/١٢، ٢٠٢٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠١٠/٧/٦، ٢٠٢٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨.
- ٤٥١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، مكتب شؤون المحافظات (OPA)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤٥٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، مكتب شؤون المحافظات (OPA)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٤٥٣- وزارة الخارجية الأميركية (DoS)، تقرير وضع العراق، ٢٠١٠/٥/٢٦.
- ٤٥٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤٥٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤٥٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد (ACCO)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١.
- ٤٥٧- جامعة يوتاه، كلية أس. جاي كويني للقانون، "مشروع العدالة العالمية: العراق"، www.gjpi.org، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤.
- ٤٥٨- جامعة يوتاه، كلية أس. جاي كويني للقانون، "مشروع العدالة العالمية: العراق"، www.gjpi.org، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤؛ استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٤٥٩- جامعة يوتاه، كلية أس. جاي كويني للقانون، "مشروع العدالة العالمية: العراق"، www.gjpi.org، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤.

- ٤٦٠ - استجابة السفارة الاميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٤٦١ - استجابة السفارة الاميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٣.
- ٤٦٢ - استجابة الحكومة العراقية، هيئة النزاهة (COI)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١. استجابة السفارة الاميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٧/١٤.
- ٤٦٣ - استجابة الحكومة العراقية، هيئة النزاهة (COI)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤٦٤ - استجابة الحكومة العراقية، هيئة النزاهة (COI)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٤٦٥ - استجابة الحكومة العراقية، هيئة النزاهة (COI)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤٦٦ - كان المفتشون العامون يعينون في بادئ الأمر من جانب المسؤول الاداري لسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) لمدة خمس سنوات بموجب الأمر رقم ٥٧ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة في ٢٠٠٤/٢.
- ٤٦٧ - استجابة الحكومة العراقية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٦/٢.
- ٤٦٨ - سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA)، الأمر رقم ٥٥، ٢٠٠٤/١/٢٨.
- ٤٦٩ - الحكومة العراقية، هيئة النزاهة (COI)، عادل عبد المهدي يعلن عن وضعه المالي الشخصي"، www.nazaha.iq/en_body.asp?field=news_en&id=149، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤.
- ٤٧٠ - استجابة الحكومة العراقية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/١٩.
- ٤٧١ - وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، *قياس الاستقرار والأمن في العراق*، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٤.
- ٤٧٢ - استجابة الحكومة العراقية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/١٩.
- ٤٧٣ - حكومة إقليم كردستان، وزارة التخطيط، www.mop-krg.org/default.aspx?page=articles&c=news&id=1149&l=1، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/١.
- ٤٧٤ - الأمم المتحدة، "لمحة عامة حول المنظمة المركزية للإحصاءات وتكنولوجيا المعلومات"، ٢٠٠٧/٢/١٥، الشريحة ٧، unstats.un.org/unsd/statcom/statcom_seminar/Pres.2.ppt، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٤.
- ٤٧٥ - وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، *قياس الاستقرار والأمن في العراق*، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٣-٥.
- ٤٧٦ - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، S/2010/240، "تقرير الأمين العام بموجب الفقرة ٦ من القرار ١٨٨٣ (٢٠٠٩)"، ٢٠١٠/٥/١٤، الصفحة ٩؛ نشرة صحفية لوزارة الخارجية الأميركية، مكتب مساعدة الكوارث الخارجية (OFDA)، "العراق-حالة طارئة معقدة"، ٢٠١٠/٥/٥، www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/countries/iraq/template/fs_sr/FY2010/iraq_ce_sr01_05-05-2010.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣.
- ٤٧٧ - وزارة الخارجية الأميركية، مكتب مساعدة الكوارث الخارجية (OFDA)، "العراق-حالة طارئة معقدة"، ٢٠١٠/٥/٥، www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/countries/iraq/template/fs_sr/FY2010/iraq_ce_sr01_05-05-2010.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢٣.
- ٤٧٨ - مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، S/2010/240، "تقرير الأمين العام بموجب الفقرة ٦ من القرار ١٨٨٣ (٢٠٠٩)"، ٢٠١٠/٥/١٤، الصفحة ٩؛ نشرة صحفية للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، اللاجئين العراقيون السابقون يستفيدون من برنامج الايواء للمفوضية العليا للاجئين في الجنوب"، ٢٠١٠/٥/٢٠، www.unhcr.org/4bf53b636.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٥.
- ٤٧٩ - وزارة الخارجية الأميركية، مكتب مساعدة الكوارث الخارجية (OFDA)، "العراق-حالة طارئة معقدة"، ٢٠١٠/٥/٥، www.usaid.gov/our_work/humanitarian_assistance/disaster_assistance/countries/iraq/template/

- ٤٨٠- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، S/2010/240، "تقرير الأمين العام بموجب الفقرة ٦ من القرار ١٨٨٣ (٢٠٠٩)"، ٢٠١٠/٥/١٤، الصفحة ٩.
- ٤٨١- نشرة صحفية للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، "المفوضية العليا للاجئين تتوصل إلى معلم في إعادة توطين اللاجئين العراقيين"، ٢٠١٠/٦/١٨، www.unhcr.org/4c1b66d133.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٥.
- ٤٨٢- نشرة صحفية للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة تحذر من طرد اللاجئين في أوروبا إلى العراق"، ٢٠١٠/٦/٨، www.unhcr.org/4c0e5f5a6.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٥.
- ٤٨٣- مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، S/2010/240، "تقرير الأمين العام بموجب الفقرة ٦ من القرار ١٨٨٣ (٢٠٠٩)"، ٢٠١٠/٥/١٤، الصفحة ١٠.
- ٤٨٤- استجابة وزارة الخارجية الأميركية (DoS) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٤/٢، ٢٠٢٠/٤/١٤، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠٢٠/٧/٦، ٢٠١٠/٧/٨، ٢٠١٠/٧/٨؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨؛ وزارة الخارجية الأميركية، استجابة مكتب السكان واللاجئين والمهجرين (PRM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٤٨٥- وزارة الخارجية الأميركية، استجابة مكتب السكان واللاجئين والمهجرين (PRM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٤٨٦- وزارة الخارجية الأميركية، استجابة مكتب السكان واللاجئين والمهجرين (PRM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٤٨٧- وزارة الخارجية الأميركية، استجابة مكتب السكان واللاجئين والمهجرين (PRM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٤٨٨- وزارة الخارجية الأميركية، استجابة مكتب السكان واللاجئين والمهجرين (PRM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٤٨٩- وزارة الخارجية الأميركية، استجابة مكتب السكان واللاجئين والمهجرين (PRM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٤٩٠- وزارة الخارجية الأميركية، استجابة مكتب السكان واللاجئين والمهجرين (PRM) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢؛ نشرة صحفية للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، "مبادرة ديالي: تسهيل العودة وخلق ظروف لإعادة الدمج المستدام"، www.iauiraq.org/reports/UNHCR/UNHCRDiyala-Initiative.pdf، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٧.
- ٤٩١- نشرة صحفية للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، نشرة صحفية للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR)، اللاجئين العراقيون السابقون يستفيدون من برنامج الايواء للمفوضية العليا للاجئين في الجنوب"، ٢٠١٠/٥/٢٠، www.unhcr.org/4bf53b636.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٥؛ استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٥.
- ٤٩٢- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش

- العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٦.
- ٤٩٣- وزارة الدفاع الأميركية (DoD)، *قياس الاستقرار والأمن في العراق*، ٢٠١٠/٤/٢٩، صفحة ٢٦.
- ٤٩٤- السفارة الأميركية في بغداد، "المحور العراقي: انتقال القطاع الصحي والتعليمي، الانتقال نحو تنمية مستدامة"، رقم ١٦٧٣، ٢٠١٠/٦/١٠، الصفحة ٣-٤.
- ٤٩٥- فريق البلاد التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل مساعدة الأمم المتحدة الإنمائية للعراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، صفحة ٢٩ و٤٧.
- ٤٩٦- سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)، *صفحة وقائع لإعادة الاعمار التراكمي*، ٢٠٢٠/٧/١.
- ٤٩٧- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠١٠/٧/٣؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، *المعيار العالمي*، ٢٠١٠/٧/٢؛ تقرير تدقيق المفتش العام PA-08-160، "مستشفى البصرة للأطفال، البصرة، العراق"، ٢٠٠٩/٧/٨٢؛ تقرير تدقيق المفتش العام رقم 06-026، "مراجعة ادارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمشروع مستشفى الاطفال في البصرة"، ٢٠٠٦/٧/٣١.
- ٤٩٨- استجابة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠١٠/٧/٣.
- ٤٩٩- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، *المعيار العالمي*، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٠٠- استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/٢.
- ٥٠١- السفارة الأميركية في بغداد، "المحور العراقي: انتقال القطاع الصحي والتعليمي، الانتقال نحو تنمية مستدامة"، رقم ١٦٧٣، ٢٠١٠/٦/١٠، الصفحة ٨.
- ٥٠٢- السفارة الأميركية في بغداد، "المحور العراقي: انتقال القطاع الصحي والتعليمي، الانتقال نحو تنمية مستدامة"، رقم ١٦٧٣، ٢٠١٠/٦/١٠، الصفحة ٦-٧.
- ٥٠٣- السفارة الأميركية في بغداد، "المحور العراقي: انتقال القطاع الصحي والتعليمي، الانتقال نحو تنمية مستدامة"، رقم ١٦٧٣، ٢٠١٠/٦/١٠، الصفحة ٧.
- ٥٠٤- السفارة الأميركية في بغداد، "المحور العراقي: انتقال القطاع الصحي والتعليمي، الانتقال نحو تنمية مستدامة"، رقم ١٦٧٣، ٢٠١٠/٦/١٠، الصفحة ١٠-١١؛ استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٢٠/٧/١٤.
- ٥٠٥- نشرة صحفية للجامعة الأميركية في العراق، "أول جامعة للفنون الحرة في العراق تتلقى اعتماد اميركي للمعايير العالية"، ٢٠١٠/٦/٢٩، www.uis.org/?q=node/368، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٧.
- ٥٠٦- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، *المعيار العالمي*، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٠٧- السفارة الأميركية في بغداد، "فرق اعادة اعمار المحافظات"، iraq-prt.usembassy.gov/public-health.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/٢٠.
- ٥٠٨- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، *المعيار العالمي*، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٠٩- الحكومة العراقية، وزارة التعليم العالي، "سنة الاف وحدة سكنية لموظفي التعليم العالي"، ٢٠١٠/٦/٧، www.moheer.gov.iq/EngPages/indexE.htm، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٨.
- ٥١٠- الحكومة العراقية، لجنة الاستثمار الوطني (NIC)، لجنة الاستثمار الوطني توافق على رخصتي استثمار لبناء مجمع الاميرييه السكني"، ٢٠١٠/٤/١٤، www.investpromo.gov.iq/index.php?id=13&items=99، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٠.
- ٥١١- حكومة إقليم كردستان، "الشركات في الإمارات العربية المتحدة تنظر في إمكانية استثمار ٧٠ مليار دولار في العراق"، *اخبار الخليج*، ٢٠٢٠/٥/٢٣.

هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٨. web.krg.org/articles/detail.asp?lngnr=12&smap=02010200&rnr=73&anr=35214، ثم الدخول إلى

- ٥١٢- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠٢٠/٧/٦، ٢٠٢٠/٧/٨؛ استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.
- ٥١٣- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير الفئات لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد للقوات الأميركية في العراق (USF-I CERP)، ٢٠١٠/٧/٢؛ استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٣٠، ٢٠٢٠/٧/٦، ٢٠٢٠/٧/٨؛ استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٨ ٢٠١٠/٧/١٣؛ استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/٤/٢.
- ٥١٤- السفارة الأميركية في بغداد، استجابة ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٣.
- ٥١٥- وحدة استخبارات الايكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠١٠/٥، الصفحة ١٤.
- ٥١٦- وحدة استخبارات الايكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠١٠/٥، الصفحة ١٤؛ صندوق النقد الدولي (IMF)، تقرير رقم ٧٢/١٠، العراق: تقرير الموظفين لاستشارات المادة الرابعة للعام ٢٠٠٩ وطلب ترتيبات احتياطية، ٢٠١٠/٣/١٦، صفحة ٢١.
- ٥١٧- المصرف المركزي العراقي "المؤشرات المالية الرئيسية"، www.cbi.iq/index.php?pid=Statistics، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥١٨- الحكومة العراقية، المصرف المركزي العراقي، www.cbi.iq، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٩.
- ٥١٩- صندوق النقد الدولي (IMF)، تقرير رقم ٧٢/١٠، العراق: تقرير الموظفين لاستشارات المادة الرابعة للعام ٢٠٠٩ وطلب ترتيبات احتياطية، ٢٠١٠/٣/١٦، صفحة ٤١.
- ٥٢٠- مقابلة مستشار عالي المستوى لحاكم المصرف المركزي مع المفتش العام، ٢٠١٠/٥/٢٥.
- ٥٢١- صندوق النقد الدولي (IMF)، تقرير رقم ٧٢/١٠، العراق: تقرير الموظفين لاستشارات المادة الرابعة للعام ٢٠٠٩ وطلب ترتيبات احتياطية، ٢٠١٠/٣/١٦، صفحة ٩.
- ٥٢٢- المصرف المركزي العراقي، البيانات الاقتصادية، www.cbi.iq/index.php?pid=Home، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٢٣- فريق البلاد التابع للأمم المتحدة (UNCT)، العراق، إطار عمل مساعدة الأمم المتحدة الإنمائية للعراق ٢٠١١-٢٠١٤، ٢٠١٠/٥/١١، الصفحة ٢٣.
- ٥٢٤- وحدة استخبارات الايكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠١٠/٥، الصفحة ١٤.
- ٥٢٥- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٢٦- وحدة استخبارات الايكونوميست، تقرير البلدان: العراق، ٢٠١٠/٥، الصفحة ١٤.
- ٥٢٧- وزارة الخارجية العراقية (DoS)، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى- العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١.
- ٥٢٨- نشرة صحفية للمجلس الدولي للمشورة والرقابة في العراق (IAMB)، "بيان للمجلس الدولي الاستشاري والرقابي لصندوق تنمية العراق"، ٢٠١٠/٥/١٣، www.iamb.info/pr/pr051310.htm، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٧.

- ٥٢٩- نشرة صحفية لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة (UNSCR)، "مجلس الامن يمدد حتى ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠١٠ ترتيبات ايداع عائدات مبيعات النفط والغاز في صندوق تنمية العراق"، ٢٠٠٩/١٢/٢١، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٧.
- ٥٣٠- تقرير تدقيق المفتش العام رقم 10-006، "صندوق تنمية العراق: هناك حاجة لتوجيه السياسات المتبعة لتحسين المساءلة بخصوص الأموال التي يديرها سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE)"، ٢٠٠٩/١٠/٢٩.
- ٥٣١- الحكومة العراقية، المنظمة المركزية لتقنية المعلومات والإحصاءات (COSIT)، "استطلاع الوضع الاجتماعي-الاقتصادي للأسر العراقية، ٢٠٠٨، صفحة ٣٢٥.
- ٥٣٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/١/١٥.
- ٥٣٣- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٣٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٥٣٥- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٣٦- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٣٧- نشرة صحفية للسفارة الأميركية في بغداد، "البعثة التجارية الزراعية الأميركية العراقية تزور بغداد"، ٢٠١٠/٦/٩، iraq.usembassy.gov/pr_06092010ag.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥.
- ٥٣٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٥٣٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٥٤٠- نشرة صحفية للسفارة الأميركية في بغداد، "البعثة التجارية الزراعية الأميركية العراقية تزور بغداد"، ٢٠١٠/٦/٩، iraq.usembassy.gov/pr_06092010ag.html، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥.
- ٥٤١- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، "العراق: التطلع إلى انتاج القمح بمستوى قريب من العادي في العام ٢٠١٠/٢٠١١، ٢٠١٠/٥/١٢، www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/05/iraq/، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥.
- ٥٤٢- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، "العراق: التطلع إلى انتاج القمح بمستوى قريب من العادي في العام ٢٠١٠/٢٠١١، ٢٠١٠/٥/١٢، www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/05/iraq/، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥.
- ٥٤٣- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، "العراق: التطلع إلى انتاج القمح بمستوى قريب من العادي في العام ٢٠١٠/٢٠١١، ٢٠١٠/٥/١٢، www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/05/iraq/، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥.
- ٥٤٤- استجابة وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٤٥- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، الشرق الأوسط: عدوى الصدأ الأصفر تؤثر على محاصيل القمح في المنطقة، www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/06/Middle%20East/، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٤٦- وكالة ناسا، مرصد الأرض، الصدأ الأصفر يلحق الضرر بالمحاصيل في الشرق الأوسط"، ٢٠١٠/٧/١، earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/view.php?id=44502، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٣.
- ٥٤٧- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، الشرق الأوسط: عدوى الصدأ الاصفر تؤثر على محاصيل القمح في المنطقة، www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/06/Middle%20East/، ثم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.

- ٥٤٨- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، "تحديث حول القمح-مشتريات مجلس الحبوب"، تقرير GAIN: العراق، ٢٠١٠/٦/١٣.
gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wheat%20Update%20-%20Grain%20Board%20Purchasing_Baghdad_Iraq_6-13-2010.pdf ، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٤٩- استجابة السفارة الاميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٥٥٠- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، "تحديث حول القمح-مشتريات مجلس الحبوب"، تقرير GAIN: العراق، ٢٠١٠/٦/١٣.
gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wheat%20Update%20-%20Grain%20Board%20Purchasing_Baghdad_Iraq_6-13-2010.pdf ، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٥١- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، "تحديث حول القمح-مشتريات مجلس الحبوب"، تقرير GAIN: العراق، ٢٠١٠/٦/١٣.
gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wheat%20Update%20-%20Grain%20Board%20Purchasing_Baghdad_Iraq_6-13-2010.pdf ، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٥٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٥٥٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٥٥٤- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، الشرق الأوسط: عدوى الصدا الاصفر تؤثر على محاصيل القمح في المنطقة، www.pecad.fas.usda.gov/highlights/2010/06/Middle%20East/ ، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٥٥- وزارة الزراعة الأميركية (USDA)، FAS، "تحديث حول القمح-مشتريات مجلس الحبوب"، تقرير GAIN: العراق، ٢٠١٠/٦/١٣.
gain.fas.usda.gov/Recent%20GAIN%20Publications/Wheat%20Update%20-%20Grain%20Board%20Purchasing_Baghdad_Iraq_6-13-2010.pdf ، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٥٦- نشرة صحفية للقوات الأميركية في العراق (USF-I)، "مواشي تمنح إلى كلية بغداد"، ٢٠١٠/٦/١٢، www.usf-iraq.com/news/headlines/livestock-donated-to-baghdad-college ، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٥٧- نشرة صحفية للقوات الأميركية في العراق (USF-I)، "مواشي يمنح إلى كلية بغداد"، ٢٠١٠/٦/١٢، www.usf-iraq.com/news/headlines/livestock-donated-to-baghdad-college ، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٥٨- نشرة صحفية للقوات الأميركية في العراق (USF-I)، "محافظة عراقية تحصل على كشف زراعي كامل" ٢٠١٠/٥/٢١، www.usf-iraq.com/news/headlines/iraqi-province-gets-agriculture-overhaul ، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٥٩- نشرة صحفية للقوات الأميركية في العراق (USF-I)، "محافظة عراقية تحصل على كشف زراعي كامل" ٢٠١٠/٥/٢١، www.usf-iraq.com/news/headlines/iraqi-province-gets-agriculture-overhaul ، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٦٠- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٦١- السفارة الاميركية في بغداد، استجابة ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١.
- ٥٦٢- السفارة الاميركية في بغداد، استجابة ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١.

- ٥٦٣- السفارة الاميركية في بغداد، استجابة ملحق وزارة المالية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٦/٢١.
- ٥٦٤- وزارة الأمن الوطني، التقرير اليومي للبنية التحتية للموارد المفتوحة، ٢٠١٠/٦/١٥، www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٦٥- وزارة الأمن الوطني، التقرير اليومي للبنية التحتية للموارد المفتوحة، ٢٠١٠/٦/١٥، www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٦٦- المصرف المركزي العراقي، المناقصة رقم (٢٠٢٠/٢)، ٢٠١٠/٥/٢٧، www.cbi.iq/index.php?pid=NewsAnnouncements/، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٦٧- وزارة الأمن الوطني، التقرير اليومي للبنية التحتية للموارد المفتوحة، ٢٠١٠/٦/١٥، www.dhs.gov/xlibrary/assets/DHS_Daily_Report_2010-06-15.pdf، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٣٠.
- ٥٦٨- نشرة صحفية للقوات الاميركية في العراق (USF-I)، "الولايات المتحدة والعراق شركاء في بنك بغداد"، ٢٠١٠/٥/٢١، www.usf-iraq.com/news/headlines/29769، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٦٩- نشرة صحفية للقوات الاميركية في العراق (USF-I)، "الولايات المتحدة والعراق شركاء في بنك بغداد"، ٢٠١٠/٥/٢١، www.usf-iraq.com/news/headlines/29769، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٧/٢.
- ٥٧٠- التقرير الأسبوعي لنشرة (MEES)، المجلد ٥٣، رقم ٢٤، ٢٠١٠/٦/١٤، صفحة ١٩.
- ٥٧١- منظمة التعاون الاقتصادي والانمائي (OECD) // "تصنيفات مخاطر البلدان"، ٢٠١٠/٤/٢، www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34169_1901105_1_1_1_37431,00.html، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٨.
- ٥٧٢- منظمة التعاون الاقتصادي والانمائي (OECD) // "تصنيفات مخاطر البلدان"، ٢٠١٠/٤/٢، www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34169_1901105_1_1_1_37431,00.html، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٨.
- ٥٧٣- نشرة صحفية للسفارة الاميركية في بغداد، "الشركات الاميركية تسعى إلى فرص تجارية في العراق"، ٢٠١٠/٦/٢١، www.oecd.org/document/49/0,3343,en_2649_34169_1901105_1_1_1_37431,00.html، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/٢٣.
- ٥٧٤- وزارة التجارة، إدارة التجارة الدولية (ITA)، webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:cGTn0FFaSa4J:trade.gov/iraq/+foster+wheel+basrah&cd=10&hl=en&ct=clnk&gl=us، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠٢٠/٦/١٥.
- ٥٧٥- حكومة إقليم كردستان، خطاب رئيس الوزراء برهم صالح ألقاه في لندن، "انباء مؤسسات مدنية قوية ومستقلة في إقليم كردستان"، ٢٠١٠/٦/١٥، www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=268&lngnr=12&smap=02040100&anr=35600، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٨.
- ٥٧٦- حكومة إقليم كردستان، خطاب رئيس الوزراء برهم صالح ألقاه في لندن، "انباء مؤسسات مدنية قوية ومستقلة في إقليم كردستان"، ٢٠١٠/٦/١٥، www.krg.org/articles/detail.asp?rnr=268&lngnr=12&smap=02040100&anr=35600، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٨.
- ٥٧٧- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، فريق عمليات الأعمال وترسيخ الاستقرار (TFBSO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.

- ٥٧٨- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، فريق عمليات الأعمال وترسيخ الاستقرار (TFBSO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠١٠/٧/١٤.
- ٥٧٩- نشرة صحفية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "البرنامج الجديد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية يساعد ٥٠٠ شاباً عراقياً في اكتساب المهارات، وإيجاد الوظائف وبدء أعمال جديدة"، ٢٠١٠/٥/٢٣، www.tijara-iraq.com/?pname=open&f=doc101468_newspik044b_web250px.jpg&id=1468&type=html&title=New_USAID_Program_to_Help_5,000_Young_Iraqis_Acquire_Skills_Find_Employment_Start_New_Businesses، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥.
- ٥٨٠- نشرة صحفية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "قطاع التمويلات الصغيرة العراقي يفتح مكتباً للفرع رقم ١٠٠"، ٢٠١٠/٦/٩، www.tijara-iraq.com/?pname=open&f=doc101481_newspik046a_web250px.jpg&id=1481&type=html&title=Iraqi_Microfinance_Industry_Opens_100th_Branch_Office، تم الدخول إلى هذا الموقع في ٢٠١٠/٦/١٥.

المختصرات والتعريفات

يتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

ACRONYMS	DEFINITIONS	ARABIC
ACA	Army Contracting Agency	وكالة العقود في الجيش
ACCO	Anticorruption Coordination Office	مكتب منسق مكافحة الفساد
ACWG	Anticorruption Working Group	مجموعة عمل مكافحة الفساد
ADUSD	(Program Support) Assistant Deputy Under Secretary of Defense for Program Support	(دعم البرامج) مساعد وكيل وزارة الدفاع لدعم البرامج
AFAA	Air Force Audit Agency	وكالة تدقيق حسابات القوات الجوية
AFCEE	U.S. Air Force Center for Engineering and the Environment	مركز القوات الجوية للامتياز البيئي
AQI	al-Qaeda in Iraq	القاعدة في العراق
AQM	Bureau of Acquisition Management (DoS)	مكتب إدارة الامتلاك (وزارة الخارجية)
ARCENT	U.S. Army Central Command	القيادة الوسطى للجيش الأميركي
ARCENT OCO	U.S. Army Central Command Overseas Contingency Operations	العمليات الطارئة خارج البلاد للقيادة الوسطى للجيش الأميركي
Army	U.S. Department of the Army	وزارة الجيش الأميركي
Army	IG Army Inspector General	المفتش العام لدى الجيش (الأميركي)
ATC	Air Traffic Control	مراقبة الحركة الجوية
BAC	Bawabet Al Amer Company	شركة بوابة العامر
BBG	Broadcasting Board of Governors	مجلس حكام محطات البث
BCT	Brigade Combat Team	فريق لواء قتالي
BEZ	Baghdad International Airport Economic Zone	المنطقة الاقتصادية في مطار بغداد الدولي
BIA	Basrah International Airport	مطار البصرة الدولي
BIAP	Baghdad International Airport	مطار بغداد الدولي
BP	British Petroleum	شركة البترول البريطانية
BPD	Barrels Per Day	برميل باليوم
BSA	Board of Supreme Audit	مجلس التدقيق الأعلى
C3	CENTCOM Contracting Command	قيادة العقود في القيادة الوسطى الأميركية

المختصرات والتعريفات

CAC	Common Access Card	بطاقة دخول عامة
CAG	Community Action Group	مجموعة عمل المجتمع الأهلي
CAP	Community Action Program	برنامج عمل المجتمع الأهلي
CBI	Central Bank of Iraq	المصرف المركزي العراقي
CBJ	Congressional Budget Justification	تبريرات موازنة الكونغرس
CBO	Congressional Budget Office	مكتب موازنة الكونغرس
CCC-I	Central Criminal Court of Iraq	المحاكم الجنائية المركزية العراقية
CENTCOM U.S	Central Command	القيادة الوسطى الأميركية
CERP	Commander's Emergency Response Program	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
CIA	U.S. Central Intelligence Agency	وكالة الاستخبارات المركزية الاميركية
CID	U.S Army Criminal Investigation Command	قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميركي
CID-MPFU	U.S. Army Criminal Investigation Command-Major Procurement Fraud Unit	وحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميركي
CMIR	Currency/Monetary Instruments Transaction	معاملة أدوات نقدية/مالية
CNOOC	China National Offshore Oil Corporation	الشركة الصينية الوطنية للتنقيب عن النفط في البحر
CNPC	China National Petroleum Company	شركة البترول الوطنية الصينية
COFE	Committee of Financial Experts	لجنة من الخبراء الماليين
COI	Commission on Integrity (previously known as Commission on Public Integrity)	هيئة النزاهة (كانت تعرف سابقاً بهيئة النزاهة العامة)
CoM	Council of Ministers	مجلس الوزراء
COM	Chief of Mission	رئيس البعثة (الدبلوماسية)
CoR:	Council of Representatives (GOI)	مجلس النواب (الحكومة العراقية)
COR	Contracting Officer's Representative	ممثل ضابط العقود
COSIT	Central Organization for Statistics and Information Technology	المنظمة المركزية لتكنولوجيا المعلومات والإحصاءات
CPA	Coalition Provisional Authority	سلطة الائتلاف المؤقتة

المختصرات والتعريفات

CPJ	Committee to Protect Journalists	لجنة حماية الصحفيين
CRS	Congressional Research Service (Library of Congress)	خدمة أبحاث الكونغرس (مكتبة الكونغرس)
CSH	Child Survival and Health	بقاء وصحة الأطفال
CSP	Community Stabilization Program	برنامج استقرار المجتمع الأهلي
CWC	Commission on Wartime Contracting in Iraq and Afghanistan	لجنة التعاقد خلال الحرب في العراق وأفغانستان
CY	Calendar Year	سنة تقويمية
DAI	Development Alternatives International	البدائل الإنمائية الدولية
DCAA	Defense Contract Audit Agency	وكالة تدقيق العقود الدفاعية
DCG-O	Deputy Commanding General for Operations	نائب اللواء القائد للعمليات
DCIS	Defense Criminal Investigative Service	دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع الأميركية
DCM	Deputy Chief of Mission	نائب رئيس البعثة (الدبلوماسية)
DFAS	Defense Finance and Accounting Service	مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية في وزارة الدفاع (الأميركية)
DFI	Development Fund for Iraq	صندوق تنمية العراق
DHS	U.S. Department of Homeland Security	وزارة الأمن الوطني الأميركية
DoD	Department of Defense	وزارة الدفاع الأميركية
DoS OIG	Department of State Office of Inspector General	مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية الأميركية
DOI	Daughters of Iraq	بنات العراق
DoJ	Department of Justice	وزارة العدل الأميركية
DoL	Department of Labor	وزارة العمل الأميركية
DoS	Department of State	وزارة الخارجية الأميركية
DoS OIG	Department of State Office of Inspector General	مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية
DPL	Development Policy Loan (World Bank)	قرض السياسات الإنمائية (البنك الدولي)
DRL	Bureau of Democracy, Human Rights and Labor	مكتب الديمقراطية وحقوق الإنسان والعمل
DTM	Directive-Type Memorandum	مذكرة من النوع التوجيهي (الأمر)
ECA	Bureau of Educational and Cultural Affairs	مكتب الشؤون التعليمية والثقافية
EIA	Energy Information Administration (DoE)	إدارة معلومات الطاقة (في وزارة الطاقة الأميركية)

المختصرات والتعريفات

ELPS	Excluded Parties List System	نظام قوائم الأحزاب المستثناة
EPC	Engineering, Procurement, and Construction Contractor (MOE)	مقاول هندسة، ومشتريات، وإنشاءات
EPP	Enduring Presence Post	مركز للوجود الدائم
EPRTs	Embedded Provincial Reconstruction Team	فرق إعادة الإعمار المرافقة
ERMA	Emergency Refugee and Migration Assistance	المساعدة الطارئة للاجئين والمهجرين
ESF	Emergency Support Funds	أموال الدعم للطوارئ
ETEC	Embassy Technical Education Committee	لجنة التعليم الفني للسفارة
EU	European Union	الاتحاد الأوروبي
FAPIS	Federal Awardee Performance and Integrity Information System	النظام الفدرالي للمعلومات حول أداء ونزاهة الفائزين بالعقود
FBI	Federal Bureau of Investigation	مكتب التحقيقات الفدرالي
FinCEN	Financial Crimes Enforcement Network	شبكة فرض تطبيق القانون في الجرائم المالية
FMS	Foreign Military Sales	مبيعات الأسلحة الخارجية
FPS	Facilities Protection Service	خدمة حماية المرافق
FY	Fiscal Year	سنة مالية
GAO	Government Accountability Office	مكتب المحاسبة الحكومية
GDP	Gross Domestic Product	الناتج المحلي الإجمالي
GE	General Electric	شركة جنرال إلكتريك
GEO	Governorate Electoral Office	مكتب الانتخاب في المحافظة
GOI	Government of Iraq	الحكومة العراقية
GSA	General Services Administration	إدارة الخدمات العامة
HJC	Higher Judicial Council	مجلس القضاء الأعلى
IA	Iraqi Army	الجيش العراقي
IAMB	International Advisory and Monitoring Board	المجلس الدولي للمشورة والرقابة في العراق
IAP	Iraqi Associates Program	برنامج الشركاء العراقيين
ICAA	Iraqi Civil Aviation Authority	هيئة الطيران المدني العراقية
ICBG	Iraqi Company for Bank Guarantees	الشركة العراقية للكفالات المصرفية
ICE	Immigration and Customs Enforcement	وكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك

المختصرات والتعريفات

I-CERP	Iraq-Commander's Emergency Response Program	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق
ICI	International Compact for Iraq (GOI and UN)	الميثاق الدولي للعراق
ICITAP	International Criminal Investigative Training Assistance program	البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية
ICOEE	Iraq Crude Oil Export Expansion	توسيع صادرات النفط الخام العراقي
IDA	International Development Association (World Bank)	هيئة التنمية الدولية (البنك الدولي)
IDA	International Disaster Assistance (USAID humanitarian assistance fund)	المساعدة الدولية للكوارث (صندوق الوكالة الأميركية للتنمية للمساعدات الانسانية)
IDFA	International Disaster and Famine Assistance	المساعدة الدولية للكوارث والمجاعة
IDP	Internally Displaced Person	مهجرون في الداخل
IED	Improvised Explosive Device	جهاز تفجير مرتجل (يدوي الصنع)
IG	Inspector General	المفتش العام
IGB	Iraqi Grain Board	مجلس الحبوب العراقي
IHCHR	Independent High Commission for Human Rights	المفوضية العليا المستقلة لحقوق الإنسان
IHEC	Independent High Electoral Commission	اللجنة الانتخابية العليا المستقلة
IIGC	Iraq Inspectors General Council	مجلس المفتشين العاميين العراقي
IIRTF	Iraq Investment and Reconstruction Task Force (U.S. Dept of Commerce)	فريق الاستثمار وإعادة الاعمار في العراق (وزارة التجارة الأميركية)
IMET	International Military Education and Training	التعليم والتدريب العسكري الدولي
IMF	International Monetary Fund	صندوق النقد الدولي
INA	Iraqi National Alliance	التحالف الوطني العراقي
INCLE	International Narcotics Control and Law Enforcement Fund (INL)	الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون
INL	Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (DoS)	مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية الأميركية)
IOM	International Organization for Migration	المنظمة الدولية للهجرة
IP	Iraqi Police	الشرطة العراقية
IPA	International Police Advisor	مستشار الشرطة الدولي
IPP	Independent Power Producers	منتجو الطاقة المستقلون
IPS	Iraqi Police Service	خدمة الشرطة العراقية

المختصرات والتعريفات

IPTP	Iraqi Police Training Program	برنامج تدريب قوات الشرطة العراقية
IRAP	Iraq Rapid Assistance Program	برنامج المساعدة السريعة للعراق
IRFFI	International Reconstruction Fund Facility for Iraq	الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق
IRI	International Republican Institute	المعهد الجمهوري الدولي
IRMO	Iraq Reconstruction Management Office (DoS)	مكتب إدارة إعادة اعمار العراق (وزارة الخارجية الأميركية)
IRMS	Iraq Reconstruction Management System	نظام إدارة إعادة إعمار العراق
IRR	Iraqi Republic Railway Company	سكة حديد الجمهورية العراقية
IRRF	Iraq Relief and Reconstruction Fund	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
IRS	Internal Revenue Service	دائرة ضريبة الدخل (الأميركية)
IRS-CI	Internal Revenue Service Criminal Investigation Division	دائرة ضريبة الدخل- فرع التحقيقات الجنائية
ISAM	Iraq Security Assistance Mission	بعثة المساعدة للأمن العراقي
ISF	Iraqi Security Forces	قوات الأمن العراقية
ISFF	Iraq Security Forces Fund	صندوق قوات الأمن العراقية
ISOC	Iraq Status of Construction	وضع البناء في العراق
ISPO	Iraq Strategic Partnership Office (replaces ITAO)	مكتب الشراكة الاستراتيجية العراقية (يحل محل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق)
ITAM	Iraq Training and Advisory Mission	البعثة التدريبية والاستشارية للعراق
ITAO	Iraq Transition Assistance Office	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق
ITF	Iraq Trust Fund	صندوق الائتمان العراقي
IZ	International Zone	المنطقة الدولية
JCC-I/A	Joint Contracting Command-Iraq/Afghanistan	القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان
JCP	Joint Campaign Plan	مخطط الحملة المشتركة
JDI	Judicial Development Institute	معهد التنمية القضائية
JIATF	U.S. Joint Interagency Task Force	قوة المهمة المشتركة الأميركية بين الوكالات
KBR	Kellogg Brown and Root Services, Inc.	شركة كيلوغ، براون أند روت، انك
Km	Kilometer	كيلومتر

المختصرات والتعريفات

KRG	Kurdistan Regional Government	حكومة إقليم كردستان
kV	kilovolt	كيلو فولت
LGP	Local Governance Program	برنامج نظام الحكم المحلي
LOA	Letter Of Authorization	كتاب تفويض
LOGCAP	Logistics Civil Augmentation Program	برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني
LPG	Liquid Petroleum Gas	غاز البترول المُسيّل
MAAWS	Money as a Weapon System	المال كنظام سلاح
MBPD	Million Barrels Per Day	مليون برميل في اليوم
MCD	Ministerial Capacity Development Program (ITAO)	برنامج تطوير قدرات الوزارات (مكتب المساعدة الانتقالية للعراق)
MCF	Million Cubic Feet	مليون قدم مكعب
MCTF	Major Crimes Task Force	فريق المهمات للجرائم الرئيسية
MEES	Middle East Economic Survey (publication resource)	مجلة المسح الاقتصادي للشرق الأوسط (مورد للمطبوعات)
MFI	Microfinance Institution	مؤسسة التمويل الصغيرة
MMQA	Maturity Model Quarterly Assessment	تقييم ربع سنوي لنموذج النضوج
MNC-I:	Multi-National Corps-Iraq	الفيلق المتعدد الجنسيات في بغداد
MNF-I	Multi-National Force-Iraq	القوات المتعددة الجنسيات في العراق
MNSTC-I	Multi-National Security Transition Command-Iraq	القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
MoC	Ministry of Communications	وزارة الاتصالات العراقية
MoD	Ministry of Defense	وزارة الدفاع العراقية
MoDM	Ministry of Displacement and Migration	وزارة المهجرين والهجرة العراقية
MoE	Ministry of Electricity	وزارة الكهرباء العراقية
MoF	Ministry of Finance	وزارة المالية العراقية
MoH	Ministry of Health	وزارة الصحة العراقية
MoI	Ministry of Interior	وزارة الداخلية العراقية
MoJ	Ministry of Justice	وزارة العدل العراقية
MoPDC	Ministry of Planning and Development Cooperation	وزارة التخطيط والتعاون الإنمائي العراقية
MoT	Ministry of Transportation	وزارة النقل العراقية
MoU	Memorandum of Understanding	مذكرة تفاهم
MoWR	Ministry of Water Resources	وزارة الموارد المائية العراقية
MRA	Migration and Refugee Assistance	مساعدة الهجرة والمهجرين
MSI	Management Systems	شركة مانيجمنت سيستمز الدولية

المختصرات والتعريفات

	International, Inc.	
MW	Megawatt	ميغا واط
MWh	Megawatt-hour	ميغا واط ساعة
NADR	Nonproliferation, Anti-Terrorism, Demining, and Related Programs	برامج عدم انتشار الأسلحة النووية، ومكافحة الإرهاب ونزع الألغام والبرامج العائدة لها
NCD	National Capacity Development Program (USAID) (also referred to as <i>Tatweer</i>)	إنماء القدرات القومية (وتسمى "تطوير" أيضاً)
NCIS	Naval Criminal Investigative Service	وكالة التحريات الإجرامية في سلاح البحرية الأميركية
NCO	non-commissioned officer	ضابط صف
NDAA	National Defense Authorization Act	قانون تفويض الدفاع القومي (الأميركي)
NDP	National Development Plan	خطة التنمية الوطنية (العراقية)
NDS	National Development Strategy (GOI and World Bank)	استراتيجية التنمية الوطنية (الحكومة العراقية والبنك الدولي)
NEA-I	Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq (DoS)	مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق (وزارة الخارجية الأميركية)
NEC	New Embassy Compound	مجمع السفارة الجديد
NGO	Non-governmental Organization	منظمة غير حكومية
NIC	National Investment Commission	لجنة الاستثمار الوطني
O&M	Operations and Maintenance	التشغيل والصيانة
OECD	Organization for Economic Cooperation and Development	منظمة التعاون الاقتصادي والإنمائي
OFDA	Office of Foreign Disaster Assistance (USAID)	مكتب المساعدات لحالات الكوارث الخارجية
OHCHR	Office of the High Commissioner for Human Rights (UN)	مكتب المفوض الأعلى لحقوق الإنسان (الأمم المتحدة)
OHDACA	Overseas Humanitarian, Disaster, and Civic Aid	المساعدة الإنسانية والكوارث المدنية الخارجية
OIG	Office of Inspector General	مكتب المفتش العام
OMB	Office of Management and Budget	مكتب الإدارة والموازنة
OPA	Office of Provincial Affairs	مكتب شؤون المحافظات
ORHA	Office of Reconstruction and Humanitarian Assistance	مكتب إعادة الأعمار والمساعدات الإنسانية

المختصرات والتعريفات

OSD	Office of the Secretary of Defense	مكتب وزير الدفاع (الأميركي)
OTA	Office of Technical Assistance	مكتب المساعدة الفنية
OTI	Office of Transition Initiatives	مكتب المبادرات الانتقالية
OUSD(C)	Office of the Under Secretary of defense(Comptroller)	مكتب وكيل وزارة الدفاع (المراقب المالي)
P.L.	Public Law	قانون عام
PCO	Project and Contracting Office	مكتب المشاريع والعقود
PDP	Police Development Program	برنامج تطوير الشرطة
PDS	Public Distribution System	نظام التوزيع العام
PEG	Provincial Economic Growth	التنمية الاقتصادية للمحافظات
PEZ	Pipeline Exclusion Zone	مناطق الحظر حول خطوط أنابيب النفط
PFB	Procurement Fraud Branch	فرع الاحتيال في المشتريات
PHC	Primary Health Care	العناية الصحية الأولية
PIC	Provincial Investment Commission	لجنة الاستثمار في المحافظات
PIC	Provincial Iraqi Control	السيطرة العراقية على المحافظات
PJAK	Party of Free Life of Kurdistan	حزب الحياة الحرة في كردستان
PKK	Kurdish Workers Party	حزب العمال الكردستاني
PM	Prime Minister	رئيس الوزراء
PPP	Purchasing Power Parity	تعادل القوة الشرائية (للعلمة)
PRDC	Provincial Reconstruction Development Committees	لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات
PRM	Bureau of Population, Refugees and Migration	مكتب السكان واللاجئين والمهجرين
PRT	Provincial Reconstruction Team	فريق إعادة إعمار المحافظات
PSC	Private security companies	الشركات الأمنية الخاصة
PSD	Personal Security Detail	مرافقو الأمن الشخصي
PST	Provincial Support Team	فريق الدعم الإقليمي (في المحافظة)
QA	Quality Assurance	ضمان الجودة/النوعية
QC	Quality Control	مراقبة الجودة/النوعية
QRF	Quick Response Fund	صندوق الاستجابة السريعة
RAC	Return Assistance Center (GOI)	مركز مساعدة العائدين (الحكومة العراقية)
RoL	Rule of Law	حكم القانون
RoLA	Rule of Law Advisor	مستشار حكم القانون
ROLC	Rule of Law Complex	مجمع حكم القانون
RoLC	Rule of Law Coordinator	منسق حكم القانون
RRT	Regional Reconstruction Team	فريق إعادة الاعمار الإقليمي
RSO	Regional Security Office	مكتب الأمن الإقليمي
SA	Security Agreement	اتفاقية أمنية
Sadrist	Independent Liberals Trend	اتجاه الأحرار المستقلين (الصدريين)

المختصرات والتعريفات

SBA	Stand-By Arrangement	ترتيبات تمويل احتياطية (صندوق النقد الدولي)
SFA	Strategic Framework Agreement	اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي
SIGAR	Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction	المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان
SIGIR	Special Inspector General for Iraq Reconstruction	المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
SIGPRO	SIGIR Prosecutorial Initiative	المبادرة الاتهامية للمفتش العام
SIV	Special Immigrant Visa	تأشيرة الهجرة الخاصة
SOF	Iraqi Special Operations Forces	قوات العمليات الخاصة العراقية
SOI	Sons of Iraq	منظمة أبناء العراق
SoL	State of Law	دولة القانون
SOW	Statement of Work	بيان العمل
SPOT	Synchronized Predeployment and Operational Tracker	نظام التعقب المتزامن المسبق للانتشار والعملائي
<i>Tatweer</i>	National Capacity Development Program (USAID)	"تطوير" - برنامج تطوير القدرات الوطني (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)
TBI	Trade Bank of Iraq	بنك التجارة العراقي
TCA	Trade and Cooperation Agreement	اتفاقية تجارة وتعاون
TFBSO	Task Force for Business and Stability Operations (DoD)	فريق عمليات الاعمال وترسيخ الاستقرار (وزارة الدفاع الأميركية)
<i>Tijara</i>	Provincial Economic Growth Program (USAID)	برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (الوكالة الأميركية للتنمية الدولية)
TPOC	Turkish Petroleum Overseas Company	شركة البترول العراقية الخارجية (عبر البحار)
Treasury	U.S. Department of Treasury	وزارة المالية الأميركية
UK	United Kingdom	المملكة المتحدة
UN	United Nations	الأمم المتحدة
UNAMI UN	UN Assistance Mission for Iraq	بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة
UNCAC	United Nations Convention Against Corruption	اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد
UNCT	United Nations Country Team	فريق البلدان التابع للأمم المتحدة
UNDAF	UN Development Assistance Framework for Iraq	إطار عمل الأمم المتحدة للمساعدة الإنمائية للعراق
UNDG	United Nations Development Group	مجموعة التنمية التابعة للأمم المتحدة
UNDP	United Nations Development Programme	برنامج الأمم المتحدة للتنمية

المختصرات والتعريفات

UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees	المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة
UNPF	United Nations Population Fund	صندوق السكان التابع للأمم المتحدة
UNSCR	United Nations Security Council Resolution	قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة
USAAA	United States Army Audit Agency	وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي
USACC	U.S. Army Contracting Command	قيادة العقود في الجيش الاميركي
USACE	U.S. Army Corps of Engineers	سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي
USAID	U.S Agency for International Development	الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
USAID OE	USAID Operating Expenses	النفقات التشغيلية للوكالة الاميركية للتنمية الدولية
USAID OIG	US Agency for International Development Office of Inspector General	مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
USCENTCOM AOR	U.S. Central Command Areas of Responsibility	مجالات مسؤولية القيادة المركزية الأميركية
USDA	U.S. Department of Agriculture	وزارة الزراعة الأميركية
USETTI	U.S. Equipment Transfer to Iraq	نقل المعدات الاميركية إلى العراق
USF-I	U.S. Forces-Iraq	القوات الأميركية في العراق
USMC	U.S. Marine Corps	قوات مشاة البحرية الأميركية
USRAP	.S. Refugee Admissions Program	البرنامج الأميركي لقبول اللاجئين
USTDA	U.S. Trade and Development Agency	وكالة التجارة والتنمية الأميركية
WFP	World Food Programme	برنامج الغذاء العالمي
WTEC	Washington Technical Evaluation Committee Acronym Definition	تعريف مصطلحات لجنة واشنطن للتقييم الفني
