

المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

التقرير الربع سنوي
إلى كونغرس الولايات المتحدة

[30 تشرين الأول / أكتوبر 2008]



رسالة المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

يسرني أن أقدم هذا التقرير ربع السنوي التاسع عشر إلى الكونغرس وإلى وزير الدفاع والخارجية. يتزامن إصدار هذا التقرير مع الذكرى الرابعة لإنشاء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق من قِبَل الكونغرس للإشراف على استخدام الأموال الأميركية لإعادة إعمار العراق. يملك مكتب المفتش العام، وكالة المتابعة للمفتش العام لدى سلطة الائتلاف المؤقتة، تفويضاً واسعاً لرفع التقارير حول أكثر من ٥٠ مليار دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين. لقد شجع نجاح مكتب المفتش العام لإعادة إعمار العراق إنشاء مكاتب لمفتشين عامين خاصين إضافيين هذه السنة، هما المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR)، وقبل مدة قصيرة المفتش العام الخاص لبرنامج أصول الإغاثة المضطربة (SIGTAR). يقدم مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق المساعدة الإدارية لمكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR).

موضوع هذا التقرير ربع السنوي "وضع طبيعي ناشئ: تطور المساعدات الأميركية إلى عراق سيّد" يعكس الاعتراف بالتحوّل الأساسي في جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الأميركية هذه السنة، التي لقبها مكتب المفتش العام في كانون الثاني/يناير بـ "سنة الانتقال". تشمل السمات الأكثر بروزاً لهذا التحوّل الأساسي:

- الأهمية المتصاعدة لموازنة العراق الرأسمالية كمصدر تمويل رئيسي للمزيد من مشاريع إعادة الإعمار، والتي نتج عنها تراجع متناسب في المساعدات الأميركية.
- تعزيز قوات الأمن العراقية الذي بات ظاهراً في انتقال المسؤوليات الأمنية الذي تم مؤخراً في الأنبار وبابل إلى السيطرة العراقية.
- التحسن المتزايد في الخدمات الأساسية عبر الأراضي العراقية وقد سلط الضوء عليه خلال ربع السنة هذا إنتاج الكهرباء الذي ضرب رقماً قياسياً.
- السرعة المتزايدة للنشاط الاقتصادي التي حفزتها عائدات النفط العراقية غير المتوقعة التي قد تتعدل قريباً أثر التراجعات السريعة مؤخراً في أسعار النفط العالمية.
- التقدم الذي حققته حكومة المالكي بالنسبة لمواضيع تشريعية مُعيّنة، أبرزها تمرير القانون الانتخابي للمحافظات.


أنتجت فرق الإشراف التابعة لمكتب المفتش العام سبعة تقارير تدقيق وثلاث عمليات تفتيش تقييمية خلال ربع السنة هذا، شملت:

- مراجعة بتكليف من الكونغرس للتعريف عن ٣١٠ مقاولين قدّموا خدمات أمنية في العراق كلفت دافعي الضرائب الأميركيين حوالي ٦ مليارات دولار (مع ذهاب معظم هذه الأموال إلى ٧٧ مقاولاً).
- تدقيق طلبه السفير رايان كروكر تضمن مراجعة إجراءات السفارة الأميركية المتبعة في رفع التقارير حول مشاريع إعادة الإعمار إلى رئيس البعثة، وعثر على نقاط ضعف منهجية تعمل السفارة بسرعة على تحسينها.
- مراجعة مالية مركزة لعقدين كبيرين لبناء القدرات تابعين للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، عثرت على أوجه قصور هامة في مراجعة الفواتير ورفع التقارير عن النتائج، وفي إشراف الوكالة على العقود.

- تدقيق حول إنها عقود لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وجد عددا قليلاً جداً من الإجراءات الجزائية ضد المقاولين الذين أنهوا العقود بسبب التقصير.
- عملية تفتيش في نظام معالجة المياه المهدورة في الفلوجة، وجدت أن المشروع سوف يكلف ثلاثة أضعاف الكلفة المقدرة الأصلية، وسوف يتم إنجازه مع تأخر حوالي ثلاث سنوات وسوف يخدم ثلث عدد المنازل التي كان من المتوقع خدمتها أصلاً.

خلال ربع السنة هذا، سافرت إلى العراق للمرة العشرين منذ تعييني سنة ٢٠٠٤. خلال زيارات قمت بها إلى الفلوجة وحول بغداد، لاحظت تحسينات ظاهرة في الوضع الأمني. كان شارع حيفا، بنوع خاص، الذي كان من أخطر الأماكن في بغداد، يعج بالمتاجر في منتصف آب/أغسطس. لكن، كما لاحظ مؤخرًا الجنرال راي أديرنو، قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، لا يزال الوضع الأمني هشاً. سوف أسافر عما قريب إلى العراق لدعم مدققي ومفتشي ومحققي مكتب المفتش العام وعددهم ٣٥ فرداً، الذين يعملون في أرجاء البلاد على طيف واسع من قضايا الإشراف الحيوية.

أخيراً، في ١٩ تشرين الأول/أكتوبر، كنت مسروراً لاستلام ثلاث جوائز بالنيابة عن المفتش العام من رئيس مجلس النزاهة والفعالية: جائزة تكريماً لفقدان مدقق المفتش العام خلال الربيع الماضي، بول كنوفيرس (الذي قُتل في المنطقة الخضراء جراء هجوم بالصواريخ)، وجائزة اعتراف بالعمل المثالي الذي قامت به كامل مديرية التدقيقات لدى مكتب المفتش العام، وجائزة امتدحت التقرير الممتاز حول سد الموصل الذي أنتجته مديرية التفتيش لدى المفتش العام. إنني فخور بفريق المفتش العام، في كل من بغداد وآرلنغتون الذي يواصل القيام بمهمتنا المعقدة مع التزام دائم بأعلى المقاييس المهنية والإنتاجية والمثابرة.



ستيوارت دبليو بووين، جونيور
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

ملخص أداء مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
بتاريخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

التدقيق

١٢٩	التقارير الصادرة
٣٤٣	التوصيات الصادرة
٨١,٦٠٠,٠٠٠	الأموال التي تم توفيرها واسترجاعها بالدولار دولار
٢٢٤,٧٢٠,٠٠٠	الأموال التي أُعيد استخدامها بصورة أفضل بالدولار دولار
١٤,٩٣٠,٠٠٠	المدفوعات المشكوك بأمرها دولار

التفتيش

١٣١	التقييمات الصادرة حول المشاريع
٩٦	التقييمات المحدودة الصادرة التي جرت في الموقع
٦٤٠	تقييمات صور الأقمار الصناعية

التحقيقات

٣٧٤	التحقيقات التي استُهلكت
٣٠٧	التحقيقات التي أُقفلت أو أُحيلت
٦٧	التحقيقات المفتوحة
١٦	الاعتقالات
١٨	الاتهامات الموجهة
١١	الإدانات القضائية
١٧,٤١٤,٠٠٠	قيمة الأصول المسترجعة أو المصادرة بأوامر قضائية بالدولار دولار

الاتصالات عبر الخط المباشر بتاريخ ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨

١٨	فاكس
٧٥	هاتف
١١٠	حضور شخصي
٣٢٧	رسائل إلكترونية
٢٦	إحالات
٢٨	بريد
٩٧	موقع المفتش العام على الانترنت
٦٨١	مجموع الاتصالات عبر الخط المباشر

منتجات غير تدقيقية

٢٦	شهادات أمام الكونغرس
٣	التقارير الصادرة حول الدروس المكتسبة

القسم الرابع
إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار
العراق
تدقيقات المفتش العام
التفتيش
التحقيقات
الخط المباشر للمفتش العام
موقع المفتش العام على شبكة الإنترنت
تحديث معلومات التشريعات

القسم الخامس
إشراف الوكالات الأخرى
مقدمة
تدقيقات الوكالات الأخرى
تحقيقات الوكالات الأخرى
الهوامش

مختصرات وتعريفات


قائمة الملحقات*
الملحق أ: الشروط القانونية
الملحق ب: أثر عمليات المفتش العام
الملحق ج: المرجع الترافي لمصطلحات موازنة المفتش العام
الملحق د: المرجع الترافي للقطاعات
الملحق هـ: الأموال الأميركية المخصصة
الملحق و: حصص كل وكالة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
الملحق ز: الأموال العراقية
الملحق ح: الدعم الدولي للعراق
الملحق ط: تدقيقات المفتش العام المنجزة
الملحق ي: عمليات تفتيش المفتش العام المنجزة
الملحق ك: الاتهامات الموجهة والإدانات القضائية
الملحق ل: حالات العزل والحظر
الملحق م: ملخص تفصيلي عن إشراف الوكالات الأخرى
الملحق ن: ملخص الإشراف الأميركي في العراق

القسم الأول
ملاحظات المفتش العام الخاص لإعادة
إعمار العراق
عودة ناشئة إلى الحالة العادية: تطور المساعدات الأميركية إلى عراق سيّد الأشكال الدبلوماسية لعودة ناشئة الاستقلال الذاتي الوظيفي المتزايد في عراق سيّد الكونغرس يقرّ قانوناً جديداً حول إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار
إشراف مكتب المفتش العام
الكلفة البشرية

القسم الثاني
نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار
ملخص حول التمويل الأميركي
الاستخدامات والحصيلة
الأمن
البنية التحتية
الاقتصاد الحكم

القسم الثالث
نظرة إجمالية حول المحافظات
لقطات سريعة حول المحافظات
كرديستان
نينوى
نميم
صلاح الدين
الأنبار
ديالي
بغداد
الواسط
بابل
القادسية
كربلاء
النجف
المتنى
ذي - قار
ميسان
البصرة

* النص الكامل للتقرير ربع السنوي ونصف السنوي هذا للمفتش العام لإعادة إعمار العراق متوفر على موقع SIGIR على الموقع www.sigir.mil. إنه النص الرسمي للتقرير الذي يحتوي على كافة الملحقات والتصحيحات.

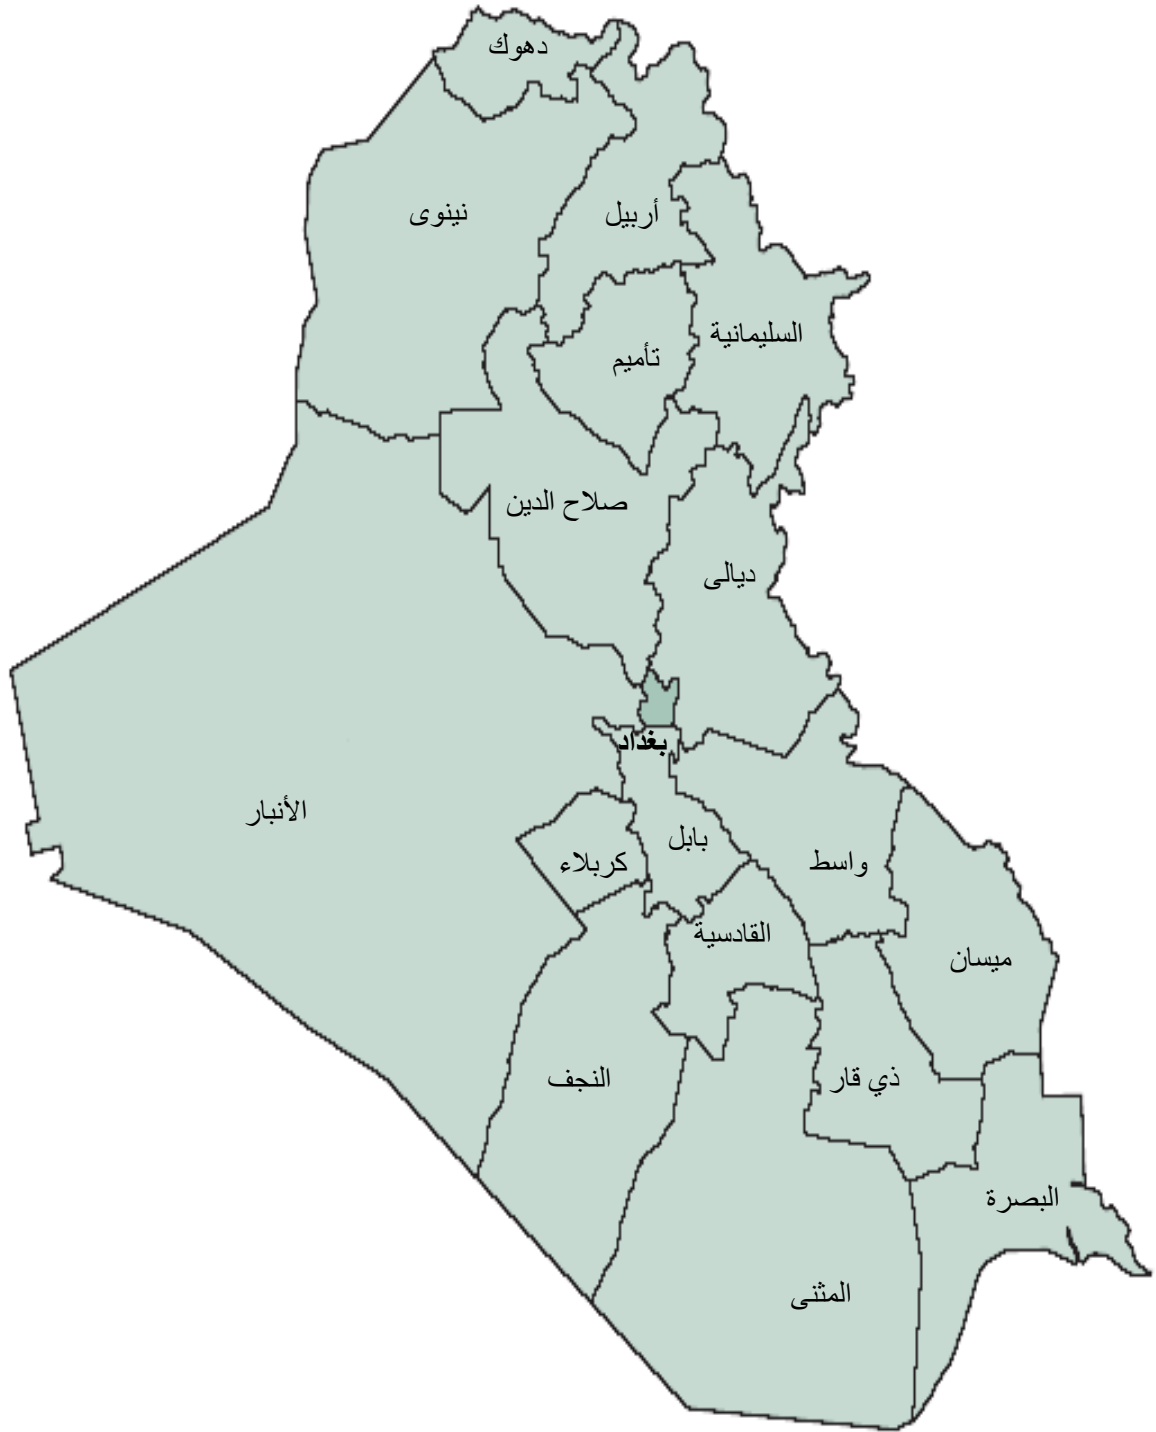

ملاحظات

مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق

وضع طبيعي ناشئ حديثاً : تطور المساعدات الأميركية إلى عراق سيّد

الحدود الدبلوماسية للوضع الطبيعي الناشئ حديثاً

الاستقلالية الذاتية الوظيفية المتزايدة لعراق سيّد

الكونغرس يُمرّر قانون جديد لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار

إشراف مكتب المفتش العام

الكلفة البشرية

القسم ١


وضع طبيعي ناشئ: تطور المساعدات الأميركية لعراق سيّد

شهد ربع السنة الثالث لسنة الانتقال ظهور وضع طبيعي ناشئ حديثاً في العراق. ففي الوقت الذي واصلت فيه المساعدات الأميركية لإعادة إعمار العراق التركيز على بناء القدرات المدنية والعسكرية، حقق العراق تقدماً على الجبهات الأمنية والسياسية والاقتصادية. فحوادث العنف هبطت إلى أدنى مستوياتها منذ سنة ٢٠٠٤، وقانون الانتخابات في المحافظات الذي طال انتظاره تم إقراره أخيراً؛ كما أن النشاط التجاري الذي حفّزته عائدات النفط العراقية غير المتوقعة، واصل الازدياد. لكن، كما لاحظ مؤخراً الجنرال راي أوديرنو، القائد العام الجديد للقوات المتعددة الجنسيات في العراق، (MNF-I)، "كان العراق دولة فاشلة (سنة ٢٠٠٦)، وأصبح في ٢٠٠٨، دولة طرية العود، ويتوجّب علينا تحويله إلى دولة مستقرة". من أجل دعم التقدم في هذا الاتجاه، يجب أن يُحسّن العراق أوضاعه الأمنية والخدمات الأساسية مثل الكهرباء، ومياه الشرب، وأنظمة الصرف الصحي وخدمات العناية الصحية.

عودة العراق الناشئة إلى الوضع الطبيعي تأتي على أثر – وإلى حدّ ما تنجم عن – إنجاز ونقل معظم مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار الأميركية الهامة. قبل خمس سنوات بالتام تقريباً، خصّص الكونغرس أكثر من ١٨ مليار دولار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF) لدعم البرنامج الطموح لإعادة بناء العراق التابع لسلطة الائتلاف المؤقتة (CPA). في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، انتهت صلاحيات الوكالات الأميركية لإلزام أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للالتزامات جديدة. عند هذه النقطة، كان قد تمّ الالتزام بنسبة ٩٧ بالمئة من هذه الأموال وإنفاق حوالي ٩٤ بالمئة^(٢). كذلك صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) الذي كان يتضمن ١٧,٩٤ مليار دولار بدأ يستهلك بحيث لم يبقَ فيه للإلزام سوى ٣,٨٥ مليار دولار، وللإنفاق ٦,٩٠ مليار دولار^(٣). صندوق دعم الاقتصاد (ESF) التابع لوزارة الخارجية، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) التابع لوزارة الدفاع بقي فيهما ١,٨١ مليار دولار و٠,٨٨ مليار دولار للإنفاق، على التوالي^(٤). باختصار، لا زال هناك حوالي ١٠,٧٢ مليار دولار من صناديق إعادة الإعمار الأميركية الكبرى بحاجة إلى الانفاق كما أن ٥,٢٦ مليار دولار لا تزال غير مُلزّمة. للحصول على نظرة إجمالية حول المبالغ المتوفرة للإلتزام بها في الصناديق الأربعة الكبرى، أنظر الشكل ١-١.

تُنفق برامج صندوق دعم الاقتصاد الأموال بوتيرة أبطأ بكثير من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد بسبب، إلى حدّ ما، استخدام وزارة الخارجية اتفاقيات الوكالات التي تحوّل أموال صندوق دعم الاقتصاد إلى وزارة الدفاع أو إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لأجل التنفيذ. الغريب أن وزارة الخارجية ذكرت أنه على الرغم من أن ١٠٠ بالمئة من أموال صندوق دعم الاقتصاد لسنة ٢٠٠٨ قد تمّ اللاتلزام بها، فإن صفر المئة منها قد أنفق خلال ربع السنة هذا. للاطلاع على الملخص التنفيذي لتدقيق مكتب المفتش العام حول هذا الموضوع، أنظر القسم ٤.

الشكل ١-١
رصيد الصناديق الأربعة الكبرى
بمليارات الدولارات

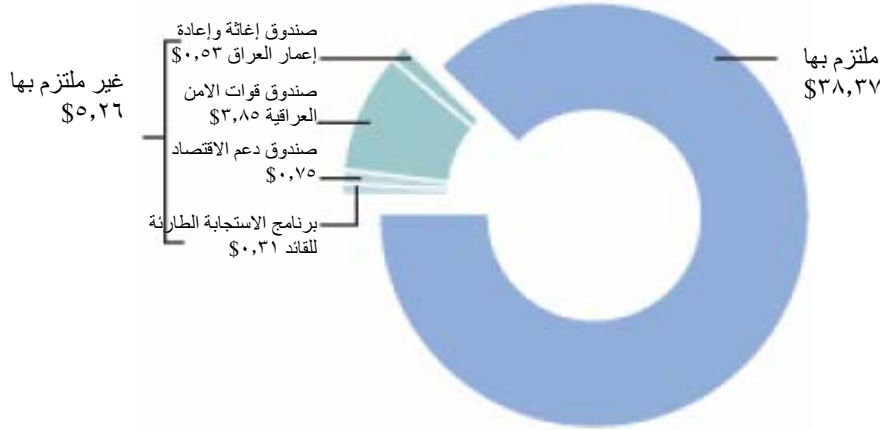

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

المصادر: وزارة الخارجية، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١؛ مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ وزارة الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/١٠/٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٤ و ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الرئيسية، ٢٠٠٨/١٠/٢.

المخصصات التكميلية التي أقرها الكونغرس خلال ربع السنة الماضي، فرضت شروطاً لاستخدام بعض أنواع المساعدات الجديدة للعراق. مثلاً، حظر الكونغرس إنفاق المخصصات الجديدة على السجون وطالب بعرض الخطط التفصيلية قبل استخدام الأموال الأخرى المُعيّنة. افترضت شروط المخصصات التكميلية على الحكومة العراقية أن تقابل بعض المساعدات الخارجية الأميركية بالمثل على أساس دولار لكل دولار. خلال ربع السنة هذا، عدّدت الهيئة الأميركية الرئيسية المكلفة بمراقبة تقيّد الحكومة العراقية بشروط المماثلة هذه المخصصات الرأسمالية في موازنة الحكومة العراقية، واعتبرتها أموالاً مماثلة.

فرض قانون دانكان هانتز (NDAA) لصلاحيات الدفاع القومي الذي صدر مؤخراً للسنة المالية ٢٠٠٩ سقف مليوني دولار كـمبلغ لأموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي يمكن لوزارة الدفاع أن تخصصها لأي مشروع فردي. ويفرض أيضاً قانون دانكان هانتز لصلاحيات الدفاع القومي على وزير الدفاع الموافقة على مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي تزيد كلفتها عن مليون دولار والتأكيد على أن المشروع سوف يُلبّي حاجات العراق الملحة للإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار.

بالنسبة للتشكيلة الحالية ومتوسط كلفة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، أنظر الشكل ٢-١.

إضافة إلى فرض سقف على أموال صندوق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي يمكن لوزارة الدفاع استخدامها في مشاريع إعادة الإعمار، يطالب قانون الترخيص للدفاع القومي :


- الحكومة الأميركية بضمان استخدام الأموال العراقية لدفع تكاليف تدريب وتجهيز ودعم قوات الأمن العراقية.
- الحكومة الأميركية البدء بمفاوضات مع الحكومة العراقية حول تقاسم تكاليف العمليات المشتركة.
- بتوسيع أنواع الحوادث الأمنية التي يجب على مقاولي الأمن الخاص العاملين في مناطق العمليات القتالية رفع التقارير حولها.
- بتحديد فترة بعض العقود غير التنافسية بسنة واحدة.
- بوضع أنظمة إضافية حول استخدام العقود التي تُستردّ تكاليفها.
- بوضع قوانين إضافية للوكالات غير التابعة لوزارة الدفاع للحد أكثر ما يمكن من الاستخدام المفرط لطبقات المقاولين من الباطن الذي لا يضيف أي قيمة تذكر، ولضمان أن لا يتلقى المقاولون أو مقاولو الباطن تكاليف أو أرباح غير مباشرة لقاء الأشغال التي يؤدونها عبر مقاولين من الباطن أدنى طبقة ولا يضيف إليها المقاول أي قيمة تذكر.
- بفرض حظر على استخدام الأموال لإنشاء قواعد للإقامة الدائمة للقوات الأميركية في العراق.

الشكل ٢-١

تشكيلة ومتوسط كلفة مشاريع

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠٠٤-٢٠٠٨

بملايين الدولارات

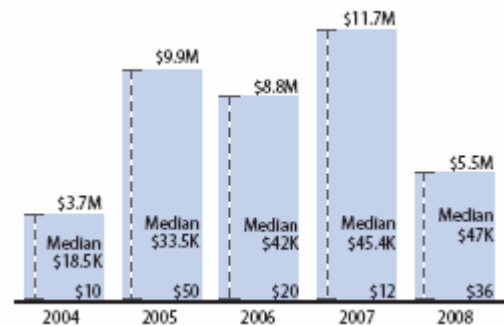

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. يشمل المشاريع المنجزة والجارية

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، ملف إكسل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠٠٨/١٠/٣

الحدود الدبلوماسية للوضع الطبيعي الناشئ حديثاً

من المتوقع أن يُحدّد اتفاقان ثنائيان الدور الأميركي المتواصل في العراق: اتفاقية إطار العمل الإستراتيجية (SFA) واتفاقية وضعية القوات (SOFA)

أضفت اتفاقية إطار العمل الإستراتيجية طابعاً رسمياً على "إعلان المبادئ لعلاقة طويلة الأمد من التعاون والصداقة بين الجمهورية العراقية والولايات المتحدة الأميركية" التي وقعها كل من الرئيس بوش ورئيس الوزراء نوري المالكي في أواخر ٢٠٠٧.^(٥) تضع الاتفاقية أسس طبيعة العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية المتواصلة بين الولايات المتحدة والحكومة العراقية.


وتضع اتفاقية وضعية القوات (SOFA) التي ترتدي طابعاً أهم، تفاصيل حقوق ومسؤوليات العاملين الأميركيين في العراق بعد ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. سوف تبطل اتفاقية وضعية القوات قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة رقم ١٥١١ (٢٠٠٣) بصفته القاعدة القانونية لاستمرار الحضور المدني والعسكري الأميركي في العراق. لقد أخرت الهواجس المتعلقة بحصانة العسكريين الأميركيين بالنسبة لمقاضاتهم بموجب القوانين العراقية، هذه الاتفاقية. أعطى الأمر ١٧ الصادر عن سلطة الائتلاف المؤقتة العاملين الأميركيين حصانة كاملة بالنسبة لمقاضاتهم بموجب القوانين العراقية. يقال أن اتفاقية وضعية القوات سوف تتنازل عن حصانة المقاولين وسوف تزيد بالتالي التكاليف الأمنية لجهود الإغاثة الأميركية المتواصلة.

الاستقلالية الوظيفية المتزايدة لعراق سيّد

خلال سنة الانتقال هذه، أكدت الحكومة العراقية التي هي كيان سيّد بصفة شرعية منذ حزيران/يونيو ٢٠٠٤، بصورة متزايدة استقلالها الواقعي إزاء الولايات المتحدة بالنسبة لمسائل القانون والشرطة والحكم. هذا المظهر للوضع الطبيعي الناشئ حديثاً في العراق قد خفّف من شفافية الحكومة العراقية بالنسبة للمحاورين الأميركيين الذين لا يزالون يعملون مع العراقيين عبر برامج بناء القدرات. مثلاً، ترفض بعض الوزارات العراقية توفير الشفافية للمستشارين الأميركيين بخصوص موازنتها (مثلاً، وزارة الكهرباء) مما يُعقد الأمور بالنسبة لتحديات التخطيط المالي التي تسببها أسعار النفط المتقلّبة. لقد ألزمت الحكومة العراقية حوالي ٢٠ مليار دولار لمشاريع إعادة الإعمار الرئيسية سنة ٢٠٠٨^(٦)، لكن غياب الوصول إلى بيانات الموازنة العراقية يحدّ من معرفة الولايات المتحدة لمعدلات التنفيذ الفعلي للموازنة.

الشكل ٣-١

إجمالي عدد قوات الأمن العراقية المُدربة، بين تموز/يوليو ٢٠٠٥ وأب/أغسطس ٢٠٠٨
بالآلاف الدولارات

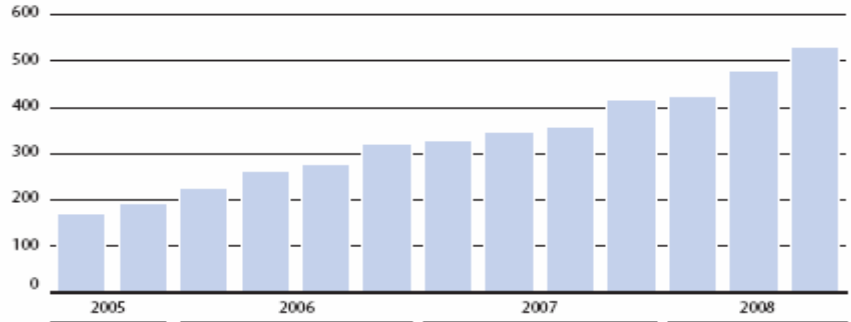

ملاحظة: أعداد المدربين في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ قد عُدلت من ٤٣٩,٦٧٨ في تقرير آذار/مارس رقم ٩٠١٠
المصدر: وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٥/٧، ٢٠٠٥/١٠، ٢٠٠٦/٢، ٢٠٠٦/٥، ٢٠٠٦/٨، ٢٠٠٦/١١، ٢٠٠٧/٣، ٢٠٠٧/٦، ٢٠٠٧/٩، ٢٠٠٧/١٢، ٢٠٠٨/٣، ٢٠٠٨/٦، ٢٠٠٨/٩

قوات الأمن العراقية في الصدارة

سمح نمو قدرات قوات الأمن العراقية لقوات الائتلاف التحول من موقع الصدارة في العمليات الحركية إلى الأدوار الداعمة. يسمح هذا التحول للقوات المتعددة الجنسيات في العراق بمواصلة تقديم المساعدات الحيوية للجيش العراقي.^(٧) من بين الـ ١٦٤ كتيبة للجيش العراقي التي تقود عمليات في أرجاء البلاد، ثمة حوالي ١٠٧ كتيبة إما في الصدارة أو تعمل بصورة مستقلة.^(٨)

لقد قام الجيش العراقي بدعم الشرطة العراقية، وقام بعمليات هجومية مدعومة خلال ربع السنة هذا في محافظة ديالى. هذا الهجوم الناجح يُشير إلى مواصلة المنحى الإيجابي الملاحظ خلال ربع السنة الماضي عندما نفذت القوات العراقية عمليات فعالة في البصرة.

مبادرة القدرات القيادية لقوات الأمن العراقية

تعاني قوات الأمن العراقية من نقص على مستوى القدرات القيادية. لقد لاحظ تدقيق لمكتب المفتش العام في نيسان/إبريل ٢٠٠٨ أنه على الجيش العراقي تعزيز جهاز الضباط وضباط الصف لديه إذا كان يريد النجاح في مهامه الأمنية على المدى الطويل^(٩). لأجل تصحيح النقص في القيادة، باشرت وزارة الدفاع جهداً جباراً دعت فيه إلى استعادة ضباط الجيش العراقي وضباط الصف الذين سُرحوا سنة ٢٠٠٣ بأمر من سلطة الائتلاف المؤقتة القاضي بتفريق الجيش. فقد أقامت وزارة الدفاع خلال ربع السنة هذا، مراكز في أنحاء العراق حيث بإمكان الضباط السابقين وضباط الصف في الجيش العراقي التسجيل للعودة إلى الخدمة. في مطلع تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كان هناك حوالي ٩٧،٠٠٠ ضابط وضابط صف مسجلين.^(١٠) هؤلاء الضباط وضباط الصف المُجربين سوف يقدمون القيادة للرجال المسجلين الذين تنقصهم الخبرة نسبياً والذين يشكلون قوات الأمن العراقية. بالنسبة للعدد الإجمالي للمدربين في قوات الأمن العراقية، أنظر الشكل ٣-١.

المشاركة الدولية المُعززة

اتخذت الأمم المتحدة خطوات خلال ربع السنة هذا لأجل زيادة مشاركتها في العراق عن طريق:

- إعلان مبادرة جديدة لمكافحة الفساد تهدف إلى تعزيز مؤسسات مكافحة الفساد الضعيفة التابعة للحكومة العراقية.
- التوسط من أجل التوصل إلى تسوية سياسية داخل مجلس النواب العراقي تساعد في إقرار قانون الانتخابات في المحافظات.
- دعم جهود الحكومة العراقية للسيطرة على انتشار الكوليرا.^(١١)



سفير الاردن لدى العراق يقدم أوراق اعتماده إلى الرئيس طالباني (صور من الحكومة العراقية)

أعلن الأمين العام للأمم المتحدة مؤخراً: "ثمة أمل جديد بأن شعب وحكومة العراق يتغلبون على التحديات المثبطة للعزيمة ويعملون معاً لإعادة بناء بلدهم، بعد سنوات من الحرب والدكتاتورية والإهمال".^(١٢) في مساندة لهذا الأمل، وسعت الحكومة العراقية الصلات الإقليمية مع عدة دول مجاورة من ضمنها الكويت والاردن والبحرين وسوريا التي أرسلت سفراء إلى بغداد خلال ربع السنة هذا لأول مرة منذ ما قبل الغزو سنة ٢٠٠٣.

تطبيع المنطقة الدولية

الإشارة الأخرى اللافتة في الوضع الطبيعي الناشئ حديثاً في العراق هي التراجع الوشيك للسيطرة الأميركية على المنطقة الدولية (IZ). هذه المنطقة الدولية التي أنشأتها سلطة الائتلاف المؤقتة "كمنطقة خضراء" تمتد على مساحة ٣,٥ أميال مربعة تقريباً في وسط مدينة بغداد التجاري وتمتد على طول نهر دجلة. تحرس قوات الائتلاف كافة نقاط الدخول إلى المنطقة الدولية وتراقب بصرامة كل دخول. عندما ستكمل السفارة الأميركية انتقالها إلى مجمع السفارة الجديد، الذي يتوقع إنجاز ه في نهاية هذا العام، سوف تتقلص حدود المنطقة الدولية كما ستقوم قوات الأمن العراقية بتحمل المسؤولية الأمنية لمعظم المنطقة.

التطورات الرئيسية

الأمن

لاحظ الرئيس بوش مؤخراً أن "العنف في العراق قد تراجع إلى أدنى نقطة منذ ربيع ٢٠٠٤" (١٣) وعلى الرغم من التحسن الكبير والملموس على الجبهة الأمنية، فإن الوضع في العراق يبقى دقيقاً (١٤) تحدّث وزير الدفاع، روبرت غيتس، مؤخراً عن مجالين معينين للقلق: (١) "احتمال اندلاع أعمال العنف قبيل الانتخابات القومية وفي المحافظات" و "التقارير المقلقة حول الجهود المذهبية (الشيوعية) الساعية إلى إبطاء دمج أبناء العراق في قوات الأمن العراقية" (١٥) للحصول على لقطة سريعة حول الحوادث الأمنية خلال فترة السنوات الأربع، أنظر الشكل ٤-١.

انتخابات المحافظات

في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أقر مجلس النواب قانون الانتخابات في المحافظات الذي طال انتظاره، وأعلن أن الانتخابات يجب إجراؤها قبل ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، ونص القانون أيضاً على ما يلي: (١٦)

- من أصل المحافظات الـ ١٥ ذات الأثرية العربية، على كافة المحافظات باستثناء محافظة التأميم (كركوك) إجراء الانتخابات قبل نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.
- يجب إجراء الانتخابات في المحافظات الكردية الثلاث في وقت لاحق سنة ٢٠٠٩.
- ٢٥ بالمئة من المقاعد في كل مجلس محافظة يجب تخصيصها للنساء.
- لن تحجز مقاعد في مجالس المحافظات للمسيحيين أو للأقليات الدينية الأخرى.


انتخابات المحافظات التي طال انتظارها في العراق يؤمل أن تصحح بعض الانشقاقات المدنية التي سببتها مقاطعة السنة لانتخابات المحافظات في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥، بحيث تُهيئ الجو للانتخابات البرلمانية في أواخر ٢٠٠٩. سوف تكون الانتخابات البرلمانية أول امتحان انتخابي لإدارة رئيس الوزراء المالكي.

أبناء العراق

في أواسط صيف ٢٠٠٧، أنشأت الولايات المتحدة "أبناء العراق" (SOI) لأجل الإتيان بعشرات الآلاف من السنة المتمردين إلى الجهاز الأمني المدني العراقي بحيث يضعف خزان المتمردين المحتملين. ساهمت مبادرة أبناء العراق، إلى جانب زيادة عديد القوات الأميركية، ووقف إطلاق النار الذي أعلنه الصدر في آب/أغسطس ٢٠٠٧، في خفض مستويات الهجمات في العراق مما كانت عليه في ذروتها في حزيران/يونيو ٢٠٠٧ إلى مستوياتها الدنيا الحالية ما بعد الغزو. لقد ألحت الولايات المتحدة على حكومة المالكي خلال ربع السنة هذا لأجل إدماج أبناء العراق في قوات الأمن العراقية. يؤكد ردّ الحكومة العراقية المتردد الحاجة المستمرة لمصالحة سنّية - شيعية.

الشكل ٤-١

الحوادث الأمنية – ثلاث لقطات سريعة

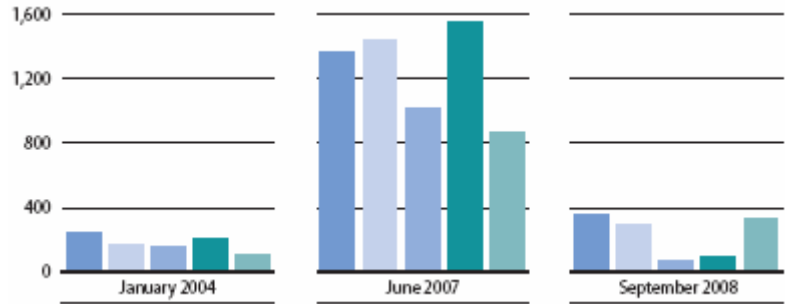

قنابل عثر عليها وأزيلت (أجهزة تفجير مرتجلة وألغام)
 قنابل فُجرت (أجهزة تفجير مرتجلة وألغام)
 هاون، صواريخ و هجمات أرض جو
 قناصة، كمان، قنابل يدوية وأسلحة هجومية خفيفة أخرى
 هجمات ضد البنية التحتية العراقية والمنظمات الحكومية

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

المصدر: مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦

هناك حوالي ٩٥,٠٠٠ عضو في أبناء العراق بينهم ٥١,٠٠٠ في بغداد.^(١٧) منذ بداية البرنامج في صيف ٢٠٠٧، دفعت الولايات المتحدة الأموال لأبناء العراق من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. في الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، أخذت الحكومة العراقية على عاتقها مسؤولية الإشراف ودفع الأموال لحوالي ٥٠,٠٠٠ عضو من أعضاء أبناء العراق. وأعلنت الحكومة العراقية إنها تنوي دمج ٢٠,٠٠٠ عضو فقط من هؤلاء في قوات الأمن العراقية النظامية.^(١٨) سوف تمنح الأعداد المتبقية راتب تقاعد، أو توظف في مواقع حكومية غير أمنية، أو تصرف من الخدمة نهائياً.

السيطرة العراقية على المحافظات – الأنبار وبابل

في الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، نقلت الولايات المتحدة محافظة الأنبار، التي كانت في وقت ما معقل نشاط التمرد السنّي، إلى السيطرة العراقية على المحافظات. وفي تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، أصبحت بابل المحافظة ١٢ المنتقلة إلى السيطرة العراقية.^(١٩) تدعو الخطط الأميركية الحالية إلى نقل محافظة الواسط إلى السيطرة العراقية قبل نهاية ٢٠٠٨.^(٢٠)

التحديات المتواصلة

حكم القانون

لا يزال نظام حكم القانون في العراق مُفككاً، وأكثر ما يؤكد كونه كونه القضاء العراقيين يُغتالون في أرجاء البلاد. سنة ٢٠٠٨، قتل الإرهابيون ٧ قضاة، إضافة إلى ١١ قاضٍ قتلوا سنة ٢٠٠٧. منذ ٢٠٠٣، تم اغتيال حوالي ٤٠ قاضٍ وأفراد من عائلاتهم. لا تزال مشكلة الأمن القضائي التي أثارها المفتش العام في التقرير ربع السنوي في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ بدون حل. تقول وزارة الداخلية إنها تعمل على إيجاد حل لكن شيئاً من هذا لم يحدث.



رئيس الوزراء العراقي ورئيس القضاة مدحت يقطعان شريط الاحتفال بافتتاح قصر العدل الجديد في الرصافة، في بغداد، في ١٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨.

الفساد

ابتلى العراق بالفساد طيلة عقود قبل غزو ٢٠٠٣، واستمر فيه الفساد منذ ذلك الحين، مما كان بمثابة "تمرد ثانٍ". فكما أعلن تقرير أصدره مؤخراً صندوق النقد الدولي، هناك حاجة متواصلة ومُلحة لكي تستعجل الحكومة العراقية الإصلاحات القادرة على احتواء مشكلة الفساد.^(٢١)

مكافحة الفساد في الحكومة العراقية هي بالدرجة الأولى مهمة المجلس الأعلى للتدقيق، ولجنة النزاهة والمفتشين العامين العراقيين. تواجه هذه الكيانات معوقات هامة لأداء مهماتها الخاصة. أصدر المجلس الأعلى للتدقيق في مطلع هذا العام تقريراً يشير فيه إلى العديد من نقاط الضعف لدى المفتشين العامين في العراق، كما أن عبء المجلس الأعلى للتدقيق قد ازداد بصورة كبيرة جداً مع ازدياد الموازنة العراقية.

ذكرت لجنة النزاهة، التي هي على ما يبدو، المنظمة الحكومية الرئيسية لمكافحة التزوير والاحتيال، خلال ربع السنة هذا، أن قانون العفو الجديد الذي وافق عليه مجلس النواب في شباط/فبراير، ألغى بفعل القانون، أكثر من نصف قضاياها.^(٢٢) بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، تم إقفال ٦٩٠ قضية فساد وفقاً لتنفيذ هذا القانون.^(٢٣) وهناك نقاط ضعف أخرى تعيق مهمة لجنة النزاهة: فهي تفتقر إلى حضور فعال خارج بغداد، كما أن مفوضها لم يجر تثبيته بعد من قِبَل مجلس النواب، ولا تزال سلطته القانونية مشلولة. باختصار، لدى لجنة النزاهة قدرات محدودة لمكافحة الفساد.

لقد لوحظت مشاكل الفساد خلال تقييم أجراه مؤخراً مكتب المفتش العام لثلاث مدارس في مدينة الصدر^(٢٤)، تم تمويلها بأموال عراقية بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق. اكتشف مفتشو المفتش العام أن مقاولاً عراقياً محلياً يعمل في المشروع طلب تحريره من العقد لأنه تلقى عدة طلبات من رسميين في الحكومة العراقية للحصول على رشاوى، وعندما رفض الانصياع لهذه الطلبات، تلقى تهديدات هو وعائلته. للحصول على ملخص تنفيذي عن التفتيش، أنظر القسم ٤.


تحديث سنة الانتقال

عائدات النفط والموازنة العراقية

نشرت وزارة المالية الخطة الإستراتيجية الجديدة لموازنة الحكومة العراقية خلال هذا الشهر وتوقعت أن ٩٤ بالمئة من إيرادات العراق سنة ٢٠٠٩ سوف تأتي من عائدات النفط وقدّرت أن متوسط صادرات النفط سوف يكون ١,٩ مليون برميل في اليوم، بسعر متوسط من ٨٠ دولار للبرميل.

في ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٨، ذكر صندوق النقد الدولي أن "توقعات نمو العراق قد تحسنت سنة ٢٠٠٨، حفزتها زيادة إنتاج النفط والصادرات"^(٢٥) لكن إذا واصلت أسعار النفط بهبوطها الأخير، فإن الحكومة العراقية سوف تحتاج إلى إعادة النظر في موازنتها لسنة ٢٠٠٩. في أواسط تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كان سعر النفط العراقي قد هبط بنسبة ٣٩ بالمئة بالمقارنة مع ذروته في أواسط الصيف في ٤ تموز/يوليو ٢٠٠٨. أنظر الشكل ٥-١.

الشكل ٥-١
أسعار نفط كركوك الخام
دولار/برميل




المصدر: الإدارة الأميركية للمعلومات حول الطاقة: "Weekly Iraq Kirkuk Netback Price at U.S. Gulf, 15/10/2008", 17/10/2008. www.eia.doe.gov

الشكل ٦-١

تقييم التقدم لفرق إعادة إعمار المحافظات

التطور الاقتصادي

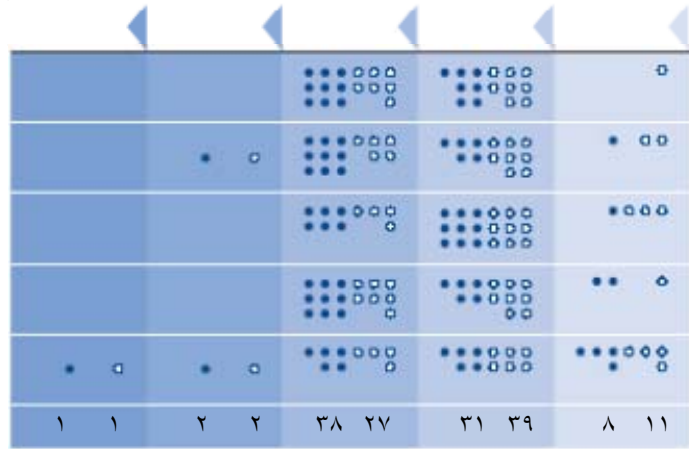

الوضعية بتاريخ ٢٠٠٨/٥/٣١ *

الوضعية بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢٩

المصدر: السفارة الأميركية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢

إستراتيجية أميركية جديدة لإعادة إعمار المحافظات

في ٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أصدرت وزارة الخارجية الأميركية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق "إطار عمل استراتيجي جديد لبناء القدرات والاستدامة في حكومات المحافظات في العراق". يوضع إطار العمل هذا أدوار ومسؤوليات الوكالات التي تدعم فرق إعادة إعمار المحافظات (PRTs). ويضع الإطار أيضاً الأرضية لإنهاء برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات، ملاحظاً أن هذه المهمة سوف تتطور إلى برنامج مساعدة تقليدي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.

يتوسع القسم ٣ من هذا التقرير في مراجعة مكتب المفتش العام لإعادة الإعمار ويقدم أفكاراً تفصيلية من قادة فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) حول جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الممولة من الولايات المتحدة في كل واحدة من المحافظات العراقية. يشر مكتب المفتش العام مؤخراً مراجعة أخرى تتعلق ببرنامج فرق إعادة إعمار المحافظات سوف تشمل على تقييم لنموذج نضوج فرق إعادة إعمار المحافظات. بالنسبة لمنحى تقدم فرق إعادة إعمار المحافظات، أنظر الشكل ٦-١.

الكونغرس يُقرّ قانوناً جديداً حول إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار

في ١٤ تشرين لأول/أكتوبر ٢٠٠٨، وقع الرئيس بوش على "قانون الإدارة المدنية لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار لسنة ٢٠٠٨" (RSCMA) كجزء من قانون دانكان هانتر للترخيص للدفاع القومي. يمثل قانون RSCMA أهم تشريع أقره الكونغرس ينظم هيكلية وتخطيط عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار المحتملة / الطارئة.

يعالج قانون الإدارة المدنية لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار العديد من التوصيات لإصلاح العمليات الطارئة التي طرحها مكتب المفتش العام عبر مبادرة الدروس المكتسبة. اللافت أكثر أن هذا القانون ينشئ الجهاز الذي يعالج النواقص في التخطيط التي حددها مكتب المفتش العام سابقاً عن طريق وضع مسؤولية إعداد الجانب المدني لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار الطارئة داخل وزارة الخارجية والإيعاز إلى وزيرة الخارجية بالتشاور مع مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لأجل تطوير إستراتيجية ما بين الوكالات للاستجابة إلى عمليات إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار.

ينص قانون الإدارة المدنية لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار على تعيين منسق لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار من قبل الرئيس وبتبني من مجلس الشيوخ، تشمل واجباته ومسؤولياته الكبرى:

- التنسيق مع الوكالات المعنية لتطوير الخطط الطارئة والإجراءات بين الوكالات لتوظيف ونشر العاملين المدنيين ولقيادة عمليات إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار لأجل معالجة مختلف أنواع الأزمات.
- التعريف عن العاملين في الحكومة المركزية في الحكومات المحلية، وفي القطاع الخاص المتوفرين للمشاركة في فرق الاحتياط المدنية (CRC) أو غيرها للمشاركة أو المساهمة في نشاطات إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار.
- اتخاذ الخطوات لضمان أن يكون تدريب وتعليم العاملين المدنيين المطلوب منهم أداء نشاطات إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار مناسباً ويتم بالصورة الملائمة مع الوكالات الأخرى المشاركة في عمليات إرساء الاستقرار.
- التخطيط بالتعاون مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمعالجة متطلبات مثل: التسريح، نزع السلاح، إعادة بناء المجتمع المدني، الشرطة، رصد حقوق الإنسان، والإعلام العام – التي تنشأ على العموم خلال أزمات إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار.
- الحفاظ على القدرات للتمكن بسرعة من تكوين فريق تقييم يضم عاملين من كافة الوكالات المعنية للقيام بالتقييم الضروري في الموقع.

وينص قانون الإدارة المدنية لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار أيضاً على أن بإمكان وزيرة الخارجية، بالتشاور مع مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، إنشاء الفرق الجاهزة للاستجابة (RRC) ومكتب منسق شؤون إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار (CRS). و"يجب أن تتشكل الفرق الجاهزة للاستجابة من مكونات نشطة واحتياطية من موظفي حكومة الولايات المتحدة، بما في ذلك موظفين من وزارة الخارجية، ومن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية والوكالات الأخرى الذين يتم استخدامهم وتدريبهم (وتوظيفهم بالنسبة للمكونات النشطة) لأجل تقديم المساعدة (عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار الطارئة) عندما يتم نشرهم للقيام بذلك من قبل الوزارة لدعم أغراض هذا القانون". يقوم مكتب منسق شؤون إعادة الإعمار وتأمين الاستقرار (CRS) بتوظيف وتدريب "الأفراد الذين يملكون المهارات الضرورية للقيام بنشاطات إعادة الإعمار وإرساء الاستقرار والذين تطوعوا لهذا الغرض".

يتطلب الموافقة على هذه السياسة الجديدة الصارمة مخصصات لدعمها. قد يأتي بعض هذا التمويل من الموازنة التي طلبها الرئيس من الكونغرس للسنة المالية ٢٠٠٩، والتي تشمل ٢٤٨,٦ مليون دولار لمبادرة إرساء الاستقرار المدني التي سوف تحسن بدرجة كبيرة الشراكة المدنية مع القوات المسلحة الأميركية في أوضاع الاستقرار بعد النزاع، بما في ذلك تشكيل فرق الاستجابة النشطة المؤلفة من ٢٥٠ شخصاً، وفرق الاستجابة الاحتياطية المؤلفة من ٢٠٠٠ شخص، وفرق الاستجابة المدنية المؤلفة من ٢,٠٠٠ شخص.

في المخصصات التكميلية للسنة المالية ٢٠٠٨، كان هناك ٥٥ مليون دولار للتطوير والانتشار الأولي للقدرات المدنية للاستجابة لتحديات إرساء الاستقرار وإعادة الإعمار بعد النزاع، ولمكونات الرد النشط والرد الاحتياطي للمبادرة؛ كما أمنت أموال إضافية للأغراض ذاتها في المخصصات سد الثغرات للسنة المالية ٢٠٠٩ (التي تغطي جزءاً من تلك السنة المالية).

يؤسس قانون الإدارة المدنية لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار في القانون الأميركي برنامج العمليات الطارئة الذي حرّكه الرئيس مع التوجيه الرئاسي للأمن القومي (NSPD) رقم 44، "إدارة جهود الوكالات المتعلقة بإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار". غير أن كيفية دمج المكونات المدنية والعسكرية لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار الطارئة لا تزال دون حل. حققت وزارة الدفاع تقدماً جيداً في تطوير عقيدة وبرامج تتجاوب مع توجيهات وزارة الدفاع 3000.05 "الدعم العسكري للاستقرار والأمن والانتقال وعمليات إعادة الإعمار". هناك تداخل هام في المهمة بين قانون الإدارة المدنية لإعادة الإعمار وإرساء الاستقرار وتوجيه وزارة الدفاع 3000.05 الذي يجب حله لضمان وحدة الجهود في عمليات الإغاثة وإعادة الإعمار القادمة.

إشراف المفتش العام

إنسجاماً مع توسيع تفويضه بموجب قانون الترخيص للدفاع الوطني للسنة المالية ٢٠٠٨، أضاف مكتب المفتش العام مزيداً من المحققين والمفتشين والمدققين إلى العاملون لديه. هؤلاء العاملين الجدد المقيم بعضهم في العراق والبعض الآخر في فرجينيا، قد عززوا إشراف مكتب المفتش العام، وعلى الأخص في مديرية التحقيقات.

التحقيقات

بتاريخ ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كان لدى مديرية التحقيقات ٦٧ تحقيقاً جنائياً ناشطاً. خلال ربع السنة هذا، تم توجيه إدانات إلى ثلاثة أشخاص إضافيين مما رفع مجموع عدد الأشخاص المدانين إلى ١١ نتيجة لعمل مكتب المفتش العام. علاوة على ذلك، تم خلال ربع السنة هذا توجيه التهم إلى مدعى عليه مما رفع مجموع عدد الأشخاص الذين وجهت إليهم التهم إلى ١٨. وهناك حالياً ثلاثة مدعى عليهم يحاكمون في محكمة فدرالية في ترنتون، بولاية نيوجيرسي، وأربعة آخرون ينتظرون محاكمتهم.

في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كان من نتيجة العمل الذي قام به مكتب المفتش العام ومشاركوه في التحقيقات أن موظف عقود في وزارة الدفاع أقر بالذنب لاستلامه حوالي ١٦٠،٠٠٠ دولار من الرشاوى من مقاولين على صلة بعمله في قاعدة بلد الجوية في العراق. بموجب اتفاقية الإقرار بالذنب، سوف يمضي هذا الموظف ٥٠ شهراً في السجن ويحرم من كل أرباحه غير الشرعية. وفي عملية إشراف مذهلة على الموظفين، تبين أن هذا الموظف قد استخدم على الرغم من أنه أمضى خمس سنوات في السجن بعد أن أدين بجريمة قتل من الدرجة الثانية.



وجدت المراجعة الشاملة التي أجراها مكتب المفتش العام حول نظام معالجة المياه المهدورة في الفلوجة أن المشروع سوف يكلف ثلاثة اضعاف سعره الأصلي المقدر، وأنه سوف ينجز مع تأخر ثلاث سنوات ويخدم عدد من المنازل أقل بكثير مما كان متوقفاً أصلاً.

التفتيش

التحسينات في الوضع الأمني، إلى جانب التعاون المُحسّن من قِبَل القوات المتعددة الجنسيات في العراق، إلى تحسين قدرات مكتب المفتش العام للقيام بتقييمات للمشاريع في الموقع. خلال ربع السنة هذا، زار مكتب المفتش العام تسعة مواقع: محطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر، وثلاث مدارس في مدينة الصدر ممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، وخمسة مشاريع في قطاع المياه في الفلوجة.

كان تقرير التفتيش في الفلوجة أحد أكثر المراجعات مثالية وشمولية قد قام بها مكتب المفتش العام. طالب السفير راين كروكر مكتب المفتش العام بتقييم هذا المشروع، وكشف التقرير أن محطة المعالجة التي كان سعرها الأصلي الأقصى ٣٢,٥ مليون دولار سوف تكلف الآن ٩٨ مليون دولار. علاوة على ذلك، سوف يتم إنجاز المشروع مع تأخر ثلاث سنوات وسوف يخدم حوالي ثلث عدد المنازل الذي كان متوقعاً أصلاً. وجد مكتب المفتش العام أنه يجب على هؤلاء الراغبين في الحصول على خدمة من النظام تأمين حرية الوصول بأنفسهم بدلاً من انتظار تزويدها لهم عبر المشروع. النقص الحاصل في "الميل الأخير" يمثل نموذجياً مشاريع مخططة بدرجة ضعيفة في العراق.

التدقيق

أصدرت مديرية التدقيق في مكتب المفتش العام سبعة تقارير خلال ربع السنة هذا. تشمل النقاط البارزة في التدقيقات:

- درست التدقيقات أكثر من ١,٢٠٠ عمل تعاقدية قد أوقف، ووجدت هدرًا، وحوادث منح فيها مقاولون موقوفون عن العمل أشغالاً فيما بعد، كما دفع لإحدى الشركات ٣١ مليون دولار لمرفق لم يجر بناؤه أبداً.
- حثت التدقيقات كلفة وإنتاج وإشراف برنامج الحكم المحلي التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية و عقود بقيمة ٦٠٠ مليون دولار مع معهد مثلث الأبحاث (RTI).
- قيّمت التدقيقات الإستراتيجية الأميركية للديمقراطية والحكم في العراق و عيّنت الفرص لتحسين الإستراتيجية ولتقييم نتائجها بالنسبة للأهداف الإستراتيجية.
- قدمت التدقيقات أفكاراً جديدة حول إجمالي عدد مقاولي الأمن الخاص العاملين في العراق، وتكاليف تقديم خدماتهم والحاجة العامة إلى تحسين رفع التقارير حول الموضوع.

فجوة بيانات إعادة الإعمار

إن رئيس البعثة هو المسؤول عن تنسيق الجهود الأميركية في العراق بموجب برنامج تطوير المهارات (NSDP) رقم 36. ونزولاً عند طلب السفير كروكر، أجرى مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا، تدقيقاً درس العملية التي يتم بها نقل المعلومات عن إعادة الإعمار إلى رئيس البعثة. لم يجد مكتب المفتش العام أية سياسات أو إرشاد له طابع رسمي حول متى وكيف يتم رفع التقارير عن وضع مشاريع إعادة الإعمار إلى رئيس البعثة. أوصى مكتب المفتش العام بأن يضع منسق السفارة للانتقال الاقتصادي في العراق (CETI) عملية لرفع التقارير عن

الإشراف المشترك على مقاولي الأمن الخاص

لا يزال دور مقاولي الأمن الخاص (PSCs) في العراق موضع خلاف. يقوم مكتب المفتش العام بجهد مكثف لتقييم المقاولين الأمنيين هؤلاء بالترافق مع المفتشين العامين من وزارة الخارجية ووزارة الدفاع والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. أنتج مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا نظرة إجمالية حول ٣٠٠ شركة تقريباً تؤمن الخدمات الأمنية في العراق بكلفة إجمالية تبلغ ٦ مليارات دولار تقريباً. يجري مكتب المفتش العام حالياً تدقيقين حول مقاولي الأمن الخاص.

التدقيق الشرعي

السنة الماضية، باشر مكتب المفتش العام برنامجاً لتنفيذ التفويض المعطى له للقيام بتدقيق شرعي، وأطلق سلسلة من المراجعات المالية المركزة لمشاريع إعادة الإعمار الكبرى لدراسة النتائج والتكاليف والإشراف الإداري. يواصل مكتب المفتش العام إنتاج هذه المراجعات المركزة وتدقيق معهد مثلث الأبحاث (RTI) هو الأخير خلال ربع السنة هذا – كما أنه سوف يوسع عمله خلال السنة القادمة ليشمل العقود الممولة من كافة حسابات إعادة الإعمار الكبرى.

لأجل تعزيز الجهود لتنفيذ تفويضه للقيام بتدقيق شرعي، بدأ مكتب المفتش العام استخدام أدوات تكنولوجية متطورة للتعرف على الأدلة على الاحتيال في العقود. سوف تعزز المبادرة الجديدة هذه جهود مكتب المفتش العام في مجال التدقيق والتحقيق لمعالجة قضايا الاحتيال التي تنخر مشروع إعادة إعمار العراق منذ ٢٠٠٣.

المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان

في أيار/مايو ٢٠٠٨، عين الرئيس بوش الجنرال المتقاعد في قوات مشاة البحرية الأميركية، أرنولد فيلدس، ليكون المفتش العام الخاص لإعادة إعمار أفغانستان (SIGAR). وسيكون المفتش العام إعادة إعمار أفغانستان الشبيه بالمفتش العام لإعادة إعمار العراق مسؤولاً عن الإشراف على ٢٥ مليار دولار موظفة في مشاريع إغاثة وإعادة إعمار أفغانستان. يواصل مكتب المفتش العام لإعادي إعمار العراق تقديم الدعم الإداري للميجور جنرال فيلدس وفريقه.

لجنة التعاقد أيام الحرب

أنشأ قانون الترخيص للدفاع القومي لسنة ٢٠٠٩ لجنة من الحزبين للتعاقد أيام الحرب في العراق وأفغانستان، وكلفها دراسة عقود إعادة الإعمار والأمن والدعم اللوجستي، ورفع التقارير عن الهدر والاحتيال وسوء الاستخدام وسوء الإدارة. أقام مكتب المفتش العام واللجنة علاقات عمل وثيقة كما أن مكتب المفتش العام سيواصل دعم جهود اللجنة سنة ٢٠٠٩.

الكلفة البشرية

في الوقت الذي يواصل فيه العنف المتقطع في التسبب بمعاناة بغداد ، ساد الهدوء النسبي المنطقة الدولية خلال ربع السنة هذا. الأمر المهم أن ربع السنة هذا شهد عدداً كبيراً من موظفي السفارة الأميركية ينتقلون للإقامة في مرافق سكنية مقواة في مجمع السفارة الجديد.

المقاولون

ذكرت وزارة العمل حصول ٣٣ حادثة وفاة خلال ربع السنة هذا لمقاولين مدنيين يعملون في مشاريع إعادة الإعمار الممولة من الولايات المتحدة في العراق. وذكرت وزارة العمل أيضاً، خلال ربع السنة هذا، أن ٤٦٥ مقاولاً تعرضوا لإصابات سببت لهم التغيب عن العمل أربعة أيام أو أكثر. منذ أن بدأت إعادة إعمار العراق، تم تسجيل ١،٢٦٤ حادثة وفاة في ملفات وزارة العمل.

المدنيون الأميركيون

ذكرت وزارة الخارجية أن أربعة مدنيين أميركيين توفوا في العراق خلال ربع السنة هذا، إثنان منهما توفياً على أثر إصابات تعرضوا لها جرّاء انفجار أحدثه جهاز تفجير مرتجل في الموصل. منذ بداية القتال سنة ٢٠٠٣، توفي ٢٧٦ مدنياً أميركياً في العراق.

الصحفيون

يواصل الصحفيون تعريض حياتهم بغية نقل التقارير عن التطورات في العراق. خلال ربع السنة هذا، قتل أربعة مراسلون على الأقل هناك مع مراسل آخر اغتيل في كركوك في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر. وفي حادثة مفرجة بصورة خاصة، جرى اختطاف مراسل كبير لمحطة تلفزيون الشرقية وشريكه في الموصل بينما كانوا يصورون برنامجاً حياً للتلفزيون جرى خلاله توزيع وجبات الإفطار في شهر رمضان مجاناً على العائلات الفقيرة. لقد عُثر على أجسادهم في وقت لاحق على مسافة قريبة من مكان اختطافهم.^(٢٧) منذ آذار/مارس ٢٠٠٣، قتل في العراق ١٣٥ صحفياً و ٥١ مساعداً لوسائل الإعلام.^(٢٨)

الأشخاص المهجرون في الداخل واللاجئون

العنف المتواصل في الموصل دفع حوالي ١٠٠٠ عائلة مسيحية إلى الهروب من منازلها في بداية تشرين الأول/أكتوبر.^(٢٩) أعلنت الحكومة العراقية أنها تنوي التحقيق في الوضع واتخاذ الإجراءات الضرورية للسيطرة على العنف ولطمأنة المواطنين المحليين.

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، ذكر ضباط أميركيون أن ١٢،١١٨ لاجئاً عراقياً على الأقل وصلوا إلى الولايات المتحدة منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧.^(٣٠) تخطى هذا العدد الهدف الأصلي لقبول ١٢،٠٠٠ لاجئاً عراقياً بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨. علاوة على ذلك،

أصدرت المفوضية الأوروبية مؤخراً تقريراً حول أزمة اللاجئين العراقيين. قدّر تقرير المفوضية الأوروبية الذي استقى معلوماته من تشكيلة واسعة من المصادر الأولية والثانوية، أن هناك قرابة مليون إلى مليون ونصف لاجئ من العراق في سوريا و ٤٥٠,٠٠٠ إلى ٥٠٠,٠٠٠ في الأردن.^(٣١) وخلص تقرير المفوضية الأوروبية إلى أن "خمسة ملايين عراقي يعيشون في ظروف مؤقتة في عدة بلدان" من بينهم ٢,٨ مليون من الأشخاص المهجرين في الداخل الهائمين في بلادهم الأم.^(٣٢)

نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار

مُلخص تمويل إعادة إعمار العراق

التمويل الأميركي

التمويل العراقي

التمويل الدولي

مُلخص التمويل الأميركي

صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق

صندوق قوات الأمن العراقية

صندوق دعم الاقتصاد

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

التعاقد

استخدامات ونتائج التمويل الأميركي لإعادة الإعمار

الأمن

البنية التحتية

الاقتصاد

الحكم

القسم ٢

ملخص تمويل إعادة إعمار العراق

منذ ٢٠٠٣، قدّمت الحكومات الأميركية والعراق إضافة إلى الأسرة الدولية ما مجموعه ١٢٥,٧٣ مليار دولار أميركي لدعم إعادة الإعمار في العراق. دعمت هذه الأموال البرامج التي سعت إلى تعزيز الحكومة العراقية والأمن والبنية التحتية الأساسية والاقتصاد. للحصول على نظرة إجمالية حول تمويل إعادة إعمار العراق، أنظر الشكل ١-٢. يقدم الشكل ٢-٢ جدولاً زمنياً للمخصصات الأميركية لإعادة الإعمار.

الحكومة العراقية هي الآن المصدر الأولي لتمويل جهود إعادة الإعمار. تقدم عائدات قطاع النفط في العراق الموارد الاقتصادية لجهود إعادة الإعمار.

التمويل الأميركي (٥٠,٧٧ مليار دولار)

رفع مكتب المفتش العام التقارير حول ٣٣ حساب تمويل أميركي لها علاقة بجهود إعادة إعمار العراق. منذ ٢٠٠٣، خصصت الولايات المتحدة ٥٠,٧٧ مليار دولار لهذه الجهود.

يمثل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وصندوق دعم الاقتصاد (ESF) ٩١ بالمئة من تلك المخصصات الأميركية.

- لقد أنفقت الآن معظم أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وبتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، لم تعد أمواله متوفرة للالتزامات الجديدة.
- صندوق قوات الأمن العراقية الذي هو حالياً أكبر تيار تمويل أميركي داعم للعراق يبلغ مجموعه ١٧,٩٤ مليار دولار.^(٣٣)
- من أصل ٣,٧٤ مليار دولار مخصصة لصندوق دعم الاقتصاد، التزمت وزارة الخارجية الأميركية حوالي ١,٢٥ مليار دولار عبر اتفاقيات الوكالات وهبات واتفاقيات تعاونية.^(٣٤)
- برنامج الاستجابة الطارئة للقائد الذي يبلغ مجموعه الآن ٣,٥٦ مليار دولار يخضع لتوجيهات أكثر صرامة بالنسبة للموافقة على المشاريع بموجب قانون الترخيص للدفاع القومي (NDAA) الذي أقر مؤخراً للسنة المالية ٢٠٠٩.

يظهر الجدول ١-٢ إجمالي المخصصات عن كل سنة مالية، ويقدم الجدول ٢-٣ المعلومات التفصيلية المتوفرة حول التمويل الأميركي. الملحق (هـ) يحدّث المعلومات حول المخصصات الأميركية لإغاثة وإعادة إعمار العراق بما فيها المخصصات والالتزامات والإنفاقات.

التمويل العراقي (٥٧,٩٦ مليار دولار)


منذ ٢٠٠٣، خصّصت الحكومة العراقية ٤٥,٩٨ مليار دولار لإعادة الإعمار عبر موازنتها الرأسمالية. يتعدى الآن مجموع الموازنة العراقية لسنة ٢٠٠٨، ٧٢,١ مليار دولار تشمل المخصصات التكميلية العراقية التي أقرّت مؤخراً وتبلغ أكثر من ٢٠ مليار دولار. للعراق ثاني أكبر موازنة بين البلدان المجاورة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي فيها عدد مماثل من السكان. (أنظر الجدول ٢-٢). لكن هذه الموازنة الغنية لم تُترجم إلى زيادة بنفس النسبة لدخل الفرد. فدخل الفرد في العراق البالغ ١,٢١٤ دولاراً فقط يأتي بعيداً خلف المملكة العربية السعودية، البلد الإقليمي الذي في الطليعة، والذي تبلغ موازنته ١١٨ مليار دولار ويبلغ دخل الفرد فيه ١٥,٤٤٠ دولار. على نقيض ذلك، لدى الجزائر موازنة قريبة جداً من موازنة العراق أما دخل الفرد فيها فيبلغ ٣,٦٢٠ أي ثلاثة أضعاف ما هو عليه في العراق.^(٣٥)

بالنسبة لحساب الأصول المصدرة والمنوطة، وكذلك صندوق تنمية العراق (DFI)، أنظر الملحق (ز).

التمويل الدولي (١٧ مليار دولار)

يصادف شهر تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، الذكرى الخامسة لمؤتمر المانحين الدوليين في مدريد، وهو أول جهد واسع من قِبَل المجتمع الدولي لتقديم المساعدة إلى العراق. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كان المانحون الدوليون قد تعهدوا بتقديم ١٧ مليار دولار. لمزيد من المعلومات حول المانحين الدوليين، أنظر الجدول (ح).

الشكل ١-٢
مصادر تمويل إعادة إعمار العراق – ١٢٥,٧٣ مليار دولار
بمليارات الدولارات

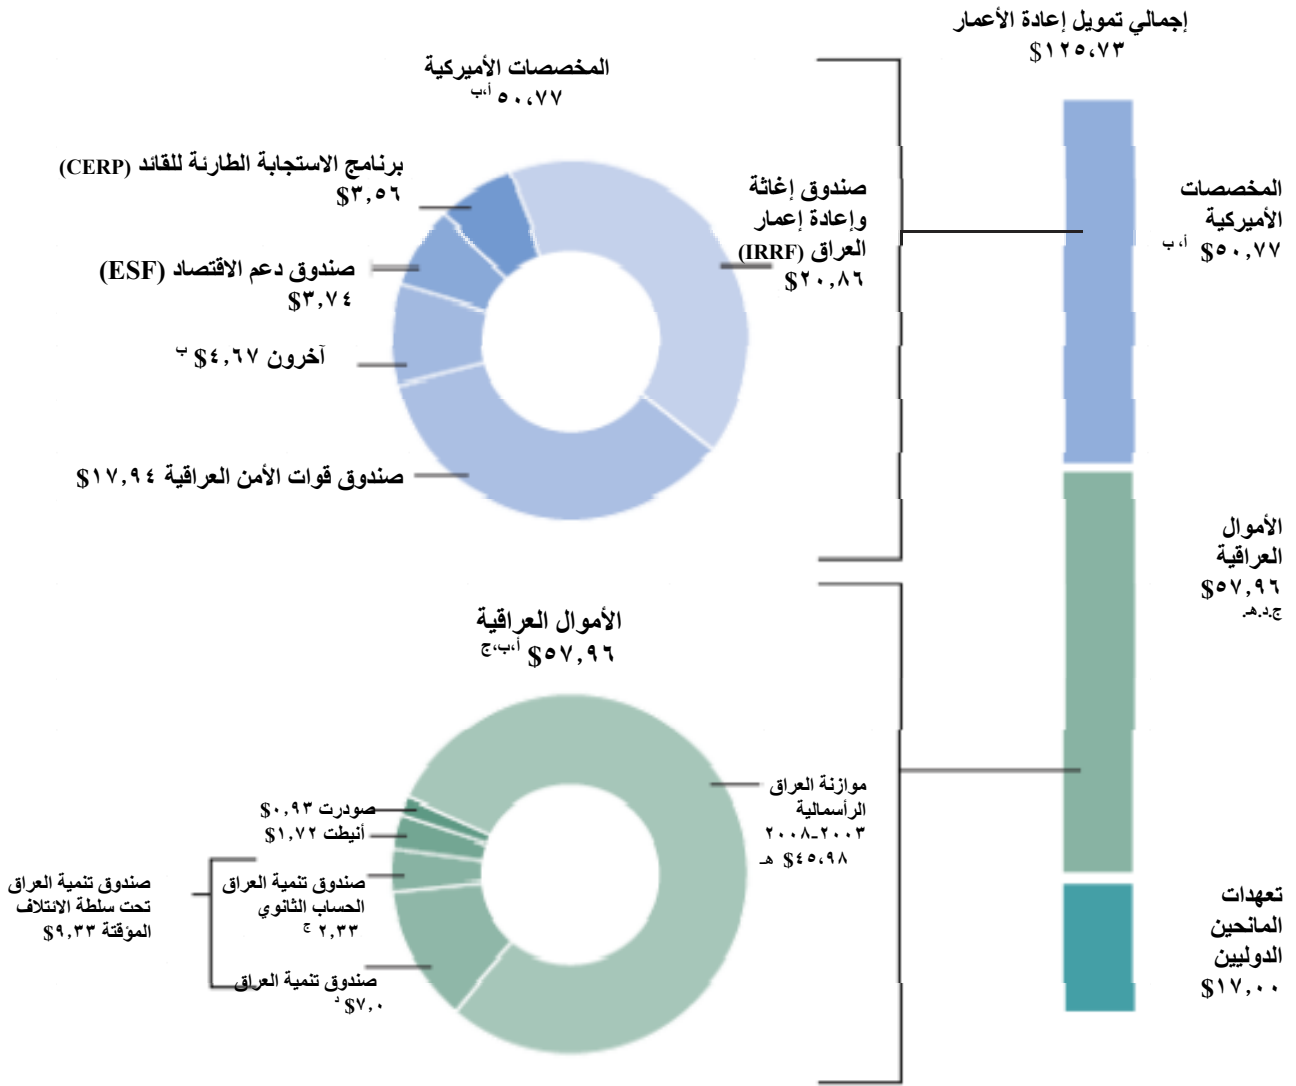


ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

- (١) أنظر قسم النظرة الإجمالية للحصول على وصف لتغيرات التمويل في المخصصات الأميركية منذ آخر تقرير ربع سنوي
(٢) قد تشمل المساعدات الإنسانية أو أنواع المساعدة الأخرى.
(٣) تشمل تحويل جرى في ١١/٨/٢٠٠٤، ٨٦ مليون دولار نقداً من بنك العراق المركزي إلى برنامج الإستجابة الطارئة للقائد بترخيص من وزارة المالية.
(٤) في تقارير ربع سنوية سابقة، ذكر مكتب المفتش العام حوالي ٢٠ مليار دولار في ودائع صندوق تنمية العراق التراكمية لأجل تمويل عمليات الحكومة العراقية وبرامج إعادة الإعمار. لقد أعاد المفتش العام تعديل هذا الرقم لكي يعكس فقط تمويل إعادة الإعمار الذي يبلغ تقريباً ٧ مليارات دولار وفقاً لتقرير مكتب المحاسبة الحكومي 05-876 (٢٠٠٥/٧/٢٨، ص ٢).
(٥) في السنة المالية 2003، غطت الموازنة النصف الأخير من سنة 2003 فقط. تشمل السنة المالية 2008 التمويل التكميلي.

المصدر: مكتب الإدارة والموازنة، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٩/١٧؛ وزارة المالية، وزارة التخطيط وسلطة الائتلاف المؤقتة، "عائدات وإنفاقات الجمهورية العراقية، ملخص موازنة تموز/يوليو / كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣"، ص 6، وزارة المالية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ مكتب الشرق الاوسط، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.

نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار

الشكل ٢-٢
الجدول الزمني للمخصصات الأميركية
بمليارات الدولارات

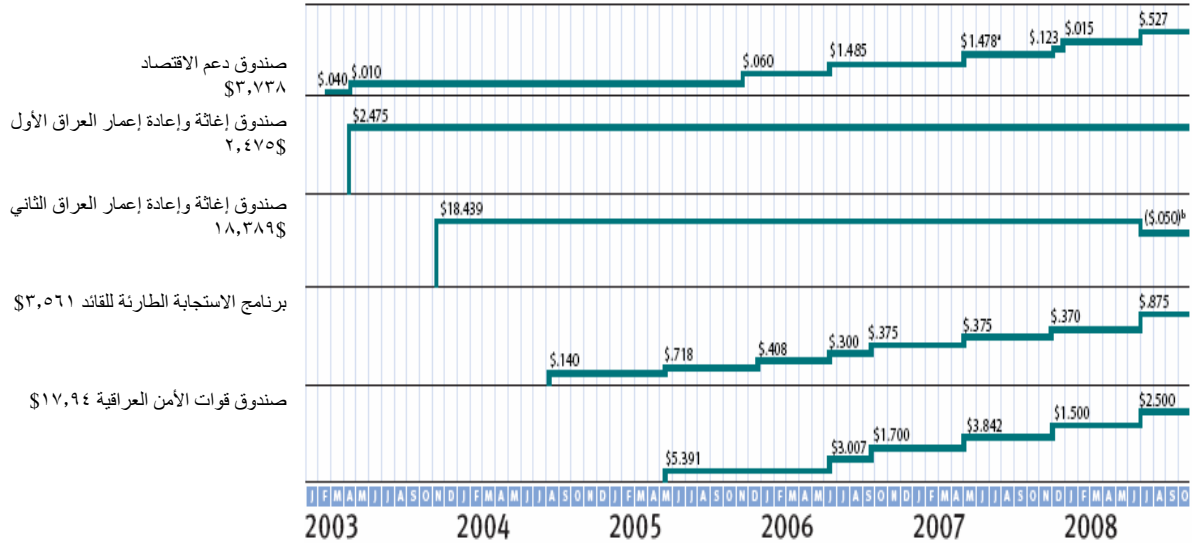

ملاحظة: إجمالي التمويل ليس وفق المقياس

- أ- يشمل إلغاء ٧٦ مليون دولار للسنة المالية ٢٠٠٧ بموجب القانون العام P.L. 110-28.
ب- يشمل إلغاء ٥٠ مليون دولار للسنة المالية ٢٠٠٨ بموجب القانون العام P.L. 110-252.

المصدر: تحليل مكتب المفتش العام للتمويل المخصص لإعادة إعمار العراق من قبل الكونغرس

الجدول ١-٢
الدعم الأميركي لإعادة إعمار العراق (بمليارات الدولارات)

أميركية	أُنفقت	ألزمت	وُزعت	خُصصت	
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول	\$٥,٢٥	\$٢,٢٦	\$٢,٢٧	\$٢,٤٨	
صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني	١٧,٢٦	١٧,٨٦	١٨,٣٣	١٨,٣٩	
إجمالي صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق	١٩,٥١\$	\$٢٠,١٢	\$٢٠,٦٠	\$٢٠,٨٦	
صندوق قوات الأمن العراقية السنة المالية ٢٠٠٥	٥,٢٢	٥,٢٨	٥,٣٩	٥,٣٩	
صندوق قوات الأمن العراقية السنة المالية ٢٠٠٦	٢,٦٧	٢,٨٦	٣,٠١	٣,٠١	
صندوق قوات الأمن العراقية السنة المالية ٢٠٠٧	٢,٩٠	٥,٥٣	٥,٥٤	٥,٥٤	
صندوق قوات الأمن العراقية السنة المالية ٢٠٠٨	٠,٢٥	٠,٤٢	٣,٠٠	٣,٠٠	
صندوق قوات الأمن العراقية السنة المالية ٢٠٠٩ لسد النقص	-	-	-	١,٠٠	
إجمالي صندوق قوات الأمن العراقية	\$١١,٠٤	\$١٤,٠٩	\$١٦,٩٤	\$١٧,٩٤	

الجدول ١-٢ (تابع)

أميركية	أُنفقت	أُلزمت	وُزعت	خُصصت
صندوق دعم الاقتصاد السنة المالية ٢٠٠٣	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٠٥	٠,٠٥
صندوق دعم الاقتصاد السنة المالية ٢٠٠٦	١,١٦	١,٣٩	١,٥٣	١,٥٥
صندوق دعم الاقتصاد السنة المالية ٢٠٠٧	٠,٧٢	١,٣٥	١,٦٠	١,٦٠
صندوق دعم الاقتصاد السنة المالية ٢٠٠٨	-	٠,٣٨	٠,٣٨	٠,٤٤
صندوق دعم الاقتصاد السنة المالية ٢٠٠٩ لسد النقص	-	-	-	٠,١٠
إجمالي صندوق دعم الاقتصاد	\$١,٩٣	\$٣,١٧	\$٣,٥٦	\$٣,٧٤
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية ٢٠٠٤	٠,١٣	٠,١٤	٠,١٤	٠,١٤
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية ٢٠٠٥	٠,٦٦	٠,٦٩	٠,٦٩	٠,٧٢
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية ٢٠٠٦	٠,٦٤	٠,٦٩	٠,٦٩	٠,٧١
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية ٢٠٠٧	٠,٦٨	٠,٧٣	٠,٧٣	٠,٧٥
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد السنة المالية ٢٠٠٨	٠,٥٧	١,٠٠	١,٠٠	١,٢٤
إجمالي برنامج الاستجابة الطارئة للقائد	\$٢,٦٨	\$٣,٢٥	\$٣,٢٥	\$٣,٥٦
تمويل آخر	٠,٠٨	٠,٢٦	٠,٢٦	٤,٦٧
إجمالي المخصصات الأميركية	\$٣٥,٢٤	\$٤٠,٨٩	\$٤٤,٦١	\$٥٠,٧٧

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

المصادر: صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF 1)؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٠؛ وزارة المالية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣؛ الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٩/٣٠؛ وزارة الخارجية (DoS)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/٤/٥؛ مصلحة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٠؛ صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2)؛ وزارة الخارجية، وضعية العراق الأسبوعية، ٢٠٠٨/١٠/١؛ صندوق قوات الأمن العراقية (ISSF)؛ OSD، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤. صندوق دعم الاقتصاد (ESF)؛ وزارة الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤ و ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ فرقة منطقة الخليج (GRD)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)؛ OSD، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ تمويلات أخرى: مكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (INL)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٧

نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار

الجدول ٢-٢
مقارنة وضعية العراق المالية مع جيرانه الإقليميين

الدخل للفرد	الموازنة (بالمليارات)	السكان (بالملايين)	البلد
\$١,٢١٤	\$٤٣,١	٢٧,٥	العراق
\$١٥,٤٤٠	\$١١٨,٣	٢٤,٢	المملكة العربية السعودية
\$١,٧٦٠	\$١١,٢	١٩,٩	سوريا
\$٨٧٠	\$٨,٤	٢٢,٤	اليمن
\$٣,٦٢٠	\$٤٠,٥	٣٣,٩	الجزائر

ملاحظة: تذكر المقارنة موازنات سنة 2007. يشمل إجمالي الدخل القومي (GNI) إجمالي الناتج المحلي وكذلك الفوائد والأرباح الموزعة والعائدات الأخرى.

المصادر: البنك الدولي www.worldbank.org/datastatistics/ دخول ٢٠٠٨/١٠/١٢؛ السفارة الأميركية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ World Facebook لوكالة الاستخبارات الأميركية (CIA)، www.cia.gov/، دخول ٢٠٠٨/١٠/١٢.

نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار

الجدول ٣-٢
المخصصات الأميركية لإغاثة وإعادة إعمار العراق (بملايين الدولارات)

اليه التمويل	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٤	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٥	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٦	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٧	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٨	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٩	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١٠	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١١	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١٢	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١٤	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١٥	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١٦	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١٧	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١٨	قانون المخصصات المدمجة ٢٠١٩	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٢٠
القانون العام	PL 108-7	PL 108-11	P.L.108-106	P.L.108-287	P.L.109-13	P.L.109-102	P.L.109-148	P.L.109-234	P.L.109-289	P.L.110-28	P.L.110-92 P.L.110-116 P.L.110-137 P.L.110-149	P.L.110-161	P.L.110-252 ⁽¹⁾					
تاريخ سن القانون	٢٠٠٣/٧/٢٠	٢٠٠٣/٤/١٦	٢٠٠٣/١١/١٦	٢٠٠٤/٨/٥	٢٠٠٥/٥/١١	٢٠٠٥/١١/١٤	٢٠٠٥/١١/١٥	٢٠٠٦/٦/١٥	٢٠٠٦/٩/٢٩	٢٠٠٧/٥/٢٥	٢٠٠٧/١٢/٢١	٢٠٠٧/١٢/٢٦	٢٠٠٨/٦/٣٠					
إجمالي تيارات التمويل الكبرى																		
			\$18,439,000															
صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق (IRRF) (2)																		
صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)																		
برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) (3)																		
صندوق دعم الاقتصاد (ESF) (ج)																		
صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق (IRRF 1)																		
إجمالي تيارات التمويل الكبرى																		
إجمالي برامج المساعدة الأخرى																		
صندوق إعادة إصلاح الأضرار التي تتعرض لها الموارد الطبيعية (NRRF)																		

نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار

الجدول ٢-٢ (تابع)

مجموع المخصصات	فئاتون المخصصات التكميلية لسنة ٢٠٠٨ (يشمل التمويل لسنة ٢٠٠٨ المالية لسد النقص للسنة المالية ٢٠٠٩)	فئاتون المخصصات المدمجة ٢٠٠٨	قرارات مواصلة المساعدات الخارجية ٢٠٠٧	فئاتون مخصصات جهوزية القوات الاميركية والعناية بقدامى الحرب، واستعادة العافية بعد اعصار كاترينا، ٢٠٠٧	فئاتون مخصصات وزارة الدفاع للسنة المالية ٢٠٠٧	مخصصات طارئة تكميلية للسنة المالية ٢٠٠٦	مخصصات لوزارة الدفاع للسنة المالية ٢٠٠٦	مخصصات لوزارة الخارجية للسنة المالية ٢٠٠٦	فئاتون المخصصات الطارئة التكميلية للدفاع والحرب العالمية ضد الارهاب واغاثة ضحايا التسونامي، ٢٠٠٥	فئاتون مخصصات وزارة الدفاع ٢٠٠٥	فئاتون المخصصات الطارئة للدفاع واعداد اعمار العراق وأفغانستان، ٢٠٠٤	فئاتون المخصصات التكميلية الطارئة لزمين الحرب، ٢٠٠٣	فئاتون المخصصات المجمعة ٢٠٠٣	اليه التمويل
	٢٠٠٨/٦/٣٠	61212007	٢٠٠٧/١٢/٢١	٢٠٠٧/٥/٢٥	٢٠٠٦/٩/٢٩	٢٠٠٦/٦/١٥	١٢/٣٠ ٢٠٠٥	٢٠٠٥/١١/١٤	٢٠٠٥/٥/١١	٢٠٠٤/٨/٥	٢٠٠٣/١١/١٦	٢٠٠٣/٤/١٦	٢٠٠٣/٢/٢٠	تاريخ سن القانون
\$٣٦٦,٤٤٨	٨٥,٠٠٠		\$٢٠,٠٤٨	\$١٥٠,٠٠٠		\$٩١,٤٠٠						\$٢٠,٠٠٠		مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي التابع لوزارة الخارجية (DoS/INL)
\$٣٢٥,٠٠٠	٧٥,٠٠٠			\$٢٥٠,٠٠٠										صندوق الديبلوماسية الخارجية (وزارة الخارجية)
\$٢٨٨,٨٠٠	٤٥,٠٠٠	\$٥٠,٠٠٠	\$٥,٠٠٠	\$٤٥,٠٠٠								\$١٤٣,٨٠٠		مساعدات الكوارث الدولية والمجاعة ^(١) مساعدات الهجرة واللاجئين ^(٢)
\$٤٨٢,٤٠٠	٢٦٩,٠٠٠	\$١٤٩,٤٠٠	\$٢٠,٠٠٠	\$٤٥,٠٠٠										صندوق حرية العراق (مبادرة بريكنلي)
\$٩٠,٠٠٠												\$٩٠,٠٠٠		صندوق برامج إنقاذ حياة الأطفال وصحتهم
\$٦٨,٠٠٠													\$٦٨,٠٠٠	القانون العام PL 480 - العنوان ٢ - المساعدات الغذائية
\$٥٠,٠٠٠												\$٥٠,٠٠٠		عمليات حفظ السلام التطوعية
\$٤٠,٠٠٠											\$٤٠,٠٠٠			محطة إذاعة الحرية العراقية
\$٣٩,٨٢٥	٤,٥٠٠	١٥,٩٧٥	\$١٢,٣٥٠	\$٧,٠٠٠										برامج عدم انتشار (أسلحة الدمار الشامل)، ومقاومة الإرهاب والأمور المتصلة بها (NADR)

ملخص التمويلات الأميركية

الجدول ٣-٢ (تابع)

مجموع المخصصات	قانون المخصصات التكميلية لسنة ٢٠٠٨ (يشمل التمويل لسنة ٢٠٠٨ المالية لسد النقص للسنة المالية ٢٠٠٩)	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٨	قرارات مواصلة المساعدات الخارجية ٢٠٠٧	قانون مخصصات جهوزية القوات الاميركية والعناية بقدامى الحرب، واستعادة العافية بعد اعصار كاترينا، ٢٠٠٧	قانون مخصصات وزارة الدفاع للسنة المالية ٢٠٠٧	مخصصات طارئة تكميلية للسنة المالية ٢٠٠٦	مخصصات وزارة الدفاع للسنة المالية ٢٠٠٦	مخصصات لوزارة الخارجية للسنة المالية ٢٠٠٦	قانون المخصصات الطارئة التكميلية للدفاع والحرب العالمية ضد الارهاب واغاثية ضحايا التسونامي، ٢٠٠٥	قانون مخصصات وزارة الدفاع ٢٠٠٥	قانون المخصصات الطارئة لإعادة إعمار العراق وأفغانستان، ٢٠٠٤	قانون المخصصات التكميلية الطارئة لزمين الحرب، ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	اليه التمويل
	٢٠٠٨/١/٣٠	612 2007	٢٠٠٧/١٢/٢١	٢٠٠٧/٥/٢٥	٢٠٠٦/٩/٢٩	٢٠٠٦/٦/١٥	١/٢/٣٠ ٢٠٠٥	٢٠٠٥/١١/١٤	٢٠٠٥/٥/١١	٢٠٠٤/٨/٥	٢٠٠٣/١١/١٦	٢٠٠٣/٤/١٦	٢٠٠٣/٢/٢٠	تاريخ سن القانون
\$٣٧,٠٠٠												\$٣٧,٠٠٠		المساعدات الطارئة للاجئين والمهجرين
\$١٧,٠٠٠											\$١٧,٠٠٠			المساعدات الإنسانية الخارجية وبمناسبة الكوارث والمدنية
\$١٥,٧٥٠				\$٢,٧٥٠		\$١٣,٠٠٠								المساعدات الفنية في الشؤون الدولية
\$١٢,٣٠٠		٦,١٥٠	٦,١٥٠											برامج التعليم والتبادل الثقافي
\$٣,٦١٢												\$٣,٦١٢		صندوق مبادرة القائد العام (CINC)
\$٢,٦٤٨	١,٦٤٨					\$١,٠٠٠								النشاطات القانونية ومساعدو القضاة (الرواتب والنفقات)
\$٢,٠٧٣		٢٤٢	\$١,١٣٨					\$٦٩٣						التدريب العسكري والتعليمي الدولي (IMET)
\$١,٦٤٨				\$١,٦٤٨										وزارة العدل، دعم الاحتكام للقضاء
٢,٤٣٢,٨٠٤ \$	٥٣٠,١٤٨	٢٢١,٧٦٧	٦٤,٦٨٦	٥٥١,٣٩٨	صفر	١٠٥,٤٠٠	صفر	٦٩٣	صفر	صفر	٥٧,٠٠٠	٨٣٣,٧١٢	٦٨,٠٠٠	إجمالي برامج المساعدات الأخرى
التكاليف التشغيلية المتعلقة بإعادة الأعمال														
\$٩٠٨,٠٠٠												٩٠٨,٠٠٠		سلطة الائتلاف المؤقتة (CPA) (*)

نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار

الجدول ٢-٢ (تابع)

اليه التمويل	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣	قانون المخصصات المدمجة ٢٠٠٣
القانون العام	PL 108-7	PL 108-11	P.L.108-106	P.L.108-287	P.L.109-13	P.L. 109-102	P.L.109-148	P.L.109-234	P.L.110-28	P.L.110-92	P.L.110-161	P.L.110-252	مجموع المخصصات
تاريخ سن القانون	٢٠٠٣/٢/٢٠	٢٠٠٣/٤/١٦	٢٠٠٣/١١/١٦	٢٠٠٤/٨/٥	٢٠٠٥/٥/١١	٢٠٠٥/١١/١٤	١/٢/٣٠ ٢٠٠٥	٢٠٠٦/٦/١٥	٢٠٠٦/٩/٢٩	٢٠٠٧/١٢/٢١	612 2007	٢٠٠٨/١/٣٠	مجموع المخصصات
مكتب المشاريع والعقود ^(د)								٢٠٠٠٠٠٠	٦٣٠٠٠٠٠				\$٨٣٠٠٠٠٠
المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)			\$٧٥,٠٠٠					\$٢٤,٠٠٠	\$٣٥,٠٠٠			٣٩,٠٠٠	\$١٧٣,٠٠٠
التكاليف الإدارية لصندوق حرية العراق (PRT)									١٠٠٠٠٠٠				١٠٠٠٠٠٠
النفقات الإدارية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ^(د)		\$٢١,٠٠٠			\$٢٤,٤٠٠			\$٧٩,٠٠٠	\$٢,٧٥٦			٤٨,٥٥٩	\$١٧٢,٩٥٩
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/مكتب المفتش العام (USAID/OIG)		\$٣,٥٠٠	\$١,٩٠٠		\$٢,٥٠٠				\$٢,٧٥٦	٥٤٢	٣,٠٢٥	٥٠٥٠٠	\$١٩,٧٢٣
وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA) (ب)									\$١٦,٣٧٢				\$١٦,٣٧٢
وزارة الخارجية - مكتب المفتش العام								\$١,٠٠٠	\$١,٣٠٠	١,٥٠٠	١,٣٠٠	٣,٨٠٠	\$٨,٩٠٠
وزارة الدفاع - مكتب المفتش العام								\$٥,٠٠٠					\$٥,٠٠٠
المتعلقة بإعادة الإعمار		٢٤,٥٠٠	٩٨٤,٩٠٠	صفر	صفر	صفر	صفر	٣٠٩,٠٠٠	صفر	٧٨٥,٤٢٨	صفر	٩٦,٨٥٩	\$٢,٢٣٣,٩٥٤
المجموع العام: كافة الأموال الأميركية المخصصة	١٠٨,٠٠٠	٣,٣٤٣,٠٢٢	١٩,٤٨٠,٩٠٠	١٤٠,٠٠٠	٦١,٣٥٠,٩٠٠	٦١,٠٨٣	٤٠٨,٠٠٠	٥٠٢,٦٤,٤٠٠	٢,٠٧٥,٠٠٠	٧٠,٣٢,٥٢٦	٢,١١٠,٩٧١	٤,٤٧٨,٥٠٧	\$٥,٠٧٧,٠٠٢

ملاحظات:

- (١) تمثل الـ ١٨,٤٣٩ مليار دولار المبلغ الذي خصصه الكونغرس لبرامج العراق في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢ بموجب القانون العام P.L. 108-106 الذي أقر في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٣. كان الكونغرس قد خصص في البداية ١٨,٦٤٩ مليار دولار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢، لكنه خصص أيضاً ٢١٠ ملايين دولار لتحويلها إلى حسابات أخرى لبرامج في الأردن وليبيريا والسودان. من أصل الـ ١٨,٤٣٩ مليار دولار المنتقبة، حوّلت الإدارة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق إلى حسابات أخرى حوالي ٥٦٢ مليون دولار إلى برامج لها علاقة بالعراق لا يمكن تنفيذها إلا في حسابات أخرى، مثل مبلغ ٣٥٢ مليون دولار الذي يمثل البرنامج الثنائي لإعفاء العراق من دينه إزاء الولايات المتحدة الذي يتطلب تمويلاً في حساب وزارة المالية الأميركية. لقد تم تبليغ الكونغرس عن كل التحويلات من حساب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. علاوة على ذلك، وفي مخصصات السنة المالية ٢٠٠٦، خصص الكونغرس ٩,٩٥ مليون دولار كي تنقل إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من حساب صندوق دعم الاقتصاد التابع لوزارة الخارجية. وتشمل أيضاً ٥٠ مليون دولار ملغاة كما هو معين في HR 2642
- (٢) خصص الكونغرس ٥٠٠ مليون دولار في تمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد بموجب القانون العام P.L. 110-161؛ وخصصت وزارة الدفاع ٣٧٠ مليون دولار للعراق و ١٣٠ مليون دولار لأفغانستان.
- (٣) يشمل ٤٠ مليون دولار من حساب صندوق دعم الاقتصاد الأساسي لسنة ٢٠٠٣ لم يتم تسديدها؛ ١٠ ملايين دولار من القانون العام P.L. 108-11. المخصصات التكميلية الطارئة لصندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية ٠٧ تشمل ٧٦ مليون دولار أُلغيت.
- (٤) التمويل المخصص لمساعدات الكوارث الدولية والمجاعة ومساعدات اللاجئين والمهجرين بموجب HR2642 معرضة للتغيير بانتظار التخصيص النهائي على الصعيد العالمي لهذين الصندوقين.
- (٥) يستنتى ٧٥ مليون دولار للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق بموجب القانون العام P.L. 108-106.
- (٦) وفق تقارير كل مؤتمر للقانونيين العامين P.L. 109-234 و P.L. 110-28، تمويل دعم إعادة الإعمار متوفر هنا لنشاطات مكتب المشاريع والعقود.
- (٧) غير منجز بانتظار مزيد من التحقيقات بخصوص الإنفاقات الإدارية لكافة السنوات المالية.
- (٨) كما هو مبين في تقرير القانون العام P.L. 110-28. يشمل جهود إعادة إعمار العراق بالنسبة للموظفين المدنيين، والواجبات المؤقتة/الإضافية والعقود المختلفة.
- (٩) التمويل الإضافي بموجب القانون العام P.L. 110-252 الذي ذكره مكتب الإدارة والموازنة سوف ينعكس في التقارير ربع السنوية القادمة لمكتب المفتش العام.
- (١٠) تستنتى ٩٩ مليون دولار لمركز إقليم في الأردن. سوف تعكس تقارير مكتب المفتش العام في المستقبل. هذا التمويل في إجمالي مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية.

ملخص التمويلات الاميركية

يرفع مكتب المفتش العام التقارير حول الإشراف واحتساب الأموال الأميركية المخصصة أو سوى ذلك والمتوفرة لبناء البنية التحتية، ولإقامة المؤسسات السياسية والاجتماعية، وشراء المنتجات والخدمات لصالح الشعب العراقي.

لقد جعلت الولايات المتحدة مساعدات إعادة الإعمار متوفرة عبر ٣٣ تياراً. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كان الكونغرس قد خصص أكثر من ٥٠,٧٧ مليار دولار لهذه الحسابات.^(٣٦)

برنامج إعادة الإعمار الأميركي المتطور

الوضع الطبيعي الناشئ حديثاً في العراق يعني ان البرنامج الأميركي لإعادة الإعمار قد دخل مرحلة جديدة ومحدودة أكثر مالياً. فعلى الرغم من أن العديد من المشاريع الأميركية تتواصل، إلا أن معدل المخصصات الأميركية قد انخفض بصورة ملحوظة هذه السنة، كما أن معظم المشاريع الكبرى الممولة من الولايات المتحدة قد أنجزت أو توقف إنجازها. الأموال التكميلية للسنة المالية ٢٠٠٨ قَدِّمت ٤,٤٨ مليار دولار، أي ٣٦ بالمئة أقل من المبالغ التكميلية للسنة المالية ٢٠٠٧. يُلخَّص الجدول ٢-٤ مخصصات إعادة إعمار العراق حسب السنوات المالية، كما يظهر الشكل ٢-٣ نظرة إجمالية حول معدل المخصصات الأميركية المتوفرة لكل واحدة من تلك السنوات.

إضافة إلى خفض مستويات التمويل، وضع الكونغرس شروطاً على التمويلات الأميركية المقبلة. في قانون الترخيص للدفاع القومي الجديد (NDAA) سمح الكونغرس بمبالغ محدودة من التمويل الإضافي ووضع قيوداً على الاستخدامات المسموح بها للمخصصات الأميركية.^(٣٧) علاوة على ذلك، تتطلب المخصصات المقررة، تنسيقاً متزايداً للإنفاق على إعادة الإعمار مع الحكومة العراقية، وعلى الأخص للمشاريع الممولة حالياً من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.^(٣٨)

الجدول ٢-٤
المخصصات الأميركية لإعادة الإعمار
حسب السنوات المالية (بملايين الدولارات)


السنة المالية	المخصصات
٢٠٠٣	\$٣,٤٥١
٢٠٠٤	\$١٩,٦٢١
٢٠٠٥	\$٦,١٣٦
٢٠٠٦	\$٥,٦٧٥
٢٠٠٧	\$٩,١٠٨
٢٠٠٩/٢٠٠٨*	\$٦,٧٧٩
المجموع	\$٦٠,٧٧٠

* الأموال التي جعلت متوفرة بموجب هذه المخصصات كانت للسنة المالية ٢٠٠٨ كما وللسنة المالية ٢٠٠٩ تمويل سد النقص.

المصدر: القوانين، P.L. 109-13, P.L. 108-287, P.L. 108-106, P.L. 108-11, P.L. 108-7, P.L. 108-148, P.L. 109-102, P.L. 109-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149, P.L. 110-161, 109-234, P.L. 109-289, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149, P.L. 110-161, 109-234, P.L. 109-289, P.L. 110-28, 110-252

الشكل ٣-٢

المخصصات الأميركية لإعادة الإعمار
حسب السنوات المالية (بملايين الدولارات)

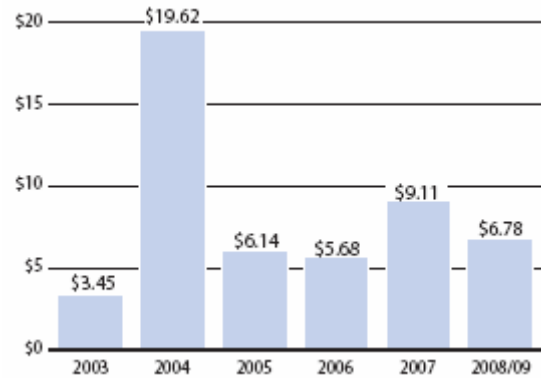


المصدر: القوانين، P.L.109-102, P.L.109-148, P.L.109- P.L.108-7, P.L.108-11, P.L.108-106, P.L.108-287, P.L.109-13, P.L.110-116, P.L.110-137, P.L.110-149, P.L.110-161, P.L.110-252 234, P.L. 109-289, P.L.110-28, P.L.110-92,

الشكل ٤-٢

نظرة إجمالية على وضعية الصناديق (بمليارات الدولارات)

وضعية الصندوق بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٣٠
الصندوق
ألزمت: النسبة المئوية للتغيير منذ ربع السنة الأخير
أنفقت: النسبة المئوية للتغيير منذ ربع السنة الأخير
الإنفاقات حسب السنة المالية للمخصصات

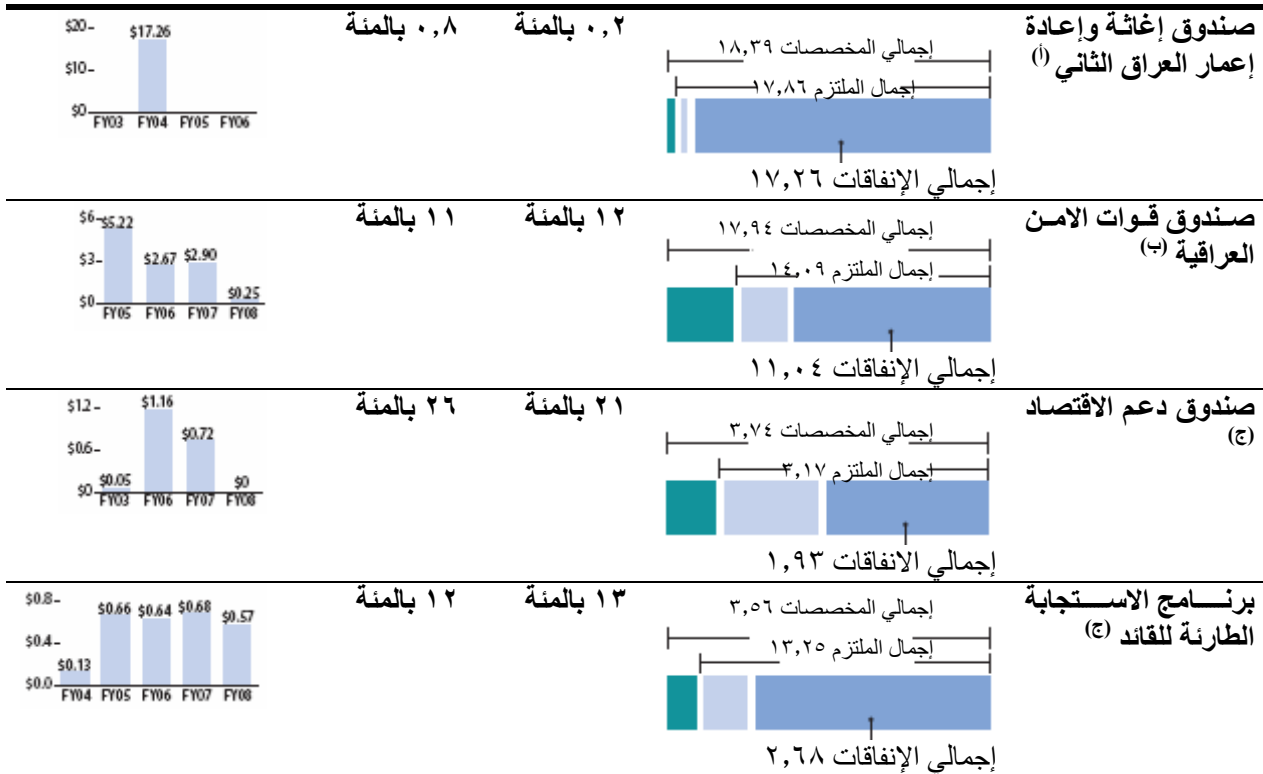

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

- (١) المصادر: P.L. 108-106؛ وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٨/١٠/١
- (٢) P.L. 108-13؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-13
- مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- (٣) P.L. 108-7؛ P.L. 108-11؛ P.L. 109-102؛ P.L. 109-234؛ P.L. 110-28؛ P.L. 110-92؛ P.L. 110-116؛ P.L. 110-137؛ P.L. 110-149؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ P.L. 110-252؛ وزارة الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٧/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، استجابة لطلب المفتش العام لليبيانات ٢٠٠٨/١/٤ و ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ فرقة منطقة الخليج (GRD)، استجابة لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، استجابة لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (٤) P.L. 108-287؛ P.L. 109-13؛ P.L. 109-148؛ P.L. 109-234؛ P.L. 109-289؛ P.L. 110-161؛ P.L. 110-252؛ مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام لليبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.

نظرة إجمالية حول حسابات التمويل الأميركية الكبرى

لقد جُعل حوالي ٩١ بالمئة من المخصصات الأميركية لإعادة إعمار العراق متوفراً عبر أربعة حسابات كبرى: صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (المشار إليهما عموماً بصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الاول (IRRF 1) وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2))، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة للقائد (CERP). ألزمت حسابات التمويل الأربعة هذه ٤٠,٦٣ مليار دولار وأنفقت ٣٥,١٦ مليار دولار لجهود إعادة الإعمار في العراق، بما في ذلك زيادة بنسبة ٦,٤ بالمئة في الإنترامات وزيادة ٥,٨ بالمئة في الإنفاقات خلال ربع السنة الأخير. تظهر المعلومات حول التمويلات الكبرى:

- **صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF):** أكثر من ٩٧ بالمئة ألزم وحوالي ٩٤ بالمئة أنفق.^(٣٦)
- **صندوق قوات الامن العراقية (ISFF):** يملك صندوق قوات الأمن العراقية أكبر مبلغ من الأموال التي لا تزال متوفرة للإنترامات الجديدة، ٣,٨٥ مليار دولار.^(٤٠)
- **برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP):** ألزم برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وأنفق أعلى نسبة مئوية من الأموال المخصصة باستثناء صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.^(٤١)
- **صندوق دعم الاقتصاد (ESF):** يتأخر صندوق دعم الاقتصاد عن سواه من الصناديق الرئيسية في الإنفاقات، مع أكثر من ٤٨ بالمئة من مخصصاته التي لا تزال غير مُنفقة^(٤٢) (بالمقارنة مع ٦ بالمئة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق و ٢,٢٥ بالمئة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، و ٣٨ بالمئة لصندوق قوات الامن العراقية). بالنسبة للتفاصيل حول مراجعة مكتب المفتش العام لحساب صندوق دعم الاقتصاد خلال ربع السنة، أنظر القسم ٤.

بالنسبة لوضعية الحسابات الأميركية الكبرى الداعمة لإعادة إعمار العراق، أنظر الشكل ٢-٤.

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨٧، انتهت مدة صلاحية الالتزام بأموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني لمشاريع جديدة. من أصل أكثر من ١٧,٨٦ مليار دولار ألترم بها لتاريخه، تم إنفاق ١٧,٢٦ مليار دولار وبقي مبلغ ٥٣٠ مليون دولار لم يلتزم به.^(٤٣) هذه الأموال لم تعد متوفرة للإنترامات جديدة لكنها سوف تبقى متوفرة لتعديلات العقود الحالية.^(٤٤)

من أصل الإجمالي الملتزم به لتاريخه، لا يزال هناك ٦٠٠ مليون دولار متوفرة للإنفاق.

صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني

وُزعت الأموال المخصصة بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني على ١٠ فئات من المشاريع^(٤٥) من أصل إجمالي برنامج الإنفاقات خلال ربع السنة هذا، سجل قطاع الكهرباء (٦٢ مليون دولار) وقطاع المياه والصرف الصحي (٢٢ مليون دولار) أعلى مبالغ^(٤٦) بالنسبة لوضعية المخصصات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني، أنظر الجدول ٥-٢.

الجدول ٥-٢

المخصصات، الإلتزامات والإنفاقات حسب القطاعات في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (بالمليارات)

نوع المشروع	خُصص	أُلزم	أنفق
الأمن وفرض القانون	\$٤,٩٦	\$٤,٩٤	\$٤,٨٧
العدل، السلامة العامة والمجتمع المدني	٢,٣٠	٢,٢٦	٢,١٨
قطاع الكهرباء	٤,١٨	٤,٠٧	٣,٩٤
البنية التحتية للنفط	١,٧٢	١,٦١	١,٥٨
المياه والصرف الصحي	٢,٠٥	١,٩٨	١,٨٥
النقل والاتصالات	٠,٤٦	٠,٤٦	٠,٤٢
الطرق، الجسور والإعمار	٠,٣٢	٠,٢٨	٠,٢٦
العناية الصحية	٠,٨١	٠,٧٩	٠,٧٤
تنمية وتطوير القطاع الخاص	٠,٨٤	٠,٨٢	٠,٨١
التعليم، اللاجئون، حقوق الإنسان، نظام الحكم	٠,٤٧	٠,٤٤	٠,٤١
النفقات الإدارية	٠,٢٢	٠,٢٢	٠,٢١
المجموع	\$١٨,٣٣	\$١٧,٨٦	\$١٧,٢٦

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

المصدر: وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٨/١٠/١

الجدول ٢-٦
تحديثات مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ٢ (IRRF 2) حسب القطاعات

فئة المشروع	النتائج والحصيلة
الأمن وفرض القانون	<ul style="list-style-type: none"> تم خلال ربع السنة هذا إنجاز قصري عدل في ديالى ونيوى. انتهت الأشغال في محطة الشرطة في الشيباش في أيار/مايو ٢٠٠٨. انتهى العمل في مرفق سجن الناصرية، المرحلة الأولى، في أيار/مايو ٢٠٠٨.
العدل، السلامة العامة والمجتمع المدني	<ul style="list-style-type: none"> تراجعت المخصصات لجهود إعادة الإعمار وتحديث مرافق الاحتجاز بأكثر من ٦ ملايين دولار. ازداد تمويل نشاطات بناء الديمقراطية بنسبة ٢٤,٨٠ مليون دولار خلال ربع السنة الأخير.
قطاع الكهرباء	<ul style="list-style-type: none"> تم إنجاز خط توزيع في ديالى. تم العمل في محطة تحويل بكلفة ٣,٦ مليون دولار في محافظة الأنبار.
البنية التحتية للنفط	<ul style="list-style-type: none"> وصلت مشاريع إعادة الإعمار الخاصة بالنفط إلى مرحلة الإقبال. بلغ إنتاج النفط القياسي ٢,٤٧ مليون برميل في اليوم.
النقل والاتصالات	<ul style="list-style-type: none"> شبكة الاتصالات اللاسلكية الرقمية لنظام التحكم بالقطار عبر الكمبيوتر من المتوقع أن تصبح شغالة قبل نهاية ٢٠٠٨. يستمر التقدم في مشروع نظام التحكم بالقطار عبر الكمبيوتر العراقي لإعادة تأهيل المساكن ومحطة الفلوجة.
الموارد المائية والصرف الصحي	<ul style="list-style-type: none"> إضافة ٢,٢٥ مليون قدم مكعب في اليوم لقدرات المعالجة. القدرات الإضافية سوف يستفيد منها ٨,٤ مليون شخص.
الطرق، الجسور والإعمار	<ul style="list-style-type: none"> تم إنجاز جسر الشيخ سعد بكلفة ٤,٩ مليون دولار بموجب اتفاقية هبة مع الحكومة العراقية. بوسر في عقد لأجل إضافة خطى سير على طريق بابل رقم ٨٠.
العناية الصحية	<ul style="list-style-type: none"> تم إنجاز ١٢ مركزاً للعناية الصحية الأولية خلال ربع السنة هذا. أنجزت أعمال إعادة التأهيل في مستشفى التوليد والأطفال في الحلة، ومستشفى بلدى للتوليد والأطفال.
تنمية وتطوير القطاع الخاص	<ul style="list-style-type: none"> أنجزت الاختبارات على نظام شبكة المنطقة المحلية للتجارة الإلكترونية في بورصة العراق؛ يتوقع أن يبدأ التبادل الإلكتروني خلال ربع السنة القادم. ساعدت وزارة الطاقة الأميركية العراقيين في تطوير إستراتيجية قومية للطاقة.
التعليم، اللاجئين، حقوق الإنسان والحكم	<ul style="list-style-type: none"> تم توسيع المساعدة التربوية إلى حوالي ٧٣,٠٠٠ لاجئ عراقي في سوريا والأردن. تم قبول الخطط لشراء معدات ومكانات بقيمة ١٠,٢ مليون دولار لمحطة المرافق المركزية في الجامعة الأميركية في العراق بمدينة السليمانية. إزداد تمويل نشاطات الحكم بحوالي ١٨ مليون دولار.

المصادر: وزارة الخارجية، تقرير القسم 2207، ٢٠٠٨/٧؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب شؤون الشرق الأدنى في وزارة الخارجية (DoS) (NEA-1)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

الجدول ٧-٢

مشاريع إعادة الإعمار الكبرى لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

المحافظة	تاريخ الإنجاز الأصلي	بداية المشروع	إجمالي الكلفة الواردة في الموازنة	المشروع
بغداد	٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٧/٢/١٧	\$١٨٢,٤٥	توسعة محطة الطاقة في القدس
بغداد	٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٦/٧/٣١	\$٥٠,٠٠٠	إنشاء محطة تحويل في فارابي وجميلة ١٣٢ كيلو فولت
المتنى	٢٠٠٩/٣/١	٢٠٠٦/١١/٢٥	\$٣٨,٥٠	إنشاء مصرف الفرات الشرقي (المناطق يب و٤)
البصرة	٢٠٠٩/١/٣١	٢٠٠٦/١٠/١٨	\$٣٤,٤٠	مستشفى الأطفال في البصرة ^(٦)
الأنبار	٢٠٠٨/١٠/١٥	٢٠٠٧/١/٣٠	\$٣٠,٩١	إنشاء محطة تحويل في الرمادي ١٣٢ كيلو فولت
القادسية	٢٠٠٨/١٠/٣١	٢٠٠٧/٦/١٧	\$٢٦,٢٩	إنشاء محطة تحويل في الديوانية ١٣٢ كيلو فولت
الأنبار	٢٠٠٩/٩/٢٢	٢٠٠٦/١٢/٩	\$٢٤,٥١	SS-016، إنشاء محطة لمعالجة المياه المهذورة في الفلوجة، المرحلة ٢
بغداد	٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٥/١٢/٢٦	\$٢٤,١٥	إنشاء مباني مراكز تحويل الهاتف في المأمون
النجف	٢٠٠٩/٤/٧	٢٠٠٧/٩/٢٠	\$٢٣,٥٣	إنشاء مشروع مشكاب لتأمين المياه
ذي-قار	٢٠٠٨/١٢/٣١	٢٠٠٧/٣/١	\$٢٠,٠٠٠	إنشاء محطة ضخ ملياه الصرف في الناصرية

ملاحظة: التكاليف الواردة في الموازنة في الجدول أعلاه تمثل حصة بنود الخط لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق من كل مشروع كما هو وارد في نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس إجمالي تكاليف المشروع. بنود الخط قد تمثل جزءاً من المشاريع المنفذة على عدة مراحل أو بموجب عدة أوامر مهمة.

(١) حصة فرقة منطقة الخليج

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) - فرقة منطقة الخليج، ملف الانتهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق، ٢٠٠٨/١٠/١.

مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قيد التنفيذ

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كان هناك ٢٩٧ مشروع لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق قيد التنفيذ بقيمة ١,١٠ مليار دولار. كانت حصة فرقة منطقة الخليج من المشاريع ٧٥ بالمئة من التكاليف، وفي ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كان هناك ٧٢ مشروعاً قيد التنفيذ لفرقة منطقة الخليج بكلفة ٨٢٦ مليون دولار.^(٤٧) خلال ربع السنة هذا، ذكرت فرقة منطقة الخليج انها أنجزت ٥٤ مشروع إعمار و٨ مشاريع غير إنشائية.^(٤٨) يعطي الجدول ٦-٢ لائحة بأسماء بعض مشاريع الإعمار الكبرى الجاري تنفيذها لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق.

الجدول ٨-٢

مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية (بملايين الدولارات)

المخصصات	القانون العام	المبلغ
قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع والحرب العالمية على الإرهاب، وإغاثة ضحايا تسونامي، ٢٠٠٥	P.L. 109-13	\$٥,٣٩١
قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع والحرب العالمية على الإرهاب واستعادة العاقبة بعد الاعصار، ٢٠٠٦	P.L. 109-234	\$٣,٠٠٧
قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠٠٧	P.L. 109-289	\$١,٧٠٠
جهوزية القوات الأميركية، العناية بقدامى المحاربين، استعادة العاقبة بعد إعصار كاترينا، وقانون ومخصصات المحاسبة في العراق، ٢٠٠٧	P.L. 110-28	\$٣,٨٤٢
قانون المخصصات المجمع، ٢٠٠٨	P.L. 110-161	\$١,٥٠٠
قانون المخصصات التكميلية، ٢٠٠٨	P.L. 110-252	\$٢,٥٠٠
المجموع		\$١٧,٩٤٠

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

صندوق قوات الأمن العراقية

صندوق قوات الأمن العراقية هو أكبر صندوق لإعادة إعمار العراق حالياً في العراق (١٧,٩٤ مليار).^(٤٩) يبلغ إجمالي الالتزامات ١٤,٠٩ مليار دولار تم إنفاق ١١,٠٤ مليار منها، وبقي ٦,٩ مليار دولار للإنفاق. ازدادت الإنفاقات خلال ربع السنة هذا أكثر من ١,١١ مليار دولار بالنسبة لربع السنة السابق. للحصول على لائحة بمخصصات صندوق قوات الأمن العراقية منذ الترخيص للصندوق سنة ٢٠٠٥، أنظر الجدول ٨-٢.

آخر مخصصات تمويل تكميلية للسنة المالية ٢٠٠٨ ولسد النقص للسنة المالية ٢٠٠٩، أضافت ٢,٥ مليار دولار إلى صندوق قوات الأمن العراقية. غير أن مخصصات الصندوق للسنة المالية ٢٠٠٨ هبطت بنسبة ٣٥ بالمئة بالنسبة للعام الماضي.

تدير القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تمويل صندوق قوات الأمن العراقية لمساعدة الحكومة العراقية في تنمية وتنظيم وتدريب وتجهيز ودعم قوات الأمن العراقية.^(٥٠) تشير الميول الأخيرة أن إنفاق صندوق قوات الأمن العراقي يركز على بناء اللوجستية وقدرات الدعم.^(٥١)

المخصصات المجمعة لموازنة الحكومة العراقية لسنة ٢٠٠٨ لقوات الأمن العراقية انخفضت بنسبة ٤٤,٣ بالمئة دون المطلوب.^(٥٢)


يؤكد قانون الترخيص للدفاع القومي على وجهة نظر الكونغرس القائلة بأن تمويل الجوانب الأساسية لإعادة إعمار العراق لا يجوز بعد الآن أن يأتي من دولارات دافعي الضرائب الأميركيين. ويقول قانون الترخيص للدفاع القومي إن صندوق قوات الأمن العراقية "لا يمكن الالتزام بمبالغه أو إنفاقها بشراء أو تحويل أو إعادة تأهيل أو تركيب مرافق في العراق لاستخدام الحكومة العراقية".^(٥٣) علاوة على ذلك، يجب استخدام الأموال العراقي لدفع تكاليف رواتب تدريب وتجهيز ودعم قوات الأمن العراقية.^(٥٤) بالنسبة لمجموع مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية حسب مجموعات النشاط الفرعي، أنظر الشكل ٥-٢.

الإنفاق حسب مجموعة نشاطات الموازنة

تنفذ كافة أموال صندوق قوات الأمن العراقية في القطاع الأمني وتوزع بين مجموعتي نشاط أوليتين للموازنة تدعم جهود وزارة الدفاع ووزارة الداخلية. يدعم معظم التمويل (٥٨ بالمئة) وزارة الدفاع، كما أن المشاريع تُموّل بموجب أربع مجموعات نشاط كبرى:

- المعدات والنقل
- الاستدامة
- التدريب والعمليات
- البنية التحتية

الشكل ٥-٢
حصص القطاعات من أموال صندوق قوات الأمن العراقية حسب مجموعات النشاطات الفرعية
بمليارات الدولارات

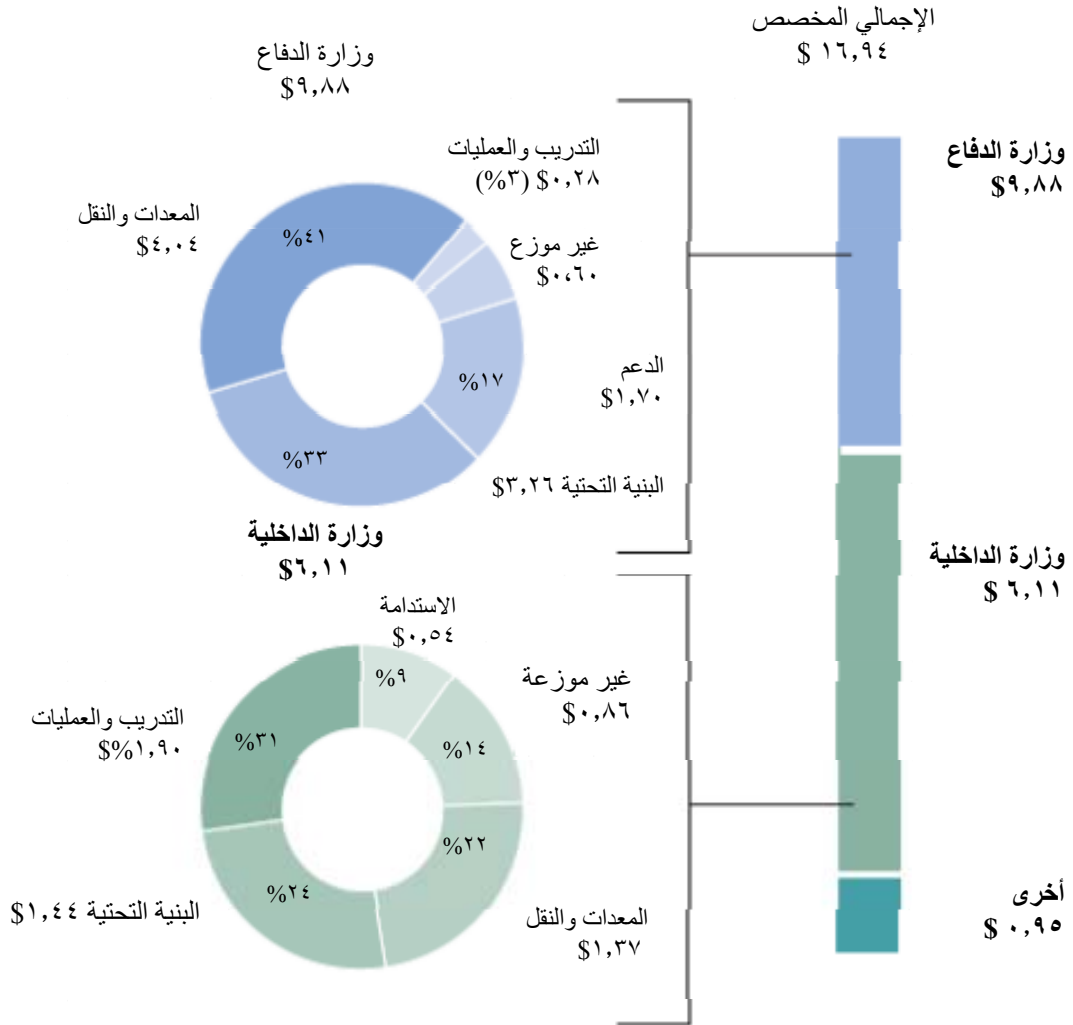

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. لا تشمل المخصصات الأموال الموافق عليها في المخصصات التكميلية للسنة المالية ٢٠٠٨. المصدر: مكتب وزير الدفاع (OSD)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، (٢٠٠٨/١٠/١٤)

نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار

الجدول ٩-٢

الفئات الأكبر لمجموعات النشاطات الفرعية، بتاريخ ٢٠٠٨/٦/٣٠ (بملايين الدولارات)

الالتزامات	مجموعة النشاطات الفرعية	الوزارة
\$٨٩٠,٦٠	العربات، المولدات وقطع الغيار	وزارة الدفاع
\$٢٤١,٣٤	الاعتماد الذاتي اللوجستي	
\$١,٠٢٨,٠٩	متطلبات البنية التحتية لوزارة الدفاع	البنية التحتية
\$٢٣٨,٣٠	الجيش العراقي - القرقة السادسة (الواء ٥)	الاستدامة
\$٣٥٠,١٠	مفهوم الاستدامة اللوجستية	
\$١٩٥,٥٠	الصيانة التعاقدية	
\$٤٦,٥٠	تكنولوجيا المعلومات، المعدات والخدمات	التدريب والعمليات
\$٣٨,٦٠	معدات وخدمات الاتصالات	
\$٣٣٢,٥٠	إعادة التوريد ومستويات مخزون قطع الغيار	المعدات والنقل
\$١٣٤,٣٠	العربات، المولدات وقطع الغيار	
\$٢٥٢,٣٠	دائرة حماية الحدود ونقاط الدخول	البنية التحتية
\$١٨٩,٢٩	البنية التحتية الداعمة لخدمة الشرطة العراقية، والشرطة الوطنية ودائرة فرض تطبيق القانون على الحدود	
\$٧٦٥,٤٠	دعم المدربين المتعاقدين	التدريب والعمليات
\$٤٥٤,٠٠	مكتب شؤون المخدرات الدولية وتطبيق القانون	

المصدر: مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.

الجدول ١٠-٢

وضعية صندوق قوات الأمن العراقية حسب مجموعات النشاطات الفرعية في وزارة الدفاع (بملايين الدولارات)

مجموعة النشاط الفرعي	أُلزم	أنفق	أُلزم %	أنفق %
المعدات والنقل	\$٤,٠٣٦,٥٠	\$٣,٥٩٨,٢٨	%٨٩	%٦٧
البنية التحتية	٣,٢٥٦,٥٢	٢,٨٤٩,٢٦	%٨٧	%٦٧
الاستدامة	١,٦٩٦,٣٦	١,٦٩١,٧١	%١٠٠	%٨١
التدريب والعمليات	٢٧٥,٦١	٢٦٦,٤٣	%٩٧	%٨٤
غير موزع	٦٠٤,٠٠	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
إجمالي وزارة الدفاع	\$٩,٨٦٨,٩٩	\$٨,٤٠٥,٦٨	%٨٥	%٦٦

المصدر: مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

تحولت التزامات صندوق قوات الأمن العراقية من نشاطات الاستدامة الى الدعم الميداني لوحدة قوات الأمن العراقية، "لتسريع نمو الوحدات اللوجستية ومواصلة الدعم الأساسي للقدرات التي سوف تمكن وتحافظ على استدامة الوحدات التي تم إنشاؤها".^(٥٥) للاطلاع على ملخص المشاريع الأكثر كلفة، حسب النشاطات الفرعية، أنظر الجدول ٩-٢.

الجدول ١١-٢

وضعية صندوق قوات الأمن العراقية حسب مجموعات النشاط الفرعي في وزارة الداخلية (بملايين الدولارات)

مجموعة النشاط الفرعي	خُصص	الزَّم	أنفق	الزَّم %	أنفق %
المعدات والنقل	\$١,٣٦٧,٠٥	\$١,٣٤٦,٧٣	\$٩٢٦,٣٩	%٩٩	%٦٨
البنية التحتية	١,٤٤٢,٣١	١,٢٩٩,١٥	٨٧٠,٩٥	%٩٠	%٦٠
مساندة الاستدامة	٥٤٤,٥١	٥٢١,٤٨	٤٥٢,٢٣	%٩٦	%٨٣
التدريب والعمليات	١,٩٠٤,٩١	١,٨٧٧,٤٠	١,٨٥٩,٠٥	%٩٩	%٩٨
غير موزع	٨٥٦,٠٠	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر	غير متوفر
إجمالي وزارة الدفاع	\$٦,١١٤,٧٨	\$٥,٠٤٤,٧٦	\$٤,١٠٨,٦٢	%٨٣	%٦٧

المصدر: مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤

موازنة وزارة الدفاع لمجموعات النشاط

خلال ربع السنة هذا، تم الالتزام بمبلغ ٥٠٢ مليون دولار لدعم المعدات والنقل لوزارة الدفاع، أي أكثر من أي فئة أخرى. يمثل هذا ٥٧ بالمئة من أصل ٨٨١ مليون دولار من الإلتزامات ربع السنوية لوزارة الدفاع.^(٥٦) تلقت مجموعة النشاطات الفرعية للمعدات والنقل في وزارة الدفاع بصورة مستمرة أعلى مخصصات من صندوق قوات الأمن العراقية.

تعدت الإنفاقات على مشاريع داعمة للبنية التحتية لوزارة الدفاع (٢٧١ مليون دولار) على مشاريع المعدات والنقل (١٤٩ مليون دولار) خلال ربع السنة هذا.^(٥٧) ازدادت الإنفاقات الداعمة لكافة مجموعات النشاطات الفرعية في وزارة الدفاع إلى أكثر من ٥٧٤ مليون دولار. يظهر الجدول ١٠-٢ الوضعية الحالية لمجموعات النشاطات الفرعية لوزارة الدفاع.

موازنة وزارة الداخلية لمجموعات النشاطات

تمثل المعدات والنقل أيضاً أكبر نسبة مئوية من المخصصات الجديدة لدعم مشاريع وزارة الداخلية خلال ربع السنة هذا، التي تزيد عن ٢١٨ مليون دولار (٤٣ بالمئة). ارتفعت الإنفاقات على جميع المشاريع الداعمة لوزارة الداخلية أكثر من ٥٠٦ ملايين دولار.^(٥٨) سجلت مجموعة النشاط الفرعي للتدريب والعمليات أكبر مبلغ أنفق منذ ربع السنة الأخير، ٢١٠ ملايين دولار،^(٥٩) كما أن مشاريع الاستدامة أنفقت أقل نسبة. يظهر الجدول ١١-٢ الوضعية الحالية لمجموعات النشاطات الفرعية لوزارة الداخلية.

الإنفاق عبر عدة سنوات مالية


من أصل إجمالي مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية إلى مجموعة نشاطات موازنات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لا زال هناك ٥,٣٦ مليون دولار دون إنفاق.^(٦٠) أن أكبر مبالغ من الإلتزامات غير المنفقة هي ضمن إلتزامات المشاريع التي تدعم وزارة الدفاع، على وجه التحديد، المعدات والنقل والبنية التحتية. لا تزال حوالي ٩٠٠ مليون دولار غير منفقة في المعدات والنقل وحوالي ٦٥٠ مليون دولار في البنية التحتية.

من أصل إجمالي إلتزامات صندوق قوات الأمن العراقية لدعم مشاريع وزارة الداخلية، هناك حوالي ٤٣٠ مليون دولار من إلتزامات البنية التحتية وأكثر من ٤٢٠ مليون دولار من إلتزامات المعدات والنقل لا تزال غير منفقة.^(٦١)

صحيح أن ٧٨ بالمئة من إلتزامات صندوق قوات الأمن العراقية قد تم إنفاقها، إلا أن معدلات الإنفاق تختلف بصورة كبيرة بين مجموعات النشاطات الفرعية وخلال السنوات المالية. من أصل أموال وزارة الدفاع

المخصصة خلال السنتين الماليين الماضيتين، تمّ إنفاق ٥٣ بالمئة من إلتزامات السنة المالية ٢٠٠٧ و ٤ بالمئة من إلتزامات السنة المالية ٢٠٠٨. وحدث الشيء نفسه بالنسبة للأموال المخصصة لوزارة الداخلية خلال نفس الفترة الزمنية، حيث تمّ إنفاق ٥١ بالمئة من السنة المالية ٢٠٠٧ و ١٢ بالمئة من السنة المالية ٢٠٠٨.^(١٢) يبين الشكل ٦-٢ وضعية الإلتزامات والإنفاقات حسب مجموعات النشاطات الفرعية لمخصصات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية حسب السنة المالية.

الشكل ٦-٢
وضعية مخصصات صندوق قوات الأمن العراقية حسب مجموعة النشاطات الفرعية وحسب السنة المالية (بملايين الدولارات)

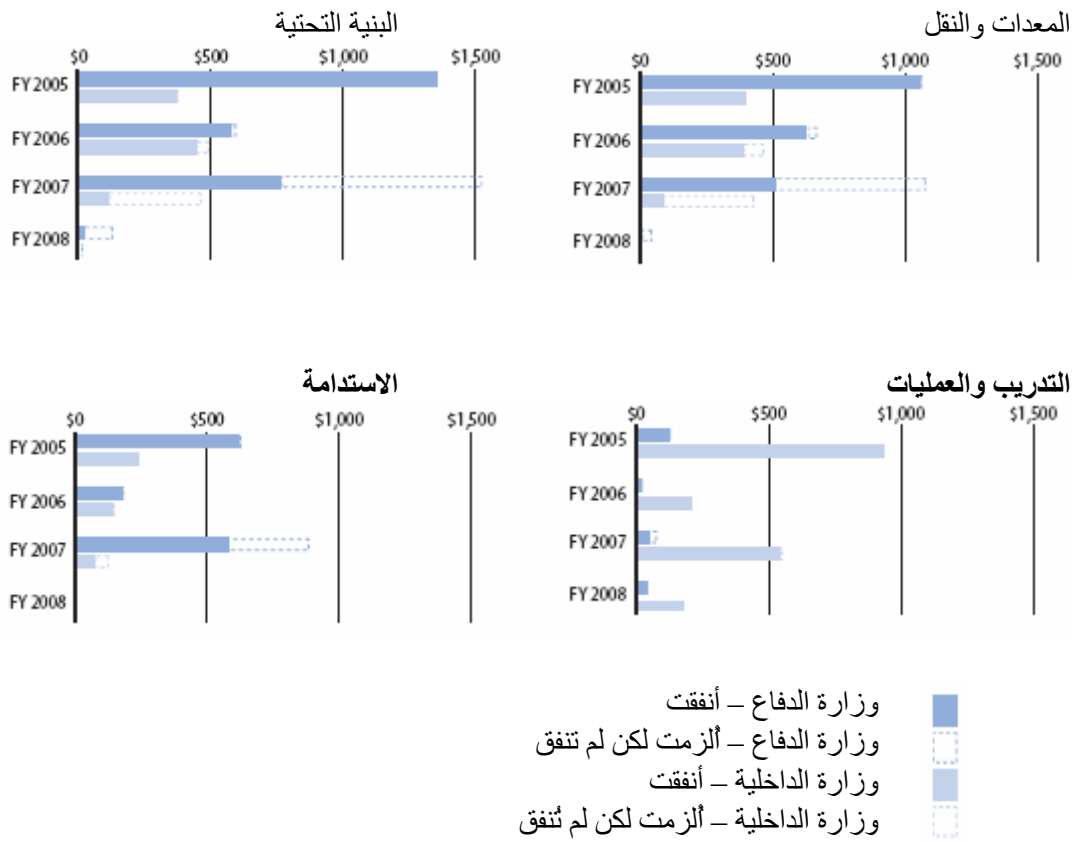

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. المخصصات لا تشمل ٦٠٤ ملايين دولار في موازنة مجموعة نشاطات وزارة الدفاع و ٨٥٦ مليون دولار في موازنة مجموعة نشاطات وزارة الداخلية التي لم تكن قد وُزعت بعد لمجموعات النشاطات الفرعية.

المصدر: مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

وضعية مشاريع صندوق قوات الأمن العراقية

ثمة ما مجموعه ٨٥٧ مشروعاً مُنجزاً لصندوق قوات الأمن العراقية الوارد ذكرها في نظام إدارة إعادة إعمار العراق^(٦٣) مقدرة بأكثر من ٢,٣٤ مليار دولار، بما فيها ١٩٨ مشروع قيد التنفيذ بكلفة واردة في الموازنة من ١,٣٤ مليار دولار.^(٦٤) وكما تكشف هذه الأرقام، لا يحتوي نظام إدارة إعادة الإعمار على تقرير شامل لمشاريع صندوق قوات الأمن العراقية. ففرقة منطقة الخليج تدير العديد من تلك المشاريع لحساب قيادة القوات الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق. أن أغلبية مشاريع صندوق قوات الأمن العراقية (٦٧ بالمئة) مركزة في محافظات بغداد والأنبار ونيوى والبصرة.^(٦٥)

يضع الجدول ٢-١٢ لائحة بأكثر عشرة مشاريع لصندوق قوات الأمن العراقية حسبما واردة تكاليفها في قاعدة بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق.

الجدول ٢-١٢

المشاريع الكبرى قيد التنفيذ لصندوق قوات الأمن العراقية (بملايين الدولارات)

المحافظة	تاريخ الإنجاز المتوقع	تاريخ البدء	إجمالي الكلفة المقررة	المشروع
صلاح الدين	٢٠٠٩/١/٢٤	٢٠٠٨/٧/١٤	\$٥٩,٩٥	موقع قيادة تكريت
ذي-قار	٢٠٠٩/١٠/١٠	٢٠٠٨/٥/٣٠	\$٣٧,٨٩	موقع قيادة شبيبة
ميسان	٢٠٠٩/٤/٦	٢٠٠٨/٧/١٢	\$٣٧,٢٨	موقع قيادة ميمونة
ديالى	٢٠٠٨/١٠/٣١	٢٠٠٧/٩/١٩	\$٣٥,٢٠	إنشاء مرافق في مركز العمليات الأمامي نورماندي
بغداد	٢٠٠٩/٥/١٣	٢٠٠٨/٤/٩	\$٣١,١١	مركز تدريب المجندين، كلية الشرطة في بغداد
بغداد	٢٠٠٨/٧/١٥	٢٠٠٧/٦/٢٨	\$٢٨,٧٨	إنشاء مقرات اللواء الأول الفرقة السادسة (١١) و٣ كتائب في مركز العمليات الأمامي / العدل
التأميم	٢٠٠٩/١/٣٠	٢٠٠٨/٣/٦	\$٢٨,٧٥	إنجاز إنشاء مدرسة القوات الجوية العراقية والتدريب على الطيران في قاعدة كركوك الجوية الإقليمية
الأنبار	٢٠٠٩/٢/٢٥	٢٠٠٧/١/١٨	\$٢٨,١١	إنشاء مقرات اللواء الأول الفرقة السابعة و٣ كتائب في الرمادي
ديالى	٢٠٠٨/٤/٢٩	٢٠٠٦/٥/٣١	\$٢٧,٩٩	إنشاء وتجديد المرافق لدعم الفرقة الخامسة
نيوى	٢٠٠٩/١/٢٠	٢٠٠٨/٦/١٦	\$٢٧,٦٩	إنشاء أكاديمية الشرطة في الموصل للمجندين

ملاحظة: الكلفة المقررة المدرجة في الجدول أعلاه تمثل حصة صندوق قوات الأمن العراقية من مواد خط كل مشروع كما هو وارد في نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس إجمالي تكاليف المشروع. مواد الخط قد تمثل جزءاً من المشروع المنفذ على عدة مراحل أو عدة أوامر مهمة.

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ملف الانهاء لدى مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١.

صندوق دعم الاقتصاد

في قانون التمويل التكميلي الأميركي الذي مُرّر في حزيران/يونيو ٢٠٠٨، تلقى صندوق دعم الاقتصاد زيادة بنسبة حوالي ١٧ بالمئة تقريباً من إجمالي التمويل (٥٢٦ مليون دولار).^(٦٦) غير أن هذا المبلغ يشكل تراجعاً هاماً بالمقارنة مع ١,٤٨ مليار دولار التي قدمتها المخصصات التكميلية لسنة ٢٠٠٧. يلعب إجمالي المخصصات البالغة ٣,٧٤ مليار دولار (أنظر الجدول ٢-١٣) إلى صندوق دعم الاقتصاد دوراً أساسياً في دعم مشاريع البنية التحتية الصغيرة الحجم وفي تطوير قدرات الحكومات على المستوى القومي والمستويات المحلية.

تدير وزارة الخارجية (الأميركية) أموال صندوق دعم الاقتصاد كما أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي، وفرقة منطقة الخليج تنفذ الأموال عبر اتفاقيات الوكالات. تلقت هاتان الوكالتان حوالي ٨٩ بالمئة من مخصصات صندوق دعم الاقتصاد.

برامج صندوق دعم الاقتصاد حسب المسار

تصنف برامج صندوق دعم الاقتصاد إلى ثلاثة مسارات: اقتصادي، سياسي وأمني. تلقى المسار الأمني أكبر مخصصات من التمويل تقدر بحوالي ٦٣ بالمئة من إجمالي مخصصات صندوق دعم الاقتصاد.^(٦٧)


للاطلاع على توزيع مخصصات صندوق دعم الاقتصاد بين المسارات الثلاثة، أنظر الشكل ٢-٧. للاطلاع على وضعية تمويل كل واحد من البرامج المختلفة التي تستخدم أموال صندوق دعم الاقتصاد، أنظر الجدول ٢-١٤.

المسار الاقتصادي. أوسع برنامج اقتصادي لا يزال مساندة استدامة التشغيل والصيانة الذي يعدّ ٥٠ بالمئة من أموال هذا المسار. يقدم هذا البرنامج الخدمات التي تساعد الحكومة العراقية في مساندة استدامة البنية التحتية الممولة من الولايات المتحدة.^(٦٨) حوالي ٨٥ بالمئة من مخصصات البرنامج تم إنفاقها.^(٦٩) يتضمن برنامج التنمية ذات الأهداف المحددة (TDP) أكبر نسبة مئوية لا تزال متروكة للإنفاق؛ بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كان قد تم إنفاق ٣,٥ بالمئة من إجمالي المخصصات فقط. ارتفع إجمالي الإنفاقات للبرنامج ١,٨٥ مليار دولار خلال ربع السنة هذا ليصل إلى ٣,٠٥ مليار دولار.^(٧٠) تأتي هذه الزيادة بعد الموافقة على ثلاث هبات لثلاث دعوات كبرى لتقديم الاقتراحات التي استهلكت كافة مخصصات برنامج التنمية ذات الأهداف المحددة.^(٧١)

المسار السياسي: برنامج تطوير القدرات القومية (NCD) لديه أكبر مخصصات بين كافة البرامج الأخرى في المسار السياسي. غير أن برنامج الديمقراطية والمجتمع المدني تعدّى، من حيث الإنفاقات، مبلغ إنفاق برنامج تطوير القدرات القومية، خلال ربع السنة هذا. فقد أنفق البرنامج خلال ربع السنة هذا ٥٧,٤٨ مليون دولار رافعاً إجمالي الإنفاقات إلى حوالي ١٢٣ مليون دولار.^(٧٢)

الشكل ٢-٧

مخصصات أموال صندوق دعم الاقتصاد حسب المسار
بمليارات الدولارات، % من ٣,٥ مليارات دولار مخصصة

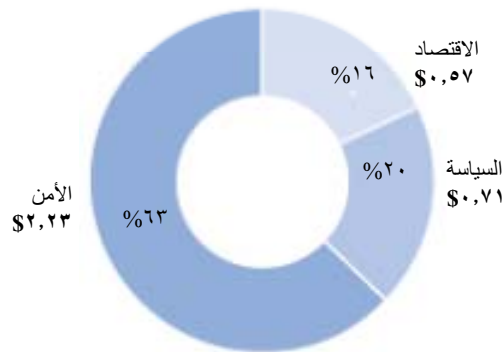

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير: المبلغ الإجمالي المُبين هو حوالي ٩٣ بالمئة من كافة مخصصات أموال صندوق دعم الاقتصاد للعراق البالغة ٣,٧٤ مليار دولار. تفاصيل البرنامج ومستوى المسار لم تكن متوفرة بالنسبة لـ ٥٠ مليون دولار من تمويل السنة المالية ٢٠٠٣.

المصادر: وزارة الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢ و ٢٠٠٨/١٠/٤؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استجابة لطلب مكتب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/١٠/٢.

الجدول ٢-١٣
مخصصات صندوق دعم الاقتصاد (بملايين الدولارات)

المبلغ	القانون العام	المخصصات
\$٤٠	P.L. 108-7	قرار المخصصات التكميلية، ٢٠٠٣
\$١٠	P.L. 108-11	قانون المخصصات التكميلية لطوارئ زمن الحرب، ٢٠٠٣
\$٦٠	P.L. 109-102	قانون العمليات الخارجية، وتمويل الصادرات، والمخصصات المتعلقة بالبرامج، ٢٠٠٦
\$١،٤٨٥	P.L. 109-234	قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع، والحرب العالمية على الإرهاب، واستعادة العافية بعد الإعصار، ٢٠٠٦
\$١،٤٧٨	P.L. 110-28	قانون جهوزية القوات الأميركية، العناية بقدامى المحاربين، استعادة العافية بعد إعصار كاترينا ومخصصات المحاسبة في العراق، ٢٠٠٧
\$١٢٣	P.L. 110-92, P.L. 110-16 P.L. 110-137, P.L. 110-149	قانون مخصصات وزارة الدفاع ٢٠٠٨، والمخصصات المتواصلة للسنة المالية، ٢٠٠٨
\$١٥	P.L. 110-161	قانون المخصصات المجمعة، ٢٠٠٨
\$٥٢٧	P.L. 110-252	قانون المخصصات التكميلية، ٢٠٠٨
\$٣،٧٣٨		المجموع

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

المسار الأمني. بين برامج المسار الأمني، تلقت مشاريع فِرَق إعادة إعمار المحافظات ولجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRDC/PRT) أعلى مخصصات - ٧٠٠ مليون دولار لتاريخه. (٧٣) هذه المشاريع لديها ثاني أدنى معدل من الإنفاق في المسار الأمني مع حوالي ٤٧ بالمئة من المخصصات المنفقة. خلال ربع السنة هذا، كانت لدى برنامج استقرار المجتمعات المحلية (CSP) أكبر زيادة في الإنفاقات بالمقارنة مع ربع السنة الماضي مع حوالي ٨١ مليون دولار أنفقت منذ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٨. (٧٤)

للاطلاع على النقاط الهامة حول حصيلة البرنامج لكل من هذه المسارات، أنظر الجدول ٢-١٥.

تنفيذ الصندوق

تتخذ حالياً الوكالات التنفيذية لصندوق دعم الاقتصاد مشاريع تستخدم الأموال التي لا تزال متوفرة لإلتزامات جديدة بموجب مخصصات متعددة من السنة المالية ٢٠٠٥ لغاية الوقت الحاضر. قام مكتب المفتش العام مؤخراً بمراجعة ثلاث اتفاقيات للوكالات مُمَوَّلة من صندوق دعم الاقتصاد لتحديد أسباب الوتيرة الأدنى لإنفاق أموال صندوق دعم الاقتصاد بالمقارنة مع الصناديق الأخرى المستخدمة في العراق. تقدر الاتفاقيات بـ ١,٢٥ مليار دولار. (٧٥) تعرقت مراجعة مكتب المفتش العام على ثلاثة عوامل مترابطة تفسر التأخير في معدل الإنفاق:

- تقع اتفاقيات الوكالات تحت سلطة قانون المساعدات الخارجية لسنة ١٩٦١ وتظل صالحة لمدة أربع سنوات بعد أن يكون الإلتزام قد أنقضت مدته. (٧٦)
- على الرغم من أن الأموال التي تم التعرف عليها في الاتفاقيات قد ألزمت في نفس الوقت الذي وقعت فيه الاتفاقيات، إلا أن عقود المشاريع ليست مرتبطة دائماً بالاتفاقيات في ذلك الوقت. مثلاً، حدّد/قرر المفتش العام أن فرقة منطقة الخليج لم تمنح عقوداً بمبلغ ١٢٦ مليون دولار من السنة المالية ٢٠٠٦ لصندوق دعم الاقتصاد و ٢٢٤ مليون دولار من مخصصات السنة المالية ٢٠٠٧.
- طبيعة وعرض الاتفاقيات - تطوير القدرات العراقية - مساهم أساسي أيضاً. (٧٧) وطالما أن هذه البرامج تشمل نشاطات التعليم والتدريب، فإن العملية لا تقود نفسها إلى الإنفاق السريع. (٧٨)

نظرة إجمالية حول إعادة الإعمار

للاطلاع على التفاصيل حول تدقيق مكتب المفتش العام بخصوص صندوق دعم الاقتصاد، أنظر القسم ٤ من هذا التقرير. يعطي الجدول ٢-١٦ تفاصيل القسم من أموال صندوق الاقتصاد التي أنفقت حسب كل سنة مالية.

الجدول ٢-١٤
وضعية تمويل برنامج صندوق دعم الاقتصاد (بملايين الدولارات)

النسبة المئوية للإجمالي المنفق من المخصصات	إجمالي الالتزامات	إجمالي المخصصات	البرنامج
المسار الاقتصادي			
٨٥%	\$٢٧٥,٠٨	\$٢٨٥,٠٠	إستدامة التشغيل والصيانة ^(أ)
٤٢%	٩٢,٥٠	٩٢,٥٠	إنماء – تنمية التصنيع الزراعي لدى القطاع الخاص
١٧%	٦٠,٧٧	٦٠,٧٧	النمو الاقتصادي في المحافظات
٥%	٥٧,٤٠	٥٧,٤٠	برنامج التطوير المحدد للأهداف
٧٢%	٤١,٧٨	٥١,٩٧	تطوير القدرات على مستوى المحطات والتدريب الفني
٩٤%	٢٣,٨٣	٢٣,٨٣	إزدهار
المسار السياسي			
٤٥%	٢٦٤,٣٣	\$٢٦٤,٣٣	تنمية القدرات القومية
٦٥%	١٨٨,٨٩	١٨٨,٨٩	الديمقراطية والمجتمع المدني ^(ب)
٣٣%	٩٥,٠٠	٩٥,٠٠	اللاجئون العراقيون (الأردن) المحولون إلى مساعدات الهجرة واللاجئين ^(ج)
٧٦%	٨٥,٠٠	٨٥,٠٠	حكم الاقتصادى المرحلة الثانية، السياسة، المساعدات الحكومية، الإصلاحات القانونية والتنظيمية
٥٦%	٣٧,٠٨	٤٥,٠٠	تطوير القدرات الوزارية
٨٨%	٣٢,٠٢	٣٣,٠٠	مكتب اتصال النظام الجنائي

الجدول ١٤-٢ (تابع)

النسبة المئوية للإجمالي المنفق من المخصصات	إجمالي الالتزامات	إجمالي المخصصات	البرنامج	المسار الأمني
٢٨%	\$٤١٢,٧٠	\$٧٠٠,٠٠	مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات ولجان إعادة إعمار وتطوير المحافظات	
٦٩%	٦١٤,٠٠	٦١٤,٠٠	برنامج الاستقرار للجماعات المحلية	
٥٧%	٢٢٥,٠٠	٢٢٥,٠٠	برنامج عمل المجتمع المحلي	
٥٩%	١٧٨,٨٠	٢١٧,٠٠	حماية أمن البنية التحتية	
٤٠%	١٣٤,٧٨	١٣٤,٧٨	صندوق الإستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار المحافظات	
٦٧%	١٤,٩٦	١٤,٩٦	صندوق ماريبا روزيكا لضحايا الحرب العراقيين المحول إلى صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراقيين	

ملاحظات: الأرقام تتأثر بالتدوير
 (١) الالتزامات "المشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات ولجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات"، "حماية البنية التحتية"، "تطوير القدرات على مستوى المحطات والتدريب التقني" و "استدامة التشغيل والصيانة" تذكرها فرقة منطقة الخليج وتمثل الالتزامات الثانوية التي منحتها لفرقة منطقة الخليج لعقد لأجل مشروع معين.
 (٢) تشمل المبالغ في هذه الفئة البرامج المذكورة كـ "تنمية وتطوير المجتمع المدني"، "المجتمع المدني - صندوق تطوير ADF وصندوق تمويل انتخابات العراق"، "المجتمع المدني - مجلس الأبحاث والتبادل الدولي (IREX)"، "الديمقراطية والمجتمع المدني"، "تمويل الديمقراطية والمعهد الجمهوري الدولي (IRI)"، المعهد الوطني للديمقراطية (في العراق) (NDI)، "NED" والمعهد الأميركي للسلام (USIP).
 (٣) تشمل المبالغ في هذه الفئة برامج ذكرت كـ "اللاجئون العراقيون (الأردن) - المنقولون إلى مساعدات الهجرة واللاجئين"، وبرنامج العلماء العراقيين، كما في الإرشادات الواردة استجابة لمكتب الإدارة والموازنة (OMB) على طلب المفتش العام للبيانات، في ٣ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨.

المصادر: وزارة الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤ و ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/١٠/٢.

الجدول ١٥-٢
تحديثات برنامج صندوق دعم الاقتصاد

المسار	فئة المشروع	النقاط البارزة
الاقتصادي	استدامة التشغيل والصيانة	<ul style="list-style-type: none"> المحطات التي دعمها التشغيل والصيانة كان فيها حوادث عطل بنسبة ١٧ بالمئة أقل من المحطات التي لم يدعمها البرنامج. تم منح ما مجموعه ٥١ مشروع بقيمة ٢٦٧,٢ مليون دولار مع الإلتزام بنسبة ٩٤ بالمئة من الأموال المتوفرة.
إنماء - تنمية التصنيع الزراعي في القطاع الخاص		<ul style="list-style-type: none"> باشرت إنماء بمنح الهبات بقوة لبرنامج القروض وأصدرت التماساً إلى المصارف العراقية الخاصة عبر البلاد. بعد اختيار المصارف، سوف تمنح إنماء الهبات لتأمين القروض على الأخص لقطاع التصنيع الزراعي. معمل بلد للمعلبات في صلاح الدين قيد التجديد. هذا المشروع البالغة قيمته ٥ ملايين دولار سوف يعيد إصلاح خطوط العمليات الـ ١١ لثاني أكبر معمل لتصنيع الأغذية في العراق.
برنامج التطوير المحدد الأهداف		<ul style="list-style-type: none"> تم منح ٢٥ هبة بما مجموعه ٣٣,٠٦٥,٠٠٧ دولار. تمويل لأجل تطوير مشروع لرفع درجة التوعية البيئية وإجراءات لسلامة الأطفال في المدارس الابتدائية. منح الأموال لإعادة تأهيل معمل لصنع الكتل الخرسانية بغية إطلاق النمو الاقتصادي في مقاطعة أبو غريب في محافظة الأنبار.
النمو الاقتصادي في المحافظات		<ul style="list-style-type: none"> أسست مؤسسة البشائر للتمويلات الصغيرة حساب مدفوعات مع بنك الوسط العراقي، فرع الجميلة، لتوزيع القروض وللقيام بمعاملات التسديد. خلال ربع السنة الأخير، وافقت الشركة العراقية لضمان المصارف (ICBG) على ١٤ قرصاً بقيمة ٧٨٧,٠٠٠ دولار. من أصل الأربعة عشر قرص، دفعت الشركة خمسة قروض قيمة القرض الواحد ١٠٠,٠٠٠ دولار.
تطوير القدرات القومية		<ul style="list-style-type: none"> تلقت وزارة الصحة المساعدة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / تطوير لوضع صيغة لخطة إستراتيجية لنظام العناية الصحية في العراق. نظمت الوزارة ورشة عمل مع شركائها في المحافظات لمناقشة الخطة الإستراتيجية والسبيل إلى تنفيذها. إجمالاً، دربت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/تطوير أكثر من ٢٦,٠٠٠ موظف مدني. هذه النواة من الموظفين المدنيين المدربين تغطي كافة اختصاصات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / تطوير وكافة المحافظات الـ ١٨. أكثر من ٥٠ بالمئة من هذا التدريب تقوم به الحكومة العراقية عن طريق تدريب المدربين المتخرجين مع نقل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملكية كافة نشاطات تدريب الكفاءات إلى الحكومة العراقية
الديمقراطية والمجتمع المدني		<ul style="list-style-type: none"> أقام مركزاً للصحافة لدائرة الإعلام في البرلمان العراقي للسماح للصحفيين بالوصول بطريقة أفضل إلى المشترعين والعمليات التشريعية، وقاموا بتحديث مرافق الكمبيوتر لأجل إرسال المقالات إلكترونياً. قدم تدريباً لمدة ثلاثة أيام لـ ٣٦٠ رجلاً وامرأة في ذي - قار حول العنف القائم على الجنس وحول معاهدة إلغاء كافة أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW).

الجدول ٢-١٥ (تابع)

المسار	فئة المشروع	النقاط البارزة
	برنامج الحكم الاقتصادي الثاني، الإصلاحات السياسية والتنظيمية	<ul style="list-style-type: none"> • أعاد تأهيل نظام إدارة المعلومات المالية العراقي (IFMIS) بما في ذلك تحديث جميع البرامج، تم نقل موازنة ٢٠٠٨ إلى الكمبيوتر كما تم تحديث جدول تصنيف الحسابات. • ركز على تكنولوجيا المعلومات حول معاشات التقاعد التالية: التدريب المتواصل لموظفي المحافظات على حلّين مؤقتين طورتهما الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ويتم استخدامها في مجلس التقاعد في العراق إلى أن يدخل حل التقاعد حيّز الوجود، نشر الشبكة، بما في ذلك أمن الشبكة وتركيب برامج أوراكل التي اشتراها البنك الدولي.
اللاجئون العراقيون (الأردن) - المنقولون إلى مساعدات الهجرة واللاجئين		<ul style="list-style-type: none"> • أعادت الولايات المتحدة توظيف ١٢,١١٨ لاجئ بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، متخطية هدف السنة المالية ٢٠٠٨ القاضي بقبول ١٢,٠٠٠ لاجئ عراقي في البلاد. • أنشأ الكونغرس برنامجين لتأشيرة الهجرة الخاصة (SIV)؛ برنامج تأشيرة الهجرة الخاصة للمتزوجين العراقيين وبرنامج كينيدي لتأشيرة الهجرة الخاصة للموظفين والمقاولين العراقيين وعائلاتهم.
تنمية القدرات الوزارية		<ul style="list-style-type: none"> • يعمل المستشارون الأميركيون مباشرة مع كل وزارة أو كيان ذي مستوى تنفيذي. • أكثر من نصف التدريب الممول من تطوير يقوم به العراقيون.
مكتب اتصال النظام الجنائي		<ul style="list-style-type: none"> • نصح وساعد موظفي المحكمة العراقية العليا حول المسائل القانونية التي لها صلة بنقل الموقوفين إلى سجون الحكومة العراقية. • طور ونفذ خطة خفض عمليات مكتب الاتصال لجانايات نظام الحكم (RCLO) والموظفين الذين تديرهم وزارة الخارجية ووزارة العدل.
المسار الأمني	مشاريع فرق إعادة إعمار المحافظات ولجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات	<ul style="list-style-type: none"> • تم إنجاز ١٣ مشروع لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRDC) مع قيمة إجمالية للعقود من ١٢,٩ مليون دولار. • تم إنجاز محطة أبو حسين لمعالجة المياه في القادسية، خلال ربع السنة هذا، التي ستخدم ١٠,٠٠٠ قروي ظلوا بدون مياه نظيفة لأكثر من ٣٦ سنة. • هذا البرنامج ينفذ في ١٨ مدينة في أرجاء العراق: بغداد، الموصل، تل عفر، كركوك، بعقوبة، البصرة، الإسكندرية، الحلة، فلوحة، الرمادي، القائم، الحبانية، حديثة، حيت، بيجي، تكريت، طوز وسمراء. • نجح البرنامج في نقل مسؤولية جمع النفايات في بغداد. الحكومة البلدية في بغداد (أمانة) مسؤولة الآن عن جمع النفايات. • حوالي ٢,١٥٨ وظيفة قصيرة الأمد و ٤٤٩ وظيفة طويلة الأمد تم إنشاؤها في البصرة.
برنامج الحكم المحلي		<ul style="list-style-type: none"> • أطلق نظام محاسبة وإدارة تجريبي لمشاريع برنامج التنمية وإعادة الإعمار المُسرّع في محافظات البصرة، ميسان، النجف وبابل. • مراكز نظام المعلومات الجغرافية (GIS) للتخطيط المدني مفتوحة الآن في ١٧ من محافظات العراق الـ ١٨.

الجدول ١٥-٢ (تابع)

المسار	فئة المشروع	النقاط البارزة
	حماية أمن البنية التحتية	<ul style="list-style-type: none"> تم إنجاز تركيب طوق أمني من الأسلاك لمحطة الراشبية لمعالجة المياه في محافظة ديالى لضمان أمن المحطة وتسهيل العمليات. تم إنجاز المرحلة ٦ من تقوية البرج الكهربائي في محافظة صلاح الدين.
	برنامج عمل المجتمع المحلي	<ul style="list-style-type: none"> هناك ١٦،١٣٢،٨٨٠ مستفيد مباشر من نشاطات مجموعة عمل المجتمع المحلي (CAG). نشاط مجموعة عمل المجتمع المحلي أوجدت ٤٥،٢٤٠ وظيفة قصيرة الأمد و ١٤،٠١٠ وظيفة طويلة الأمد.
	صندوق الاستجابة السريعة لفرق إعادة إعمار المحافظات	<ul style="list-style-type: none"> موظفو صندوق الاستجابة السريعة في السفارة (QRF) قاموا بأعمال واسعة النطاق مع كل فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق أدت إلى زيادة في كمية ونوعية المقترحات المقدمة من لجنة التقييم الفني للسفارة. أنجز شريك مُنفذ للوكالة الأميركية للتنمية الدولية قاعدة بيانات لتعقب المعلومات حول الهبات والموافقات والمعالم.

المصدر: وزارة الخارجية، تقرير القسم ٢٢٠٧، ٢٠٠٨/٧؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ السفارة الأميركية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.

الشكل ١٦-٢

وضعية صندوق دعم الاقتصاد، حسب السنة المالية (بملايين الدولارات)

السنة المالية	خصص	ألزم	أنفق	النسبة المئوية للملزم	النسبة المئوية للإنفاق
السنة المالية ٢٠٠٣	\$٥٠,٠٠٠	\$٥٠,٠٠٠	\$٥٠,٠٠٠	%١٠٠,٠	%١٠٠,٠
السنة المالية ٢٠٠٦	\$١,٥٢٥,٤١	\$١,٣٩٠,٤٠	\$١,١٥٨,٧٣	%٩١,١	%٧٥,٩
السنة المالية ٢٠٠٧	\$١,٦٠٢,٧٣	\$١,٣٤٢,١٧	\$٧٢١,٢٣	%٨٣,٧	%٠,٤٥
السنة المالية ٢٠٠٨	\$٣٨٢,٧٩	\$٣٨٢,٧٩	لا شيء	%١٠٠,٠	%٠,٠

المصدر: وزارة الخارجية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٧/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/١٠/٢.

الجدول ٢-١٧

المشاريع الكبرى قيد التنفيذ لصندوق دعم الاقتصاد (بملايين الدولارات)

المحافظة	تاريخ الإنجاز المتوقع	تاريخ بداية العمل	إجمالي التكاليف المقررة	المشروع
ميسان	٢٠٠٩/٥/١٩	٢٠٠٨/٢/١٩	\$١٤,٠٨	مستشفى ميسان للجراحة، المرحلة ٢
البصرة	٢٠٠٩/٣/٩	٢٠٠٩/٣/٢٢	\$١٣,١٠	تأمين وتركيب كابل مغذي للطاقة ١٣٢ كيلو فولت
صلاح الدين	٢٠٠٩/١/١١	٢٠٠٨/٥/٤	\$١١,٨٦	منطقة الحظر حول أنابيب النفط في بيجي - بغداد
صلاح الدين	٢٠٠٨/١٢/٢٦	٢٠٠٨/٥/١٣	\$١٠,٥٠	منطقة الحظر حول أنابيب النفط في بيجي - بغداد
البصرة	٢٠٠٨/١٢/١٨	٢٠٠٨/١/٢٤	\$١٠,١٨	تغذية المياه النظيفة ESFPRDC06
ديالى	٢٠٠٩/٤/١٧	٢٠٠٨/٣/١٥	\$٩,٦١	مستشفى بعقوبة العام (PRDC) EHC
صلاح الدين	٢٠٠٨/١٢/٢٦	٢٠٠٨/٥/١٣	\$٨,٥٧	منطقة الحظر حول أنابيب النفط في بيجي - بغداد
صلاح الدين	٢٠٠٨/١٢/٢٦	٢٠٠٨/٥/١٥	\$٨,١١	منطقة الحظر حول أنابيب النفط في بيجي - بغداد
صلاح الدين	٢٠٠٨/١٢/١٨	٢٠٠٨/٥/٢٢	\$٧,٩٣	منطقة الحظر حول أنابيب النفط في بيجي - بغداد
ميسان	٢٠٠٩/٥/١٩	٢٠٠٧/١١/٢٩	\$٧,٦١	إنشاء مستشفى يتضمن ٨٠ سريراً - المرحلة الأولى (٣٦ سريراً)

ملاحظة: التكاليف المقررة المدرجة في الإجمالي أعلاه تمثل حصة بنود خط صندوق دعم الاقتصاد في كل مشروع كما هو وارد في نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس كافة تكاليف المشروع. بنود الخط قد تمثل جزءاً من المشاريع التي تم تنفيذها على عدة مراحل أو عدة أوامر مهمة.

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ملف الانتهاء لدى مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، ٢٠٠٨/١٠/١.

وضعية مشاريع صندوق دعم الاقتصاد

هناك حالياً ٩٨٥٠ مشروعاً لصندوق دعم الاقتصاد قيد التنفيذ مع تكاليف مقررة بقيمة ١,٠٠٨ مليار دولار.^(٧٩) هناك العديد من مشاريع منطقة الحظر حول أنابيب النفط (PEZ) بين هذه المشاريع (أنظر الجدول ٢-١٧). لقد كان مشروع حماية أمن البنية التحتية (ISP) التابع لبرنامج منطقة الحظر حول أنابيب النفط موضع تفتيش من قِبَل مكتب المفتش العام خلال ربيع السنة الأخير. ذكر التفتيش أن مرحلة كركوك إلى بيجي (المرحلة ٣) في مشروع منطقة الحظر حول أنابيب النفط ساهمت في زيادة صادرات نفط الشمال الخام.^(٨٠)

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

تدير وزارة الدفاع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ويُنفذ عبر الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC) I) لأجل تلبية حاجات المجتمعات حيث يعمل القادة العسكريون. لهذا السبب، تختلف طبيعة ونطاق مشاريع البرنامج. تصنف برامج برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب الاستخدام المسموح به في نظام "المال كنظام سلاح" (MAAWS) وهو كُتِبَ برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للإجراءات التشغيلية القياسية.

لقد خصص الكونغرس ٣,٥٦ مليار دولار لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد مع ٣,٢٥ مليار دولار ألزمت و ٢,٦٨ مليار دولار أنفقت.^(٨١) بالنسبة لكافة مخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، أنظر الجدول ٢-

١٨

برامج برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب القيمة

في أحدث تفويض أعطي لوزارة الدفاع، أو عز الكونغرس إلى وزارة الدفاع بأن لا تستخدم في المستقبل مخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد للمشاريع التي تزيد قيمتها عن مليوني دولار مع بعض الاستثناءات.^(٨٢) هذه القيود على الإنفاق جاءت في وقت كان فيه متوسط قيمة المشاريع لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد تميل قليلاً إلى الهبوط سابقاً، كان متوسط قيمة المشاريع في صعود بالنسبة للمشاريع غير الإنشائية ولمشاريع إعادة الإعمار (المعروف عنها في نظام إدارة إعادة إعمار العراق كمشاريع إعمار).

بعد اندفاع أولية سنة ٢٠٠٥، بقي متوسط قيمة المشاريع مرتفعاً وبلغ الذروة سنة ٢٠٠٧. سنة ٢٠٠٨، بقيت قيمة المشاريع أعلى من تلك التي مُنحت في مراحل مبكرة من إعادة الإعمار، لكن تم حصول تراجع ملحوظ.^(٨٣) يظهر الجدول ٢-١٩ متوسط قيمة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب السنة، استناداً إلى تاريخ بدء المشروع.

الجدول ٢-١٨
مخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (بملايين الدولارات)

المخصصات	القانون العام	المبلغ
قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠٠٥	P.L. 108-287	\$١٤٠
قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع، والحرب العالمية على الإرهاب وإغاثة ضحايا التسونامي ٢٠٠٥	P.L 109-13	\$٧١٨
قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠٠٦	P.L. 109-148	\$٤٠٨
قانون المخصصات التكميلية الطارئة للدفاع، والحرب العالمية على الإرهاب وإغاثة ضحايا التسونامي ٢٠٠٦	P.L. 109-234	\$٣٠٠
قانون مخصصات وزارة الدفاع، ٢٠٠٧	P.L. 109-289	\$٣٧٥
قانون جهوزية القوات الأميركية، العناية بقدامى المحاربين، استعادة العافية بعد كاترينا، والمحاسبة في العراق	P.L. 110-28	\$٣٧٥
قانون المخصصات المُجمّعة، ٢٠٠٨	P.L. 110-161	\$٣٧٠
قانون المخصصات التكميلية، ٢٠٠٨	P.L. 110-252	\$٨٧٥
المجموع		\$٣,٥٦١

الجدول ٢-١٩
متوسط قيمة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد غير الإنشائية والإنشائية، حسب السنة (بألوف الدولارات)


٢٠٠٤	٢٠٠٥	٢٠٠٦	٢٠٠٧	٢٠٠٨
\$٤٢	\$٧١	\$٧٦	\$٨١	\$٨٠
\$٦٨	\$١٤٦	\$١٨١	\$١٦٤	\$١٣٨

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ملف اكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠٠٨/١٠/٣

علاوة على الزيادات في متوسط قيمة المشاريع، يُصور توزيع قيمة المشاريع أيضاً الاستخدام المتطور لتمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. ومع أن أغلبية مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد تقع تحت ١٠٠,٠٠٠ دولار، إلا أن النسبة المئوية لتكاليف المشاريع مائلة بصورة غير متناسبة نحو المشاريع الكبرى. سنة ٢٠٠٧، كانت المشاريع التي تزيد قيمتها عن ٥٠٠,٠٠٠ دولار تمثل ٣ بالمئة من إجمالي مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي بوشرت في تلك السنة وكانت تستهلك ما يزيد عن ٣٦ بالمئة من تكاليف المشاريع^(٨٤)، لكن، من أصل المشاريع التي بوشر بها سنة ٢٠٠٨، كان ١ بالمئة منها تزيد كلفته عن ٥٠٠,٠٠٠ دولار ويستهلك ١٦ بالمئة من إجمالي التكاليف^(٨٥) وحتى عندما يتقلب توزيع قيمة مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، فإن القيمة المتوسطة لهذه المشاريع قد ازدادت قليلاً كل سنة. الشكل ٨-٢ يظهر توزيع قيمة المشاريع حسب السنة.

الشكل ٨-٢

توزيع مشاريع وتكاليف برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب الفئة والسنة

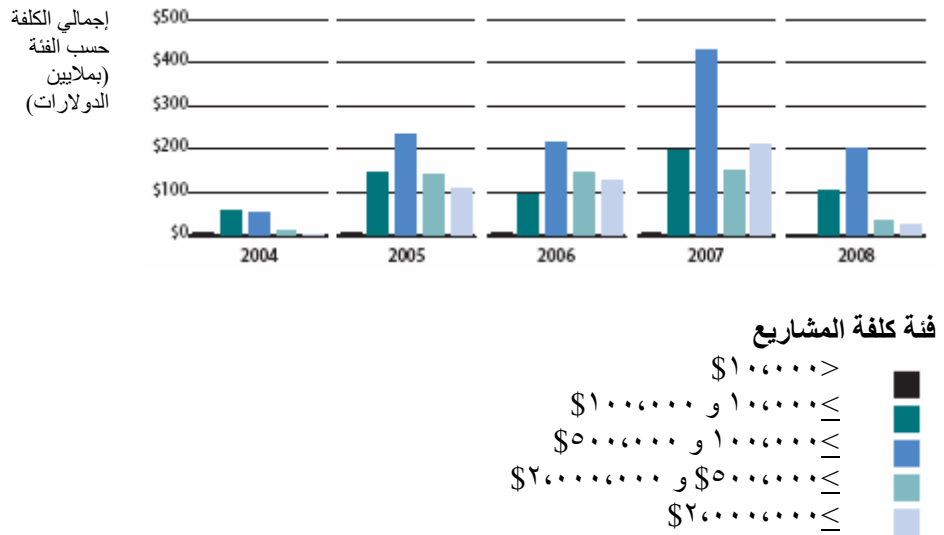

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ملف أكسيل، ٢٠٠٨/١٠/٣

الإنفاق حسب فئة البرنامج

تلقت فئة المياه والصرف الصحي أكبر حصة من التزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لتاريخه. في السنة المالية ٢٠٠٨، ازدادت الالتزامات بصورة كبيرة داخل فئة الإجراءات الوقائية التي هي الآن الفئة الثانية في التزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. خلال ربع السنة هذا، تم إنجاز ٢٥٨ مشروع للإجراءات الوقائية التي تمثل أكثر قليلاً من ٦٤ بالمئة من تكاليف المشاريع المنجزة منذ ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٨^(٨٦).

يُفصل الشكل ٩-٢ الأموال الملتزم بها حسب نوع المشروع والسنة المالية.

وضعية إعادة الإعمار لدى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

بتاريخ ٢٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، تم إنجاز ٢٢,٩٠٣ مشاريع لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد^(٨٧). تعد هذه المشاريع حوالي ٧٠ بالمئة من كافة التزامات البرنامج. خلال ربع السنة هذا، تم إنجاز ٤٩٩ مشروعاً للبرنامج^(٨٨) وهناك، وفقاً لنظام إدارة إعادة إعمار العراق، ٢٢٧١ مشروعاً قيد التنفيذ مع تكاليف مقررّة

بقيمة ٥١٦,٥٠ مليون دولار. من ضمن المشاريع الموجودة قيد التنفيذ، هناك ٩٣٣ مشروعاً متوقع إنجازها خلال ربع السنة القادم.^(٨٩) بالنسبة لقائمة المشاريع الكبرى لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي هي قيد التنفيذ، أنظر الجدول ٢-٢٠.

وضعية مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق I-CERP

يهدف برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق الذي تديره الولايات المتحدة إلى إشراك المسؤولين على مستوى المحافظات في تخطيط وتنسيق وتحديد أولوية ونقل المشاريع التي تدفع تكاليفها الحكومة العراقية.^(٩٠) يهدف برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق الذي أنشأته وتموله الحكومة العراقية في نيسان/إبريل ٢٠٠٨، مع مشروع مُعجل يركز على المدارس ومحطات تنقية المياه والعيادات الصحية، ومرافق التخطيط المدني، والطرق والمجارير والري،^(٩١) إلى تسوية/تعديل الموارد التكتيكية للائتلاف في الميدان وكذلك آلية برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لكي توجه الموارد بسرعة إلى المشاريع التي يستفيد منها الشعب العراقي.

يوزع حجم مخصصات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، حسب سكان المحافظات، كما أن وضعية المشروع تخضع لمراجعة ربع سنوية بالتفاهم مع المجلس الأعلى لإعادة الإعمار في العراق. تهدف المشاريع لكي تخدم كفرص تدريب للموظفين العراقيين المنضمين على أمل أن يتم مع الوقت نقل البرنامج إلى المسؤولين في صندوق قوات الأمن العراقية وفي المحافظات.

لتاريخه، هناك ٢١٦١ مشروع قيد التنفيذ، إضافة إلى ٤٣٢ مشروعاً في مرحلة التخطيط و ٧١ تم إنجازها.

الشكل ٢-٩

إلتزامات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد حسب نوع المشاريع والسنوات المالية (بملايين الدولارات)

نوع المشروع	الالتزامات حسب السنة المالية	نوع المشروع	النوعية المتغيرة بين السنة المالية ٠٧ و ٠٨										
الإجراءات الوقائية	<table border="1"> <tr><th>السنة</th><th>القيمة (\$ملايين)</th></tr> <tr><td>FY04-5</td><td>74.5</td></tr> <tr><td>FY06</td><td>48.2</td></tr> <tr><td>FY07</td><td>107.7</td></tr> <tr><td>FY08</td><td>58.1</td></tr> </table>	السنة	القيمة (\$ملايين)	FY04-5	74.5	FY06	48.2	FY07	107.7	FY08	58.1	التعليم	٦٠٧٪
السنة	القيمة (\$ملايين)												
FY04-5	74.5												
FY06	48.2												
FY07	107.7												
FY08	58.1												
الزراعة	<table border="1"> <tr><th>السنة</th><th>القيمة (\$ملايين)</th></tr> <tr><td>FY04-5</td><td>13.2</td></tr> <tr><td>FY06</td><td>1.6</td></tr> <tr><td>FY07</td><td>37.4</td></tr> <tr><td>FY08</td><td>264.0</td></tr> </table>	السنة	القيمة (\$ملايين)	FY04-5	13.2	FY06	1.6	FY07	37.4	FY08	264.0	الاتصالات	٢٠٪
السنة	القيمة (\$ملايين)												
FY04-5	13.2												
FY06	1.6												
FY07	37.4												
FY08	264.0												
أضرار المعارك	<table border="1"> <tr><th>السنة</th><th>القيمة (\$ملايين)</th></tr> <tr><td>FY04-5</td><td>15.0</td></tr> <tr><td>FY06</td><td>7.7</td></tr> <tr><td>FY07</td><td>3.7</td></tr> <tr><td>FY08</td><td>1.8</td></tr> </table>	السنة	القيمة (\$ملايين)	FY04-5	15.0	FY06	7.7	FY07	3.7	FY08	1.8	النقل	١١٪
السنة	القيمة (\$ملايين)												
FY04-5	15.0												
FY06	7.7												
FY07	3.7												
FY08	1.8												
إنتاج وتوزيع الغذاء	<table border="1"> <tr><th>السنة</th><th>القيمة (\$ملايين)</th></tr> <tr><td>FY04-5</td><td>86.2</td></tr> <tr><td>FY06</td><td>63.3</td></tr> <tr><td>FY07</td><td>110.0</td></tr> <tr><td>FY08</td><td>50.9</td></tr> </table>	السنة	القيمة (\$ملايين)	FY04-5	86.2	FY06	63.3	FY07	110.0	FY08	50.9	إصلاح البنية التحتية المدنية	١٥٪
السنة	القيمة (\$ملايين)												
FY04-5	86.2												
FY06	63.3												
FY07	110.0												
FY08	50.9												
مدفوعات للموقوفين الذين أطلق سراحهم	<table border="1"> <tr><th>السنة</th><th>القيمة (\$ملايين)</th></tr> <tr><td>FY04-5</td><td>16.5</td></tr> <tr><td>FY06</td><td>18.3</td></tr> <tr><td>FY07</td><td>37.6</td></tr> <tr><td>FY08</td><td>15.1</td></tr> </table>	السنة	القيمة (\$ملايين)	FY04-5	16.5	FY06	18.3	FY07	37.6	FY08	15.1	نشاطات التنظيفات المدنية	٢١٪
السنة	القيمة (\$ملايين)												
FY04-5	16.5												
FY06	18.3												
FY07	37.6												
FY08	15.1												
المشاريع الإنسانية ومشاريع إعادة الإعمار الأخرى	<table border="1"> <tr><th>السنة</th><th>القيمة (\$ملايين)</th></tr> <tr><td>FY04-5</td><td>15.5</td></tr> <tr><td>FY06</td><td>29.4</td></tr> <tr><td>FY07</td><td>73.9</td></tr> <tr><td>FY08</td><td>29.1</td></tr> </table>	السنة	القيمة (\$ملايين)	FY04-5	15.5	FY06	29.4	FY07	73.9	FY08	29.1	الكهرباء	٢٢٪
السنة	القيمة (\$ملايين)												
FY04-5	15.5												
FY06	29.4												
FY07	73.9												
FY08	29.1												
مدفوعات التعزية	<table border="1"> <tr><th>السنة</th><th>القيمة (\$ملايين)</th></tr> <tr><td>FY04-5</td><td>86.7</td></tr> <tr><td>FY06</td><td>69.2</td></tr> <tr><td>FY07</td><td>121.9</td></tr> <tr><td>FY08</td><td>38.4</td></tr> </table>	السنة	القيمة (\$ملايين)	FY04-5	86.7	FY06	69.2	FY07	121.9	FY08	38.4	القانون والحكم	٣٤٪
السنة	القيمة (\$ملايين)												
FY04-5	86.7												
FY06	69.2												
FY07	121.9												
FY08	38.4												
العناية الصحية	<table border="1"> <tr><th>السنة</th><th>القيمة (\$ملايين)</th></tr> <tr><td>FY04-5</td><td>38.3</td></tr> <tr><td>FY06</td><td>9.9</td></tr> <tr><td>FY07</td><td>36.1</td></tr> <tr><td>FY08</td><td>11.3</td></tr> </table>	السنة	القيمة (\$ملايين)	FY04-5	38.3	FY06	9.9	FY07	36.1	FY08	11.3	المياه والصرف الصحي	٣٦٪
السنة	القيمة (\$ملايين)												
FY04-5	38.3												
FY06	9.9												
FY07	36.1												
FY08	11.3												
التحسينات الاقتصادية والإدارية	<table border="1"> <tr><th>السنة</th><th>القيمة (\$ملايين)</th></tr> <tr><td>FY04-5</td><td>257.1</td></tr> <tr><td>FY06</td><td>122.4</td></tr> <tr><td>FY07</td><td>162.2</td></tr> <tr><td>FY08</td><td>44.0</td></tr> </table>	السنة	القيمة (\$ملايين)	FY04-5	257.1	FY06	122.4	FY07	162.2	FY08	44.0	عربات الدعم المدني	٤٢٪
السنة	القيمة (\$ملايين)												
FY04-5	257.1												
FY06	122.4												
FY07	162.2												
FY08	44.0												

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي لقيادة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١٥.

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. تختلف الإلتزامات حسب نوع المشاريع عن الإلتزامات المذكورة في ملخص التمويل الأميركي. لم يتلق مكتب المفتش العام من الوكالات تقارير عن مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد أو مستوى قطاعها.

الجدول ٢-٢٠

مشاريع إعادة الإعمار الكبرى قيد التنفيذ لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (بملايين الدولارات)

المشروع	إجمالي الكلفة المقررة	بداية المشروع	تاريخ الإنجاز الأمني	المحافظة
توزيع الكهرباء في المحلة ٣١٢	\$١١,٦٨	٢٠٠٧/١٠/٨	٢٠٠٩/١/٣١	بغداد
محطات ضخ مياه المجاري في الفلوجة ف١ وف٢	\$٧,٦٠	٢٠٠٦/١/٢٠	٢٠٠٩/٢/٢	الأنبار
توزيع الكهرباء في المحلة ٣١٠	\$٦,٥٧	٢٠٠٧/١٠/١٨	٢٠٠٨/١٠/٢٤	بغداد
إعادة تأهيل محطتين للطيران الداخلي في مطار بغداد الدولي	\$٦,٥٦	٢٠٠٧/٦/١٣	٢٠٠٨/١٠/١٢	بغداد
منشآت مياه الصرف الصحي في قرمة علي	\$٦,٥٦	٢٠٠٧/٨/١١	٢٠٠٨/٨/١١	البصرة
لوازم ومعدات التنظيف في مدينة كركوك	\$٦,١٣	٢٠٠٧/١/١	٢٠٠٨/٣/١	التأميم
الفاو، الوفرة والتخفيف	\$٥,٩٢	٢٠٠٦/٦/٣٠	٢٠٠٨/٥/٣١	ذي - قار
الإضاءة بالطاقة الشمسية في الفلوجة، المرحلة الثانية	\$٥,٥٠	٢٠٠٨/٦/٦	٢٠٠٩/١/١	الأنبار
إنشاء المدرسة المهنية والفنية الجديدة في السليمانية	\$٥,٢٠	٢٠٠٧/١٢/٢	٢٠٠٨/١٢/٢٣	السليمانية
محولات لمجلس المحافظة في بغدا	\$٤,٨٢	٢٠٠٦/١٠/٢٠	٢٠٠٧/٦/٣٠	بغداد

ملاحظة: التكاليف المقررة المدرجة في هذا الجدول تمثل حصة بنود خط برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في كل مشروع كما هو وارد في نظام إدارة إعادة إعمار العراق وليس كافة تكاليف المشروع. فبنود الخط قد تمثل جزءاً من المشاريع المنفذة على مراحل متعددة أو أوامر مهمة متعددة.

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ملف اكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠٠٨/١٠/٣

التعاقد

ثمة ست وكالات حكومية أميركية مسؤولة بالدرجة الأولى عن عقود إعادة إعمار العراق:^(٩٢)

- سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، فرقة منطقة الخليج.
- القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A).
- القيادة المتعددة الجنسيات في العراق.
- القوات الجوية للامتياز البيئي (AFCEE).
- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
- وزارة الخارجية

المقاولون العشرة الكبار

مُول أكثر من ١٢ مليار دولار من التزامات العقود المقاولين الخاصين العشرة الكبار المتعاقدين مع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق، وصندوق قوات الأمن العراقية وصندوق دعم الاقتصاد.

لما كان العديد من مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق على وشك الإنجاز ولما لم تعد الأموال متوفرة للالتزامات جديدة، لم يكن هناك تغييرات تذكر بالنسبة لأغلبية المقاولين العشرة الكبار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق فيما يخص الالتزامات والإنفاقات خلال ربع السنة الأخير. الالتزامات بالنسبة ليكتل ناشونال إنك قد تراجعت ٧٥ مليون دولار بالمقارنة مع الأرقام المذكورة خلال ربع السنة الأخير.^(٩٣)

ظل كبار مقاولي صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق دون تغيير نسبياً خلال ربع السنة الأخير باستثناء مقاول واحد. فشركة دفلوبمنت ألترناتيفز إنك لم تظهر على لائحة العشرة الكبار لمقاولي صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق-٢ خلال ربع السنة هذا. لم تعطِ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التي تحدثت عن عقد سنة سابقة، الأرقام المُحدّثة حول كامل قيمة هذا العقد في الوقت المناسب لنشرها في هذا التقرير.

شهد إثنان من المقاولين العشرة الكبار لصندوق قوات الأمن العراقية زيادة كبيرة نسبياً في التمويل خلال ربع السنة هذا. حصلت شركة المعدات الأميركية (American Equipment Company) على أكبر تغيير في الالتزامات منذ حزيران/يونيو ٢٠٠٨، مع ما يزيد عن ١٠٠ مليون دولار من الالتزامات الجديدة، وحصلت الشركة الكيماوية البيئية (Environmental Chemical Company) على أعلى مبلغ من الإنفاقات الجديدة، بلغ أكثر بقليل من ١٠٠ مليون دولار.^(٩٤)

حافظ مقاولو صندوق دعم الاقتصاد العشرة الكبار على نفس الترتيب كما ذكر في ربع السنة الأخير. ازدادت الالتزامات شركة عقود الإغاثة الدولية والتنمية (International Relief and Development) خلال ربع السنة هذا ١٣٧ مليون دولار.^(٩٥) بالنسبة لمقاولي صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق العشرة الكبار، أنظر الجدول ٢-٢١؛ وصندوق قوات الأمن العراقية، الجدول ٢-٢٢ وصندوق دعم الاقتصاد، الجدول ٢-٢٣.

إنهاء العقود

خلال ربع السنة هذا، راجع مكتب المفتش العام سجلات وزارة الدفاع وتعرف على ١,٢٦٢ مشروع أنهتها وزارة الدفاع، منها ٧٣٢ بالتفاهم مع الحكومة و ٥٣٠ بسبب التقصير من قِبَل المقاولين.^(٩٦) هذه المشاريع التي أنهيت كانت لديها التزامات أصلية بحوالي مليار دولار دُفع من أصلها ٦٠٠ مليون دولار إلى المقاولين، من ضمنها ٨٩,٧ مليون دولار إلى مقاولين لمشاريع تم إنهاؤها بسبب تقصير المقاولين.

وجد مكتب المفتش العام أن إنهاء العقود بالتراضي كان عائداً في أكثر الأحيان إلى تغييرات في شروط الحجم أو المشاكل الأمنية، أو لأن المشاريع لم تعد ضرورية. الإنهاءات بسبب التقصير كانت عائدة عادة إلى الأداء الرديء للمقاول أو المقاول من الباطن غير أن القليل منها كان بسبب المشاكل الأمنية.^(٩٧)

تكاليف العقود والحصيلة

واصل مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا مراجعاته لحصيلة وكلفة الإشراف بالنسبة لمشاريع إعادة الإعمار الكبرى وأصدر ثمانية تقارير. نظر هذا التقرير في عقدين للوكالة الأميركية للتنمية الدولية بخصوص نشاطات برنامج الحكم المحلي، بقيمة ٥٩٨ مليون دولار.

قال مكتب المفتش العام أنه من غير الواضح ما الذي تحقق خلال أول ربع سنوات من العقود لأن الخطط الأساسية والتقارير حول ما تحقق المطلوبة بموجب العقد لم تقدم.^(٩٨) كذلك، جاء ذكر التكاليف فقط على المستوى الإجمالي بدلاً من مستوى النشاط الأمر الذي يحول دون تقييم كلفة وفوائد النشاطات الفردية. لقد تلقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية منذ ذلك الحين الخطط والتقارير حول ما تم تحقيقه لكن الأسعار لا تزال غير مذكورة على المستوى الذي يسمح بتقييم قيمة النشاطات الفردية.^(٩٩)

الجدول ٢-٢١

المقاولون العشرة الكبار لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2) (بملايين الدولارات)

الرقم	المقاول	أُزمت	أنفقت
١	بكتل ناشونال إنك	\$١,١٨٧	\$١,١٧٨
٢	فليور أمك، إل إل سي	\$٩٤٨	\$٩٤٣
٣	بارسونز غلوبال سرفيسز إنك	\$٦٧١	\$٦٣٥
٤	بارسونز العراق	\$٦٣٦	\$٦٢١
٥	كيلوغ، براون وروت سيرفسز، إنك	\$٦٣٠	\$٦١٨
٦	واشنطن غروب انترناشونال	\$٥١٢	\$٥٠٥
٧	الشركة الكيماوية البيئية	\$٣٥١	\$٣٤٩
٨	معهد مثلث الأبحاث	\$٢٨٧	\$٢٥٥
٩	مشروع مشترك لشركة أنهام	\$٢٥٩	\$٢٥٩
١٠	سمبيون باور إل إل سي	\$٢٥٣	\$٢٣٤

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. أنتجت هذه القائمة عن طريق جمع بيانات الالتزامات على مستوى العقود التي قدمتها فرقة منطقة الخليج (GRD) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).
المصادر: نظام الإدارة المالية لسلح الهندسة في الجيش الأميركي "تقرير كافة البنود المقدمة إلى (PMCON) وتقرير كافة البنود المقدم إلى (PMNCN)"، ٢٠٠٨/١٠/٧، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٠.

الجدول ٢-٢٢

المقاولون العشرة الكبار لصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) (بملايين الدولارات)

الرقم	المقاول	أُزمت	أنفقت
١	شركة AECOM للخدمات الحكومية، إنك	\$٧٧٨	\$٥٣٠
٢	الشركة الكيماوية البيئية	\$٧٧٢	\$٦٩٧
٣	عقد لوزارة الخارجية لدعم مكتب شؤون المخدرات وفرض تطبيق القانون الدولي	\$٦٩٦	\$٦٩٦
٤	شركة المعدات الأميركية	\$٤٤٢	\$٢٤٢
٥	عقد لوزارة الخارجية لدعم مكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون الدولي	\$٣٨٦	\$٣٨٦
٦	عقد لشركة انترناشونال ميليتري أند غوفرمنت إل إل سي	\$٣٣٢	\$٤٨
٧	مقاول عراقي	\$٣٠٣	\$٢٣٨
٨	تترا انترناشونال إل إل سي	\$٢٩٠	\$٢٤٧
٩	شركة الحلول التقنية المبتكرة، إنك	\$٢٨٤	\$٢٥٧
١٠	شركة تولتست، إنك	\$٢٥٩	\$٢٢١

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصادر: نظام الإدارة المالية لسلح الهندسة في الجيش الأميركي، ٢٠٠٨/٩/٣٠.

الجدول ٢-٢٣
المقاولون العشرة الكبار لصندوق دعم الاقتصاد (بملايين الدولارات)

الرقم	المقاول	ألزمت	أنفقت
١	شركة الإعانة الدولية والتنمية	\$٦٣٦	\$٣٤١
٢	معهد مثلث الأبحاث	\$٣٢٣	\$١٤٣
٣	نظام الإدارة المالي	\$٢٦٤	\$١١١
٤	مجموعة لويس بيرغر	\$١٧٧	\$٦٤
٥	سي ايتش إف انترناشونال	\$١٤٥	\$١١٢
٦	بدائل التنمية، إنك	\$١٣٠	\$٢٩
٧	بيرنغ بوينت، إنك	\$٨٥	\$٦٠
٨	ويمار انترناشونال	\$٧٠	\$٦٣
٩	بارسونز برينكر هوف	\$٥٨	\$٥٨
١٠	مقاول عراقي	\$٤٣	\$٣٤

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصادر: نظام الإدارة المالية لسلح الهندسة في الجيش الأميركي، ٢٠٠٨/٩/٣٠، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٠.

الاستخدامات والحصيلة


يستعرض هذا القسم حصيلة ونتائج جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الأميركية لتاريخه. لأجل تحليل الالتزامات والإنفاقات بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وكذلك الحسابات الصغرى، يقسم مكتب المفتش العام نشاطات ونتائج البرامج الأميركية إلى أربعة ميادين رئيسية:

- **الأمن:** الأمن والعدل.
- **البنية التحتية:** النفط والغاز، الكهرباء، المياه، العناية الصحية، النقل والمواصلات.
- **الاقتصاد:** التنمية الاقتصادية.
- **الحكم:** تطوير القدرات، الديمقراطية، اللاجئين، حقوق الإنسان والتعليم.

للاطلاع على مخصصات التمويل الأميركية لهذه الميادين الأربعة، أنظر الشكل ٢-١٠ ولأجل الرجوع إليها حسب كل برنامج، أنظر الملحق (د).

الشكل ٢-١٠


مخصصات التمويل الأميركية للأمن والبنية التحتية والاقتصاد والحكم (بمليارات الدولارات)

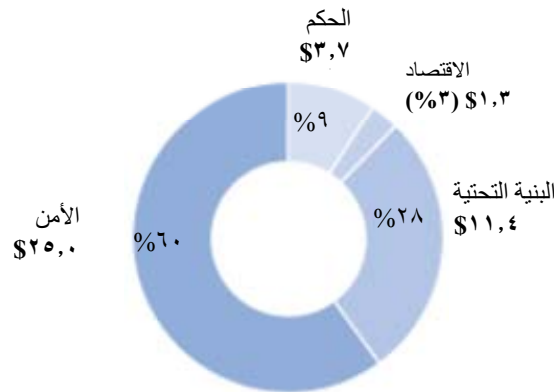

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. بالنسبة لمنهجية كيفية جمع البرامج الأميركية في فئات (الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد والحكم)، أنظر الملحق (د). الالتزامات والإنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن الالتزامات والإنفاقات الواردة في ملخص التمويل الأميركي. لم يتلق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من كافة الوكالات، كما أن بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق. تشمل الأرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISSF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وهي تعد حوالي ٨٢ بالمئة من كافة المخصصات الأميركية.

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تكاليف صندوق دعم الاقتصاد (ESF) التي بحاجة للإكمال، ٢٠٠٨/٩/٣٠، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٨/١٠/١، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

النسبة المئوية للأموال المخصصة حسب مجال إعادة الإعمار

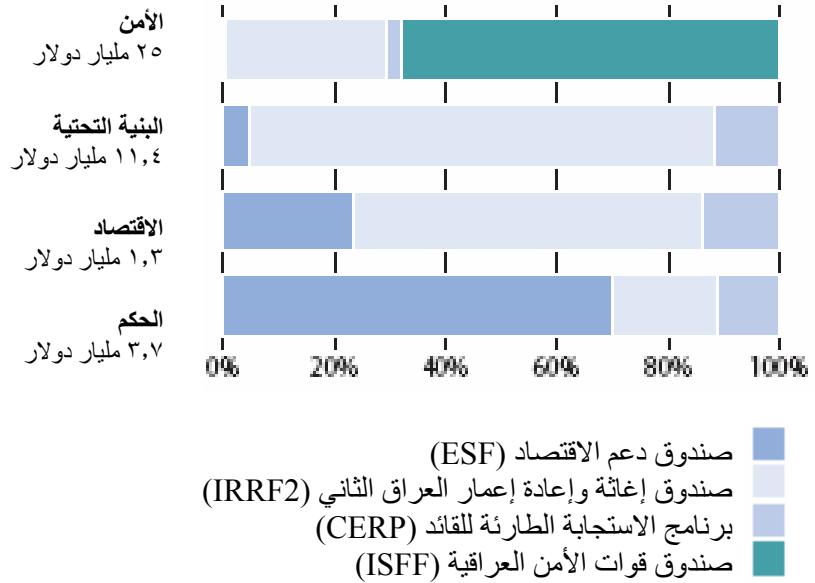

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. بالنسبة لمنهجية كيفية جمع البرامج الأميركية في فئات (الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد والحكم)، انظر الملحق (د). الالتزامات والإنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن الالتزامات والإنفاقات الواردة في ملخص التمويل الأميركي. لم يتلق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من كافة الوكالات، كما أن بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق. تشمل الأرقام فقط تمويل صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISSF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وهي تعد حوالي ٨٢ بالمئة من كافة المخصصات الأميركية.


المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تكاليف صندوق دعم الاقتصاد (ESF) التي بحاجة للإكمال، ٢٠٠٨/٩/٣٠، وزارة الخارجية، تقرير وضع العراق الأسبوعي، ٢٠٠٨/١٠/١، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

الأمن

خصصت الولايات المتحدة حوالي ٢٥ مليار دولار لدعم قوات الأمن العراقية (ISFF) والنظام العدلي، والتزمت بأكثر من ٢٢ مليار دولار، وأنفقت قرابة ١٩ مليار دولار. عيّن الكونغرس الأموال لأجل الأمن عبر عدة حسابات بما في ذلك صندوق قوات الأمن العراقية، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، صندوق دعم الاقتصاد، وتمويل عبر مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) التابع لوزارة الخارجية.

الشكل ٢-١١

وضعية الأموال الأميركية الداعمة لأمن العراق (بمليارات الدولارات)

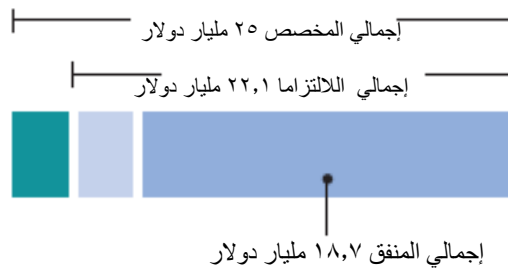

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. بالنسبة لمنهجية كيفية جمع البرامج الأميركية في فئات (الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد والحكم)، انظر الملحق (د). الالتزامات والإنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن الإلتزامات والإنفاقات الواردة في ملخص التمويل الأميركي. لم يتلق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من كافة الوكالات، كما أن بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق. تشمل الأرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISSF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) وهي تعد حوالي ٨٢ بالمئة من كافة المخصصات الأميركية.

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تكاليف صندوق دعم الاقتصاد (ESF) التي بحاجة للإكمال، ٢٠٠٨/٩/٣٠، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٨/١٠/١، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

استدامة البيئة الأمنية

الوضع الأمني في العراق هش^(١٠٠)، مع إمكانية قلب المكاسب التي تحققت مؤخراً^(١٠١) على الرغم من هذا التقييم الحذر، تواصل قوات الأمن العراقية نموها من حيث القوة والقدرات، واستعادت العراق السيطرة على السلطة الأمنية في ١١ محافظة وتراجع العنف إلى أدنى مستوياته منذ ٢٠٠٤. مثلاً، الهجمات في بغداد هبطت بنسبة ٦١ بالمئة مما كانت عليه في ربع السنة الثالث من هذا العام^(١٠٢).

السيطرة العراقية على المحافظات

أعاد الائتلاف المسؤولية الأمنية في الأنبار إلى العراقيين في الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨. إن انتقال الأنبار التي كانت سابقاً إحدى أعنف المحافظات في العراق، يُشكّل معلماً بارزاً في التقدم الأمني في البلاد^(١٠٣) في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، أصبحت بابل المحافظة ١٢ التي تعود إلى السيطرة العراقية على المحافظات^(١٠٤).

كانت الولايات المتحدة على استعداد لنقل الأنبار في تموز/يوليو ٢٠٠٨ لكن عدداً من التحديات سبب التأخير. اللافت أكثر ان التوتر الذي حصل بين بغداد وزعامات الأنبار حول السياسة الأمنية قد ساهم في تأجيل موعد انتقال الأنبار إلى السيطرة العراقية على المحافظات^(١٠٥).

من أصل المحافظات الست المتبقية تحت سيطرة الائتلاف، ذكرت القوات المتعددة الجنسيات انه كان من المتوقع نقل محافظة الواسط في نهاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨^(١٠٦). ومن المتوقع أن تتبع التأميم وصلاح الدين في نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.

التاريخ المقرر لمحافظة ديالى هو شباط/فبراير ٢٠٠٩، كما ان نينوى سوف تنقل بحلول آذار/مارس ٢٠٠٩^(١٠٧). بغداد ستكون الأخيرة التي من المبرمج نقلها في أيار/مايو ٢٠٠٩^(١٠٨).

عندما تتوصل المحافظة إلى فرض السيطرة العراقية على المحافظات، تقدم قوات الأمن العراقية جميع الخدمات تقريباً. غير ان بعض الاعتماد على مساندة قدرات الائتلاف سوف يتواصل.

أبلغ سلاح الهندسة في الجيش الأميركي- فرقة منطقة الخليج (GRD) مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا ان القيام بعمليات في المحافظات بعد نقلها إلى السيطرة العراقية على المحافظات لم يؤثر كثيراً على جهود إعادة الإعمار. وذكر موظفو فرقة منطقة الخليج انهم يعتمدون إما على مواردهم الخاصة أو على المساعدة من قوات الأمن العراقية اثر الحوادث الأمنية بدلاً من الاعتماد على القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)^(١٠٩). غير أن الاعتماد على قوات الأمن العراقية بإمكانه تقييد تحركات الموظفين الأميركيين والمطالبة بمواكبة من قوات الأمن العراقية لمقاولي الأمن الخاص، وقد فعلت هذه القوات ذلك، على الأخص في محافظتي ذي قار والمنتى^(١١٠).



مع التحسّن الأمني، تعمل الولايات المتحدة والعراق على إزالة الجدران في بغداد التي شيدت للحدّ من العنف عن طريق فصل الأحياء الشيعية والسنية.

البرامج الأميركية الأساسية

تلقت برامج الأمن والعدل أكبر حصة من التمويل الأميركي لإعادة الإعمار في العراق، فسهلت تدريب قوات الأمن العراقية، وقدمت المعدات، وعززت القضاء في العراق، وساندت إنشاء السجون ومرافق المحاكم، من جملة النشاطات الأخرى.

وضع قوات الأمن العراقية

منذ العام ٢٠٠٣، ارتفع عدد قوات الأمن العراقية المدربة من ٨٧،٤١٤ إلى ٥٣١،٠٠٠^(١١١). البيانات الخاصة بقوات الأمن العراقية التي تعكس معلومات كشف الأجرور، تشير إلى ٥٩١،٦٩٥ عنصر^(١١٢). تعتبر وزارة الدفاع البيانات هذه على أنها تقييم واقعي أكثر لأفراد قوات الأمن العراقية الحاليين لأن أرقام المدربين لا تعكس أعداد الحاضرين منهم وتشمل أفراداً متغيّبين أو مصابين. لمقارنة هذه الفوارق، انظر الجدول ٢-٢٤.

خلال ربع السنة هذا، أجرى مكتب المفتش العام متابعة لتقريره الصادر في نيسان/أبريل ٢٠٠٨، مع تدقيق قيم مدى الاعتماد على التقارير التي ترفعها قوات الأمن العراقية. عثر مكتب المفتش العام على العديد من نقاط الضعف الناجمة عن توثيق غير مناسب، وعن الفساد، والموظفين الأشباح والتوظيفات غير المرخص بها وأنظمة إدارة العاملين الضعيفة^(١١٣).

ولأن مقاييس وتعريف التقارير قد تغيّرت مع الوقت، لاحظ مكتب المفتش العام ان ميول التحليل لدى عدد غير قليل من موظفي قوات الأمن العراقية لا تزال صعبة. تموّل الولايات المتحدة جهوداً لتطوير نظاماً ممكنماً لوزارة الدفاع في حين تركز الحكومة العراقية على نظام لوزارة الداخلية^(١١٤).

بناء قدرات قوات الأمن العراقية

يواجه مدراء البرنامج الأمني تحديات متعددة في عملهم لأجل إنشاء قوات عراقية مكثفية ذاتياً تحت إمرة وزارة الدفاع وتضم فرقاً تشكو نقصاً في الضباط وذات قدرات لوجستية غير مناسبة وعمليات شراء رديئة.

إن الفساد المتواصل داخل وزارة الداخلية، والمذهبية والنقص في القيادة والسيطرة، والصيانة، تحد من التقدم^(١١٥).

على الرغم من أن إجمالي موازنات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية قد ازدادت بصورة مضطربة منذ ٢٠٠٤، إلا أنها لا تزال دون متطلبات الوزارة. سنة ٢٠٠٨، طالبت وزارة الداخلية بمبلغ ١٠,٣ مليار دولار لكن ٥٣ بالمئة فقط من هذا الطلب قد تمت الموافقة عليه.^(١١٦) وتلقت وزارة الدفاع ٦٣ بالمئة من طلبها.^(١١٧) هذه العجزات التي تزيد من تعقيدها آليات تنفيذ الموازنات، تؤثر على الجهود الأميركية لتطوير الاكتفاء الذاتي لدى قوات الأمن العراقية.^(١١٨)

وعلى الرغم من النواقص هذه، حققت قوات الأمن العراقية خلال ربع السنة هذا تقدماً. تواصلت وزارة الدفاع تحسين التنسيق ما بين الوكالات، والتدريب، وإنشاء قوات الجيش، وتوسيع سلاح الطيران وسلاح البحرية في العراق.^(١١٩) غير أن التدريب الأساسي محدود بسبب ترهل المعدات والمرافق. لاحظ فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة (CAATT) أن الظروف المعيشية القياسية والخيم المتضررة قد خفضت قدرات التدريب الأساسية بنسبة ١٤ بالمئة.^(١٢٠)

لقد تحسنت وزارة الداخلية أيضاً. فقد حققت تقدماً في الجهود الرامية إلى تأمين ١٠٠ من أصل ١٠٨ قطعة أرض ضرورية للنشآت المستقبلية، وافتتحت أربعة مختبرات شرعية، وزادت قوات الشرطة الوطنية وقوات شرطة المحافظات، ووسعت المرافق (بما في ذلك إنشاء أو تجديد ١٧٥ محطة للشرطة).^(١٢١)

الأعداد المتنامية للضباط وضباط الصف

تحدثت تقارير مكتب المفتش العام سابقاً عن النقص في أعداد الضباط وضباط الصف من ذوي الخبرة في قوات الأمن العراقية. لم يلبي الضباط المدربين البالغ عددهم ١٢,٠٠٠ ضابط المدربين بين تموز/يوليو ٢٠٠٧ إلى وتموز/يوليو ٢٠٠٨ سوى ثلث الأعداد المطلوبة لقيادة القوات الحالية.^(١٢٢)

في ٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، سعت وزارة الدفاع إلى استدعاء ضباط الصف والضباط العسكريين من عهد صدام. بتاريخ ٦ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، تسجل قرابة ٩٧,٠٠٠ ضابط وضابط صف سابقين، وهو عدد تخطى الهدف الأصلي لوزارة الدفاع أي ٨٠,٠٠٠ ضابط.^(١٢٣) ذكرت القوات المتعددة الجنسيات في العراق أن ذوي الرتب الأدنى من رتبة عقيد لديهم أفضل الفرص للقبول.^(١٢٤) لقد أعادت وزارة الدفاع رسمياً ٧٣٨ ضابط و١٤٢٥ ضابط صف الذين سجلوا بتاريخ ١٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨. للحصول على نظرة إجمالية على تسجيل ضباط الصف والضباط السابقين، انظر الجدول ٢-٢٥.

الجدول ٢-٢٤

إجمالي المعينين والمدربين لقوات الأمن العراقية بتاريخ ١٥/٨/٢٠٠٨

القوات	فرع الخدمة	المعينون	المدربون
وزارة الدفاع	الجيش العراقي	١٨٠,٢٩٦	٢٢٤,٩٧٠
	قوات التدريب والمساندة	٢٢,٠٦٩	٢١,١٤٤
	سلاح الجو	١,٨٨٧	٢,٢٤٦
	البحرية	١,٨٧٢	١,٤٩٤
وزارة الداخلية	إجمالي وزارة الدفاع	٢٠٦,١٢٤	٢٤٩,٨٥٤
	الشرطة العراقية	٢٩٩,١٧٠	١٩٢,٠٢٨
	الشرطة الوطنية	٣٩,٧٣٩	٥٠,١٨٤
	فرض امن الحدود	٤٣,٠٧٣	٣٤,٣٧٠
	إجمالي وزارة الداخلية	٣٨١,٩٨٢	٢٧٦,٥٨٢
مكتب مكافحة الإرهاب	العمليات الخاصة	٣,٥٨٩	٤,٥٦٤
مجموع قوات الأمن العراقية		٥٩١,٦٩٥	٥٣١,٠٠٠

ملاحظة: على الرغم من أن أعداد المعينين تصور بيانات جدول الرواتب، فإنها لا تعكس إجمالي الحاضرين للخدمة. تشمل أرقام المدربين الأفراد المتغيبين بدون إذن، والبعيد بسبب الإصابات.
المصدر: وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠، ص ٣٣

الجدول ٢-٢٥

تسجيل الضباط وضباط الصف السابقين بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/٦

الرتبة	المسجلون
لواء	١،٣٢١
مقدم إلى عقيد	٤،١٦٣
ملازم أول إلى رائد	٨،٢٩٩
ضباط صف	٨٣،١٧٨
المجموع	٩٦،٩٦١

المصدر: القوات المتعددة الجنسيات في العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٠.

مساندة التدريب والانتقال

على الرغم من أن العراق حمل حصة أكبر من واجبات التدريب والواجبات الإدارية لقوات الأمن العراقية، تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم الاستشاري الأساسي لمساعدة القادة الميدانيين ولمساعدة الوزارات في بلوغ أهدافها من "الاستقلال الذي له علاقة بالعمليات".^(١٢٥) تشرف القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) على المستشارين الذين يعملون كجزء من تسع فرق متخصصة في مساعدة الجهاز الأمني في العراق. إضافة إلى الفرق الاستشارية في وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، وفي مراكز القيادة المشتركة، يقدم الائتلاف الأفراد لفرق تدريب الشرطة (بما في ذلك ٧٦٦ مستشار شرطة دوليين)^(١٢٦)، وفرق الحدود الانتقالية، وفرق المساعدة العسكرية الانتقالية داخل كل فرع من الفروع العسكرية العراقية، من بينهم ١٧٩ مستشاراً أميركياً للتدريب الأساسي للجيش العراقي.^(١٢٧)

تشرف قوات الائتلاف على مرافق العمليات الطارئة المشتركة التي تخدم كقواعد مشتركة للعمليات. حالياً، تستضيف ٥٤ قاعدة عمليات طوارئ وموقع وأكثر من ٣٦٢ أماكن اصغر لعمليات الطوارئ، تستضيف قوات الأمن العراقية وقوات الائتلاف.^(١٢٨)

ذكرت وزارة الدفاع ان الهدف إقفال هذه المرافق جزئياً أو تسليمها إلى قوات الأمن العراقية عندما يتم تحقيق مكاسب في منطقة ما. مثلاً، خلال ٢٠٠٧، كانت هناك ٦٣ قاعدة كبرى خلال ذروة تعزيز القوات الأميركية عددياً، ومع سحب القوات التكميلية تم نقل أو إقفال ٩ قواعد كبرى و١٧ قاعدة اصغر إلى الحكومة العراقية.^(١٢٩)

ذكر المستشارون الأميركيون لدى وزارة الداخلية حصول تحسينات في عمليات تنفيذ الموازنة، والقدرات التدريبية، وآليات إنشاء القوات لكنهم أشاروا إلى تحديات مكافحة الفساد وإدارة الموقوفين.^(١٣٠)

وذكر كل من فريق مساعدة تدريب الشرطة المدنية والفريق الانتقالي لوزارة الداخلية ان التخطيط الاستراتيجي الهزيل، وقدرات مركز التدريب غير المناسبة، والمرافق غير المناسبة بنيوياً والاندماج والمهارة المهنية البطيئة لقوات وزارة الداخلية تواصل إعاقه التقدم.^(١٣١)

مساندة اللوجستية والصيانة

تقدم قوات الائتلاف المساندة الاستشارية لمساعدة وزارة الدفاع في دعم أنظمة الشراء، والتخزين والصيانة والتوزيع الأساسية بالنسبة لتجهيز العاملين في الميدان. غير ان التقدم في تطوير أنظمة اللوجستية الذاتية الاعتماد والصيانة أبطأ مما كان متوقعاً^(١٣٢) ولا يزال يُشكّل مشكلة.^(١٣٣)

تتخذ الولايات المتحدة الخطوات لدعم القدرات اللوجستية للجيش العراقي، بما في ذلك:^(١٣٤)

- تدريب حوالي ٣٠٠٠ جندي كجزء من عدة مبادرات لوجستية خلال ربع السنة هذا.
- تطوير عقيدة واليات لوجستية.
- إنشاء التدريب والإرشاد لتحسين الكفاءات الأساسية.
- إعداد فوج احتياطي للنقل العام لنقل المعدات والإمدادات من الموانئ والمستودعات إلى المرافق الأخرى.
- المطالبة بـ ١٨,٧٥ مليون دولار لأجل تحسين المعدات القديمة الطراز لتلبية متطلبات التغيير على المدى البعيد.
- المطالبة بحوالي ٢٥ مليون دولار من أموال المشتريات لمعالجة النقص في المعدات في فوجين مزودين بعربات للنقل.
- دعم إنتاج برنامج للمركبات السيارة السريعة المتعددة الأغراض مع ٤٥ مليون دولار من الإمدادات، وقطع الغيار وفريق إدارة.



احتفال أميركي-عراقي مع أفراد من جماعة أبناء العراق

من المتوقع إنجاز مستودع ومجمع التاجي الوطني الممول من الولايات المتحدة، الذي سيكون أكبر مرفق لوجستي في العراق في مطلع ٢٠٠٩. لكن ستكون هناك حاجة إلى مستشاري الائتلاف للتدريب وللإشراف على المرافق إلى حين يستطيع العراقيون تأمين السيطرة.^(١٣٥) تم تسليم مخزن الأسلحة الخفيفة في أيار/مايو ٢٠٠٨ وبدأ التدريب في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨.^(١٣٦)

خلافًا لوزارة الدفاع، لا تملك وزارة الداخلية نظاماً لوجستياً مكرساً رسمياً، كما ان قدرات الصيانة لديها ليست قوية بما فيه الكفاية لتأمين جهوزية صيانة العربات أعلى من ٨٥ بالمئة.^(١٣٧) وزارة الداخلية بصدد تطوير لواء إسناد معزز للشرطة الوطنية الذي يتوقع انجازه بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كان اللواء يضم ٤٦ بالمئة من العاملين المطلوبين والذين يشملون فرق الصيانة واللوجستية والطب والنقل.^(١٣٨)

عقود الدعم الحياتي

في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، بدأ مكتب المفتش العام رفع التقارير حول الجهود الأميركية الرامية إلى نقل مسؤوليات الدعم الحياتي إلى وزارة الداخلية ووزارة الدفاع للمرافق والأمن والنقل والصيانة واللوجستية وتكنولوجيا المعلومات. من أصل ٣٣ عقد جعلتها الولايات المتحدة هدفاً للنقل، كان هناك ١٩ عقداً لوزارة الدفاع مقدرتها قيمتها بـ ١٨٤ مليون دولار و ١٤ عقداً لوزارة الداخلية مقدرتها قيمتها بحوالي ٢٦٧ مليون دولار. ذكرت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق ان كافة العقود المتعلقة بوزارة الداخلية سوف تنقل بحلول ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨.^(١٣٩)

بتاريخ ٨ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، تم نقل ١٣ عقداً بقيمة ١٥٠ مليون دولار.^(١٤٠) الإجمالي هذا اقل مما ابلغ إلى مكتب المفتش العام في تموز/يوليو ٢٠٠٨ لان القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق قد قررت الاحتفاظ بالسيطرة على سبعة عقود يبلغ مجموعها ٩٤ مليون دولار.^(١٤١)

منذ تموز/يوليو ٢٠٠٨، تم نقل ثلاثة عقود بقيمة ١٠ ملايين دولار وبقي حوالي ٣٠٠ مليون دولار في عقود يحتفظ بها الائتلاف.^(١٤٢)

نقل برنامج أبناء العراق إلى السيطرة العراقية

سنة ٢٠٠٧، بدأت الولايات المتحدة تمويل منظمة أبناء العراق (SOI) من أموال الإجراءات الوقائية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد الذي أصبح منذ ذلك الحين أكبر فئة في برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. لقد انفق حوالي ٣٦٨ مليون دولار من البرنامج على برنامج أبناء العراق.^(١٤٣) وعلى الرغم من ان التمويل الشهري لأبناء العراق قد ازداد منذ بداية البرنامج، إلا ان متوسط الإنفاق الشهري للفرد قد هبط بصورة متواصلة منذ أواخر ٢٠٠٧، عاكساً الزيادة الكبيرة في عضوية منظمة أبناء العراق.

بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، وافقت الحكومة العراقية على تحمل مسؤولية دفع الموجبات للأعضاء ال ٥١,٠٠٠ في منظمة أبناء العراق العاملين في بغداد.^(١٤٤) هذه أول خطوة في عملية نقل برنامج أبناء العراق من الإدارة الأميركية إلى الإدارة العراقية. ذكر الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق انه يعتزم نقل الأعضاء المتبقين وعددهم ٤٤,٠٠٠ في أرجاء البلاد خلال الأشهر الستة القادمة. ولاحظ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ايضاً ان الولايات المتحدة سوف تواصل دعم ما تبقى من أعضاء منظمة أبناء العراق إلى حين تستطيع العمل مع الحكومة العراقية لنقلهم إلى وظائف مدنية دائمة ذات معنى أو إلى قوات الأمن العراقية.^(١٤٥)

وعلى الرغم من ان رئيس الوزراء العراقي قد قال علناً أنه يؤيد هذا الانتقال^(١٤٦) إلا ان وزارة الداخلية وبعض القادة العراقيين ابدوا تحفظاً بالنسبة للخطة وسط التوتر المذهبي.^(١٤٧) تأمل الولايات المتحدة بنقل حوالي ٢٠ بالمائة من أعضاء منظمة أبناء العراق إلى قوات الأمن العراقية لكن الانتقالات إلى الشرطة العراقية خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة قد أظهرت "تقدماً بطيئاً ان لم نقل لا تقدم".^(١٤٨) علاوة على ذلك، ذكرت وزارة الدفاع ان بعض أعضاء منظمة أبناء العراق يجري استهدافهم من قبل الحكومة العراقية.^(١٤٩)

إضافة إلى تنسيق نقل وتسديد رواتب أبناء العراق، يتوجب على الحكومة العراقية والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق وضع الصيغة النهائية لمذكرة تفاهم لأجل خفض التوترات المتعلقة بالعمليات بين الائتلاف والجيش العراقي في الوقت الذي تتم فيه مسؤولية الإشراف على منظمة أبناء العراق.^(١٥٠)

لقد أقام الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق خلية مصالحة لإشراك لجنة التطبيق والمتابعة العراقية للمصالحة الوطنية^(١٥١)، التي تقود التدقيق في المتطوعين في الشرطة وتعمل مع الحكومات المحلية وحكومات المحافظات حول قضايا المصالحة.^(١٥٢) عهد رئيس الوزراء إلى اللجنة مهمة الإشراف على انتقال برنامج أبناء العراق.

قام الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق أيضاً باتخاذ مبادرتين اثنتين:

- إقامة مركزين للدفع لبدء تأقلم الجيش العراقي مع إدارة المجموعة عن طريق دفع رواتب أبناء العراق وعن طريق استخدام الأموال الأميركية.^(١٥٣)

- القيام بأعمال التسجيل المشتركة مع الجيش العراقي للمساعدة في ضم أبناء العراق للاستفادة من البرنامج الانتقالي.^(١٥٥)


تسهيل المبيعات العسكرية الخارجية

يسمح برنامج المبيعات العسكرية الخارجية للعراق بالشراء السريع للسلع والمعدات والخدمات من الولايات المتحدة. تشرف وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) على العملية التي تؤمن إمداد تشكيلة من المعدات للعراقيين بما في ذلك قطع السلاح الصغيرة، والملبوسات والصحاريج، والعربات المقطورة وقطع الغيار.^(١٥٦) طالب العراقيون في المدة الأخيرة بمعدات أكثر أهمية من ضمنها طوافات استطلاع وطائرات النقل.^(١٥٧)

منذ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧، التزام العراق بمبلغ ٣,٤ مليار دولار لهذا البرنامج.^(١٥٨) بتاريخ ١٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كانت القيمة الإجمالية لقضايا برنامج المبيعات العسكرية الخارجية ٢,٩ مليار دولار (٨٥ بالمئة من إجمالي ما ألزم) كما ان إجمالي المبلغ الذي سلم كان حوالي ١,٧ مليار دولار. لمعرفة التقدم الحاصل في المبيعات العسكرية الخارجية منذ آذار/مارس ٢٠٠٨، انظر الشكل ٢-١٢.

الشكل ٢-١٢

وضع المبيعات العسكرية الخارجية مع العراق، ٢٠٠٨

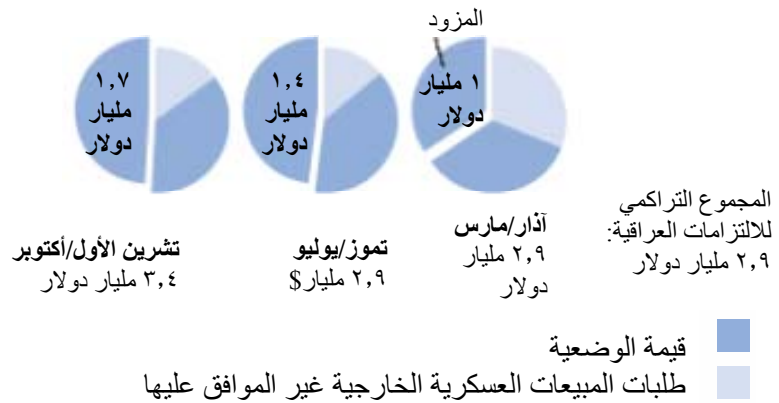

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصدر: وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٣، استجابة القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٤. نائب المفتش العام، المقابلة مع مكتب وزير الدفاع، مساعد نائب وزير الدفاع، شؤون الامن العالمية، ٢٠٠٨/٧/٧. استجابة وكالة التعاون الامني الدفاعي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٥.

بين آذار/مارس ٢٠٠٨ وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، تجاوزت المبالغ التي التزمت بها الحكومة العراقية للمبيعات العسكرية الخارجية المواد التي تم تسليمها. لقد ساهمت العمليات الطويلة الأمد سابقاً في تأخير الموافقة والتسليم. لأجل تبسيط عملية المبيعات العسكرية الخارجية، أقامت وزارة الدفاع فريق مهمة لتحسين سرعة العمليات كما ان وكالة التعاون الأمني الدفاعي انتقلت من دور السياسة والإشراف إلى موقف عملائي أكثر.^(١٦٠)

لقد عززت وكالة التعاون الأمني الدفاعي آليات التسليم عن طريق تحسين العلاقة مع قيادة النقل الأميركية، رافعة أولوية الشحن لسلع برنامج المبيعات العسكرية الخارجية، معتمدة على النقل الجوي وناقلة خط الشحن البحري من موانئ في الكويت إلى أم قصر.^(١٦١)

لقد أصبحت فرقة منطقة الخليج (GRD) مؤخراً الوكيل التنفيذي لعدة قضايا ومكونات قضايا^(١٦٢) بتاريخ ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كانت فرقة منطقة الخليج تدير قضية واحدة لإنشاء مشروع رصيف وجدار بحري في أم قصر.^(١٦٣) تلقت فرقة منطقة الخليج أيضاً التمويل لقضايا أخرى مقدرة جماعياً بمبلغ ١٢٨,٤ مليون دولار.^(١٦٥)

تحديد شكل النظام القضائي في العراق

تركز المساعدة الأميركية للنظام القضائي العراقي على الأمن القضائي والتدريب والمشاريع الإنشائية. سعت الولايات المتحدة التي تعترف بان استقرار وامن هذه المؤسسات سوف يتطلب سنوات من الجهود وراء تشكيله منوعة من المبادرات، من ضمنها:

- معالجة آليات الأمن القضائي غير المناسبة.
- تحسين نظام المحاكم.
- تخفيف الازدحام في السجون.

حماية الموظفين القضائيين

تواصل التهديدات الخطيرة إعاقة القضاء العراقي. يتعرض الموظفون التخويف والفساد والاعتقالات عندما يقومون بالتحقيق في القضايا والمقاضاة في مجال عديد موظفيه وتدريبهم دون المطلوب. ذكرت وزارة الدفاع ان "التخويف يعيق بشكل هام إدارة النظام القضائي الجنائي وهو التهديد المباشر أكثر لحكم القانون في العراق"^(١٦٥)

منذ حزيران/يونيو ٢٠٠٣، اغتيل ٣٨ قاض (قتل ٧، سنة ٢٠٠٨) كما ان ٦ أعضاء من عائلات موظفين قضائيين قتلوا (لم يقتل احد خلال ربع السنة هذا).^(١٦٦) منذ حزيران/يونيو ٢٠٠٤، جرى استهداف ٩٩ عضو آخرين من الجسم القضائي.^(١٦٧) تقدم الولايات المتحدة السكن الأمن ل ٢٩ قاض وعائلاتهم.^(١٦٨)

بين تموز/يوليو ٢٠٠٨ وتشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، أصدرت وزارة الداخلية ٦٥ رخصة سلاح للموظفين القضائيين.^(١٦٩) رفع هذا إجمالي عدد الرخص إلى ٤٧٠ لكنه يعد اقل من ١٠ بالمئة من أمن الموظفين القضائيين. مجلس القضاء الأعلى غير قادر لعي إعطاء الدعم المناسب لخدمة حماية القضاء. فعلى الرغم من ان المجلس قد تلقى بعض المال لتسديد تكاليف امن الموظفين وأعضاء خدمة حماية المرافق، إلا انه لم يتلق ما فيه الكفاية للحفاظ على العدد الكافي من الموظفين.^(١٧٠)

تنسق الوكالات الأميركية مع مجلس القضاء الأعلى ومع وزارة الداخلية لدعم أمر صادر عن رئيس الوزراء يطالب وزارة الداخلية بتحمل المزيد من المسؤولية بالنسبة للأمن القضائي.^(١٧١) لاحظ مكتب شؤون المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون ان "مستقبل الأمن القضائي" عبر العراق يتوقف على الخطة.^(١٧٢)

يمول مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون نواب مارشالات أميركيين ومقاولا لتقييم الأمن القضائي في أرجاء البلاد، ولوضع سياسات وخطط لأمن الموظفين القضائيين، وتطوير المساعدة الأمنية، والعمل مع المسؤولين في الحكومة العراقية لإعداد صفوف تدريب امني لمعهد التعليم والتطوير القضائي.^(١٧٣)



السجادة الحمراء تنتظر أصحاب المقامات الرفيعة بمناسبة افتتاح قصر العدل الجديد في الرصافة، في ١٠ أيلول/سبتمبر

تحسين مرافق العراق القضائية

في الرصافة، ساعدت الوكالات الأميركية في نقل المحكمة والموظفين إلى قصر العدل الجديد الذي بنته الولايات المتحدة بكلفة ١١,٣ مليون دولار (المعروف بقصر العدل).^(١٧٤) افتتح قصر العدل، ومساحته ١٠,٢٠٠ قدم مربع، في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ لخدمة أكثر من مليون مواطن. يشمل المُجمّع مرفقاً لحماية الشهود، وأماكن لإقامة القضاة والموظفين القانونيين والعديد من المباني للأمن والصيانة والخدمات الغذائية.^(١٧٥) ومع أن الولايات المتحدة تعتبر المجمع كمثال يمكن تطبيقه في أنحاء العراق، يتردد مجلس القضاء الأعلى في إعادة التجربة.^(١٧٦)

منذ تموز/يوليو ٢٠٠٨، جرى افتتاح ٩ محاكم جديدة ليصبح إجمالي المحاكم في البلاد ٦٦٤ محكمة.^(١٧٧) بحلول ٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كانت التحسينات الأمنية في محاكم الموصل وكركوك على وشك الانجاز.^(١٧٨) لقد حدد المارشالات الأميركيون ومكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) ٢٧ قصر عدل آخر لرفع مستوى الأمن فيها.^(١٧٩)

علاوة على إنشاء المحاكم، تمول الولايات المتحدة مرافق حماية الشهود المتواجدة داخل قصور العدل. ان غياب المرافق الرسمية يُجبر الشهود والمحامين على الإقامة في معسكرات. منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧، أقام قرابة ٣٠٠ شاهد ومحامي دفاع في تلك المعسكرات. من الأول من تموز/يوليو إلى ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أقام أكثر من ٨ محامين دفاع و١٧ شاهد أكثر من ٦ أسابيع في المعسكرات. لاحظ الملحق العدلي لدى السفارة الأميركية ان المعسكرات سلّمت إلى الحكومة العراقية في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨.^(١٨٠)

بحلول ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كان المرفقان الجديان المنجزان مؤخراً لحماية الشهود جزءاً من المحكمة الجنائية المركزية في العراق، واحد في الكرخ والثاني في مجمع قصر العدل في بغداد. بالنسبة لأحدث المعلومات عن هذه المرافق، أنظر الجدول ٢-٢٦.

الجدول ٢-٢٦

مرافق حماية الشهود الممولة من الولايات المتحدة، بتاريخ ٣٠/٨/٢٠٠٨.

المكان	الكلفة (بملايين الدولارات)	كلفة الانجاز (بملايين الدولارات)	تاريخ الانجاز المتوقع	النسبة المئوية للانجاز	التغيير عن ٢٠٠٨/٧
البصرة	\$١,٩	\$٠,١	٢٠٠٨/١٠/١٥	٩٨ بالمئة	٢ بالمئة
الرصافة	\$٢,٩	\$٠	أنجز	١٠٠ بالمئة	أنجز
الكرخ	\$٢,٠	\$٠	أنجز	١٠٠ بالمئة	لم ينجز

المصدر: استجابة مكتب شؤون المخدرات الدولية لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣

بناء قدرات المحاكم في العراق

لقد تمت زيادة عدد العاملين في المحاكم وهم يشملون الآن ٤٨٢ قاضٍ جديد و ٢٨٧ قاضي تحقيق، و ٦٨٩ مُحقق و ٣١٣ مدعي عام و ٤,٤٨٢ موظف حماية.^(١٨١) غير ان الجسم القضائي لا يزال يزرح تحت عدد القضايا الكبير.

لقد اتخذت الولايات المتحدة مقاربة تتالف من ثلاث خطوات لمساعدة العراق في معالجة القضايا المتركمة غير المنجزة. على المدى القصير، يعالج مستشارو حكم القانون القضايا الفورية/العاجلة مثل الخدمات الكهربائية وإدارة الملف لوزارة الداخلية.^(١٨٢) على المدى الطويل، يساعد موظفو مكتب شؤون المخدرات الدولية ووزارة الخارجية في تطوير مشروع إدارة محكمة مجلس القضاء الأعلى الذي يُركّز على بناء القدرات لأجل تطبيق وتوحيد معايير إدارة القضايا. وتساعد الولايات المتحدة أيضاً في تنسيق المساحات المخصصة للمكاتب الإدارية داخل المحاكم الجديدة لأنها تقتصر إلى المركزية.^(١٨٣)

فريق المهمة للقانون والنظام (LAOTF) التابع للسفارة الأميركية، والقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) وفرق إعادة إعمار المحافظات-بغداد، تساهم في تقديم الدعم اللوجستي والتقني إلى المحكمة الجنائية المركزية في العراق.^(١٨٤) تشمل الجهود في الكرخ، مساندة القدرات الاستشارية لمعالجة الأدلة، والتنسيق بين الشهود وتقديم الدعم الأمني واللوجستي المباشر لنقل السجناء.^(١٨٥)

تسوية القضايا


بين كانون الثاني/يناير وآذار/مارس ٢٠٠٨، جرى تقديم أكثر من ٢٠٠,٠٠٠ قضية إلى محاكم الاستئناف الفدرالية العراقية.^(١٨٦) بين أيار/مايو ٢٠٠٨ وتموز/يوليو ٢٠٠٨، ارتفعت نسبة القضايا المقدمة ٢٢ بالمئة عن ربع السنة الأول من العام ٢٠٠٨، مبقية معدلاً مرتفعاً من القضايا التي تنتظر الحل.^(١٨٧) في العراق، كل ادعاء يدعمه شاهدان أو أكثر يصبح قضية. عندما تصبح في الملف، تعرض القضية على قاضي التحقيق الذي يسعى جاهداً إلى اكتشاف الوقائع وفي نفس الوقت تمثيل مصالح العراق. قاضي التحقيق مسؤول عن الإشراف على جمع الأدلة اللازمة لحل القضية أو تحويلها إلى محكمة أعلى، بصرف النظر عن صلاحية أو القضية أو صلتها بالموضوع. وهكذا، تساهم الشروط هذه في العدد الكبير من القضايا التي يتم الاستماع إليها في نظام المحاكم في العراق. بعدها، يُقرر قاضي التحقيق ما إذا كان سيواصل العمل على القضية أو تسويتها دونما عمل إضافي. للحصول على ملخص عن تسوية القضايا، انظر الشكل ٢-١٣.

تشمل الجهود الأميركية تقديم النصح لموظفي لجنة النزاهة (الذين يطورون ويرسلون القضايا إلى محاكم التحقيقات)، زيادة عدد القضايا المحوالة من لجنة النزاهة وتدريب قضاة التحقيق والمحققين القضائيين.^(١٨٨)

علاوة على ذلك، تحاول الولايات المتحدة تخفيف التوترات بين قضاة التحقيق والشرطة التي يمكن ان تسبب تأخيرات في تحويل القضايا والتعاون.^(١٨٩)

الشكل ٢-١٣

عدد القضايا التي حسمتها محاكم الاستئناف الاتحادية في العراق، ٢٠٠٨/٧-٢٠٠٨/٥، ٢٥٠,٣٧١ قضية عُرضت و ٧١ بالمئة حُسمت



ملاحظة: محكمة التمييز الاتحادية شبيهة بالمحكمة العليا الأميركية، "الاستئنافات كما هي مقدمة أصلاً و"الاستئنافات كما هي مقدمة إلى محكمة التمييز" تشير إلى المحاكم المشابهة في عملياتها لمحاكم الدائرة المتوسطة الأميركية. المحاكم الجنائية المركزية في العراق محاكم تدعها الولايات المتحدة وتعالج قضايا الفساد والقضايا ذات العلاقة بالتمرد. محاكم العمل والمحاكم الابتدائية ومحاكم الأوضاع الشخصية والمحاكم الدينية هي محاكم مدنية. محاكم الجرح والأحداث والتجارة والتحقيق هي محاكم جميعها جنائية. تشمل المحاكم الأخرى، محاكم الأحداث، محاكم المجموعات الدينية غير المسلمة، محاكم العمل، المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف كما هي مقدمة أصلاً.

المصدر: الملحق العدلي لدى السفارة الأميركية، "التقرير الإحصائي للمحكمة العليا العراقية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.

الجدول ٢-٢٧

التغيرات من ربع سنة لربع سنة آخر في قضايا المؤهلة لقانون العفو، الربع الأول والثاني من سنة ٢٠٠٨

الموقوفون المؤهلون	السجناء المؤهلون	مؤهلون بكفالة	هاربون مؤهلون	مرفوضون
+ ١٤,٠٩ بالمئة	+ ٢٢,١٦ بالمئة	+ ٢٦,٠٧ بالمئة	٣٢,٢٦ بالمئة	+ ١٣,٣٠ بالمئة

المصدر: الملحق العدلي في السفارة الأميركية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.

افتتحت فرقة إعادة إعمار المحافظات في بغداد (PRT) وفرقة المهمة للقانون والنظام (LAOTF) مركز الرصافة للدفاع القانوني في أيار/مايو ٢٠٠٨ لتقديم الاستشارات القانونية للمعتقلين. بحلول تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، تم إجراء أكثر من ٤,٢٠٠ استشارة (٨٣ في اليوم) لدعم إطلاق سراح أو نقل ٢,١٧٦ معتقلاً، أطلق سراح ١,٠٢٤ منهم بموجب قانون العفو.^(١٩٠)

ساند مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) تطوير نظام تعقب للقضاء الجنائي عُرف بمشروع الدمج العدلي في العراق. فبعد التغيير في المقاولين المنفذين، أعيد تنشيط المشروع. في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، بدأ ثلاثة موظفون العمل مع وزارة الداخلية لتبسيط المعلومات حول المعتقلين التي ستكون متوفرة أيضاً لمجلس القضاء الأعلى ولوزارة العدل لأجل تحسين التنسيق بالنسبة لوضع المعتقلين.^(١٩١)

توسيع قضايا قانون العفو

بحلول ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، ذكر مجلس القضاء الأعلى ان ١٥١,٢١٩ قضية عرضت أمام المحاكم نتيجة قانون العفو الصادر في شباط/فبراير. وقد اعتبر قرابة ١٢٢,٠٠٠ معتقل مؤهلين للعفو.^(١٩٢)

أكبر مُعدل زيادة في القضايا المؤهلة تتعلق بالفارين، إذ ارتفع هذا المعدل أكثر من ٣٢ بالمئة بين ربع السنة الأول والثاني من سنة ٢٠٠٨.^(١٩٣) لاحظت وزارة الخارجية ان هيئات العفو تركز على مراجعة وحل تلك القضايا التي لا يكون أفرادها معتقلين (أو تكون أماكن وجودهم غير معروفة).^(١٩٤) لرؤية معدلات التغيير بين ربع السنة الآخر للقضايا القانونية المؤهلة للعفو، انظر الجدول ٢-٢٧.

وفقاً لمجلس القضاء الأعلى، منح العفو لقرابة ٨٠ بالمئة من تلك القضايا.^(١٩٥) لكن الملحق العدلي ذكر ان عدد المطلق سراحهم الفعلي غير واضح. فالتأخير الإداري، وغيوب قاعدة البيانات وغياب التنسيق بين مجلس القضاء الأعلى، ووزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة العدل، ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية، تحول أحياناً كثيرة دون تنفيذ أوامر إطلاق السراح.^(١٩٦) غير ان مكتب رئيس الوزراء ووزير حقوق الإنسان يعملان لتحسين التزام بين الوزارات المنفذة وبين الكيانات الحكومية الأخرى.^(١٩٧)

معالجة السجون المزدحمة ومرافق الاعتقال

بتاريخ ٨ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، كان هناك ٣١,٥٧٨ معتقلاً و ١٠,١٦٩ سجيناً في العراق.^(١٩٨) الازدحام في السجون وعدد المعتقلين الكبير نسبياً يضغطان ليس فقط على المحاكم بل أيضاً على أنظمة الاعتقال. أما سوء معاملة المعتقلين والسجناء فيزيد أيضاً من التحديات التي تواجه نظام العدل الجنائي في العراق. تحاول الولايات المتحدة تخفيف بعض هذا الضغط عن طريق تدريب موظفي الخدمة الإصلاحية وبناء سجون جديدة. تمول الولايات المتحدة إنشاء ستة سجون تقدر قيمتها ب ٨٩,٥ مليون دولار. تتمكن هذه المرافق مجتمعة من استيعاب ٨,٠٨٩ سجيناً ومحتجزاً.^(٢٠٠) للحصول على نظرة إجمالية حول هذه المرافق، انظر الجدول ٢-٢٨.

الجدول ٢-٢٨
إنشاء السجون

السجن	القيمة (بملايين الدولارات)	المكان	التاريخ المقدر للانجاز	قدرة الاستيعاب المقدرة	الوضعية
سجن البصرة المركزي	\$٩,٤	البصرة	٢٠٠٩/٩	١٥٠٠ سرير	مُنح العقد في ٢٠٠٨/٨/١٠. صدر إشعار جزئي في ٢٠٠٨/٨/٢٩ للبدء بأعمال التصميم وإصلاح الجدار المحيط المتضرر. احتلت وحدة من الشرطة الوطنية المرفق لأغراض أبواء الجنود بين أواخر صيف ٢٠٠٧ ولغاية تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧، حيث توقفت كل الأعمال منذ ذلك الحين، أعيد النظر في بيان العمل وتم إعداد تقدير حكومي مستقل جديد.
سجن شمشال	\$٣٢	السليمانية	٢٠٠٩/٢	٣٠٠٠ سرير	منجز بنسبة ٥٢ بالمئة بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٧، بسبب التأخيرات لرداءة الطقس، منح تمديد لمدة ٢٣ يوماً من قبل فرقة منطقة لخليج الشمالية.
حصن سوز، المرحلة الأولى	\$٦,٥	السليمانية	٢٠٠٩/٤	٦٨٩ سرير	منجز بنسبة ٤٢ بالمئة بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٧. أدت مراجعة التعديل نسبة ٣٠ بالمئة لعقد التصميم من قبل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي (USACE) تمديداً لمدة ٨٠ يوم. أعطى المقاول مزيداً من الأيام بسبب التأخيرات لرداءة الطقس بما في ذلك حظر التجول الذي كانت تفرضه السلطات المحلية.
حصن سوز المرحلة الثانية	\$١١,٥	السليمانية	٢٠٠٩/٨	١٠٠٠ سرير	منح العقد في ٢٠٠٨/٦/٨؛ اتفاقية الدعم مع مكتب شؤون المخدرات الدولية معلق.
سجن الناصرية المرحلة الثانية	\$٧,٣	ذي قار	٢٠٠٨/١	٤٠٠ سرير	منجز بنسبة ٤٥ بالمئة بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٣. تحول تاريخ الانجاز الأصلي من ٢٠٠٨/١١ إلى ٢٠٠٨/١٢ بعد ان نقل العمال من المرحلة الأولى للمساعدة في انجاز هذا المشروع في الوقت المحدد. أدى التعديل الإضافي للقعد بهدف تحسين مستوى محطة معالجة مياه المجاري الصحية إلى تأخير موعد الانجاز لغاية كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.
سجن الرمادي	\$٢٢,٨	الأنبار	يقرر لاحقاً	١٥٠٠ سرير	الخلافات حول ملكية الأرض وضعت المشروع في الانتظار.

ملاحظة: احتسبت قيمة سجن البصرة المركزي عن طريق إضافة ٦,٥ بالمئة و ٧,٥ بالمئة احتياطي طوارئ، إلى المبلغ الفعلي للعقد الممنوح. استند التقرير الأخير إلى تعديل حكومي مستقل.
المصدر: مكتب شؤون المخدرات الدولي استجابة لطلب المفتش العام لليبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣ و ٢٠٠٨/١٠/١٥.


البنية التحتية

التزمت الولايات المتحدة قرابة ١١,٠١ مليار دولار وأنفقت قرابة ١٠,٢٧ مليار^(١٩٩) لمعالجة الحاجات الماسة للبنية التحتية في العراق، في قطاعات إعادة الإعمار التالية:

- النفط والغاز
- الكهرباء
- المياه
- العناية الصحية
- النقل والاتصالات

بالنسبة لوضع التمويل الأميركي عبر مشاريع وبرامج البنية التحتية، انظر الشكل ١٤-٢ وبالنسبة للتوزيع حسب القطاعات، انظر الشكل ١٥-٢.


الشكل ١٤-٢
وضع التمويل الأميركي للبنية التحتية
(بمليارات الدولارات)



ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. بالنسبة لمنهجية كيفية جمع البرامج الأميركية في فئات (الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد والحكم)، انظر الملحق (د). الالتزامات والإنفاقات حسب فئات المقتش العام قد تختلف عن الإلتزامات والإنفاقات الواردة في ملخص التمويل الأميركي. لم يتلق مكتب المقتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من كافة الوكالات، كما أن بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق. تشمل الأرقام فقط تمويل صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISSF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تكاليف صندوق دعم الاقتصاد (ESF) التي بحاجة للإكمال، ٢٠٠٨/٩/٣٠، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٨/١٠/١

الشكل ١٥-٢
الالتزامات الأميركية للبنية التحتية، حسب القطاع

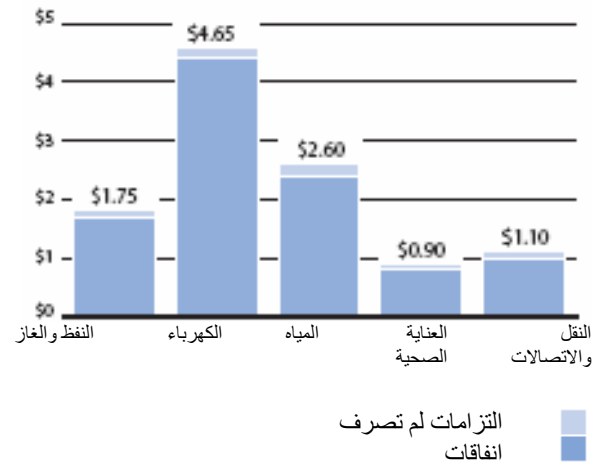

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. بالنسبة لمنهجية كيفية جمع البرامج الأميركية في فئات (الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد والحكم)، انظر الملحق (د). الالتزامات والإنفاقات حسب فئات المقتش العام قد تختلف عن الإلتزامات والإنفاقات الواردة في ملخص التمويل الأميركي. لم يتلق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من كافة الوكالات، كما أن بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق. تشمل الأرقام فقط تمويل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISSF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تكاليف صندوق دعم الاقتصاد (ESF) التي بحاجة للإكمال، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٨/٩/٣٠، ٢٠٠٨/١٠/١.

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كان نسبة ٩٤ بالمئة تقريباً من مخصصات صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني قد أنفقت^(٢٠٠). تحول تركيز الدعم الأميركي المتبقي لإعادة إعمار البنية التحتية من المشاريع الكبرى إلى مشاريع إعادة البناء والإصلاح الصغيرة الحجم، وكذلك إلى المساعدات الفنية المحددة الأهداف جيداً. في بداية سنة ٢٠٠٨، أعادت السفارة الأميركية رصف الأموال المتبقية في صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق للتركيز على الاقتصاد، والحكم وجهود تطوير القدرات، مؤشرة إلى نهاية المشاريع الإنشائية الجديدة الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق^(٢٠١).

النفط والغاز

التزمت الولايات المتحدة بأكثر من ١,٧٥ مليار دولار وأنفقت قرابة ١,٦٩ مليار دولار في قطاع النفط والغاز^(٢٠٢).

بالنسبة لسنة ٢٠٠٨، خصصت الحكومة العراقية، مليار دولار لوزارة النفط للمشاريع الرأسمالية. بتاريخ حزيران/يونيو ٢٠٠٨^(٢٠٣)، تلقت الوزارة أكثر من ٤٨٢ مليون دولار من هذا المبلغ وأنفقت منه ٤١٠ مليون دولار^(٢٠٤). في الأموال العراقية التكميلية لسنة ٢٠٠٨، المصدقة في آب/أغسطس، خصصت الحكومة العراقية ٢٦٠ مليون دولار إضافية لوزارة النفط^(٢٠٥).

إنتاج وصادرات النفط

سجل إنتاج النفط الخام خلال ربع السنة هذا رقماً قياسياً لما بعد الحرب، مع متوسط ٢,٤٧ مليون برميل في اليوم^(٢٠٦)، أي بزيادة ٢٦ بالمئة عن الرقم المذكور خلال ربع السنة الأخير، و١٨ بالمئة ارتفاع بالنسبة لنفس ربع السنة من العام الماضي^(٢٠٧).

بلغ متوسط صادرات النفط الخام ١,٧٣ مليون برميل في اليوم، مع تراجع بنسبة ٨ بالمئة بالنسبة لربع السنة الأخير، وزيادة ٢ بالمئة بالنسبة لنفس ربع السنة من العام الماضي.^(٢٠٨) تراجع الصادرات مؤخراً ينسب إلى عاملين على الأقل:

الشمال: في مطلع أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، تحدثت شركة نفط الشمال عن انقطاع في خط التصدير الرئيسي إلى جيهان، نتج عنه توقف في صادرات النفط إلى الشمال لمدة أسبوع تقريباً إلى حين انجاز الإصلاحات في منتصف الشهر.

الجنوب: الطقس الرديء أحرّ أدى إلى تأخير التحميل في محطة النفط في البصرة.^(٢٠٩)

إن متوسط صادرات السنة لتاريخه البالغ ١,٨٦ مليون برميل في اليوم هو أدنى قليلاً من هدف ١,٩ مليون برميل في اليوم الذي حددته وزارة النفط.^(٢١٠)

أسعار وعائدات النفط

بلغت عائدات النفط في العراق سنة ٢٠٠٨، ٥٥,٤ مليار دولار^(٢١١). يتوقع مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) تتراوح عائدات النفط سنة ٢٠٠٨ بين ٦٦,٥ و ٧٩,٢ مليار دولار، لكن أسعار النفط قد هبطت بصورة قوية من مستوياتها القياسية التي بلغت في أواسط ٢٠٠٨.^(٢١٢) لذلك، فإن الدخل السنوي العراقي من النفط سوف يستقر على الأرجح عند المستوى الأدنى. لقد كان متوسط سعر نفط كركوك الخام، خلال ربع السنة هذا، ١١٣ دولار للبرميل، لكن المتوسط الأسبوعي في ١٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨ هبط تحت ٨٢ دولار.^(٢١٣)






في خطتها الإستراتيجية للأعوام ٢٠٠٩-٢٠١١، احتسبت الحكومة العراقية أسعار الصادرات ب ٨٠ دولار للبرميل سنة ٢٠٠٩، و ٨٥ دولار سنة ٢٠١٠ و ٩٠ دولار سنة ٢٠١١.^(٢١٤) بالنسبة لمخصص للميول الأخيرة لإنتاج النفط العراقي الخام وللصادرات، انظر الجدول ٢-١٩.

المحروقات المكررة

تواصل الحكومة العراقية الكفاح من أجل تلبية الطلب الداخلي في البلاد على المحروقات المكررة. مثلاً، المتوسط اليومي لإمداد المحروقات المكررة للأسبوع المنتهي في ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كان:^(٢١٥)

- ٤١ بالمئة تحت المستويات المستهدفة بالنسبة للبنزين
- ٢٩ بالمئة تحت المستويات المستهدفة بالنسبة للمازوت
- ٢٨ بالمئة تحت المستويات المستهدفة بالنسبة للكاز
- ٨ بالمئة تحت المستويات المستهدفة بالنسبة لغاز النفط المسيل.

الجدول ٢-٢٩
إنتاج وصادرات وأسعار وعائدات النفط الخام

ميول المتوسطات الشهرية	التغيير بالنسبة لنفس ربيع السنة العاام الماضي	المتوسط ربيع السنوي ٢٠٠٨/٩/٣٠/٢٠٠٨/٧/١	
	١٩ بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) ٢,٥٠ مليون برميل في اليوم	الإنتاج ^(١)
	١٨ بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA) ٢,٤٧ مليون برميل	
	٣ بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) ١,٨٣ مليون برميل في اليوم	الصادرات ^(١)
	٢ بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى (NEA) ١,٧٣ مليون برميل	
	٥٤ بالمئة	١٠٨,٢٠/البرميل (خفيف البصرة)	الأسعار التي تلقاها العراق من النفط ^(ب)
	٥٩ بالمئة	١١٣,٠٣/البرميل (خام كركوك)	
	٥٤ بالمئة	١٧,٦ مليار دولار	عائدات النفط المتراكمة ٢٠٠٧-٢٠٠٨ ^(ج)

ملاحظات: الأرقام تتأثر بالتدوير..

- (أ) تاريخياً، استند مكتب المفتش العام لتحديد ميول الصادرات والإنتاج على معلومات جمعها من مكتب المساعدة الانتقالية للعراق. المتوسطات ربيع السنوية المتغيرة للإنتاج والصادرات ذكرتها وزارة الخارجية ومكتب شؤون الشرق الأدنى-العراق (NEA-I). خلال ربيع السنة هذا، استخدم المفتش العام أرقاماً تاريخية قدمتها السفارة الأميركية لخلق ثلاثة خطوط للميول.
- (ب) متوسطات السعر ربيع السنوية قدمها مكتب شؤون الشرق الأدنى-العراق، غير ان خط الميل أنشئ من بيانات مكتب المساعدة الانتقالية للعراق التي تشمل أسعار خفيف البصرة وخام كركوك خلال ٢٠٠٨/٩/٥.
- (ج) خط الميل هو لعائدات النفط التراكمية منذ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٧. المتوسط ربيع السنوي لعائدات النفط قدمه مكتب شؤون الشرق الأدنى-العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤. غير ان الأرقام التاريخية المستخدمة لخلق خط الميل التي جمعت من تقارير وضعية العراق الأسبوعية لوزارة الخارجية، تقارن جيداً بأرقام ايصالات النفط لدى بنك العراق المركزي (CBI). تظهر بيانات وزارة المالية الأميركية ٤٦,٦ مليون دولار في ايصالات لبنك العراق المركزي لغاية آب/أغسطس ٢٠٠٨. لاحظت تقارير وضعية العراق الأسبوعية الصادرة عن وزارة الخارجية في ٢٧/٨/٢٠٠٨ تقديرات لعائدات النفط يبلغ ٤٨,٢ مليار دولار.

المصادر: السفارة الأميركية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٧/١/٣١، ٢٠٠٧/٢/٢٨، ٢٠٠٧/٣/٢٨، ٢٠٠٧/٤/٢٥، ٢٠٠٧/٥/٣٠، ٢٠٠٧/٦/٢٧، ٢٠٠٧/٧/١١، ٢٠٠٧/٨/٢٩، ٢٠٠٧/٩/٢٦، ٢٠٠٧/١٠/٣١، ٢٠٠٧/١١/٢٨، ٢٠٠٧/١٢/١٢، ٢٠٠٨/١/٣ و ٢٠٠٨/١/١٦؛ مكتب الشرق الأدنى-العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

تواصل البلاد الاعتماد بقوة على الواردات لتلبية بعض الطلب. وقد تمّ استيراد قرابة ٦٣ بالمئة من الإمداد المستهدف لغاز البترول المسيل^(٢١٦). خلال ربع السنة هذا، ازداد المتوسط اليومي لاستيراد غاز البترول المسيل ٢٨٠ بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة نفسه من العام الماضي^(٢١٧). بالنسبة لمخصص الإنتاج وصادرات المحروقات المكررة، انظر الجدول ٢-٣٠.

إقبال القطاع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

خلال ربع السنة هذا، أعلنت فرقة منطقة الخليج إقبال برنامجها النفطي^(٢١٩) الذي انفق ١,٧ مليار دولار على مشاريع مولها صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني^(٢٢٠) وعلى الرغم من ان معظم المشاريع ا لبالغ عددها ١٨٤ باتت منجزة مادياً، فان القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان لا تزال تقوم بإقبال أشغال العقد^(٢٢١).

ذكرت فرقة منطقة الخليج، عبر هذه المشاريع، أنها حققت أهدافها زيادة طاقة إنتاج النفط الخام إلى ٣ ملايين برميل في اليوم^(٢٢٢). كان مستوى الطاقة اليومية لإنتاج النفط الخام قبل الحرب ٢,٨ مليون برميل في اليوم^(٢٢٣). وأنتجت مشاريع فرقة منطقة الخليج أيضاً قدرات إنتاج متزايدة لغاز البترول المسيل لغاية ٣٠٠٠ طن متري في اليوم كما رفعت إنتاج الغاز الطبيعي إلى ٨٠٠ قدم قياسي مكعب في اليوم.

تواصل الجهود الأميركية في قطاع النفط والغاز عبر تمويل صندوق دعم الاقتصاد^(٢٢٤) للحصول على ملخصات المشاريع المنجزة والتي قيد التنفيذ الممولة من كل من صندوق دعم الاقتصاد وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. كما هو وارد في نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، انظر الجدول ٢-٣١.

مناطق الحظر حول أنابيب النفط الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF)

إن برنامج حماية أمن البنية التحتية (ISP) الممول من صندوق دعم الاقتصاد، مبادرة أساسية في قطاع النفط. أدت مشاريع مناطق الحظر حول أنابيب النفط (PEZ) المنفذة عبر البرنامج إلى خفض المنع وتحسين الاعتماد على تسليم منتجات النفط الخام والبترول. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كان قد تم إنفاق حوالي ١٢٩ مليون دولار من برنامج حماية امن البنية التحتية^(٢٢٥).

قدّمت فرقة منطقة الخليج تحديثاً خلال ربع السنة هذا حول ثلاث مراحل من برنامج مناطق الحظر حول أنابيب النفط^(٢٢٦):

من بييجي إلى بغداد (١٥٦ كلم): أنجزت فرقة منقطة الخليج ٥٠ بالمئة من المكون الأميركي للمشروع لكن الأشغال توقفت على قسم الحكومة العراقية بسبب قضايا تعاقدية مع وزارة الدفاع. كان برنامج مناطق الحظر حول أنابيب النفط قد خصص له ٤١,٥ مليون دولار من صندوق دعم الاقتصاد. كان تاريخ الانجاز الأصلي مقرراً في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨.

من كركوك إلى بييجي (٦٩ كلم): القسم الأميركي من المشروع الممول بمبلغ ٣٢,٥ مليون دولار أصبح الآن منجزاً. أظهر تفتيش هذا المشروع من قبل مكتب المفتش العام خلال ربع السنة الأخير نجاح المشروع. توقفت الأشغال على القسم العراقي للمشروع الممولة ب ١٣,٥ مليون دولار من الحكومة العراقية. كان في المبرمج أن يُنجز المشروع في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كما انه لم يؤت على ذكر تاريخ معدّل.

من الدورة إلى الحلة (٤١ كلم): الأشغال الأميركية على هذا المشروع (١٣,١ مليون دولار) منجزة بنسبة ٩٧ بالمئة. مساهمة الحكومة العراقية، المدعومة بمبلغ ٥,٦ مليون دولار من وزارة الداخلية، لا تزال في مرحلة التخطيط دون تاريخ مقدر للمباشرة.

الجدول ٣٠-٢
الميول ربع السنوية- واردات وإنتاج المحروقات المكررة

التغيير بالنسبة لنفس ربع السنة الماضي	المتوسط ربع السنوي ٠٨/٩/٣٠-٠٨/٧/١	التغيير بالنسبة لنفس ربع السنة من العام الماضي	المتوسط ربع السنوي ٠٨/٩/٣٠-٠٨/٧/١	
٢٦٩+ بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: ٣,٦٧٧ مليون برميل في اليوم	٦٤+ بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: ٢,٤٧٨ مليون برميل في اليوم	غاز البترول المسيل
٢٨٠+ بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى: ٣,٧٩١ مليون برميل باليوم	٧٦+ بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى: ٢,٦٦٤ مليون برميل باليوم	
٥- بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: ٥٢٧ مليون برميل في اليوم	٩٠+ بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: ١٠,٦٥٠ مليون برميل في اليوم	الكاز
٢+ بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى: ٤٧٩ مليون برميل باليوم	١١٠+ بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى: ٨,٢٨٠ مليون برميل باليوم	
١٢+ بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: ٤,٦٥١ مليون برميل في اليوم	٩٣+ بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: ٧,٥٩٨ مليون برميل في اليوم	البنزين
١٩- بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى: ٣,٨٢٩ مليون برميل باليوم	١٠+ بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى: ٨,٤٨٥ مليون برميل باليوم	
٣١+ بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: ١,٧٨٩ مليون برميل في اليوم	٩٦+ بالمئة	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق: ١٦,٢٧٣ مليون برميل في اليوم	الكاز
٣١+ بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى: ١,٧٧٩ مليون برميل باليوم	١٠٥+ بالمئة	مكتب شؤون الشرق الأدنى: ١٧,٠١٥ مليون برميل باليوم	

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصدر: السفارة الأميركية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام لليبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨، مكتب شؤون الشرق الأدنى-
العراق، استجابة لطلب المفتش العام لليبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٨.

الجدول ٣١-٢
وضعية مشاريع النفط والغاز الأميركية

المشاريع المنجزة	قيمة المشاريع المنجزة	مشاريع قيد التنفيذ	قيمة المشاريع قيد التنفيذ	
بناء القدرات	\$ ٤٨٠,٤٣٩,٠٠٢	٠	\$ ٠	٣٠٥
مكرسة للطاقة	\$ ٣٦,١٩٧,٧٧٤	٠	\$ ٠	٧
أمن البنية التحتية ^(أ)	\$ ١٧٢,٢٨٨,١٧٢	١٤	\$ ٨٥,١٧٤,٦٨٣	٤١
محطة الرحاب لغاز البترول المسيل والغاز الطبيعي المسيل	\$ ١٥١,٥٥٠,٢٥٢	٠	\$ ٠	٨
مرافق مختلفة ^(ب)	\$ ٩٣٢,٣١٤,٠٩٤	٤	\$ ٧٨,٦٨٩,٠٥٤	١٤٧
إعادة تزويد مخزون قطع الغيار	\$ ٣٣٠,٧٣٦	٠	\$ ٠	٧
التخزين/التوزيع	\$ ١١,٢١٣	٠	\$ ٠	١
مساندة الاستدامة (التشغيل والصيانة)	\$ ١٢٤,٨١٩,١٦٤	٠	\$ ٠	٣
حقن محطات الضخ بالمياه	\$ ٣٤,٦٠٥,٧٥٩	٠	\$ ٠	٣٠
المجموع	\$ ١,٩٣٢,٥٥٦,١٦٧	١٨	\$ ١٦٣,٨٦٣,٧٣٧	٥٤٩

ملاحظة: تستند هذه اللائحة لقيم مشاريع إعادة الإعمار قائمة على معلومات قدمها نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS). ذكر المفتش العام ان بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ليست دقيقة أو كاملة تماماً. لذلك، فان إجمالي المشاريع قد لا يتوافق مع الالتزامات والإنفاقات المقدمة من الوكالات. هذا الجدول يشمل قيمة المشاريع وليس الالتزامات أو الإنفاقات.

- (أ) هذه الفئة تشمل مشاريع إضافية علاوة على مشاريع برنامج حماية امن البنية التحتية. مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) و برنامج حماية أمن البنية التحتية (ISP) ذكرا أن هناك ٥٢ مشروعاً منجزاً في مجال البنية التحتية بقيمة ٧٤,٢ مليون دولار. مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) و برنامج حماية أمن البنية التحتية (ISP)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٨.
- (ب) كافة المشاريع باستثناء مشروع واحد ممولة من صندوق دعم الاقتصاد. بتاريخ الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، ذكر نظام إدارة إعادة إعمار العراق مشروعاً واحداً لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بقيمة ٥٨,٠٣٦,٥٤٤ دولار. هذا المشروع مُدرج في الجدول تحت عنوان "مرافق مختلفة" بتاريخ ٤/٨/٢٠٠٨، ذكرت فرقة منطقة الخليج أن أمري مهمة إداريين منحا لإقفال النشاطات النهائية.
- (ج) المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، الملف النهائي لدى مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، ١/١٠/٢٠٠٨.

مشروع صادرات الجنوب الزائدة عن الحاجة/النقطة الوحيدة لمراسي السفن تساعد الولايات المتحدة وزارة النفط في أكبر وأهم مشروع فردي يتعلق بالاقتصاد الوطني في العراق، وفقاً لفرقة منطقة الخليج.^(٢٢٧) مع تمويل مؤمن بصورة رئيسية من الحكومة العراقية، بدأ العمل في مشروع صادرات الجنوب الزائدة عن الحاجة/مراسي السفن، وقيمتها ٥ مليارات دولار، في آب/أغسطس ٢٠٠٧. سوف يقدم المشروع خطوط أنابيب جديدة تحت البحر في الخليج الشمالي الذي يمتد من الشاطئ إلى محطات ثابتة ومراسي السفن. الأشغال على الشاطئ الواحد سوف تتكون من خزانات وخطوط أنابيب ومضخات ومعدات مراقبة. وهذه هي مرحلتنا المشروع:^(٢٢٨)

- سوف تؤمن المرحلة الأولى طاقة زائدة لطاقة التصدير القائمة البالغة ١,٦ مليون برميل في اليوم.
- المرحلة الثانية سوف تمكن وزارة النفط من زيادة طاقة التصدير في جنوب العراق إلى ٤,٥ مليون برميل في اليوم.

الكهرباء

التزمت الولايات المتحدة بمبلغ ٤,٦٥ مليار دولار وأنفقت قرابة ٤,٤٢ مليار لقطاع الكهرباء في العراق.

سنة ٢٠٠٨، خصصت الحكومة العراقية ١,٣ مليار دولار لمشاريع الكهرباء الرأسمالية. بتاريخ حزيران/يونيو ٢٠٠٨، كان قد تم تحرير ٧٠٨ مليون دولار من هذا المبلغ للوزارة التي أنفقت حوالي ٢٢٩ مليون دولار.^(٢٢٩) في الموازنة التكميلية للحكومة العراقية لسنة ٢٠٠٨. الممددة في آب/أغسطس^(٢٣٠)، قدمت الحكومة العراقية ١,٠٣ مليار دولار إضافية إلى وزارة الكهرباء.^(٢٣١)

إنتاج قياسي

متوسط التوليد اليومي للكهرباء سجل رقماً قياسياً لما بعد الحرب خلال ربع السنة هذا مع متوسط ٤,٩١٩ ميغا واط في اليوم، بما في ذلك متوسط يومي من ٣١٩ ميغا واط مستورد. كان هذا المتوسط أعلى بنسبة ١٢ بالمائة من ربع السنة الأخير و٨ بالمائة أعلى من ربع السنة نفسه العام الماضي.^(٢٣٢)

على الرغم من هذه المكاسب في إنتاج الكهرباء، تواصلت الحكومة العراقية الكفاح لأجل تلبية الطلب المتزايد.^(٢٣٣) فاستخدام السلع الاستهلاكية الالكترونية مثل الكمبيوترات والبرادات ووحدات تكييف الهواء، قد ازداد بصورة كبيرة منذ ٢٠٠٣ دافعاً إلى الأعلى الطلب على الكهرباء.^(٢٣٤)

متوسط طاقة الإنتاج لمحطات التوليد في العراق لإنتاج الكهرباء مع الوقت قياس مفيد لمعرفة كيفية استخدام الزبائن للطاقة. خلال ربع السنة هذا، بلغ معدل الإنتاج ١١٧,٨٤٩ ميغا واط/ساعة في اليوم، بزيادة ١٢ بالمائة عما كان عليه خلال ربع السنة الأخير و٨ بالمائة بالنسبة لربع السنة نفسه العام الماضي.^(٢٣٥) في ٨ آب/أغسطس ٢٠٠٨، بلغ الإنتاج ١٢٧,٥١١ ميغا واط/ساعة، وهو رقم قياسي جديد لإنتاج يوم واحد.^(٢٣٦) ذكرت السفارة الأميركية ان الشبكة العراقية أنتجت حوالي ٩٠٠,٠٠٠ ميغا واط في اليوم قبل الحرب.^(٢٣٧) بالنسبة لأحدث المعلومات حول الإنتاج والطلب على الكهرباء في العراق، وكذلك حول قدرات الشبكة العراقية، انظر الشكل ٢-١٦.





قدرة توليد الطاقة

طاقة التوليد المعقولة الأخيرة للعراقيين هي حوالي ٩,٦٠٠ ميغا واط.^(٢٣٨) الهوة بين القدرات والإنتاج تنجم عن ممارسات الصيانة الرديئة، واستخدام المحروقات من نوعية غير ممتازة، والافتقار إلى توزيع مناسب للمحروقات والإمدادات غير الكافية للمياه.^(٢٣٩)

طلبت وزارة النفط مؤخراً مساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لجمع الغاز المنذلع من حقل نفط الزبير في البصرة. أنجزت وزارة النفط إنشاء محطة لجمع الغاز سنة ٢٠٠٣ لكن القضايا الأمنية حالت دون مباشرة المحطة عملها. سوف تساعد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في بدء تشغيل المحطة التي سوف تلتقط ما يكفي من الغاز لتوليد مليار دولار كعائدات سنوية وتزيد من قدرات الشبكة العراقية ٣,٥٠٠ ميغا واط.^(٢٤٠)

أعلنت وزارة الكهرباء خلال ربع السنة هذا أنها وقعت اتفاقات يبلغ مجموعها ٨ مليار دولار مع عدة شركات غربية لبناء محطات توليد بغية زيادة ١١,٠٠٠ ميغا واط من القدرات على شبكة الكهرباء العراقية. منحت الوزارة أكبر عقد إلى شركة جنرال إلكتريك لبناء محطات قادرة على إنتاج ٦,٨٠٠ ميغا واط.^(٢٤١)

الشكل ١٦-٢
إنتاج الكهرباء، الطلب والقدرة

	ميول المتوسطات الشهرية	التغيير بالنسبة لنفس ربع السنة العام الماضي	المتوسط ربع السنوي /٩/٣٠/٠٨/٧/١	
			٠٨	
	١٢٠,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠ ٨٠,٠٠٠	٨ بالمئة ↑	١١٧,٨٤٩	الإنتاج مع الوقت ميغا واط/ساعة
	٢٥٠,٠٠٠ ١٧٥,٠٠٠ ١٠٠,٠٠٠	٧ بالمئة ↑	٢٠٩,٤٨٣	الطلب (ميغا واط/ساعة)
	١٠٠,٠٠٠ ٩٠,٠٠٠ ٨,٠٠٠	١٢ بالمئة ↑	٩,٨٣٤	طاقة الإنتاج المعقولة (ميغا واط)
	٥٠,٠٠٠ ٤٠,٠٠٠ ٣٠,٠٠٠	٨ بالمئة ↑	٤,٩١٩	متوسط الإنتاج اليومي (ميغا واط)

ملاحظات: الأرقام تتأثر بالتدوير

المصدر: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير نظام إدارة وإعادة إعمار العراق عن الأداء اليومي للوحدات الكهربائية، ٢٠٠٦/٧/١-٢٠٠٨/٩/٣٠.

البرامج الأميركية للتشغيل والصيانة ومساندة الاستدامة

محطات الطاقة المدعومة من البرنامج الأميركي للعمليات والصيانة والاستدامة (OMS) دعمت تعرضت لعدد أقل من الانقطاعات سنة ٢٠٠٨ بمتوسط شهري من ١٧ بالمئة^(٢٤٢) يشمل البرنامج الأميركي للعمليات والصيانة ومساندة الاستدامة ٩٥ مشروع في قطاعات الكهرباء والعناية الصحية والنقل والمواصلات والمياه. تلقت مشاريع الكهرباء أكثر من ٨٠ بالمئة من إجمالي التزامات البرنامج البالغ ٢٧٥ مليون دولار. من أصل الـ ٢٢٢ مليون دولار الملزمة لمشاريع الكهرباء التابعة للبرنامج، تم إنفاق قرابة ١٩٨ مليون دولار^(٢٤٤).

خلال ربع السنة الأخير، تحدث تقرير المفتش العام عن الخلاصة المتعلقة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ للدعم الأميركي للبرنامج الأميركي للعمليات والصيانة ومساندة الاستدامة لمساعدة وزارة الكهرباء. وذكرت السفارة الأميركية خلال ربع السنة هذا ان الوزارة حصلت على ترخيص من مجلس الوزراء لتحمل مسؤولية عقد البرنامج^(٢٤٥) أحكام وشروط وسعر العقد مع البائع الحالي قيد التفاوض. التمويل الأميركي لهذا البرنامج من المقرر ان ينتهي دون شروط في أواسط تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨.

مشاريع الكهرباء التابعة لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

أضاف حوالي ٥٥٠ مشروعاً لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بقيمة ٤,٣ مليار دولار، حوالي ٢,٥٠٠ ميغا واط إلى الشبكة العراقية، بزيادة ٤٠ بالمئة إلى الطاقة الإجمالية^(٢٤٦) بالنسبة لنظرة إجمالية حول مشاريع فرقة منطقة الخليج المنجزة وقيد التنفيذ لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2) في قطاع الكهرباء، انظر الجدول ٢-٣٢. بالنسبة للمقاييس والأهداف التي حددتها فرقة منقطة الخليج، انظر الجدول ٢-٣٣.

أنجزت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) برنامجها البالغة قيمته ٢,٣ مليار دولار التابع لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق في قطاع الكهرباء سنة ٢٠٠٦. فوفقاً للوكالة الأميركية للتنمية الدولية، زاد ٤٢ مشروع توليد القدرات على الشبكة في العراق كما ان ٢٥ مشروع أعادت تأهيل محطات التوزيع الفرعية. دربت الوكالة أيضا ٢٤٠ مسؤول من وزارة الكهرباء ومدراء محطات ومهندسين حول تشغيل وصيانة محطات الطاقة^(٢٤٧).

الجهود الأميركية الجارية

يوصل مدراء إعادة الإعمار الأميركيون المشاريع في قطاع الكهرباء عبر آليات تمويل. مثلاً، منحت فرقة منطقة الخليج خلال ربع السنة هذا عقداً بقيمة ٦,٥ مليون دولار لرفع درجة نظام توزيع الكهرباء لوزارة الداخلية. تمويل صندوق قوات الأمن العراقية سوف يدعم هذه الجهود^(٢٤٨) الجدول ٢-٣٤ يقدم وضعية المشاريع الأميركية في هذا القطاع.

الجدول ٢-٣٢

مشاريع الكهرباء قيد التنفيذ لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق

المشاريع	تاريخ الإقفال المقدر	إجمالي قيمة المشاريع قيد التنفيذ	المشاريع قيد التنفيذ	إجمالي قيمة المشاريع المنجزة	
توسعة محطة الطاقة في قدس: ١٧٦,٨ مليون دولار. الوضعية: لا يزال المقاول متأخر عن البرنامج وقد لا ينجز الأشغال في نهاية ٢٠٠٨	غير معروف	٤٣٠,٣ مليون دولار	٩	٣٤٣,٠ مليون دولار	التوليد
محطة غماس الفرعية (هبة مع الحكومة العراقية): ١٤٢,٧ مليون دولار. الوضعية: المشروع منجز بنسبة ٨٥ بالمئة كما أن الأشغال المدنية منجزة بنسبة ٤٥ بالمئة، الحفريات لأساسات المعدات جارية. تاريخ الانجاز المقدر ٢٠٠٩/٣/٣١	٢٠٠٩/٣/٣١	٢٣٢,٨ مليون دولار	١٧	٦٢٧,٢ مليون دولار	النقل
محطة بحريز الفرعية ١١/٣٣ كيلو فولت: ٣,٦ مليون دولار. الوضعية: تعديل حجم المنشآت الكهربائية قد أنجز كما ان إنجاز الأشغال المدنية المتبقية مقدر في ٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨/٩/٣٠	١٢,٢ مليون دولار	٣	٦٨٩,٨ مليون دولار	التوزيع

ملاحظة: إحصائيات مشروع التوليد قيد التنفيذ تشمل تلك الممولة من قبل صندوق دعم الاقتصاد.

المصدر: فرقة منطقة الخليج Bi-weekly Directorate SITREP، ٢٠٠٨/٨/٤، ص ٤-٣، Monthly Directorate SITREP، ٢٠٠٨/٨/٣١.

المياه

التزمت الولايات المتحدة بمبلغ ٢,٦٠ مليار دولار وأنفقت حوالي ٢,٣٨ مليار دولار في قطاع المياه منذ ٢٠٠٣.^(٢٤٩)

سنة ٢٠٠٨، خصصت الحكومة العراقية ٣٧٥ مليون دولار للمشاريع الرأسمالية في موازنتها الأصلية لسنة ٢٠٠٨. بتاريخ حزيران/يونيو كان قد حرر ٣٢٧ مليون دولار من هذا المبلغ للوزارة التي أنفقت حوالي ١١٢ مليون دولار.^(٢٥٠) في الأموال التكميلية الممددة في آب/أغسطس ٢٠٠٨^(٢٥١)، خصصت الحكومة العراقية في الموازنة ٢٤١ مليون دولار إضافية لوزارة الموارد المائية.^(٢٥٢) منحت الحكومة العراقية مؤخراً مناقصة لمجموعة فرنسية-عراقية لمشروع مياه بقيمة مليار دولار سوف ينجز في الرصافة على مدى الأشهر ٢٨ القادمة.^(٢٥٣) يخطط المشروع لإعادة تشغيل إمدادات المياه في بغداد الشرقية.^(٢٥٤)

مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق أعادت تأهيل أو أضافت القدرات لمعالجة ٢,٢٥ مليون متر مكعب من المياه في اليوم التي تخدم ٨ ملايين عراقي.^(٢٥٥) حوالي ٥٨ بالمئة من العراقيين يشعرون ان بإمكانهم الحصول على مياه نظيفة للشرب على الأقل في بعض الأوقات.^(٢٥٦)

تلقت فرقة منطقة الخليج، بسبب إعادة برمجة الأموال سنة ٢٠٠٥، فقط نصف مبلغ ال ٢,٠٥ مليار دولار المخصص لها أصلاً من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لمشاريع في قطاع المياه.^(٢٥٧) ثمة مشاريع

فرقة منقطة الخليج بقيمة ٢٦٧ مليون دولار باقية قيد التنفيذ ومشاريع بقيمة ١٠ ملايين دولار لم تبدأ بعد.^(٢٥٨) بالنسبة لوضعية المشاريع قيد التنفيذ في قطاع المياه، انظر الجدول ٣٥-٢.

الجدول ٣٣-٢
برنامج الكهرباء لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق - مقاييس وأهداف فرقة منطقة الخليج

المقاييس	الأهداف الأميركية	المنجزة فعلاً
٠٨/٨/٣٠-٠٨/٨/١٧		
ما يساوي ساعات الطاقة في اليوم، في الدولة ^(١)	١٢-١٠ ساعة	١٢ ساعة
ما يساوي ساعات الطاقة في اليوم، في بغداد	١٢-١ ساعة	١١ ساعة
٢٣٢ كيلو فولت و ٤٠٠ كيلو فولت للمحطات الفرعية المنجزة	٤٣	٢٩
٣٣ كيلو فولت للمحطات الفرعية المنجزة	٨٩	٨٧

ملاحظة: المقاييس والأهداف كما ذكرتها فرقة منطقة الخليج.
(أ) لا تمثل الساعات الفعلية الواصلة إلى المنازل؛ تشمل الخدمات الأساسية التي تتلقى ٧/٢٤ ساعة كهرباء كما والحكومة والجامعات التي تتلقى ١٢ ساعة في اليوم.
المصدر: فرقة منطقة الخليج تقرير الحالة الأسبوعي، ٢٠٠٨/٨/٤، ص ٣-٤، فرقة منطقة الخليج تقرير الحالة الشهري، ٢٠٠٨/٨/٣١

الجدول ٣٤-٢
وضعية مشاريع الكهرباء الأميركية

المشـاريع المنجزة	قيمة المشاريع المنجزة	المشاريع قيد التنفيذ	قيمة المشاريع قيد التنفيذ
٢	\$٢,٠٥٦,٨٥٤	٢٠	١٦٣,١٤٨,٨٨٣
٦٩٩	١,٢٥٠,٥٢٧,٦٤٠	١	\$١٣٣,٧٠٧
٦٣٠	\$٢,٢٤١,٨٢٨,٨٤٨	١٤	\$٢١٤,٨٦٤,٨٢٧
٥	\$٤,٣٧٤,٧٤٣	١	\$١,٩٨٩,٢٣٨
١١	\$١٣٠,٨٤٥,٥٩٠	٢	\$٩,٩٢٣,٤٦٥
٥	\$٢,٦١٩,٦٤٨	٠	\$٠
١٨١	\$٣٤٠,٢٦٥,٧١٠	٢٣	\$٥٤,٠٤٠,١٩٣
٣٩٩	\$٩٩٤,٧٨٥,٩٨٤	١٤	\$١٧٠,٢٨٢,٩٦٩
٣٣٧	\$٥٨,٠٢٦,٣٧٧	١٠	\$٤,٩٩٨,٤٨٥
١٩٥	\$٣٨,٠٦١,١٤٧	١	\$٩٤٠,٠٨٢
٤٢	\$٥٨,١٢٤,٨٣٢	٢	\$١٨٤,٣١٧,٩٤٣
٩٤٠	\$٣٦٥,٢١٢,٨٠٤	٩٧	\$٦٦,٤١٥,٨٦١
٣,٤٤٦	\$٥,٤٨٦,٧٣٠,١٧٦	١٨٥	\$٨٧١,٠٥٥,٦٥٣

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. هذه اللائحة لمشاريع إعادة الإعمار تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة إعمار العراق. ذكر المفتش العام ان بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ليست دقيقة أو كاملة تماماً. لذلك فان إجمالي المشاريع قد لا يتوافق مع الالتزامات والإنفاقات التي قدمتها الوكالات. يشمل هذا الجدول قيمة المشاريع وليس الالتزامات والإنفاقات.

محطة تكرير المياه أر ٣ في مدينة الصدر

خلال ربع السنة هذا، أجرى مكتب المفتش العام تفتيشاً في محطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر ببغداد، المشروع الذي يهدف إلى تأمين ٤٠٠٠ متر مكعب في الساعة من مياه الشرب إلى حوالي ١٩٢،٠٠٠ مقيم في مدينة الصدر. عند الإنجاز، سوف تزيد محطة المعالجة الجديدة هذه الوصول إلى الماء من ٤٦ لتر للفرد إلى ٢٠٠ لتر – أي بزيادة أكثر من ٣٠٠ بالمئة. خلص تفتيش مكتب المفتش العام إلى المشروع الذي تبلغ قيمته ٦٥,٨ مليون دولار – والذي هو مُنجز بنسبة ٩٢ بالمئة - يجب أن ينتج عنه محطة معالجة للمياه فعّالة.^(٢٥٩)

نظام معالجة المياه المهذورة في الفالوجة

نزولاً عن طلب السفير الأميركي في العراق، أجرى مكتب المفتش العام خلال ربع السنة هذا مراجعة لنظام معالجة المياه المهذورة في الفالوجة. المشروع الذي بلغت كلفته ٩٨ مليون دولار هو نظام معالجة مياه المجاريير الكبير الوحيد الذي يجري إنشاؤه في العراق.^(٢٦٠)

خلص تقييم المفتش العام إلى أن المشروع سيكون قادراً فقط على تأمين العمود الفقري لنظام معالجة المياه المهذورة في الفالوجة وليس نظام شامل للمدينة كما كان مُخططاً أصلاً. علاوة على ذلك، سوف يتم إنجاز المشروع مع تأخير ثلاث سنوات على الموعد المبرمج كما سيكلف ثلاث مرات أكثر من السعر الأعلى الأصلي - ٣٢,٥ مليون دولار. أن ثلث عدد المنازل المستهدفة أصلاً فقط سوف يكون له وصول إلى النظام كما أن المشروع لا يربط هذه المنازل بالنظام.^(٢٦١)

وفي حين كانت رقابة المفاول على النوعية مفصلة بما فيه الكفاية وكان ضمان النوعية من قِبَل الحكومة فعّالاً، لم تكن الاستدامة معالجة بالصورة الملائمة بالنسبة للمشروع.^(٢٦٢) شملت توصيات المفتش العام التنسيق الأفضل مع الحكومة العراقية في تأمين الطاقة الدائمة والمحروقات المناسبة للمحطة، و ضمان تسديد المتوجب للمقاولين المُتبقين، و ضمان وصل المنازل بالنظام لربط مناطق الجمع بنظام المجاريير.^(٢٦٣) لمزيد من المعلومات المفصلة حول عمليات التفتيش التي أجراها مكتب المفتش العام، أنظر القسم ٤ من هذا التقرير.

العناية بالصحة

ألزمت الولايات المتحدة ٨٩٦ مليون دولار وأنفقت ٨٢٤ مليون في قطاع العناية بالصحة.^(٢٦٤)

سنة ٢٠٠٨، خصصت الحكومة العراقية ٨٣ مليون دولار في موازنتها الأصلية للمشاريع الرأسمالية للعناية بالصحة. بتاريخ حزيران/يونيو ٢٠٠٨، كان حوالي ٤٣ مليون دولار من إجمالي المبلغ المقرر قد حرر إلى الوزارة التي أنفقت أكثر من ٨ ملايين دولار.^(٢٦٥) في الأموال التكميلية لسنة ٢٠٠٨ التي مُررت في آب/أغسطس^(٢٦٦)، خصصت الحكومة العراقية ٥١ مليون دولار إضافية لوزارة الصحة.^(٢٦٧)

مشاريع المستشفيات الأميركية

مستشفى ميسان الجراحي هو أحد أكبر المشاريع قيد التنفيذ للعناية بالصحة. تم تمويل إنشاء المرفق بحوالي ١٣ مليون دولار من صندوق دعم الاقتصاد. ذكرت فرقة منطقة الخليج أن وزارة الصحة العراقية تنظر إلى المشروع على أنه أهم مشروع في المحافظة. أشغال المشروع منجزة بنسبة ١٠ بالمئة فقط، لكن المرافق سوف تشمل مستشفى رئيسي، ودائرة للطوارئ، و عدة خدمات دعم. من المتوقع إنجاز المشروع في آب/أغسطس ٢٠٠٩.^(٢٦٨) الجدول ٢-٣٦ يظهر وضعيات مشاريع العناية بالصحة الأميركية.

إنشاء المبنى الرئيسي لمستشفى الأطفال في البصرة - ١٦٤ مليون دولار - أنجز خلال ربع السنة هذا.^(٢٦٩) الإنجاز النهائي لعقود فرقة منطقة الخليج، بما فيها دمج المعدات، متوقع في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩.

الجدول ٣٥-٢
وضعية مشاريع المياه الأمريكية

المشاريع المنجزة	قيمة المشاريع المنجزة	المشاريع قيد التنفيذ	قيمة المشاريع قيد التنفيذ
توزيع المياه	٤٤٢	٢٧	\$٥٠,١٨٠,٥٧٩
المياه - عموماً	١,٤٧٧	٤٥	\$٢٥,٦١١,٨٥٣
الموارد المائية	٧	٨	\$٦٩,٠٩٣,٦٩٢
مرافق مختلفة	٤٥٧	١١	\$١٨,٢٦٠,١٦٣
جمع مياه المجاري	٢٦	١٧	\$٣٤,٩٣٩,٤٧٠
الري	٧	١	\$٢٩,٠١٩,٠٠٠
معالجة مياه المجاري	٤	٢	\$٢٤,٨٤٦,٣٤٢
الصرف الصحي	١٣٤	١	\$٤,٨٨٥,١٢٦
MFS	٧	٠	\$٠
أمن البنية التحتية	٥	٠	\$٠
البنية التحتية المدنية	١	٠	\$٥٥,٤١٥
النفائات الصلبة	٠	١	\$٩٠,٥٦١,٦١٦
بناء القدرات	١٧	٥	\$٣,٢٤٢,٩٧٥
مشتريات مختلفة	١٣٤	٧	\$٣٠,٧٠٢,٠١٢
مساندة الاستدامة للتشغيل والصيانة	٣٣٨	٣	\$٦,٥٩٤,٨٧٨
معالجة المياه	٢٣٧	١٨	\$٨٦,٤٤٩,٣٩١
أخرى	٥	١	\$٨٤,٦٧٠
الفئة غير مقدمة	١,٧٢١	١٦٧	\$٥٥,٥٧٢,١٧٧
المجموع	٥,٠١٩	٣١٦	\$٤٣٠,٨٨٧,٩٤٤

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. هذه اللائحة للمشاريع الإنشائية تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة إعمار العراق. نذكر المفتش العام أن بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ليست دقيقة أو كاملة تماماً. لذلك فإن إجمالي المشاريع قد لا يتوافق مع التزامات وإنفاقات top-line التي قدمتها الوكالات. يشمل هذا الجدول قيمة المشاريع وليس الالتزامات والإنفاقات.

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، الملف النهائي، ٢٠٠٨/١٠/١؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ملف أكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠٠٨/١٠/٣.

سنة ٢٠٠٣، سمح الكونغرس بتخصيص ٥٠ مليون دولار من أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق لمستشفى البصرة^(٢٧٠) وجد تفنيش أجراه مكتب المفتش العام سنة ٢٠٠٦ أن الكلفة المقدرة قد نمت إلى ٩٨ مليون دولار، وأن تاريخ الإنجاز المقدر قد انتقل إلى ٣١ تموز/يوليو ٢٠٠٧^(٢٧١). وكان تاريخ الإنجاز الأصلي ٣١ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥^(٢٧٢). حولت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية إدارة المشروع إلى فرقة منطقة الخليج في تموز/يوليو ٢٠٠٦^(٢٧٣).

تواصل العمل خلال ربيع السنة هذا في مشروع اللجان الإقليمية لإعادة الإعمار البالغ ٧,٤ مليون دولار لبناء عيادة للطوارئ الصحية في المستشفى العام في بعقوبة. بعد إنجازه في نيسان/إبريل ٢٠٠٩، سوف يخدم المرفق أكثر من ٣٠٠,٠٠٠ عراقي مع أسرة إضافية وغرف (سويت) الجراحة ذات التكنولوجيا المتقدمة^(٢٧٤).

مراكز الصحة الأولية

برنامج مراكز الصحة الأولية شارف على الإنجاز مع ٢٥ مركز للصحة الأولية سُلمت إلى الحكومة العراقية خلال ربع السنة هذا. على العموم، تم إنجاز ١٢٢ مركز من أصل ١٤٢ كانت الهدف، ونقلت إلى وزارة الصحة بتاريخ ٢٥ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨^(٢٧٥). تنتظر سبعة مراكز إضافية للصحة الأولية كتب القبول من الوزارة. الجدول ٢-٣٧ يظهر وضعية برنامج المراكز الصحية الأولية بالمقارنة من تحديث ربع السنة الأخير.

تخطط وزارة الصحة لبناء ٦ مستشفيات جديدة و ١٠٠٠ مركز للصحة الأولية خلال السنوات العشر القادمة^(٢٧٦).

الجدول ٢-٣٦ وضعية مشاريع العناية بالصحة الأميركية

المشاريع المنجزة	قيمة المشاريع المنجزة	المشاريع قيد التنفيذ	قيمة المشاريع قيد التنفيذ
مراكز الصحة الأولية/عيادات	٣٧٨	٧٩	\$١٤١,٧٦٢,٣٨٦
برامج الصحة والمعدات	٢٢	٧٣	\$٢٨,٣٦٦,٤٦٨
العناية الصحية	٢٠٢	٨	\$١,٣٦٧,٨٧٥
العيادات	١٥٧	٢	\$٥٦٨,٩٥٠
المستشفيات	١٣٨	١٥	\$٧٥,٥٢٣,٧٤٤
الصحة الأولية	٢	٠	\$٠
البنية التحتية المدنية	١	٠	\$٠
أمن البنية التحتية	١	٠	\$٠
بناء القدرات	١	١	\$٧٩٠,٠٠٠
مساعدة الاستدامة (التشغيل والصيانة)	٠	٢	\$٧,٠٠٨,٠٦١
أخرى	٦	١	\$٢٧,٣٣٨
مرافق مختلفة	٣٥٤	٧٠	\$٢٣٣,٦٠١,٢٨٨
فئة لم تقدم	٥٨٥	٤٠	\$١٠,٢٤٢,٨٣٧
المجموع	١,٨٤٧	٢٩١	\$٤٩٩,٢٥٨,٩٤٧

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. هذه اللائحة للمشاريع الإنشائية تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعمار العراق. ذكر المفتش العام أن بيانات نظام إدارة إعمار العراق ليست دقيقة أو كاملة تماماً. لذلك فإن إجمالي المشاريع قد لا يتوافق مع الالتزامات والإنفاقات التي قدمتها الوكالات. يشمل هذا الجدول قيمة المشاريع وليس الالتزامات والإنفاقات.

المصادر: نظام إدارة إعمار العراق، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، الملف النهائي، ١/١٠/٢٠٠٨؛ نظام إدارة إعمار إعمار العراق، ملف اكسل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٣/١٠/٢٠٠٨.

النقل والاتصالات

خصصت الولايات المتحدة قرابة ١,١٠ مليار دولار وأنفقت ٩٦٤ مليون دولار لمشاريع النقل والاتصالات^(٢٧٧). الجدول ٢-٣٨ يقدم وضعية المشاريع الأميركية كما أوردها نظام إدارة إعمار العراق.

سنة ٢٠٠٨، شملت استثمارات الحكومة العراقية في تلك المجالات^(٢٧٨):

- **وزارة النقل:** خصصت الحكومة العراقية ٣٠١ مليون دولار للمشاريع الرأسمالية في موازنتها الأصلية لسنة ٢٠٠٨. بتاريخ حزيران/يونيو ٢٠٠٨، كان قد حرر قرابة ٧٧ مليون دولار من هذا المبلغ للوزارة التي أنفقت قرابة ٤٠ مليون دولار.

- **وزارة المواصلات:** خصصت الحكومة العراقية ٢٥٠ مليون دولار للمشاريع الرأسمالية في موازنتها الأصلية لسنة ٢٠٠٨. بتاريخ حزيران/يونيو ٢٠٠٨، كان أكثر من ٥١ مليون دولار من هذا المبلغ قد حُرر إلى الوزارة التي أنفقت حوالي ٣٩ مليون دولار.

تأجيل تسليم الطائرات

خلال ربع السنة الأخير، أعلنت الحكومة العراقية أنها أوصت على ٤٠ طائرة تجارية بقيمة ٥ مليارات دولار من شركتي بوينغ وبومباردييه. منذ توقيع الصفقة، أقامت الكويت دعوى في كندا تطالب فيها الخطوط الجوية العراقية والحكومة العراقية بـ ١,٢ مليار دولار تعويضاً عن الأصول والعائدات المفقودة خلال حرب الخليج.^(٢٧٩) نتيجة لذلك، جرى تأجيل تسليم أول طائرة بومباردييه كان من المفترض تسليمها باكراً هذه السنة – من قبل أمر أصدرته محكمة كندية بالنيابة عن الخطوط الجوية الكويتية.^(٢٨٠) وصلت طائرة بومباردييه واحدة إلى العراق في ٧ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨؛ غير أن قضية التعويضات للكويت لم تُحل بعد.^(٢٨١)

من المُقرّر حالياً أن يتم تسليم أول طائرة بوينغ في ٢٠١٠، بعد إنجاز الجمع والإنتاج في شركة بوينغ علماً أنه إذا ما عُدلت الطلبات السابقة، يظل كل تسليم ممكناً. قوة المهمة التابعة لوزارة الدفاع لأجل تحسين الأعمال واستقرار العمليات، قدمت الدعم لمشتريات الحكومة العراقية خلال المفاوضات للحصول على الطائرات.^(٢٨٢)

افتتاح المطارات

في ٢٢/أغسطس ٢٠٠٨، افتتح مطار الموصل للعمليات التجارية. وفي الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، بدأت الخطوط الجوية العراقية خدمة أسبوعية منظمة إلى الموصل من كل من بغداد والبصرة.^(٢٨٣)

أفتتح مطار النجف في ٢٠ تموز/يوليو ٢٠٠٨. سهل مكتب ملحق النقل لدى السفارة الأميركية وفرق إعادة إعمار المحافظات في النجف إنشاء والمصادقة على القدرة التشغيلية للمطار من قبل هيئة الطيران المدني العراقية. يُقدّر الراسميون أن حوالي ٤٠٠٠ مقيم في المحافظة سوف يستخدمون المطار خلال أيام الحج القادمة.^(٢٨٤)

بالنسبة لتحديثات إضافية في قطاع النقل في العراق، أنظر الجدول ٢-٣٩.

البنية التحتية للاتصالات

ذكرت السفارة الأميركية خلال ربع السنة هذا أن ١,٣ مليون عراقي قد اشتركوا في خدمات الهاتف الثابت – بزيادة ٨ بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة الأخير؛ واشترك ٨٢٧,٥٠٠ في الانترنت – بزيادة ١٠ بالمئة منذ ربع السنة الأخير. قرابة ١٣ مليون عراقي مشتركون في خدمات الهاتف اللاسلكي.^(٢٨٥) حوالي ٤ مليارات دولار من الأسهم الخاصة دخلت في قطاع الاتصالات منذ ٢٠٠٣.^(٢٨٦) غير أن broadband لدرجة الأعمال، الجديرة بالثقة، لا تزال غير متوفرة لأن البنية التحتية للألياف الجوهريّة تقيد التقدم في خدمات البيانات الحديثة بما في ذلك الخدمات المصرفية والجردات وأنظمة إدارة الرقابة.^(٢٨٧)

الجدول ٢-٣٧
وضعية مراكز الصحة الأولية

تاريخ التقرير	حولت	إنشاء منجز	قيد الإنشاء	أنجزت مع أثر أممي	ألغيت	المجموع
٢٠٠٨/٧/٢	٩٧	١٦	١٩	٠	١٠	١٤٢
٢٠٠٨/٩/٢٥	١٢٢	٦	٣	١	١٠	١٤٢
التغيير	٢٥+	١٠-	١٦-	١+	٠	٠

المصدر: فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٧/٢ و ٢٠٠٨/١٠/٧

الجدول ٢-٣٨
وضعية المشاريع الأميركية في النقل والاتصالات

مشاريع منجزة	قيمة المشاريع المنجزة	مشاريع قيد التنفيذ	قيمة المشاريع قيد التنفيذ	الموانئ
٦٥	\$١٥٧,٩٨٦,٢٤٤	٠	\$٠	معدات الاتصالات
١١٦	\$١٥٧,٢٦٩,٦٩٥	٤	\$٦,٨٤٨,٩٥٤	النقل (أخرى)
٧٢	\$١٢٧,٢١٩,٣١٧	٤	\$١,٥٢٧,٣٣٠	المطارات
٦٢	\$١٠٥,٥١٦,٨٣٥	١٣	\$٥٩,٨٥١,٣٢١	محطات سكة الحديد
٢١٤	\$٩٩,٤٥٧,٥٩٠	٦	\$١,٨٩١,٨١١	طرق القرى
١١٦	\$٩٧,٩٤٤,٣٥٨	١٤	\$٢٤,٥٤٠,٨٧١	الطرق
٦٧٣	\$٨٩,٨٣٧,٤٦٥	١٠	\$١,٢٠٠,٥٧٢	الجسور
٩٨	\$٢٢,١٦٤,١٤٣	١١	\$١٥,٠٣٢,٧٣٦	تلكوم
١٩٤	١٩,١٣٤,٩٨٠	٣	\$٣٢٧,٤٧١	الطرق السريعة
٢	\$١٣,٦٧٧,٠٢٧	٣	\$٣٦,٦٥٠,٤٦٣	المرافق البريدية
٢٩	\$١٣,٦٥٢,٢٥٤	٠	\$٠	المحطات الخارجية
٣	\$١,٧٦٢,٨٤٨	٥	\$٢٧,٥٩٧,٣٣٤	البنية التحتية المدنية
١	\$٨٢٧,٦٠٠	٠	\$٠	السكك الحديدية
٥	\$٧٣٩,٧٩٠	٠	\$٠	الإدارة الاقتصادية المالية
٢	\$٨٠,٢٩٠	٠	\$٠	مختلف
٢	\$٢٥,٢٦٧	٠	\$٠	أمن البنية التحتية
١	\$٠	١	\$٥٢٥,٠٠٠	أخرى
٢	\$٦١٢,٥٥٤	٠	\$٠	غير مدرجة في فئة
١,١٧٣	\$٤٩٣,٠٠٣,٨٤٥	٩١	\$٣٧,٦٧٢,٨٠٧	المجموع
٢,٨٣٠	\$١,٤٠٠,٩١٢,١٠٢	١٦٥	\$٢١٣,٦٦٦,٦٦٩	

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. هذه اللائحة للمشاريع الإنشائية تستند إلى معلومات قدمها نظام إدارة إعادة إعمار العراق. نذكر المفتش العام أن بيانات نظام إدارة إعادة إعمار العراق ليست دقيقة أو كاملة تماماً. لذلك فإن إجمالي المشاريع قد لا يتوافق مع الالتزامات والإنفاقات التي قدمتها الوكالات. يشمل هذا الجدول قيمة المشاريع وليس الالتزامات والإنفاقات.

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، الملف النهائي، ٢٠٠٨/١٠/١؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق، ملف اكسل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠٠٨/١٠/٣.

تواصل الولايات المتحدة تقديم الدعم لهذا القطاع لكن العمل قد توقف في مركز تلكوم المأمون^(٢٨٨)، مركز تلكوم الوحيد الذي تم بناؤه في البلاد^(٢٨٩) إنجاز المشروع الأميركي هذا – الذي يشمل أنظمة تحويل ونقل جديدة – سوف ينتقل إلى ٢٠٠٩^(٢٩٠).

التطورات الحديثة

الطيران	مراجعة مطار البصرة: أنجز اختبار القبول في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كما أن الكشف على صلاحية الطيران لنظام الرادار الممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق مُقرّر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨. وخضع نظامان آخران لكشف على صلاحية الطيران. التدريب على رقابة الملاحة الجوية يتوقع إنجازه بحلول كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩، كما من المتوقع إنجاز المشاريع الممولة من الولايات المتحدة في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨.
الطرق والجسور	تحديث الموازنة: لجنة الدولة للطرق والجسور في وزارة الإنشاء والإسكان أنفقت ٦٧ بالمئة من موازنة الصيانة لسنة ٢٠٠٨ و ٦٦ بالمئة من الموازنة الرأسمالية. ويبدو أن المخصصات الأولية لم تكن كافية لبرنامج مناسب لطريق سريعة وللصيانة.
السكك الحديدية	السكك الحديدية للجمهورية العراقية (IRR): التقديرات الأولية لحركة القطارات خلال ربع السنة هذا هي ٢٢٠٠ قطار، بزيادة ٤٠ بالمئة بالمقارنة مع ربع السنة الأخير. لقد واصل الوضع الأمني تحسنه خلال الربع الثالث لسنة ٢٠٠٨، وسمح لسكة حديد الجمهورية العراقية مواصلة زيادة إجمالي حركة القطارات.
الموانئ	لقد خصصت وزارة النقل ٩٦٠ مليون دولار لإعادة إعمار خطوط سكة الحديد بين بغداد والرابية وبغداد والبصرة. وأشارت وزارة النقل إلى أن أموالاً رأسمالية إضافية سوف تستخدم لشراء مواد البناء لمشروع السكك وأن السكك الحديدية للجمهورية العراقية سوف تؤمن الإدارة واليد العاملة لإنجاز المشروع. يتوقع أن يكون التمويل متوفراً في موازنة الحكومة العراقية لسنة ٢٠٠٩.
الموانئ	تنمية ميناء أم قصر: يواصل مكتب ملحق النقل السير على المسار الحالي من أجل إعادة تأهيل ميناء أم قصر وتطويره تجارياً، بما في ذلك تشجيع وزير النقل الجديد على الموافقة على توظيف مستشارين دوليين مجربين بشؤون الموانئ لتقديم النصح والاستشارات حول إنماء الموانئ القومية. ويعمل الملحق أيضاً مع فرقة منطقة الخليج ومع القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان لإنجاز تجديد رافعتين نلكون في المرسى ٥ و ٦ في ميناء أم قصر. إنجاز هذا المشروع الممول من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق متوقع قبل كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. الاستخدام المحدود لأموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد مخطط لمشاريع تحسينات إضافية في ميناء أم قصر، بما في ذلك إصلاح عربات المستوعبات للحكومة العراقية وإصلاح سجاج المحيط الأمني للميناء.


المصادر: السفارة الأميركية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٨/٨/٢٠٠٨؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ١/١٠/٢٠٠٨.

الاقتصاد

خصصت الولايات المتحدة قرابة ١,٣٥ مليار دولار وألزمت ١,٢٩ مليار دولار، وأنفقت حوالي ١,١٠ مليار دولار لنشاطات التنمية الاقتصادية في العراق. بالنسبة لوضعية تلك الأموال، أنظر الشكل ١٧-٢.

- عائدات النفط المتزايدة سنة ٢٠٠٨ ساندت الاقتصاد في العراق.^(٢٩١) في أيلول/ سبتمبر، أعلن تقرير لصندوق النقد الدولي (IMF) أن:^(٢٩٢)
- توقعات العراق من أجل نمو اقتصادي مستدام قد تحسّنت.
 - يبدو أن النشاط الاقتصادي في القطاعات غير النفطية قد ازداد خلال النصف الأول من سنة ٢٠٠٨، باستثناء قطاع الزراعة الذي أصيب بالجفاف.
 - التضخم في العراق تباطأ وبات تضخم أسعار الاستهلاك ذي رقم واحد منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧.

الشكل ١٧-٢
وضعية الأموال الأميركية الداعمة للاقتصاد العراقي
بمليارات الدولارات



ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. بالنسبة لمنهجية كيفية جمع البرامج الأميركية في فئات (الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد والحكم)، انظر الملحق (د). الالتزامات والإنفاقات حسب فئات المقتضى العام قد تختلف عن الإلتزامات والإنفاقات الواردة في ملخص التمويل الأميركي. لم يترك مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من كافة الوكالات، كما أن بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق. تشمل الأرقام فقط تمويل صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISSF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).

المصادر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تكاليف صندوق دعم الاقتصاد (ESF) التي بحاجة للإكمال، ٢٠٠٨/٩/٣٠، وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٨/١٠/١، نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

بالنسبة لنظرة إجمالية على التضخم، وسعر الصرف ومعدلات الفائدة، كما وعلى إجمالي الدخل المحلي وعائدات النفط الحكومية، أنظر الشكل ١٨-٢.

التحديات الاقتصادية

على الرغم من التقدم المالي مؤخراً، لا يزال الاقتصاد عرضة لتشكيلة من المخاطر الكبرى^(٢٩٣) لا يزال العديد من العراقيين يكافحون من أجل تلبية حاجاتهم الاقتصادية الأساسية. ذكرت الأمم المتحدة (UN) أن "معدلات البطالة لا تزال مرتفعة كما أن معدلات العديد من المحافظات متدنية بالنسبة للمؤشرات الاجتماعية والاقتصادية الأساسية، مثل البطالة وسوء التغذية والأمية"^(٢٩٤).

منذ ٢٠٠٣، قيل إن العراق عرف متوسط ٦٠ بالمئة من عدم توفر فرص العمل المناسبة إضافة إلى البطالة^(٢٩٥)، لكن الرقم الدقيق يصعب قياسه^(٢٩٦) التقديرات الرسمية للحكومة العراقية حول البطالة تبقى قرابة ١٨ بالمئة وفرص العمل غير المناسبة ٣٨ بالمئة^(٢٩٧) تقدر الأمم المتحدة أن أكثر من نصف العراقيين لا وصول لهم إلى واحد أو أكثر من الخدمات الأساسية^(٢٩٨).

تطوير حقول النفط العراقية


لقد أحرر الافتقار إلى قانون للهيدروكربون المفاوضات مع المستثمرين الأجانب المحتملين الذين يهتمهم تطوير حقول النفط في العراق. في ٩ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أعلن وزير النفط إلغاء الخطط الرامية إلى منح عقود قصيرة الأمد للخدمات الفنية لعدة شركات نفط غربية. لكن في ١٣ تشرين الأول/أكتوبر، فتح رسميو وزارة النفط العروض لعقود لمدة ٢٠ سنة تُغطي ٦ حقول نفط وحقلي غاز طبيعي. بموجب أحكام العقد، سوف تطالب الحكومة العراقية الشركات بتشكيل مشاريع مشتركة مع الشركات العراقية التي تملكها الدولة التي سوف تحتفظ بأكثرية الملكية^(٢٩٩).

الشكل ١٨-٢

النقاط البارزة للاقتصاد العراقي


إجمالي الناتج المحلي حسب القطاعات

% من ٧٧,٧٢ تريليون دينار عراقي

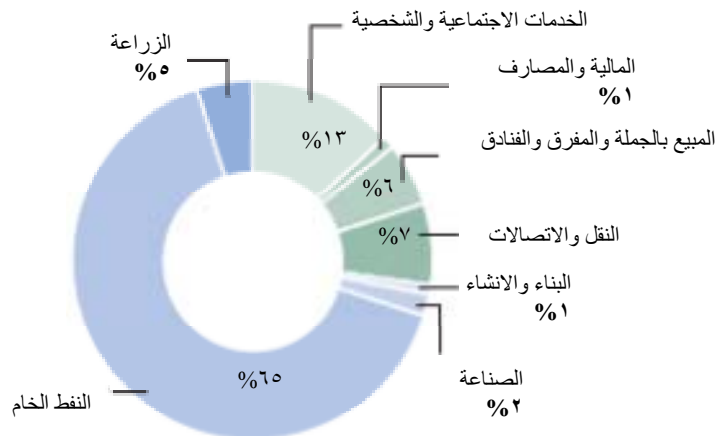

ملاحظة: النسب المئوية تستند إلى التقديرات المؤقتة لسنة ٢٠٠٦ (بالأسعار الحالية) لنشاطات إجمالي الناتج المحلي. ساهم قطاعان (التعدين الآخر والكهرباء/المياه) بأقل من واحد بالمئة في إجمالي الناتج المحلي. المصدر: صندوق النقد الدولي، "تقرير البلدان رقم ٠٧/٢٩٤"، ٢٠٠٧/٨.

النمو الاسمي لإجمالي الناتج المحلي
بمليارات الدولارات

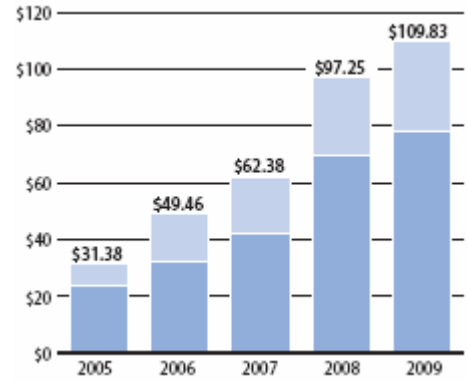

نشاطات أخرى لإجمالي الناتج المحلي
عائدات النفط الحكومية

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. بيانات عائدات النفط الخام قُدمت كنسبة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. البيانات لسنة ٢٠٠٥ و ٢٠٠٦ تقديرية؛ ٢٠٠٧ أولية؛ ٢٠٠٨ و ٢٠٠٩ ملحوظة. المصدر: صندوق النقد الدولي، "تقرير البلدان الرقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩، ص ١٧.

معدلات الفائدة، سعر الصرف والتضخم في العراق

معدل فائدة الإقراض

معدل الفائدة الذي يدفعه بنك العراق المركزي (CBI) لودائع المصارف التجارية.



- في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، بدأ بنك العراق المركزي رفع معدلات الفائدة لإبقاء السيطرة على التضخم.
- في بداية تموز/يوليو ٢٠٠٨، خفف بنك العراق المركزي الرقابة النقدية على التضخم عن طريق خفض سياسة معدل الفائدة من ١٧ بالمئة إلى ١٦ بالمئة.

سعر الصرف

متوسط أسعار صرف الدينار العراقي (ID) مقابل الدولارات الأميركية (USD) في المزاد اليومي لبنك العراق المركزي.



- تحسن سعر الدينار العراقي بالنسبة للدولار الأميركي بنسبة ٢٤ بالمئة منذ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ عندما بدأ بنك العراق المركزي استهداف معدلات الفائدة للسيطرة على التضخم المتصاعد.
- لإبقاء السيطرة على التضخم، سوف يزيد بنك العراق المركزي سرعة تحسن العملة إلى ٠,٥ بالمئة في الشهر خلال النصف الثاني من ٢٠٠٨.

التضخم الإجمالي للأسعار

المقارنة الشهرية لمتوسطات التضخم من سنة لسنة لإجمالي مؤشر أسعار المستهلك.



- التحسن المتواصل للدينار وتحسن البيئة الأمنية ساهما في الاستقرار المتواصل لمعدل تضخم أسعار المستهلك.
- تضخم الأسعار من سنة لسنة كان سلبياً خلال حزيران/يونيو، تموز/يوليو وأب/أغسطس ٢٠٠٨، مما يعني أن الأسعار كانت أدنى مما كانت عليه في نفس الفترة الزمنية سنة ٢٠٠٧.



التضخم الجوهري

المقارنة من سنة لسنة للمتوسطات الشهرية لمؤشر أسعار المستهلك الأساسية التي تستثني تكاليف المحروقات والكهرباء والنقل والاتصالات.

- ساهمت أسعار الغذاء الأعلى في نتوء بعد آذار/مارس ٢٠٠٨، لكن التضخم الجوهري عاد إلى حوالي ١٢ بالمئة في حزيران/يونيو ٢٠٠٨، وظل ثابتاً نسبياً خلال ربع السنة هذا.
- أسعار الغذاء تواصل شد التضخم الجوهري إلى أعلى بالنسبة لتضخم الأسعار.

المصادر: صندوق النقد الدولي، "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩؛ بنك العراق المركزي، "المؤشرات المالية الأساسية"، ٢٠٠٨/٩/٢٤، accessed ٢٠٠٨/٩/٢٤، www.cbi.iq، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٢٦؛ مكتب شؤون الشرق الأدنى - العراق، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

الجدول ٤٠-٢

نشاط سوق الأوراق المالية العراقية

النشاط	٢٠٠٧ (كامل السنة)	٢٠٠٨ (أشهر)
الشركات المدرجة	٩٤	٩٥
جلسات التعامل	١١٩	٩٨
الأسهم المتبادلة	١٥٣ مليار سهم	١٢٤ مليار سهم
قيمة المبادلات	٣٥٧ مليون دولار	٢١١ مليون دولار
الأسهم الخارجية المتبادلة	٧ مليارات سهم	١٢ مليار سهم
قيمة المبادلات الخارجية	١٤ مليون دولار	١٤ مليون دولار

المصدر: السفارة الأميركية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.

المفاوضات والترتيبات الأخرى لأجل تطوير موارد العراق الطبيعية جارية:

- في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، وافقت الحكومة العراقية على صفقة غاز أولية بين رويال داتش شلّ وشركة غاز الجنوب العراقية لإقامة مشروع مشترك لمعالجة الغاز الطبيعي المنتج في البصرة.^(٣٠٠)
- شركة النفط الوطنية الصينية (CNPC) تسعى إلى عقد شراكة مع شركة نفط الشمال العراقية لأجل تطوير حقل أهدب للنفط بتاريخ ٢ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، وافق مجلس الوزراء العراقي على الخطوط الكبرى لصفقة بقيمة ٣ مليارات دولار، لكن يبقى على وزير النفط وشركة النفط الوطنية الصينية التوقيع على عقد يُحدّد شروط الشراكة.^(٣٠١) اللافت سنة ٢٠٠٧، أن الصين قد وقعت مذكرة تفاهم لإعفاء ٨,٥ مليار دولار من دين العراق الخارجي^(٣٠٢) كما تتواصل المفاوضات للتوصل إلى اتفاقية نهائية للدين بين البلدين.^(٣٠٣)

الفساد المتواصل في قطاع النفط

خلال ربع السنة هذا، ذكر صندوق النقد الدولي أن العراق حقق تقدماً في تعزيز الحكم وفي مكافحة الفساد في قطاع الهيدروكربون عبر قياس النفط مترياً والتزام العراق المشاركة في مبادرة شفافية الصناعات الاستخراجية (EITI).^(٣٠٤) تشدد المبادرة على أهمية الشفافية من قِبَل الحكومة والشركات في الصناعات الاستخراجية وعلى الحاجة إلى تعزيز الإدارة والمحاسبة المالية العامة.^(٣٠٥) خلال ربع السنة هذا، عيّنت الحكومة العراقية منسّقاً عراقياً لمبادرة شفافية الصناعات لاستخراجية.^(٣٠٦)

تشجيع الاستثمارات الأجنبية

يصادف ربع السنة هذا مرور عام على افتتاح المبادلات في سوق الأسهم في العراق (ISX) – البورصة – أمام المستثمرين الأجانب. واصلت الاستثمارات الأجنبية في بورصة العراق تأخرها بالنسبة للاستثمارات المحلية لكن الولايات المتحدة تعتقد أن الاستثمارات الأجنبية سوف تزداد بعد أن يرفع العراق شروط تسليم مستندات الأسهم في السوق إلى الوسطاء.^(٣٠٧) بالنسبة لنظرة إجمالية على نشاط سوق الأوراق المالية العراقية، أنظر الجدول ٢-٤٠.

تواصل الولايات المتحدة دعم تطور أسواق العراق الرأسمالية بعدة طرق، تضم:^(٣٠٨)

- تشكيل اللجنة العراقية المستقلة للأوراق المالية
- أتمتة البورصة العراقية بصورة كاملة.
- دعم الجمعية العراقية لوسطاء السندات المالية.
- وضع الصيغة الدائمة لقانون الأوراق المالية العراقية (البورصة).

اللجنة القومية العراقية للاستثمارات (NIC) التي تأسست في شباط/فبراير ٢٠٠٧، تضع السياسة القومية للاستثمارات، والخطوط الهادية والقوانين وتخدم كوكالة قومية تنظيمية لكافة الاستثمارات باستثناء الاستثمارات في المصارف والتأمين وفي صناعات استخراج وإنتاج النفط والغاز^(٣٠٩). تنسق اللجان في المناطق والمحافظات مع اللجنة القومية العراقية للاستثمارات لأجل خلق خطط استثمار لمحافظاتها. هناك حالياً ١٥ لجنة استثمار في المحافظات. وحدها ديالى وكركوك والأنبار لا يزال عليها تشكيل لجان. نشاطات القطاع الخاص الأخرى تشمل برنامج حوار الأعمال الأميركي – العراقي وإصلاح منظمة التعاون الاقتصادي وإنماء الاستثمارات.^(٣١٠)

نظام التوزيع العام المكلف للغذاء

يقدم نظام التوزيع العام للغذاء (PDS) سلة غذاء شهرية لكل مواطن عراقي كجزء من نظام الأهلية الأساسي. يعتمد أكثر من ١٢ مليون عراقي على سلة الغذاء كمصدرهم الأولي للتغذية^(٣١١). طالبت وزارة التجارة بموازنة من ٧,٣ مليار دولار لتغطية نظام التوزيع العام للغذاء لسنة ٢٠٠٨ وخصصت الحكومة العراقية أقل من ثلاثة أرباع هذا المبلغ أي ٥,٣ مليار دولار (٣,٣ مليار دولار في موازنة ٢٠٠٨، و٢ مليار دولار في المبالغ التكميلية للحكومة العراقية لسنة ٢٠٠٨).^(٣١٢)

ارتفاع أسعار الأغذية سوف يؤثر على الأرجح على خطة الحكومة العراقية لمواصلة العمل بنظام التوزيع العام للغذاء^(٣١٣). علاوة على ذلك، "كان للنظام آثار معاكسة على الزراعة بسبب اعتمادها الكبير على الواردات والأسعار المتدنية بصورة اصطناعية التي يسببها الإدخال الكبير للغذاء في السوق العراقية"^(٣١٤). خلال ربع السنة هذا، لاحظت فرق إعادة إعمار المحافظات في نينوى أن "نظام التوزيع العام للغذاء يسلم جزءاً من المؤهلات إلى المستفيدين، ومن ثم يفعل ذلك فقط بشكل مُتفرّق"^(٣١٥).

عبء الدين

منذ ٢٠٠٣، استفاد العراق من إعفاءات دولية فوق العادة وغير مسبوقه لدينه. من أصل ١٤٢ مليار دولار من الديون الخارجية قبل اتفاقية نادي باريس سنة ٢٠٠٤، كان هناك ٤٣ مليار دولار من إجمالي الدين المتبقي، (وفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي)^(٣١٦) المرحلة الثالثة من خفض الدين بموجب اتفاقية نادي باريس التي سوف تخفض دين العراق الخارجي بـ ١٠ مليارات دولار إضافية^(٣١٧) معلقة بانتظار مراجعة سيقوم بها صندوق النقد الدولي في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨ لأداء العراق بموجب الترتيب الاحتياطي.^(٣١٨)

منذ أيار/مايو ٢٠٠٧ – الذي يصادف بداية العهد الدولي مع العراق – ساهمت الاتفاقيات الثنائية مع كل من روسيا وبلغاريا وبوسنيا وسلوفاكيا في خفض التزامات العراق إزاء تلك البلدان من ٢٦ مليار دولار إلى حوالي ٩٠٠ مليون دولار. أعلنت الإمارات العربية المتحدة مؤخراً أنها قد تلغي ٧ مليارات دولار من دين العراق؛ غير أنه لم يتم حتى الآن توقيع اتفاقية رسمية بهذا الخصوص.^(٣١٩)

ذكر صندوق النقد الدولي أن العراق يتفاوض حالياً مع ١١ بلداً دائناً من غير نادي باريس، لتسوية مسألة ١٦ مليار دولار إضافية^(٣٢٠). وقع العراق مذكرة تفاهم مع الصين للتوصل إلى اتفاقية حول ٨,٥ مليار دولار من الديون^(٣٢١). في ما يلي أكبر مبالغ متبقية من الدين:^(٣٢٢)

- العربية السعودية: ١٥ مليار دولار – ٣٩ مليار دولار
- الصين: ٨,٥ مليار دولار
- الكويت: ٨,٢ مليار دولار
- قطر: ٥ مليار دولار

وفي عملية لتبديل الدين إلى سندات خزينة، تم خفض الدين التجاري العراقي بـ ١٦ مليار دولار. حصل الدائنون على سندات عراقية بقيمة ٠,٢٠ دولار لكل دولار كما أن سعر كل السندات القابلة للتداول قارب الـ ٠,٧٥ دولار في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨.^(٣٢٣)

الجدول ٢-٤ برامج المساعدة المالية الأميركية

البرنامج	تحديث البرنامج
الهيئات الصغيرة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد	<ul style="list-style-type: none"> ● أُلزم البرنامج ٤,٢ مليون دولار للهيئات الصغيرة في ٢٠٠٨/٨/٣١ – أي بزيادة ٣٨٪ بالمقارنة مع التزامات ربع السنة الأخير. ● بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٣٠، بلغ إجمالي التزامات البرنامج للسنوات المالية ٢٠٠٧ و ٢٠٠٨، ٣٠ مليون دولار كما أن قرابة ١٠ ملايين دولار قد وزعت عبر الهيئات الصغيرة. ● العدد الإجمالي للهيئات المقدمة في السنة المالية ٢٠٠٧ ولأرباع السنة الثلاثة الأولى للسنة المالية ٢٠٠٨ كان ٢,٢٢٩ هبة مع متوسط موافقة للهيئة من ١٣,٨١٥ دولار.
برنامج ازدهار	<ul style="list-style-type: none"> ● أقل البرنامج في ٢٠٠٨/٣/٣١. ● قدم برنامج ازدهار أكثر من ٢٧ مليون دولار على شكل قروض صغيرة بين ٢٠٠٣/٨ و ٢٠٠٨/٣. ● ذكرت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن معدل التسديد قارب ٩٩ بالمئة.
برنامج تجارة	<ul style="list-style-type: none"> ● تمت خلال ربع السنة هذا الموافقة على ثلاثة اقتراحات هبات بقيمة ٢ مليون دولار على شكل رأسمال قروض. ● البرنامج المسمى أيضاً برنامج النمو الاقتصادي في المحافظات، يساعد مؤسسات التمويل الصغير في إقامة حسابات مدفوعات مع فروع المصارف العراقية للقيام بأعمال صرف القروض ومعاملات التسديد. ● بتاريخ ٢٠٠٨/١٠/١٤، لم يكن البرنامج قد قدم أية هبات وسوف يباشر برنامجه هبات إلى قروض في الربع الأول من السنة المالية ٢٠٠٩.

البرنامج	تحديث البرنامج
برنامج استقرار المجتمعات المحلية (CSP)	<ul style="list-style-type: none"> • قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من ٨٥٠٠ هبة لتنمية الأعمال ضمن برنامج استقرار المجتمعات المحلية، إلى أصحاب مشاريع عراقيين. • بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢١، تمت الموافقة على أكثر من ٦٨ مليون دولار من الهبات وأنجز قرابة ٣٥ مليون دولار. • الهبات للمشاريع التجارية في بغداد مثلت حوالي ٤٦ بالمئة من إجمالي الإنفاقات، كما أن المشاريع التجارية في الأنبار قد منحت هبات تمثل حوالي ٢٧ بالمئة من المبالغ المنفقة.
صندوق الاستجابة السريعة	<ul style="list-style-type: none"> • بموجب صندوق دعم الاقتصاد، وسّع البرنامج فرص التمويل إلى أصحاب مشاريع عراقيين. • بتاريخ ٢٠٠٨/٩/٢٣، وافقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على هبات كبيرة بقيمة تزيد عن ٣٤ مليون دولار. • وافقت وزارة الخارجية على هبات صغيرة يبلغ مجموعها ١,٥ مليون دولار، وعلى مشتريات صغيرة بـ ١٧ مليون دولار ومشتريات مباشرة بقيمة إجمالية تبلغ ١٦ مليون دولار. ٥٠ بالمئة من المبالغ الموافق عليها قد صرفت.
برنامج التنمية المحددة الأهداف	<ul style="list-style-type: none"> • البرنامج الذي يديره مكتب المساعدة الانتقالية للعراق يضع تمويل الهبات مع منظمات غير حكومية. • أدار البرنامج ثلاثة دعوات للاقتراحات ومنح ٣٢ هبة بقيمة تزيد عن ٥٧,٤ مليون دولار - مُنفقاً كل مخصصات صندوق دعم الاقتصاد لهذا البرنامج.
الشركة العراقية لضمانات المصارف	<ul style="list-style-type: none"> • تشكلت هذه الشركة من ١١ مصرف عراقي خاص بدعم من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. • تقدم المنظمة الوصول إلى القروض لمؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة. • خلال ربع السنة هذا، تمت الموافقة على ١٤ قرض بقيمة ٧٨٧,٠٠٠ دولار.

المصدر: السفارة الأميركية في بغداد استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ وزارة الخارجية، تقرير القسم 2207، ٢٠٠٨/٩؛ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ وزارة الخارجية، نشرة صندوق الاستجابة السريعة، ٢٠٠٨/٩/٢٥؛ السفارة الأميركية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ ITAO IMU، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.

برامج المساعدة المالية الأميركية

تدير الولايات المتحدة عدة برامج لدعم التنمية الاقتصادية في العراق. النشاطات التي بدأت بموجب صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق تتواصل مع التمويل من صندوق دعم الاقتصاد وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد. قدمت عدة برامج أميركية أدوات التمويل لدعم تطوير مشاريع الأعمال العراقية. يقدم الجدول ٤١-٢ التفاصيل حول عدة برامج أميركية توسع آليات التمويل لتحفيز تنمية مشاريع الأعمال العراقية.

المشاريع الزراعية الأميركية

من أصل ٥٨١ مشروع ري وزراعة، تم إنجاز ٦٨ بالمئة منها^(٣٢٤). أن أكثر من ٥٦ بالمئة من إجمالي كلفة المشاريع الزراعية الأميركية مُركزة في أربع محافظات - ديالى، البصرة، بغداد وكربلاء. نصف الأموال المخصصة للمشاريع في محافظة ديالى وحدها^(٣٢٥). بالنسبة لوضعية تمويل إعادة الإعمار في هذا القطاع، أنظر الجدول ٤٢-٢.

الجدول ٢-٤
وضعية المشاريع الأميركية في قطاع الزراعة

الوضعية	عدد المشاريع	قيمة المشاريع	الري	عدد المشاريع	قيمة المشاريع
مُقرحة	٤	٣,٥٠ مليون دولار	١٤	١١٠,١٧ مليون دولار	
مُخططة	٤	٠,٥٨ مليون دولار	٧	١٤,١٣ مليون دولار	
في تقدم	٢٧	١٨,٢١ مليون دولار	١٦	٢١,٤٨ مليون دولار	
منجزة	٢٤٨	٤٠,٦٢ مليون دولار	٢٦١	٤٤,٨٢ مليون دولار	
المجموع	٢٨٣	٦٢,٩١ مليون دولار	٢٩٨	١٩٠,٦٠ مليون دولار	

المصدر: ITAO IMU، "نظرة إجمالية على الزراعة والري في العراق"، ٢٠٠٨/٦، ص ٩.



مزرعة الأسماك في الفرات

برنامج إنماء للتصنيع الزراعي

تواصل عدة برامج مُمولة من صندوق دعم الاقتصاد دعم المشاريع التي هي قيد التنفيذ في قطاع الزراعة. برنامج إنماء للتصنيع الزراعي يهدف إلى تحفيز نمو الزراعة التجارية وزيادة الإنتاج الزراعي لزيادة الإنتاجية.

- **معمل المعلبات في بلد (صلاح الدين) – مشروع بقيمة ٥ ملايين دولار لإعادة تأهيل كافة خطوط التصنيع الـ ١١ لثاني أكبر معمل للمعلبات في العراق.**^(٣٢٦)
- **مزرعة الأسماك في الفرات (بابل) – اتفاقية عقد بقيمة ٣,٦ مليون دولار لتأمين مكان التفقيس مع تمويل لشراء الأسماك الصغيرة لمساعدة المزارع في مضاعفة توقعاتها عن طريق إنتاج ١٢ مليون سمكة صغيرة.**^(٣٢٧)
- **مشروع الخضار في تاجي – أبو غريب – يزود ٩٠٠ مزارع بنفس المجموعة من البزور والأغطية البلاستيكية لحماية الخضار خلال موسم الشتاء.**^(٣٢٨)
- **مشروع البندورة في البصرة – يُخطط لشركة متكاملة تماماً لمعالجة وتصنيع البندورة الطازجة ويحتوي على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا مرافق التعليب والتصنيع.**^(٣٢٩)
- **سوق نيسان (بغداد) – يخطط لإعادة تموين السوق في بغداد وسوف يشمل إنجاز ستاندات العرض، والستائر الجرارة على الأكوشاك وتركيبات الكهرباء والسكريدية.**^(٣٣٠)

باشرت إنماء خلال ربع السنة هذا برنامج هبات لقروض سوف يزيد التمويل المتوفر للتصنيع الزراعي. وسوف تمنح إنماء الهبات لانتقاء المصارف التي سوف تقدم القروض لقطاعات التصنيع الزراعي.^(٣٣١)

في تدقيق حول نشاطات إنماء، ذكر مكتب المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وجود مشاكل في ٢ من أصل ١٢ نشاط في التصنيع الزراعي.^(٣٣٢)

- زيادة المبيع بالجملة للتمور بنسبة ١٥٠ بالمئة خلال ثلاث سنوات: وجد التدقيق أن هذا الهدف كان طموحاً أكثر من اللزوم نظراً للوضع الحالي لصناعة التمور التي تكافح الجفاف ومشاكل الحشرات المتواصلة. علاوة على ذلك، لم يبين برنامج إنماء على الجهود السابقة للمبادرة الزراعية للوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
- تقديم شهادات الماجستير في مواضيع التصنيع الزراعي لـ ٢٥ عراقياً خلال ثلاث سنوات: وجد التدقيق أن الخمسة ملايين دولار (٥) المخصصة لتغطية، على الأرجح، تكاليف المشاركين العراقيين سوف لن تستخدم لأنه لم يتم التعرف إلا على عدد قليل من المرشحين المؤهلين. وأوصى التدقيق بإعادة برمجة تلك الأموال لاستخدامها في أماكن أخرى.

الجهود الزراعية لفرق إعادة إعمار المحافظات

لوزارة الزراعة الأميركية (USDA) ٢٣ مستشاراً زراعياً يخدمون في فرق إعادة إعمار المحافظات في ١٥ محافظة^(٣٣٣). المستشارون الزراعيون الأميركيون في فرق إعادة إعمار المحافظات، ووزارة الزراعة الأميركية ورسميو الحكومة العراقية يعملون معاً لمعالجة آثار الجفاف الذي يصيب القطاع الزراعي في العراق. في آب/أغسطس ٢٠٠٨، خصصت الحكومة العراقية ١٦٧ مليون دولار عبر الموازنة التكميلية لدعم الجهود الرامية إلى التخفيف من آثار الجفاف^(٣٣٤).

فريق المهمة التابع لوزارة الدفاع لتحسين عمليات الأعمال التجارية والاستقرار في العراق

فريق المهمة لتحسين عمليات الأعمال التجارية والاستقرار في العراق الذي أطلق في حزيران/يونيو ٢٠٠٦، ركز جهوده على تحفيز استعادة العافية الاقتصادية والتوظيف في العراق. حُصص فريق المهمة حوالي ٢١٠ مليون دولار من أموال وزارة الدفاع؛ أكثر من ٣٤ بالمئة من هذا المبلغ قد أنفق^(٣٣٥). بالنسبة لتوزيع مخصصات قوة المهمة على مجموعات النشاط، باستثناء الإنفاقات على الخدمات الإدارية والداعمة، أنظر الجدول ٢-٤٣.

تواصلت خلال ربيع السنة هذا جهود فريق المهمة الرامية إلى توسيع القدرات المصرفية وتشجيع الاستثمار في العراق.

- تعزيز الشبكات المصرفية والمالية في العراق. من أجل اعتماد أوسع لإمكانيات نقل الأموال إلكترونياً (EFT)، تدعم قوة المهمة مركز مساعدة نقل الأموال إلكترونياً في بغداد. على الرغم من أن عمليات المركز تواجه التحدي المتواصل لانعدام الثقة بالمصارف العراقية، فإن المركز لم يذكر حتى الآن أنه عاش قضايا فساد^(٣٣٦). حوالي ٩٤ بالمئة من مدفوعات عقود القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان يجري تنفيذها الآن عن طريق استخدام نقل الأموال إلكترونياً. خلال النصف الثاني من السنة المالية ٢٠٠٨، تم دفع قرابة ٨٢ مليون دولار لعقود لأول بائعين عراقيين عبر نقل الأموال إلكترونياً، بالمقارنة مع ٢ مليون خلال الخمسة أشهر الأولى^(٣٣٧).

- تسهيل الفرص أمام شركات الاستثمار الدولية. ذكرت وزارة الدفاع أن الاستثمارات الخارجية المباشرة التي تسهلها قوة المهمة سوف تزيد عن مليار دولار في مشاريع جديدة هذه السنة، وأكثر من مليار دولار في استثمارات خاصة في الشركات العراقية التي تمتلكها الدولة. بتاريخ ٢٦ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كان هناك أكثر من ٥٠ اقتراح دولي قيد المعالجة لمشاريع استثمار سهلتها قوة المهمة مثل الفندق الفخم الجديد الذي بدأ بالظهور مؤخراً في بغداد^(٣٣٨).

الجدول ٤٣-٢
نظرة إجمالية ووضعية نشاطات قوة المهمة


النسبة المئوية للتغيير منذ تموز/يوليو ٢٠٠٨	مخصصات التمويل المقدرة (بملايين الدولارات)	الإستراتيجية	المجال المُركز عليه
+٤٥%	\$٧٦,٢٠	إعادة العمل واستعادة الإنتاج للقاعدة الصناعية العراقية المعطلة	استعادة القدرات الصناعية
+٦%	\$٣٦,٠٠	تسهيل فرص الاستثمار المباشرة من قِبَل المؤسسات والأسهم الخاصة والشركات	الاستثمارات الخاصة/الخصخصة
لا تغيير	\$١٧,٥٠	تحفيز تنمية البيئة التحتية للاتصالات السلكية واللاسلكية القادرة على دعم النشاط الاقتصادي.	البنية التحتية للاتصالات
لا تغيير	\$١٣,٥٠	دعم القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان عبر سياسات وعمليات وأنظمة لتوجيه عقود الحكومة الأميركية إلى شركات الأعمال العراقية الخاصة.	التحفيز الاقتصادي المباشر عبر عقود وزارة الدفاع
لا تغيير	\$٦,٠٠	تحفيز تنمية الخدمات المالية للقطاع الخاص والبنية التحتية التابعة لها.	الشبكات المصرفية والمالية
+٢١%	\$١٤٩,٢٠		المجموع

ملاحظة: ذكرت قوة المهمة أن مخصصات التمويل بين مختلف العناصر الأساسية يصعب تعيينها لأن الأموال موضوعة أحياناً كثيرة ضد الجهود التي تدعم أكثر من عنصر واحد. كذلك، فإن الجزء من الأموال المستخدمة للخدمات الإدارية والداعمة، مثل الأمن، ودعم الحياة والسفر ليست مدرجة.

المصادر: تدقيق المفتش العام 08-024، "معلومات حول دائرة خاصة من برنامج الدفاع لتحفيز استعادة العافية الاقتصادية في العراق"، ٢٩/٧/٢٠٠٨، TFBSO، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨.

اشكل ١٩-٢

المصانع التي تمتلكها الدولة التي تدعمها قوة المهمة لتحسين عمليات الأعمال التجارية والاستقرار.

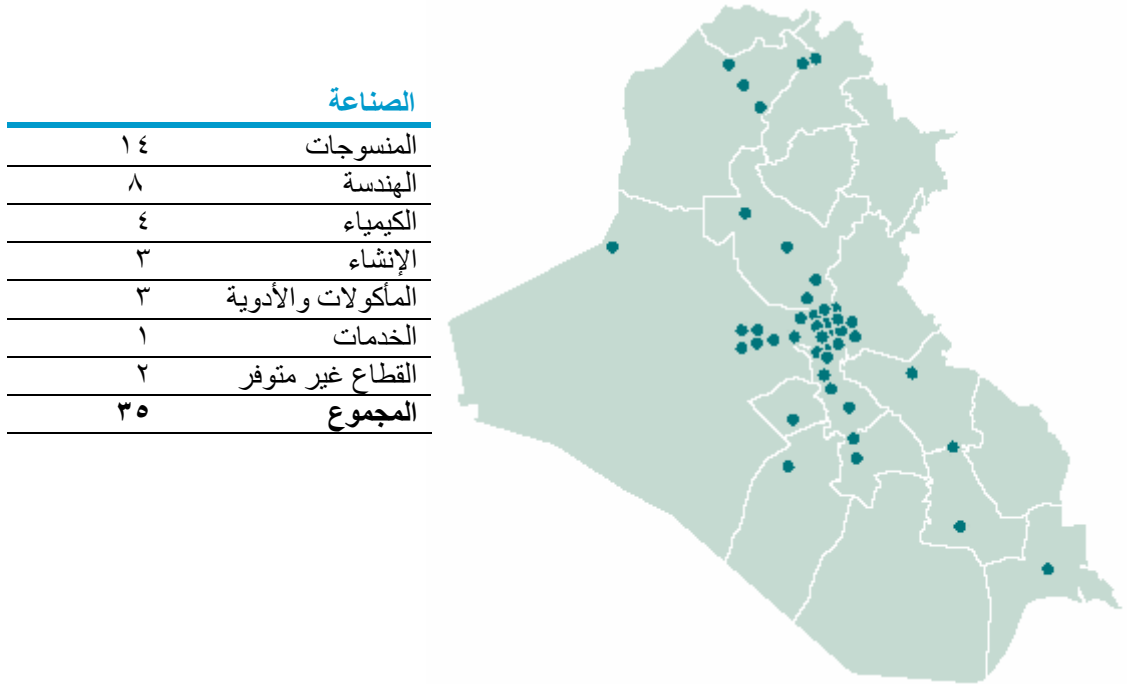

ملاحظة: الأماكن تقريبية. قدمت قوة المهمة خريطة تظهر المواقع حيث "أثرت على معمل"، وكذلك قائمة بالمشاريع التي تمتلكها الدولة (SOEs)، حسب الصناعة، المدعومة حسب نشاطاتها.
المصدر: مكتب وزير الدفاع، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢

في مراجعته لجهود قوة المهمة خلال ربع السنة الأخير، ذكر المفتش العام أن قرابة ٥٠ مليون دولار قد خصصت لإعادة العمل في المعامل في العراق. قدّرت فرقة المهمة أن إعادة العمل هذه نتج عنها وظائف لـ ٢٥,٠٠٠ عراقي^(٣٣٩). الشكل ١٩-٢ يقدم القطاع وأماكن المعامل التي تتلقى المساعدة من قوة المهمة. سوف يصدر المفتش العام مراجعة جديدة لمبادرات قوة المهمة في ربع السنة القادم.

أول برنامج عراقي

سعى إداريو إعادة الإعمار إلى تعزيز التنمية الاقتصادية المحلية عن طريق تشجيع شراء السلع والخدمات من المواطنين المحليين. وعملت القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان مع قوة المهمة على تعيين البائعين العراقيين لعقود إعادة الإعمار. بين الأول من آب/أغسطس ٢٠٠٧ و ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٨، نفذت القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان قرابة ١٥,٠٠٠ عملاً تعاقدياً تقدر بأكثر من ٣ مليارات دولار.^(٣٤٠)

خلال آب/أغسطس ٢٠٠٨، قرابة ٢١ بالمئة من كافة منح القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان خلال السنة قد مُنحت إلى بائعين عراقيين.^(٣٤١)

الحكم

منذ ٢٠٠٤، خصصت الولايات المتحدة ٣,٧ مليار دولار وألزمت ٣,٣٦ مليار دولار وأنفقت ٢,٢١ مليار دولار لنشاطات الحكم في العراق بما في ذلك برامج الديمقراطية وبناء القدرات، ومساعدة اللاجئين، وبرامج دعم حقوق الإنسان والتعليم^(٣٤٢). من هذه المبالغ، ألزمت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من ١,٩ مليار دولار لبرامج الديمقراطية^(٣٤٣).

بالنسبة لوضع أموال إعادة الإعمار الأميركية في البرنامج الذي ينفذ نشاطات الحكم، أنظر الشكل ٢-٢٠. بالنسبة للتوزيع حسب الفئات لمختلف برامج إعادة الإعمار حسب القطاعات التي حددها المفتش العام، أنظر الملحق د.

الديمقراطية والمصالحة

الأعمال التشريعية والتنفيذية الأساسية التالية ضرورية لمساعدة العراق في الانتقال بسرعة باتجاه المصالحة الوطنية:

- إجراء الانتخابات في المحافظات
- فرض المادة ١٤٠ من الدستور العراقي
- تمرير تشريع الهيدروكربون
- تنفيذ تشريع مكافحة الفساد
- تمرير قانون مقولي الأمن الخاص


بالنسبة للجدول الزمني للتقدم الحاصل فيما يخص إجراءات التشريعات العراقية الأساسية، أنظر الشكل ٢-٢١.

انتخابات المحافظات

لقد ظلت الانتخابات في المحافظات معلقة لمدة طويلة في العراق. *قانون انتخابات المحافظات* الذي سيحكمها مرر أخيراً من قِبَل مجلس النواب في ٢٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨^(٣٤٤). فباستثناء محافظة التأميم وكرديستان، من المقرر أن تجري الانتخابات في المحافظات بحلول ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩^(٣٤٥).

وفقاً للمادة ٢٣ من قانون انتخابات المحافظات، سوف تجري المحافظات الكردية (دهوك وإربيل والسليمانية) الانتخابات لاحقاً هذه السنة بسبب الخلاف القائم حول الإحصاءات الديموغرافية المذهبية^(٣٤٦). في المحافظات الأخرى، أعلنت معظم الأحزاب الكبرى تأييدها لهذه الانتخابات – وهي خطوة كبرى في التطور السياسي في العراق التي سوف تُمهّد الطريق للانتخابات الوطنية في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٩^(٣٤٧).

الشكل ٢-٢٠
وضعية الأموال الأميركية الداعمة للاقتصاد العراقي
بمليارات الدولارات



ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير. بالنسبة لمنهجية كيفية جمع البرامج الأميركية في فئات (الأمن، البنية التحتية، الاقتصاد والحكم)، انظر الملحق (د). الالتزامات والإنفاقات حسب فئات المفتش العام قد تختلف عن الإلتزامات والإنفاقات الواردة في ملخص التمويل الأميركي. لم يتلق مكتب المفتش العام تقارير على مستوى المشاريع أو القطاعات من كافة الوكالات، كما أن بعض المعلومات تم جمعها من نظام إدارة وإعادة إعمار العراق. تشمل الأرقام فقط تمويل صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2)، صندوق قوات الأمن العراقية (ISSF)، صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).

المصادر: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية استجابة لطلب المفتش العام للبيانات؛ ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق استجابة لطلب المفتش العام للبيانات؛ ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ نظام إدارة إعمار العراق، صندوق دعم الاقتصاد، كلفة الإنجاز، ٢٠٠٨/٩/٣٠؛ وزارة الخارجية، تقرير وضعية العراق الأسبوعي، ٢٠٠٨/١٠/١؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات، ٢٠٠٨/١٠/١٤. تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ فرقة منطقة الخليج، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.

المادة ٥٠

قانون انتخابات المحافظات لا يتضمن المادة ٥٠ من القانون الإداري الانتقالي الذي يحجز مقاعد للأقليات في عدة مجالس للمحافظات (PCs)^(٣٤٨). تواصل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI) استشاراتها مع القادة السياسيين ومع مجموعات الأقليات لضمان إعادة إدخال هذا البند إلى مجلس النواب.^(٣٤٩)

المادة ١٤٠

خلال ربع السنة هذا، تم تحقيق تقدم قليل حول المادة ١٤٠، التي تتحدث عن عملية تطبيع واستفتاء حول الأراضي المتنازع عليها. لقد قدمت بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق المساعدة للقادة العراقيين وأنجزت مؤخراً ما توصلت إليه بخصوص المناطق المتنازع عليها هذه في شمال العراق.^(٣٥٠)

- أكر
- الحمدانية
- مقاطعات مخمور
- مقاطعات مندلي الفرعية في بلادروز

تخطط بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق لإصدار تقارير حول المناطق المتنازع عليها المتبقية في شمال العراق، بما فيها التأميم، خلال ربع السنة القادم.^(٣٥١)

قانون تشكيل المناطق الذي مُرّر في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦، تضمن شرطاً يقول ان القانون لن يصبح ساري المفعول لغاية نيسان/إبريل ٢٠٠٨. في شباط/فبراير ٢٠٠٨، مرّر مجلس النواب القانون الذي

يحكم/يحدّد سلطات المحافظات التي لم تشكل في مناطق. الخطوات من أجل تشكيل منطقة إجراءات تتخذها مجالس المحافظات التي سوف تُنتخب بموجب قانون انتخابات المحافظات في نهاية كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى في العراق (ISCI) وأحزاب الفضيلة يبدون اهتماماً في تشكيل منطقة في الجنوب.^(٣٥٢)

الشكل ٢-٢١
وضعية التشريعات العراقية لتشجيع المصالحة الوطنية

الوضعية	نشر القانون في الجريدة الرسمية	إجراءات المصادقة	التصويت	مسودات عدلتها اللجنة	مسودات حوّلت إلى لجنة مجالس النواب	قوانين صيغت وتمت مراجعتها
دستور الحكومة العراقية	تمّت الموافقة على الدستور العراقي في استفتاء وطني أجري في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥، لكن الحكومة العراقية لم تنجز مراجعتها الدستورية لحل وضعية الأراضي المتنازع عليها وميزان القوى بين الحكومة الفدرالية وحكومات المحافظات.	تاريخ غير معروف	تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥	تاريخ غير معروف	أب/أغسطس ٢٠٠٥	حزيران/يونيو ٢٠٠٥
قانون الانتخابات الوطنية	أجريت أول انتخابات وطنية في ٢٠٠٥/١٢/١٥، كما أن الانتخابات القادمة مقررة في ٢٠٠٩/١٢.	تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٤	حزيران/يونيو ٢٠٠٤	تاريخ غير معروف	كانون الثاني/يناير ٢٠٠٤	أب/أغسطس ٢٠٠٥
قانون انتخابات المحافظات	من المقرر أن تجري انتخابات المحافظات بحلول ٢٠٠٩/١/٣٢ باستثناء كردستان ومحافظة التأميم.	أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨	شباط/فبراير ٢٠٠٨	تموز/يوليو ٢٠٠٨	كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨	تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧
قانون سلطات المحافظات	يدخل القانون حيز التنفيذ عند إجراء الانتخابات في المحافظات (المخططة في ٢٠٠٩/١/٣١).	شباط/فبراير ٢٠٠٨	شباط/فبراير ٢٠٠٨	أب/أغسطس ٢٠٠٨	كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨	تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧
قانون العفو	التطبيق قيد الإجراء؛ غير أن عدد المعتقلين والمساجين المؤهلين لإطلاق سراحهم بموجب القانون غير واضح لأن الوكالات العراقية تفتقر إلى قواعد البيانات المندمجة والمحدثة لتعقب أعداد المعتقلين.	تاريخ غير معروف	شباط/فبراير ٢٠٠٨	تاريخ غير معروف	كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨	تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧
قانون الهيدروكربون	أعدت الحكومة العراقية ثلاث مسودات من أصل أربعة أجزاء قوانين ضرورية لإقامة السيطرة على وإدارة موارد الهيدروكربون العراقية وضمنان التوزيع العادل للعائدات. فقط مسودة نطاق عمل الهيدروكربون عرضت على مجلس النواب - كردستان والحكومة الفدرالية غير متفقين على عدة جوانب من القانون المقترح - وعلى الأخص حول مدى السيطرة التي ستكون لحكومة منطقة كردستان في إدارة مواردها من النفط.	تاريخ غير معروف	شباط/فبراير ٢٠٠٨	تموز/يوليو ٢٠٠٧	آذار/مارس ٢٠٠٧	شباط/فبراير ٢٠٠٧
قانون مقاولي الأمن	تتناقش لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب دمج مسودتين للقانون. القراءة الثانية لم تحدث بعد.				أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨	أب/أغسطس ٢٠٠٨

المصادر: وزارة العدل العراقية، www.iraqilegislations.org/laws، accessed ٤/١٠/٢٠٠٨؛ مجلس النواب العراقي، "مسودات القوانين"، <http://www.parliament.iq/>، accessed ٤/١٠/٢٠٠٨؛ مجلس النواب العراقي، "نشر القوانين"، <http://www.parliament.iq/>، accessed ٤/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المحاسبة الحكومية، تأمين استقرا وإعادة بناء العراق؛ تقرير التقدم: بعض المكاسب التي تحققت، الإستراتيجية المحدثة الضرورية، ٢٣/٧/٢٠٠٨؛ السفارة الأميركية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨.

تنظيم الانتخابات

في تموز/يوليو ٢٠٠٨، بدأت اللجنة العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) الإعداد للانتخابات المحافظات لضمان أن يكون للعراقيين الوقت الكافي للوصول إلى المعلومات حول العملية الانتخابية^(٣٥٣). تساعد الأمم المتحدة في الجهود الرامية إلى تنظيم الانتخابات، فتدرب وتبني قدرات موظفي الانتخابات، وتساعد المئات من المنظمات الوطنية غير الحكومية (NGOs) في إطلاق مؤسسة التربية الانتخابية.

على اللجنة العليا المستقلة للانتخابات التغلب على التحديات اللوجستية والتنظيمية في تنظيم عملياتها وتنفيذ مشتريات معقدة، وجمع وتوزيع المواد الانتخابية. ألزمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أكثر من ١٠٢ مليون دولار وأنفقت أكثر من ٦١ مليون دولار لدعم الهيئة مع التحضيرات للانتخابات في المحافظات^(٣٥٤). تقدم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، عبر المستشارين المتواجدين ضمن اللجنة العليا المستقلة للانتخابات والذين يعملون في المحافظات مع مكاتب المحافظة الانتخابية (GEOS)، التدريب والدعم الإداري لتسهيل الانتخابات القومية والمحلية^(٣٥٥).

قانون الهيدروكربون

لا يزال التقدم حول سلة قانون الهيدروكربون متوقفاً. وهكذا ستكون لدى الحكومة فرص قليلة لمنح العقود لشركات النفط الأجنبية وعلى أسس خاصة إلى حين تمرير الأجزاء الأربعة من قانون الهيدروكربون^(٣٥٦).

قانون العفو

في شباط/فبراير ٢٠٠٨، مرّرت الحكومة العراقية قانون العفو الذي يسمح بمنح العفو للمعتقلين في السجون العراقية ما لم يكونوا قد حكم عليهم بالإعدام أو إذا كانت التهم الموجهة إليهم ليست ضمن لائحة الإعفاءات^(٣٥٧). غير أنه مطلوب من المعتقلين تقديم عريضة تلتزم العفو عبر اللجان التي سوف تشكل أولاً في المحافظات. عدد المعتقلين والمساجين المؤهلين لإطلاق سراحهم بموجب قانون العفو غير واضح لأن الوكالات العراقية تفتقر إلى قواعد البيانات المدمجة والمُحدّثة لعدد المعتقلين^(٣٥٨). ويحدث أحياناً كثيرة أن تصدر المحاكم أوامر لا يتم تنفيذها بسبب التقصير وغياب التنسيق بين الوزارات. وزير حقوق الإنسان ومكتب رئيس الوزراء يعملان لأجل توحيد جهود الوزارات الأخرى بغية التطبيق الفعال للقانون^(٣٥٩).

قانون مكافحة الفساد

القانون المقترح المتعلق بسلطات لجنة النزاهة (CoI)، والمجلس الأعلى للتدقيق (BSA) والمفتشين العاميين للوزارات (IGs) لم ينجح في إنجاز قراءة ثانية، في مجلس النواب، في حزيران/يونيو، وأعيد لاحقاً إلى مكتب رئيس الوزراء. يحاول القانون الجديد وضع تشريع لسلطات وكالات مكافحة الفساد في العراق التي وُضعت أولاً بموجب الأوامر ٥٥، ٥٧ و ٧٧ لسلطة الائتلاف المؤقتة. وعلى الرغم من أن مسودات للقوانين الجديدة لمكافحة الفساد قد وُضعت في التداول منذ حزيران/يونيو ٢٠٠٨، فإن أي عرض رسمي لها على مجلس النواب لم يجر^(٣٦٠).

الجهود الدولية لمكافحة الفساد

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أطلقت الأمم المتحدة خطة خمسية لمساعدة العراق في منع ومكافحة الفساد^(٣٦١). هذه المبادرة التي يمولها جزئياً صندوق الائتمان العراقي لدى مجموعة التنمية في الأمم المتحدة سوف يقوم بها مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم (UNDOC) وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) لأجل تعزيز هيئات مكافحة الفساد الرئيسية في العراق ولتشجيع التعاون بينها عبر مجلس مكافحة الفساد المشترك. وبالتناغم مع معاهدة الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، سوف توجه المشاريع نحو تعزيز المنع والشفافية والمساءلة والنزاهة في القطاعات الخاصة والعامة. ويهدف البرنامج أيضاً إلى تعزيز قدرات رسميي مكافحة الإرهاب العراقيين على منع واكتشاف والتحقيق في غسل الأموال وتمكينهم من استرجاع الأصول^(٣٦٢).

الجهود الأميركية في محاربة الفساد

تواصل السفارة الأميركية ووزارة الخارجية (DoS) إعادة النظر في خططها لإدارة نشاطات مكافحة الفساد دعماً للحكومة العراقية. مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد التابع للسفارة الأميركية (ACCO) منح هبة بقيمة ٨ ملايين دولار إلى برنامج الأمم المتحدة للتنمية وإلى مكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجرائم خلال ربع السنة هذا لإجراء برمجة لمدة سنتين لمكافحة الفساد في العراق.^(٣٦٣)

سوف يُركز البرنامج على التقيد باتفاقية الأمم المتحدة ضد الفساد التي تبنها العراق هذا العام. تشمل النشاطات إجراء تقييم شامل للفساد في العراق والعمل مع الحكومة العراقية لتطوير إستراتيجية قومية مقاومة للفساد لتشجيع المساءلة والشفافية والحكم الصالح على مستوى الحكومات في المناطق والمحافظات. مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد هو بصدد المراحل النهائية لمنح الهبات لتعزيز إطار العمل التشريعي لمحاربة الفساد في العراق ولتعزيز الآثار العامة البعيدة (public outreach) للهيئات العراقية المقاومة للفساد.

يواصل مكتب شؤون المخدرات الدولية وفرض تطبيق القانون (INL) رعاية البرنامج الدولي للمساعدة على التدريب في التحقيقات الجنائية (ICITAP). لقد أدار المستشارون قرابة ١٧٥٦ ساعة من التدريب على توجيه التحقيقات لمحقيقي هيئة النزاهة و ٧٢٠ ساعة من التدريب على التحقيقات. خلال ربع السنة هذا، حوّلت ٣٠ قضية تحقيق جديدة إلى قضاة التحقيق في العراق كما أن السجل يضم الآن ١٨٨ قضية قيد التقدم.^(٣٦٤)

الإصلاح الدستوري

لجنة المراجعة الدستورية (CRC) التي تعد ٢٩ عضواً، مسؤولة عن مراجعة واقتراح الإصلاحات للدستور المنطور. التقرير النهائي للمسودة أنتج في آب/أغسطس ٢٠٠٨ – أي بعد ١٧ شهر على الموعد الأصلي المقترح – وتستوجب اتفاقات على أكثر من ٥٠ تعديل دستوري. في أيار/مايو ٢٠٠٧، أصدرت لجنة المراجعة الدستورية تقريراً مؤقتاً أكدّ على ضرورة معالجة تلك القضايا التي لا تزال دون حلّ من قبل المجلس التنفيذي.^(٣٦٥)

- السلطات الرئاسية
- السلطات الإقليمية مقابل السلطات الفدرالية
- وضعية محافظة التأميم (المادة ١٤٠)

قانون الشركات الأمنية الخاصة

أجرى مجلس النواب القراءات الأولى لمسودتي قانونين يحكمان حصانة الشركات الأمنية الخاصة (PSC). تسحب المسودتان الحصانة بالنسبة للشركات الأمنية الخاصة، لكن المسودة الأقصر تحتفظ بالترخيص وبتسجيل البرامج التي هي أقل عرقلة من المسودة الأولى. لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب تناقش حالياً مسألة دمج المسودتين كما أن القراءة الثانية لم تحصل بعد.^(٣٦٦)

التغيرات بخصوص حصانة الشركات الأمنية الخاصة سوف تؤثر على جهود إعادة الإعمار في العراق. خلال مناقشات غير رسمية مع السفارة الأميركية، أشار العديد من الشركات الأمنية الخاصة إلى أنها سوف تغادر العراق حالما ترفع الحصانة. إذا رحلت الشركات الأمنية الخاصة بأعداد كبيرة، سوف تضطر جهود إعادة الإعمار الأميركية للاعتماد على الأمن العسكري الأميركي، وإلى زيادة عدد الشركات الأمنية الخاصة مع الأمن المحلي أو إلى خفض العمليات.^(٣٦٧)

البرامج الأميركية الداعمة لبناء الديمقراطية في العراق

منذ ٢٠٠٤، ألزمت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية قرابة ٢ مليار دولار لبرامج بناء الديمقراطية في العراق - أكثر من ٩٣ بالمئة تحت إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية^(٣٦٨). من هذه الإلتزامات، هناك قرابة ١,٢ مليار دولار في مشاريع لا تزال قيد التنفيذ. بالنسبة لنظرة إجمالية حول نشاطات بناء الديمقراطية لهاتين الوكالتين، أنظر الجدول ٢-٤٤. مع إقفال مشاريع إعادة الإعمار، تلقت برامج الديمقراطية والحكم مخصصات أعلى نسبياً من أموال إعادة الإعمار الأميركية.

هذا القسم يلقي الأضواء على عدة برامج قيد التنفيذ مُمولة من صندوق دعم الاقتصاد وتنفيذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية، ويقدم أمثلة عن نشاطات بناء الديمقراطية كما ذكرتها الوكالات.

الجدول ٢-٤٤

نشاطات بناء القدرات والديمقراطية الجارية من قِبَل الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ووزارة الخارجية

البرنامج	الالتزامات (بملايين الدولارات)	الهدف	الإِنجاز المبرمج
برامج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية			
برنامج الحكم المحلي	\$٣٧٠	لتعزيز الحكومات المحلية	٢٠٠٨/١٢
البرنامج الوطني لتنمية القدرات	\$٣٣٩	لبناء قدرات وزارات حكومة العراق الوطنية	٢٠٠٩/٧
برنامج عمل الجماعات	\$١٥٠	لتشجيع وتأمين الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي لدى الجماعات العراقية	٢٠٠٨/٩
صندوق الاستجابة السريعة	\$٣٠	لدعم المجتمع المدني وبناء الممارسة الديمقراطية عبر فرق إعادة الإعمار في المحافظات	٢٠٠٨/١٢
برنامج المساعدة السريعة للعراق	\$٥٣	لتقديم المساعدة الفنية إلى اللجنة العليا المستقلة للانتخابات (IHEC) استعداداً للانتخابات	٢٠١٠/١٢
الإصلاح السياسي التنظيمي	\$٢٤	لتحسين إطار العمل التشريعي للحكومة العراقية	٢٠١٠/٩
برامج وزارة الخارجية			
المنحة الوطنية للديمقراطية - هبة	\$٧١	لمساعدة التحول الديمقراطي في العراق ولتشجيع تنمية مجتمع مدني ووسائل إعلام شرعيين للعمل بصورة مستقلة	٢٠٠٩/٣
المعهد الديمقراطي الوطني - هبة	\$٥٠	لتشجيع الحوار السياسي البناء ومشاركة الحكومة العراقية	٢٠٠٩/٣
المعهد الجمهوري الدولي - هبة	\$٥٠	للمساعدة في تدريب الحكم العراقي والمجتمع المدني والأحزاب السياسية	٢٠٠٩/٣
الهيئات الأصغر	\$٤٤	متوسط الهيئات الـ ١١ المنتقبة حوالي ٤ ملايين دولار للهيئة الواحدة وتمول الدعم لوسائل الإعلام المستقلة في العراق، والتدريب على المصالحة الوطنية والمساعدة في التحول الديمقراطي، من بين النشاطات الأخرى	غير متوفر
مجموع البرامج قيد التنفيذ			
			\$١,١٨١

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصدر: تدقيق المفتش العام 09/001 "فرص تعزيز الإستراتيجية الأميركية لبناء الديمقراطية في العراق" ٢٠٠٨/١٠.

الخطة الإستراتيجية لجهود الديمقراطية في المستقبل

تدير وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية الإستراتيجية الأميركية لتقدم وتعزيز الديمقراطية والحكم في العراق. وجد تدقيق للمفتش العام خلال ربع السنة هذا أن الإستراتيجية لا تُلبّي الأهداف التالية:^(٣٦٩)

- معالجة كيفية تكامل الغايات والأهداف الأميركية مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية.

- تتضمّن التكاليف الحالية والمستقبلية لتطبيق الإستراتيجية مثل تكاليف بناء قدرات الحكومة العراقية على مستوى المحافظات والمستوى القومي.
- تعيين المساءلة لتطبيق الجوانب الكبرى للإستراتيجية.

لاحظ التدقيق أن بإمكان وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحسين تقييماتهما بخصوص التقدم الحاصل في بلوغ أهداف الإستراتيجية. فعلى الرغم من أن وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تلقتا تقارير تصف التقدم الحاصل في البرامج الفردية، إلا أن هذه التقارير لا تظهر بصورة كاملة التقدم نحو الأهداف الأوسع للإستراتيجية أو الحصيلة المتوقعة. بالنسبة لمخلص حول النتائج والتوصيات، أنظر القسم ٤ من هذا التقرير.

برنامج عمل الجماعات

في آب/أغسطس ٢٠٠٨، أجرى مكتب المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تدقيقاً لبرنامج عمل الجماعات الثاني وقدم أربع توصيات. حالياً، تعالج الوكالة الأميركية للتنمية الدولية اثنتين من التوصيات الأربع:^(٣٧٠)

- إعادة تقدير ما إذا كانت الأهداف الحالية واقعية وتضمن ان الأهداف الواقعية متضمنة في خطة إدارة الأداء ونظام إصدار التقارير عن المشاريع.
- تطوير الإجراءات لضمان توثيق التغييرات في مؤشرات الأداء والأهداف بصورة مناسبة.

برنامج الحكم المحلي

منذ ٢٠٠٥، شارك أكثر من ٣٢,٦٠٠ عراقي في ٨٣٠٠ اجتماع لتثقيف المواطنين حول الديمقراطية والانتقال السياسي عبر برنامج الحكم المحلي للوكالة الأميركية للتنمية الدولية (LGP)^(٣٧١). علاوة على ذلك، درب برنامج الحكم المحلي ٨٨٢٥ عضو مجالس، و ١٨ حاكماً (محافظاً) و ١٨ نائب محافظ و ٣٣٠ مدير عام كما وموظفين أساسيين في ٤٠٠ دائرة وجميع أعضاء مجالس المحافظات الذين انتخبوا في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٥.^(٣٧٢)

مؤخراً، استضاف برنامج الحكم المحلي ورشة عمل حول المساءلة هدفت إلى الإتيان بمزيد من الشفافية داخل الحكومة. انضم إلى الاجتماعات أكثر من ٧٠ قائد عراقي من مجلس محافظة بغداد إلى أعضاء مجالس أحياء بغداد ومكتب محافظ بغداد.^(٣٧٣)

خلال ربع السنة هذا، أكمل مكتب المفتش العام تدقيقاً مُركزاً حول مقاول الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الذي طبق برنامج الحكم المحلي^(٣٧٤). درس التدقيق عقدين تزيد قيمتهما عن ٥٩٨ مليون دولار كانا قد مُنحا إلى معهد مثلث الأبحاث (RTI) سنة ٢٠٠٣، ووجد التدقيق أن التكاليف لا تتوافق بسهولة مع الحصيلة وأن إنجازات العقدين كانت في البداية غير واضحة. غير أن إدارة العقد والإشراف قد تحسّنا في السنوات الأخيرة. بالنسبة لمخلص عن النتائج والتوصيات، أنظر القسم ٤ من هذا التقرير.

صندوق الاستجابة السريعة

وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تتفان معاً مشاريع صندوق الاستجابة السريعة (QRP) لتسريع القدرات على مستوى الحكومات المحلية ولتحفيز التنمية المحلية في تشكيلة واسعة من القطاعات بما فيها الزراعة، التعليم، وسائل الإعلام، التمويل الصغير وحكم القانون.^(٣٧٥)

بتاريخ ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، تمت الموافقة على ٦٨,٤ مليون دولار عبر هيئات صندوق الاستجابة السريعة لـ ٢٠٦٥ برنامج، كما تم صرف ٣٤ مليون دولار. بالنسبة لمخصص لهيئات صندوق الاستجابة السريعة حسب الأهداف، أنظر الجدول ٢-٤٥.

لقد تم خلال ربع السنة هذا توقيع هبة من صندوق الاستجابة السريعة لتأمين اللوازم والمعدات الطبية الأساسية بقيمة ٢٠٠,٠٠٠ دولار لتعزيز قدرات الاستجابة لحالات الطوارئ في مستشفى الإسكندرية بمحافظة بابل.^(٣٧٧)

برنامج الاستقرار للجماعات المحلية

برنامج الاستقرار للمجتمعات المحلية يستجيب للحاجات الأساسية للجماعات العراقية ويُدار بالتعاون الوثيق مع الحكومات القومية والمحلية، والقطاع الخاص وفرق إعادة إعمار المحافظات.^(٣٧٨)

الجدول ٢-٤٥

القطاعات التي تستخدم هيئات برنامج الاستقرار للجماعات المحلية

القطاعات	تمت الموافقة عليها	صُرِفَت	صُرِفَت %
الزراعة	\$٦,٩٢٣,٤٣٦	\$٤,٤٠٠,١٣٤	%٦٤
التنمية الاقتصادية	\$٩,٦٠٥,٨٦٢	\$٤,٩٦٨,٦٢٦	%٥٢
المجتمع المدني	\$٧,٤٣٩,٢٧٥	\$٤,٧١١,٠٨٢	%٦٣
التعليم	\$١٠,٧٤٣,٤٥٥	\$٣,٤٩٢,٧٥٢	%٣٣
الحكم	\$٩,٧٤٠,٤٥٩	\$٤,٤٩٠,٨٨٠	%٤٦
تنمية الأعمال التجارية	\$٤,٤٧٠,٤٢٦	\$٢,٦٤٥,٩٤٥	%٥٩
الصحة	\$٦,٦٤٣,٧٣٧	\$٢,٣٣٣,٩٣٨	%٣٥
البرامج النسائية	\$٣,٨٤٢,٨٩٧	\$٢,٧١٤,٢٩٦	%٧١
برامج الشباب	\$٢,٩٨٣,٣٧١	\$٢,٥٥٢,٧٣٠	%٨٦
حكم القانون	\$٢,٦٢٤,٧٨٠	\$١,٤٣١,٨٦٤	%٥٥
أخرى	\$٣,٣٣٧,٦٠٤	\$٢١٠,٥٢٠	%٦

المصدر: وزارة الخارجية، نشرة صناديق الاستجابة السريعة، ٢٠٠٨/٩/٢٥

نظم برنامج الاستقرار للجماعات المحلية ووزارة الشباب رابطات لكرة القدم الأميركية على طراز تلك التي في الولايات المتحدة^(٣٧٩). تهدف دورات كرة القدم الأميركية إلى بقاء الشباب منخرطين في بدائل بناءة لنشاطات التجنيد التي تقوم بها الميليشيات. رعى برنامج الاستقرار للجماعات المحلية ١٤ دورة لكرة القدم الأميركية (بكلفة ١,١ مليون دولار) عبر محافظة بغداد. سمح البرنامج لأكثر من ٤٠,٠٠٠ فتى وفتاة عراقيين بالمشاركة في الأحداث التي أقيمت في المنزهات العامة التي أعيد تجديدها.^(٣٨٠)

البرامج الأميركية لتنمية القدرات

تواصل جهود بناء القدرات الوزارية العراقية التركيز على الإشراف الداخلي وتوسيع فرق مستشاري الائتلاف. تقود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق الجهود لتقييم الأداء الوزاري الحالي ومتابعته عبر خطط الأعمال ذات الأولوية، والمعالم والحصيلة. يعمل المستشارون الأميركيون مباشرة مع كل وزارة أو كل كيان له مستوى تنفيذي. بالنسبة لتوزيع الموظفين المدنيين في الوزارات بتاريخ ١١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أنظر الجدول ٢-٤٦.

بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، تم إلزام قرابة ٣٠٠ مليون دولار على شكل مخصصات لبرنامج تنمية القدرات القومي (NCD) المعروف أيضاً بالاسم العربي للتنمية، "تطوير"^(٣٨١). ساعد البرنامج منذ آب/أغسطس الحكومة العراقية في بناء قدرات الإدارة العامة والتدريب المهني.

الجدول ٢-٤٦

المستشارون الأميركيون في وزارات الحكومة العراقية وفي المكاتب التنفيذية

مستشارو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية	مستشارو السفارة الأميركية	وزارات الحكومة العراقية
٥	١٢	مكتب إدارة البرامج PMO/ComSec
٧	٩	الكهرباء
١٠	٥	النفط
٤	٦	الصحة
١	٧	العدل
٧	٥٥	التخطيط والتنمية
٥	١١	الزراعة
٠	٢	التعليم
٣	٠	البلديات والاشغال والعامة
٥	٢	المياه
٤	٩	المالية
٠	١١	النقل
١٦	٤٩	متعدد
٧	٠	التجارة
١	٠	L&SA
٧٥	١٧٨	المجموع

المصدر: الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤

أدار برنامج تطوير خلال ربع السنة هذا عدة نشاطات عبر كافة المحافظات بما في ذلك:^(٣٨٢)

- ٣٧١ صف لحوالي ٧٦٠٠ إنسان
- تدريب على مكافحة الفساد، والمشتريات والموارد البشرية لـ ٢٨٣ عضو من موظفي المفتشين العاملين في الوزارات.

قامت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بنقل ملكية قدرات التدريب المتنامية إلى الحكومة العراقية كما أن أكثر من نصف أعمال التدريب الممولة من "تطوير" يقوم بها العراقيون^(٣٨٣). الجدول ٢-٤٧ يقدم تحديثات إضافية لنشاطات "تطوير" داخل الوزارات العراقية خلال ربع السنة هذا.

مراكز المساعدة للمشتريات الممولة من الولايات المتحدة

تواصل الحكومة العراقية مراجعة الدعم الأميركي لنشاطاتها الخاصة بالمشتريات العامة. برنامج مراكز المساعدة للمشتريات (PAC) الذي يديره العراقيون، وفرق المساعدة للمشتريات في المحافظات (PPATs) ثُمولها وتديرها قوة المهمة لتحسين الأعمال التجارية وعمليات الاستقرار (قوة المهمة). هناك ثلاثة مكاتب لمراكز المساعدة للمشتريات (إثنان في بغداد وواحد في إربيل). فرق المساعدة للمشتريات في المحافظات متواجدة حالياً في كافة المحافظات باستثناء دهوك وميسان، كما أن بغداد تتلقى المساعدة من مركز المساعدة للمشتريات.^(٣٨٤)

الجدول ٢-٤٧

النقاط البارزة في نشاطات "تطوير" في الوزارات العراقية

الوزارة	الوضعية
وزارة الكهرباء	وقعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / تطوير ووزارة الكهرباء مذكرة تفاهم لتعزيز التزام الحكومة الأميركية مواصلة مساعدتها للوزارة في تحسين الأنظمة الإدارية والتدريب مع تشديد على الإدارة المالية وإعداد وتنفيذ الموازنة، والمشتريات وإدارة المشاريع.
وزارة البلديات والأشغال العامة	أمن مستشارو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / تطوير التدريب لوزارة البلديات والأشغال العامة على خمسة عشر (١٥) وحدة تخطيط في المحافظات في FoxPro البصري. البرنامج هذا يُستخدم لتخزين وتحليل معلومات مشاريع الاستثمار الرأسمالي وسوف يسمح لوحدات التخطيط في المحافظات بتعقب التقدم ورفع التقارير مباشرة إلى بغداد حول مشاريعهم الخاصة.
وزارة الصحة	تلقت وزارة الصحة المساعدة من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / تطوير في صياغة خطة إستراتيجية للنظام الصحي في العراق. كانت حصيلة ورشة العمل بيان رؤيوي للوزارة كما أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية / تطوير تلعب دوراً أساسياً في صياغة الخطة الإستراتيجية لوزارة الصحة لسنة ٢٠٠٩ - ٢٠١٣.

ملاحظة: منذ مطلع ٢٠٠٨، قدمت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية التدريب للمفتشين العامين في ١٠ وزارات على الأقل.
المصدر: السفارة الأميركية في بغداد استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨.

تُحلل الولايات المتحدة بيانات المشتريات التي ترفع فرق المساعدة للمشتريات في المحافظات التقارير عنها وتساعد فرقة دعم بغداد المكونة من مواطنين محليين عبر برنامج تدريب ورعاية. الدعم الجاري قد مكن من إصدار تقارير أكثر تماسكاً من قِبل المحافظات وهو يبني الثقة بين فرق المساعدة للمشتريات في المحافظات ومكاتب مراكز المساعدة للمشتريات. تقدم برامج مراكز المساعدة للمشتريات المساعدة المباشرة والتدريب إلى ١٩ وزارة وإلى مكاتب المشتريات في المحافظات، لـ ١٦ محافظة.^(٣٨٥)

المهجرون العراقيون في الداخل (IDPs)

مكتب وزارة الخارجية للسكان واللاجئين والهجرة (PRM) خصص له ٢٠ مليون دولار في آذار/مارس ٢٠٠٨ للاستجابة لنداء الصحة للأمم المتحدة لأجل العراقيين. من أصل هذا التمويل، تلقت المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة (UNHCR) ١٢,٤ مليون دولار، وتلقت منظمة الصحة العالمية (WHO) ٤,٦ مليون دولار وتلقى صندوق طوارئ الأمم المتحدة الدولي للأطفال (UNICEF) ٣ ملايين دولار.^(٣٨٦)

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، تلقى مكتب السكان واللاجئين والهجرة التابع لوزارة الخارجية (PRM) ٤٥ مليون دولار من أموال صندوق دعم الاقتصاد للاجئين العراقيين في الأردن من المخصصات التكميلية الطارئة للسنة المالية ٢٠٠٨. وقد وزعت الأموال على المنظمات التالية، لكن لم ترفع لتاريخه أية تقارير عن الإنفاقات.^(٣٨٧)

- ٣٦,٦ مليون دولار للمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة من مبالغ ٢٠٠٨ التكميلية للنداء لأجل العراق.
- ٤,١ مليون دولار لبرنامج النداء للتعليم لصندوق طوارئ الأمم المتحدة الدولي للأطفال.
- ٢,٦ مليون دولار لبرنامج النداء من أجل الصحة التابع لمنظمة الصحة العالمية.
- ١,٧ مليون دولار لصندوق طوارئ الأمم المتحدة الدولي للأطفال.

اللاجئون

بتاريخ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أعادة الولايات المتحدة توطين ١٢،١١٨ لاجئاً مُتخطية هدف السنة المالية ٢٠٠٨ القاضي بقبول ١٢،٠٠٠ لاجئاً عراقي^(٣٨٨). لحماية العديد من العراقيين الذين يعملون في خدمة أو بالنيابة عن الولايات المتحدة، أنشأ الكونغرس برامج لتأشيرتي هجرة خاصتين (SIV):^(٣٨٩)

- برنامج لتأشيرتي هجرة خاصتين للمتقدمين للخطيين والشفويين.
- برنامج لتأشيرتي هجرة خاصتين للموظفين والمقاولين العراقيين وعائلاتهم.

بين الأول من تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧ و ٣١ آب/أغسطس ٢٠٠٨، أصدرت تأشيريات هجرة خاصة إلى ٨٧٠ عراقي. هناك أكثر من ١٠٠٠ عراقي أعدوا خطط سفر لزيارة الولايات المتحدة بحلول نهاية أيلول/سبتمبر^(٣٩٠). بالنسبة لتقدير لعدد اللاجئين العراقيين في الدول الأخرى، أنظر الجدول ٢-٤٨.

كنتيجة لطاقة المعالجة المتزايدة عبر المنطقة، تتوقع وزارة الخارجية (الأميركية) أن يتم قبول ١٧،٠٠٠ لاجئاً عراقي في الولايات المتحدة في السنة المالية ٢٠٠٩. معالجة مسألة إعادة توطين اللاجئين العراقيين تتطلب التعاون بين العديد من الفرق بما في ذلك وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي، والمفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة، والكيانات المُعالجة في الخارج، والمنظمة الدولية للهجرة واللجنة الدولية الكاثوليكية للهجرة والحكومة العراقية.

الجدول ٢-٤٨
العدد المقدر للمهجرين (بالآلاف)

سوريا	١،٤٠٠-٢،٠٠
الأردن	٥٠٠-٤٥٠
لبنان	٥٠
مصر	٤٠-٢٠
تركيا	١٠-٥
دول الخليج	أكثر من ٢٠٠

المصدر: وزارة الخارجية، "وضعية معالجة إعادة توطين المواطنين العراقيين"، التقرير رقم MERO-IQO 08-02، ٢٠٠٨/٧.

الجدول ٢-٤٩
التمويل الأميركي للمساعدات الإنسانية - السنة المالية ٢٠٠٧ والسنة المالية ٢٠٠٨ (بملايين الدولارات)

الوكالة	المنظمات الدولية	المنظمات غير الحكومية	إجمالي السنة المالية ٢٠٠٨	إجمالي السنة المالية ٢٠٠٧
وزارة الخارجية	\$٢٠٧،٨٠	\$٣،٥٠	\$٢١١،٣٠	\$١٢٢،٨١
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية	٦٦،٧٠	٤٠،٢٠	١٠٦،٩٠	٤٨،٢٥
المجموع	\$٥٠،٢٧٤	\$٤٣،٧٠	\$٣١٨،٢٠	\$١٧١،٠٦

المصدر: وزارة الخارجية، مكتب المتحدث باسم الوزارة، "الولايات المتحدة تتخطى هدف قبول ١٢،٠٠٠ لاجئاً في السنة المالية ٢٠٠٨؛ المساعدات تبلغ مستويات جديدة"، ٢٠٠٨/٩/١٢.

المهجرون العراقيون في الداخل

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أصدر رئيس الوزراء العراقي أمراً بطرد كافة الذين احتلوا بيوتاً بدون وجه حق في بغداد بحيث يستطيع أصحاب هذه المنازل المهجرون العودة إليها. صحيح أن المجموعات المقاومة تحتل بعض الممتلكات بصورة غير شرعية، إلا أن عدداً غير قليل من الذين يقيمون في بيوت بصورة غير شرعية

هم من الأشخاص المهجرين داخلياً الذين يمكن أن يصبحوا من المهجرين للمرة الثانية. عندما تغادر هذه العائلات، سوف تكون مؤهلة لمعونة تأجيرية بقيمة ٢٥٠ دولار شهرياً لمدة ستة أشهر.^(٣٩٢)

في محافظة التأميم، أدت التوترات الإثنية بين العرب والأكراد والترکمان إلى تهجير مئات العائلات. تواجه هذه العائلات آثار التمييز في التخمينات المرتفعة للإيجارات والوصول الرديء إلى الخدمات الأساسية والتوظيف.^(٣٩٣)

العائدون

يزداد عدد العائدين من الأشخاص المهجرين في الداخل إلى بغداد وديالى مع مواصلة الحكومة العراقية تشجيع العراقيين على العودة إلى منازلهم. كان هناك هذه السنة حوالي ١٦,٠٠٠ عائد إلى العراق.^(٣٩٤) أعلنت وزارة المهجرين والهجرة أنها سوف تمنح ٦٠٠ دولار تقريباً إلى كل عائلة عائدة سبق أن سُجّلت لدى الوزارة.^(٣٩٥)

المساعدات الإنسانية للعراقيين

المساعدات الإنسانية الأميركية للاجئين العراقيين، وضحايا النزاع والأشخاص المهجرين في الداخل ازدادت إلى أكثر من ٣١٨ مليون دولار في السنة المالية ٢٠٠٨. هذه زيادة تبلغ ١٧١ مليون دولار بالمقارنة مع السنة الماضية^(٣٩٦). لقد كانت الولايات المتحدة منذ ٢٠٠٣، أكبر مساهم في برامج مساعدة العراقيين المهجرين فمُولت برامج الغذاء والصحة والتعليم والمياه والصرف الصحي، وملاجئ الطوارئ والحماية^(٣٩٧). بالنسبة لنظرة إجمالية على التمويل الأميركي حسب الوكالات، أنظر الجدول ٢-٤٩.

التعليم

يواصل البرنامج الأميركي دعم إنشاء وإعادة تأهيل المدارس في العراق. بتاريخ ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كانت الولايات المتحدة قد ألزمت ٧٢٣,٤٥ مليون دولار وأنفقت ٦٢٢,٣١ مليون دولار في قطاع التعليم^(٣٩٨). الجدول ٢-٥٠ يقدم نموذجاً عن عدة مشاريع كبرى قيد التنفيذ في قطاع التعليم.

خمن مكتب المفتش العام ثلاثة مشاريع تجديد مدارس تابعة لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق في مدينة الصدر. وجد المفتشون أن المدارس – القدس، المعلمين والفاو – كانت غير مُنجزّة في وقت زيارة الموقع من قبل مكتب المفتش العام في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨. كان التاريخ الأصلي لإنجاز المشاريع ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٠٨.^(٣٩٩)

لم يُنجز المقاول العراقي أعمال التجديد لأنه طلب إعفاءه من العقود. أعلن المقاول أنه تلقى تهديدات لأنه لم يدفع رشاوى إلى ممثلي الحكومة العراقية. كانت إحدى توصيات المفتش العام أن يقوم فيلق القوات المتعددة الجنسيات في العراق بإعداد عقد جديد لإكمال تجديد المدارس.^(٤٠٠)

الجدول ٥٠-٢
المشاريع قيد التنفيذ في قطاع التعليم (بملايين الدولارات)

اسم المشروع	إجمالي الكلفة المقررة	نوع الصندوق	المحافظة	تاريخ بدء المشروع	تاريخ الإنجاز المقرر سابقاً
إنشاء مدرسة السليمانية المهنية التقنية	\$٥,٢٠	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد	السليمانية	٢٠٠٧/١٢/٢	٠٨/١٢/٢٣
إنشاء مدرسة ابتدائية جديدة	\$٤,٢٦	صندوق دعم الاقتصاد	بغداد	٢٠٠٧/١١/٢٨	٠٨/٩/١٨
مدرسة زويبا الابتدائية الجديدة ESF-154	\$٤,٢٥	صندوق دعم الاقتصاد	بغداد	٢٠٠٧/١١/١٩	٠٩/٢/١٤
تصميم إنشاء مدرسة سلوى الابتدائية الجديدة	\$٣,٩٢	صندوق دعم الاقتصاد	بغداد	٢٠٠٧/١٢/١٠	٠٨/١١/١٥
تجديد مدرسة المجتمع الجديد الابتدائية	\$٣,٠٢	صندوق دعم الاقتصاد	بغداد	٢٠٠٨/٧/٢١	٠٨/١٢/١٧

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق، مكتب الإدارة الانتقالية لإعادة إعمار العراق، الملف النهائي، ٢٠٠٨/١٠/١، نظام إدارة إعادة إعمار العراق ملف أكسيل لدى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، ٢٠٠٨/١٠/٣.

نظرة إجمالية على المحافظات

لقطات من المحافظات
معلومات محدثة من فريق إعادة إعمار المحافظات
معلومات محدثة من فرقة منطقة الخليج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية

القسم ٣

لقطات من المحافظات

يركز هذا القسم على الجهود الأميركية لإعادة الإعمار في المحافظات العراقية. يزود المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR) معلومات حول التمويل، الأمن، الحكم والاقتصاد كما تحديثات أبلغت عنها فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT) ومدراء البرامج من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي وفرقة منطقة الخليج (GRD) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID).

تركز البرامج الأميركية في المحافظات على تقوية الحكم في المحافظات، أنظمة الدعم الاقتصادي والخدمات الأساسية والأمن. تستمد هذه المبادرات خبراتها من مجموعة واسعة من الخبرات لدى المنظمات المدنية والعسكرية.

أنظر الجدول ٣-١ للحصول على نظرة إجمالية لمؤشرات الأمن والبنية التحتية والاقتصاد والحكم على مستوى كل محافظة.

معلومات محدثة من فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)

يتمثل الهدف الأساسي لفرق إعادة إعمار المحافظات في العراق بتنمية قدرات الحكومات المحلية من أجل تأمين احتياجات السكان.

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كانت ٢٧ فرقة لإعادة إعمار المحافظات تعمل في العراق: ١٤ فرقة دائمة على مستوى المحافظات و ١٣ فرقة أخرى مرافقة لإعادة إعمار المحافظات تعمل سوية مع فرق الألوية القتالية. تعتمد الاستراتيجية الأميركية لإعادة إعمار العراق على قدرة فرق إعادة إعمار المحافظات على تأمين توازن بين القدرات الدبلوماسية والعسكرية والتنمية الاقتصادية.

في أواخر العام ٢٠٠٧، طور مكتب شؤون المحافظات في السفارة الأميركية نموذج نضوج القدرات (CMM) لاستعماله من جانب فرق إعادة إعمار العراق في المحافظات. يزود المفتش العام معلومات محدثة تستند إلى أحدث تقرير أنجز في أيار/مايو ٢٠٠٨. نموذج نضوج القدرات هو نظام تقييم يستخدم مقاييس موحدة لقياس التقدم في تحقيق أهداف فرق إعادة إعمار المحافظات.^(٤٠٢)

نظام الحكم: "المساعدة في تطوير الحكومات المحلية اللامركزية لكي تكون ذاتية الاكتفاء وشفافة ويمكن محاسبتها على أعمالها وقادرة على تعريف وتحديد أولويات وخدمة احتياجات المواطنين."

التطوير السياسي: "التشجيع على انخراط السكان المحليين وتطوير فعالية الأحزاب السياسية، والمؤسسات، والممثلين، والمسؤولين بحيث يحترمون حقوق الأفراد والجماعات، ويشجعون التعددية وينقلون السلطة بصورة سلمية."

التطوير الاقتصادي: "مساعدة الحكومات المحلية اللامركزية والقطاع الخاص في وضع وتطبيق استراتيجيات تنمية اقتصادية شاملة وواسعة النطاق وتعزز نمواً عادلاً ومستداماً."

حكم القانون: "تعزيز نوعية العدالة التي يتمتع بها الناس من خلال تحسين المساءلة وفعالية واستمرارية الخدمات التي تدار بواسطة مؤسسات الشرطة والإصلاح والقضاء وغير ذلك من المؤسسات القانونية."

المصالحة: "مساعدة الأطراف المتنازعين على حل خلافاتهم من خلال المشاركة في حوار سلمي ومباشر لتحديد ومتابعة الأهداف والمصالح".

يقيم كل فريق لإعادة إعمار المحافظات وكل فريق مرافق لإعادة إعمار المحافظات مدى التقدم في منطقة عملياته الإقليمية والبلدية وفي المحافظات من حيث المراحل الخمس للتطوير والتنمية.^(٤٠٣)

- ١- **البدائية:** تشير إلى الوضع عند الخط القاعدي حيث يكون التقدم طفيفاً في معظم المسائل. تشمل هذه المسائل الحد الأدنى من عمليات اتخاذ القرارات، تقديم الاحتياجات الآنية وليس بصورة منتظمة، المشاركة السياسية غير المتطورة، المؤسسات الفاسدة لتطبيق القانون، الحريات المدنية القليلة، البنى التحتية والأنظمة المالية المحدودة ومعدلات البطالة المرتفعة.
- ٢- **التطوير:** يشير إلى الحد الأدنى من التحسينات في الأنظمة الاقتصادية والحكم والأمن. تبقى نواقص خطيرة تشمل قدرات غير متطورة في التخطيط وإعداد الموازنات والمشاركة المحدودة السياسية ومن المجتمع المدني، خلق فرص عمل على المدى القصير، مصارف قليلة العدد وفساد مستمر في الأجهزة الأمنية.
- ٣- **الاستدامة:** تقترح زيادة فعالية الاستراتيجيات المحلية، ولكنها تشير أيضاً إلى عدم فعالية التنسيق المتواصل. تشمل هذه المسائل حواراً محدوداً بين المنظمات على مستوى المحافظات وعلى مستوى الوطن، تقوية الأحزاب السياسية، المشاركة السياسية المركزة، العمليات غير المتوازنة لسلسلة الإمداد والتمويل، فتح مصارف خاصة ووطنية، تأثيرات قبلية متواصلة وتحسين قدرات الشرطة.
- ٤- **الأداء:** يعكس الآليات الاجتماعية والمالية والبنية التحتية التي تؤدي وظائفها في الغالب. نظام يمثل الحكم نموذجياً بتحسين التنسيق، التمثيل، المشاركة والشفافية بين مختلف الهيئات. من الوجهة الاقتصادية، أصبح هناك عدد أكبر من المصارف، وازدادت فعالية سلسلة الإمداد والتمويل (مع بعض الانقطاعات الشديدة) وأصبح النقل أكثر انتشاراً. يتحسن تطبيق القانون مع تزايد دعم زعماء القبائل للمؤسسات القانونية وتقدم قوات الأمن المحلية مع إشراف محدود. يعاني الفرع القضائي من استمرار تكديس ملفات الأعمال غير المنجزة ولكنه ينمو من الوجهة الاستقلالية والموضوعية.
- ٥- **الاعتماد على النفس:** يشير إلى تحول كامل باتجاه الاستقلال والتنسيق التنظيمي والحريات المدنية. تتميز آليات الأمن والسياسة والاقتصاد بالمشاركة الكاملة، التسامح العام الوضعي والديني، العمليات الاقتصادية والمالية التي تؤدي وظائفها، النظام القضائي المفتوح والعاقل ومؤسسات الأمن الذاتية الاكتفاء.

في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، طورت السفارة الأميركية في بغداد والقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) إطار عمل استراتيجي جديد لإعادة بناء قدرات الدوائر الحكومية في المحافظات العراقية. يؤمن إطار العمل إرشادات حديثة لفرق إعادة إعمار المحافظات ويشمل الأهداف والغايات، الخطوط الواضحة للسلطة، الإجراءات المتبعة لتنسيق جهود إعادة إعمار المحافظات، وخطة تدريب تدعم برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات بفعالية أكبر.^(٤٠٤)

نظرة إجمالية على المحافظات

أعلن المفتش العام عن قيامه بمراجعة جديدة لبرنامج فرق إعادة إعمار المحافظات بضمنها تقييم نموذج نضوج القدرات.

نظرة متبصرة لقيادة فرق إعادة إعمار المحافظات

زود مكتب شؤون المحافظات (OPA) المفتش العام بمجموعة من الملاحظات من قادة فرق إعادة إعمار المحافظات/فرق إعادة الإعمار المرافقة. تلخص الملاحظات المبلغ عنها ذاتياً في كل محافظة تحت عنوان "نظرة متبصرة لقيادة فرق إعادة إعمار المحافظات".

تحديث معلومات فرقة منطقة الخليج والوكالة الأميركية للتنمية الدولية

تشمل أيضاً كل لقطه من المحافظة مختصراً لمشاريع وبرامج فرقة منطقة الخليج (GRD) والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID). زودت الوكالتان المفتش العام بتحديثات ربع سنوية للتقدم في عمليات إعادة الإعمار، تشمل نتائج المشاريع الإنشائية وبناء القدرات المكتملة. هذه التحديثات ليست تقارير شاملة لنشاطات فرقة منطقة الخليج أو الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ولكنها تزود نظرة موجزة تركز على إعادة الإعمار في كل محافظة.

الجدول ٣-١

مقارنات مختارة للمحافظات العراقية

الاقتصاد	الأمن	التمويل العراقي	التمويل الأميركي، للفرد الواحد	إحصائيات السكان	المحافظة						
المؤسسا ت التي تملكها الدولة - المصانع (ك)	السيطرة العراقية على المحافظات - ت (د)	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١	مجموع الاعتداءات ت /٤/١ ٢٠٠٨	تخصيص الموازنة الرأسمالية للمحافظات (٣) ٢٠٠٨	إجمالي اكلاف مشاريع صندوق دعم الاقتصاد (٤)	إجمالي اكلاف مشاريع صندوق قوات الأمن العراقية (٥)	اكلاف مشاريع صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني (٥)	المهجرون إلى الداخل (٦)	عدد السكان (١)	المحافظة	
٢	٦	٢٠٠٨/٧/١ (د)	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	٢٢,٥٢٢,٢٠	\$٢١,٩٢	\$٤٩,٠٧	\$١٩,٣٨	\$٢٣٢,٥٩	٤,٢١٣	٤,٦٢١,٦٠٠	كردستان (دهوك، أربيل، والسليمانية)
١٣	٩٢٤	٢٠٠٨/٧/١	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$٣٥٧,٧٠	\$٧١,٦٩	\$٣٢,٠٣	\$٣١٠,٧٤	\$٣١٥,٩١	١٥٨,٦٨٣	٢,٤٧٣,٧٠٠	نينوى
٤	٢٤٥	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$١٤٣,٥٠	\$١٧٦,٩٥	\$٢٦٧,٣٧	\$٢٧٤,٣٤	\$١,٢٠٢,٧٧	٥٩,٥٤١	٨٣٩,١٠٠	التأمين
٥	٤٨٦	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$١٤٧,٤٠	\$١٨٤,٥٩	\$٢٩٠,١٦	\$١٨٧,٣٨	\$٦٤١,٦٩	٨٧,٠٦٥	١,٠٧٧,٨٠٠	صلاح الدين
١٦	٢٠٩	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$٢٢٣,٠٠	\$٢٤٩,٠٤	\$١٠٤,٧٢	\$١,٣٠٣,٧٨	\$٨٤٥,٤٢	٧٩,٧٦٣	١,٢٨٠,٠٠٠	الأنبار
١	٥٣٣	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$١٦٧,٩٠	\$١٣٥,٥٤	\$٢٢,٠١	\$٣١٩,٢٣	\$٦٢٢,٣٨	٥٥,٠٤٧٧	١,٢٧٣,٩٠٠	ديالى
٤٨	٨٦٧	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$٨٨٤,٥٠	\$١٦٨,٨٣	\$١٥٨,٥٥	\$٥٤٥,١١	\$٧٧٢,٤٧	١,٧٨٥,٦٨٠	٦,٢٨٦,١٠٠	بغداد
١	٨	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$١٢٤,٧٠	\$٦٧,٨١	\$٨١,٩٠	\$١٥٤,٥٨	\$٤٤٧,١٢	٦,١٧٩	٩٤١,٨٠٠	واسط
١٠	٥٤	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$٢٠٠,٨٠	\$١٢٢,٥٧	\$٢٩,٥٦	\$٣١,٠٤	\$٢١٦,٢٢	٢٥,٨٣٩	١,٤٤٤,٤٠٠	بابل
٤	٧	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$١٢٢,٤٠	\$٩٥,٤٧	\$٢٢,١٧	\$٦٧,٣١	\$٢٤٤,٢٢	٨٤٣	٨٦٦,٧٠٠	القادسية
٣	٤	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$١١٥,٢٠	\$٧٠,٣٦	\$٥٨,٣٣	\$١,٣٠	\$١٨٧,٢٦	٥٦٢	٧٥٦,٠٠٠	كربلاء
٥	١	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$١٤٢,٣٠	\$٤١,٠٦	\$٢,٩٧	\$٧٠,٦١	\$٢٦٦,٨٧	—	٩٤٦,٣٠٠	النجف
٣	١	٢٠٠٨/٩/٣٠	٢٠٠٨ /٧/١ (٣)	\$٨٣,٤٠	\$٤٦,٠٠	\$٧٦,٨٣	\$٥,٤٧	\$٦٦٣,٦١	٢٨١	٥٣٦,٣٠٠	المتن

الاقتصاد	الأمن	التمويل العراقي	التمويل الأمريكي، للفرد الواحد	إحصائيات السكان					
٢ ذو قار ٢٠٠٦ أيلول/سبتمبر	٢١	١٧	\$٢١٥,٨٠	\$٢٨,٦٩	\$٤١,٤١	\$١٢١,٣٩	\$١,٠١٢,٩٥	١,٩٦٦	١,٤٢٧,٢٠٠
٤ ميسان نيسان/أبريل ٢٠٠٧	٤٣	١٢	\$١٢٠,٥٠	\$٢٩,٧٥	\$٨٤,٨٧	\$١٠٢,٩٨	\$٣٤٨,٧٦	٢٨١	٧٤٣,٤٠٠
٩ البصرة كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧	٢٦	١٠٨	\$٣٠٦,٠٤	\$٤٧,٠٤	\$٢٢٦,٠٥	\$١٥٩,٢٣	\$١,٥٧٦,٥٣	٤٦٠,٦٠	١,٧٦١,٠٠٠
١٣٠	٢,٤٣٥	٥,٣١٨	٥,٠٠٩,٤	\$١,٧٥٧,٢٥	\$١,٦١٨,٠٠	\$٣,٦٧٣,٨٥	\$٩,٥٩٦,٩٢	٢,٨٠٧,٤	٢٧,٤٧٥,٣٠٠
			\$٠					٣٣	

ملاحظة: تتأثر الأرقام بالتدوير. إجمالي أكلاف المشاريع الممولة من مختلف الصناديق هي كما ابلغ عنها في تقرير نظام إدارة إعادة إعمار العراق. وهي لا تمثل الالتزامات او النفقات الفعلية.

- أ- العدد الإجمالي للسكان القاطنين في المحافظة، وفقاً للأمم المتحدة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧. نشرة مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA)، "عدد السكان العراقيين حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- ب- عدد العراقيين الذين هجروا من منازلهم واستقروا في تلك المحافظة. لم تزود أعداد العراقيين الذين هجروا من منازلهم في محافظة دهوك. وتعكس المجموع أربيل والسليمانية فقط. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٢/١٠.
- ج- تتأثر الأرقام بالتدوير. تاريخياً، كان المفتش العام يبلغ عن أكلاف الموازنة المخصصة لمشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية استناداً إلى التقرير الربع السنوي لنشاطات الوكالة ولكن مثل هذه التقارير لن تنتج بعد الآن. سوف يستعمل المفتش العام معلومات من نظام إدارة إعمار العراق التي تختلف عن المجاميع المبلغ عنها في التقارير السابقة نظام إدارة إعمار العراق (IRMS)، "ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق"، ٢٠٠٨/١٠/١.
- د- تتأثر الأرقام بالتدوير. تاريخياً، كان المفتش العام يبلغ عن أكلاف الموازنة المخصصة لمشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية استناداً إلى التقرير الربع السنوي لنشاطات الوكالة ولكن لن تنتج بعد الآن مثل هذه التقارير. سوف يستعمل المفتش العام معلومات من نظام إدارة إعمار العراق التي تختلف عن المجاميع المبلغ عنها في التقارير السابقة، نظام إدارة إعمار العراق، "ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق"، ٢٠٠٨/١٠/١.
- هـ- تتأثر الأرقام بالتدوير. تاريخياً، كان المفتش العام يبلغ عن أكلاف الموازنة المخصصة لمشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية استناداً إلى التقرير الربع السنوي لنشاطات الوكالة ولكن مثل هذه التقارير لن تنتج بعد الآن. سوف يستعمل المفتش العام معلومات من نظام إدارة إعمار العراق التي تختلف عن المجاميع المبلغ عنها في التقارير السابقة نظام إدارة إعمار العراق (IRMS)، "ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق"، ٢٠٠٨/١٠/١.
- و- تتأثر الأرقام بالتدوير. تاريخياً، كان المفتش العام يبلغ عن أكلاف الموازنة المخصصة لمشاريع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية استناداً إلى التقرير الربع السنوي لنشاطات الوكالة ولكن مثل هذه التقارير لن تنتج بعد الآن. سوف يستعمل المفتش العام معلومات من نظام إدارة إعمار العراق التي تختلف عن المجاميع المبلغ عنها في التقارير السابقة نظام إدارة إعمار العراق (IRMS)، "ملف الإنهاء لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق"، ٢٠٠٨/١٠/١.
- ز- و ملف أكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ح- المبالغ المخصصة لكل محافظة من قبل الحكومة العراقية لجهود إعادة الإعمار. "التقرير الرأسمالي لوزارة المالية: حزيران/يونيو عام ٢٠٠٨"، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٨.
- ط- العدد الإجمالي للاعتداءات التي حصلت داخل المحافظة من ٢٠٠٨/٤/٢١ إلى ٢٠٠٨/٧/١، استجابة مكتب وزير الدفاع الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- ي- العدد الإجمالي للاعتداءات التي حصلت داخل المحافظة من ٢٠٠٨/٧/١ إلى ٢٠٠٨/٩/٣٠، استجابة مكتب وزير الدفاع الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- ك- تاريخ نقل سلطة الأمن إلى العراقيين. وزارة الدفاع الأميركية، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢. استجابة القيادة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.

نظرة إجمالية على المحافظات

نظام الحكم				البنية التحتية				الاقتصاد		
قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي (بملايين الدولارات) ^(د)	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ^(د)	عدد المترين في برنامج "تطوير" المحافظة ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٩/٢٠ ^(د)	تسجيل الناخبين كما كان في ٢٠٠٨/٧/١٤ ^(د)	النسبة المئوية للممولة من المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ^(د)	المبالغ المخصصة من موازنات لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (بملايين الدولارات) ^(د)	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ^(د)	مستعملو الإنترنت ^(د)	متوسط الطلب (ميغاواط/ساعة) ^(د)	متوسط الحمل الكهربائي المزود لربع لسنة (ميغاواط/ساعة) ^(د)	أعمال عقود برنامج العراقيين أو لجان ^(د)
٦,٤٧	٦٩	١,٠٤٦	٢,٣٨٦,٨٦١	٨٩ بالمئة	\$٨١,١٤	١٦	٥٣٠,٠٠٠	٢٠,٧٤٦	١٢,٧٢٥	٥٣
٣,٠٤	٦٢	١,٠٦٣	١,٥٣٠,٢٩١	٦٠ بالمئة	\$٢٧,٤٣	٩	١٨٠,٠٠٠	١٩,٣٥٩	٩,٧٥١	٥٨٨
٢,٨٩	٦٠	٥٣٥	٦,٨٨٤,٢٢٢	٦٥ بالمئة	\$٢٧,١٠	٥	٣٠٠,٠٠٠	٧,٤٣٧٣	٤,٢٩١	٧٤٨
٤,٣١	١٦٩	٤٩	٦,٣٣,٦٩٢	٤٤ بالمئة	\$٢٤,٣٠	٨	٥٠٠	٨,٧٥٤	٥,٣٥٩	٤,٧٣٣
٣,٥٤	١٢٦	١٢١	٧٣٠,١٩٥	٥٥ بالمئة	\$٥٢,٢٨	٧	٣,٠٠٠	٧,٤٨٨	٤,٧٢٨	١,٠٢٨
٣,٢١	٧٤	٧٦	٧٥٨,٨٨٦	٧٦ بالمئة	\$٢٤,٣٦	٩	٥,٢٩٩	٥,٢٩٩	٣,٢٥٦	١٨٣
٣٤,٠٠	١,٠٧٦	١,٠٤٣	٤,٢٨٨,٠١٩	٦٤ بالمئة	\$١٤,٧٥٣	٣٠	١٥٢,٠٠٠	٦,٠٤٦	٢٨,٨٦٣	٥,٣٣١
٤,٣٦	٨١	٣٨٥	٥٨٨,٨٢١	٩١ بالمئة	\$٢٧,٩٢	٧	١,٠٠٠	٦,٩١٤	٣,٠٨٩	٢٨٣
٦,٨٧	٩٥	٤١٢	٨٨٢,٢٠٦	١٢٦ بالمئة	\$٢١,٨٥	٧	٣,٠٠٠	٩,٦٧٨	٤,٣٨٧	٣٨١
٥,٦٨	٦٠	٢٧١	٥٧٠,٨١٠	٧٥ بالمئة	\$٢٤,٦٣	٥	٨,٠٠٠	٥,٧٦٠	٢,٩٢٥	٢٦٦
٨,٩٠	٧٤	٣٠٧	٥١٨,٠٤٢	٧٠ بالمئة	\$٢٣,٣١	٧	١٥,٠٠٠	٦,٢٢٢	٣,٠٣٥	١٤
٢,٨٥	٦٨	٣٩٢	٦٣٨,٤٩٦	٣٣ بالمئة	\$٢٥,٧٢	٦	١١,٠٠٠	٨,٤٥٢	٣,٩٩٩	١٥
١,٧٨	٦٠	٢٦٤	٣٤٦,٦٦٦	٥٠ بالمئة	\$٢٤,٩٥	٣	٤,٦١٠	٤,٦١٠	٢,٣٨٠	١٠
٦,٢١	٦٣	٤٥٣	٩١٣,٦٨٦	٤٣ بالمئة	\$٢٥,٨٠	٨	٢,٠٠٠	٩,٢١٥	٦,٠٣٠	٨٣٦
٦,١٢	٧٩	٣٣٩	٥١٤,١٢٢	٧٣ بالمئة	\$٢٩,٩٤	٤	١,٠٠٠	٦,٢٢٢	٢,٧٤٧	٤
٨,٣٢	١٧٥	٣٨٧	١,٣٥٧,٠٤٥	٧٣ بالمئة	\$٦٦,٩٥	١١	٥٣,٠٠٠	٢٠,٩٦٦	١٥,٥٧٦	٤٤١
١٠٨,٥٥	٢,٣٤١	٧,٤٦١	١٧,٣٤٦,٠٨٠		\$٦٥٦,٢١	١٤٢	٨٢٧,٥٠٠			١٤,٩١٤


- ك- العدد الإجمالي للمصانع التابعة لمؤسسات تملكها الدولة في المحافظة. دمجت مؤسسة إضافية تملكها الدولة كانت قد أدرجت بصورة منفصلة تحت "كركوك" مع إجمالي المصانع في محافظة التأميم. استجابة فريق العمل لتحسين عمليات الأعمال والاستقرار (TF-BSO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ل- العدد الإجمالي للعقود التي استلمها بائعون عبر برنامج العراقيين أولاً من ٢٠٠٧/٨/١-٢٠٠٨/٨/١. استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- م- المتوسط اليومي للميغاواط/ساعة المستعمل لتلبية حمل الكهرباء المزود حسب تقدير وزارة الكهرباء وحسب ما جاء في تقرير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق. مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، تقرير الأداء اليومي للوحدات الكهربائية، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق، ٢٠٠٨/٧/٢-٢٠٠٨/٩/٣٠. الإنتاج الفعلي بالميغاواط/ساعة ١١٧,٨٤٩ لربع السنة. يختلف الإنتاج الفعلي عن الحمل المزود.
- ن- متوسط عدد الميغاواط/ساعة المطلوب حسب تقدير وزارة الكهرباء وحسب ما جاء في تقرير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق. مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، "تقرير الأداء اليومي للوحدات الكهربائية" الصادر من مكتب إعادة إعمار العراق، ٢٠٠٨/٧/٢-٢٠٠٨/٩/٣٠.
- (س) عدد مستعملي الإنترنت في المحافظة. المجموع حسب تقرير السفارة الأميركية بلغ ١,١٢ مليون ولكن حسابات المفتش العام تشير إلى الرقم ٩٣٣,٥٠٠. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ع) العدد التراكمي للعيادات المبنية أو المحسنة أو المعاد تجهيزها باستعمال التمويل الأميركي بموجب برنامج العناية الصحية الأولية لفرقة منطقة الخليج. استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٨.
- (ف) المبالغ الإجمالية المخصصة في الموازنة لكل محافظة من أموال برنامج فرق إعادة إعمار المحافظات/مجلس تنمية وإعادة إعمار المحافظات من التخصيصات التكميلية للسنتين ٢٠٠٦ و ٢٠٠٧. استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- (ص) مبالغ العقود الممنوحة من مجلس تنمية وإعادة إعمار المحافظات كنسبة مئوية من المبالغ المخصصة لمجلس تنمية وإعادة إعمار المحافظات. استجابة مكتب شؤون المحافظات لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- (ق) العدد الإجمالي التراكمي للسكان في سن ١٨ وما فوق. المواطنون المدرجون في قاعدة بيانات نظام التوزيع العام يسجلون تلقائياً للانتخاب. تمثل البيانات كافة العراقيين المدرجة أسماؤهم في قاعدة البيانات قبل تحديث تسجيل الناخبين. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ر) عدد العراقيين الذين تلقوا تدريباً من برنامج "تطوير" ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٩/٢٠. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ش) العدد الإجمالي للمشاريع الأميركية الجاري تنفيذها الممولة من صندوق دعم الاقتصاد وتنفيذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. تهدف المشاريع إلى تعزيز الروابط بين الحكومة العراقية والمجتمعات المحلية من خلال تسهيل تنسيق المجتمع المحلي مع الحكومات المحلية وحكومات المحافظات. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٢/١٠.
- (ت) القيمة الإجمالية لمشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي الممولة من الولايات المتحدة. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

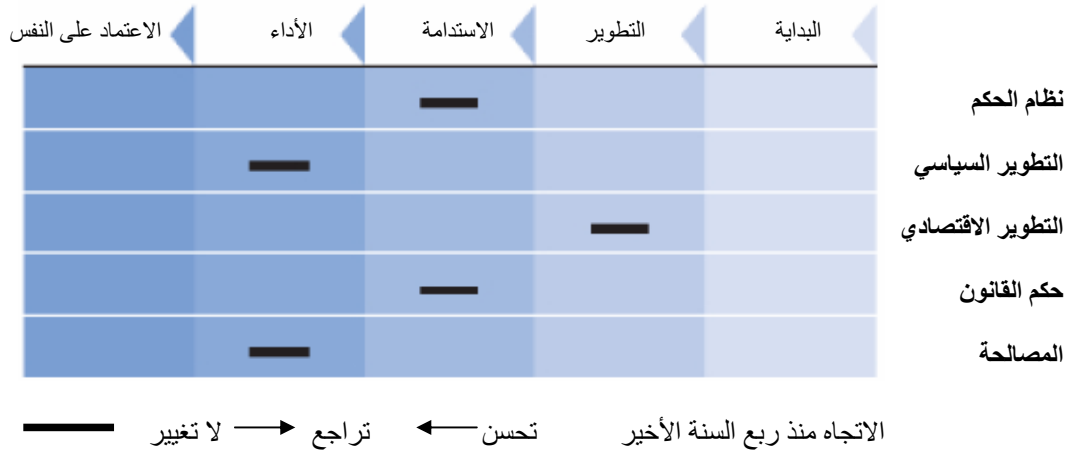

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

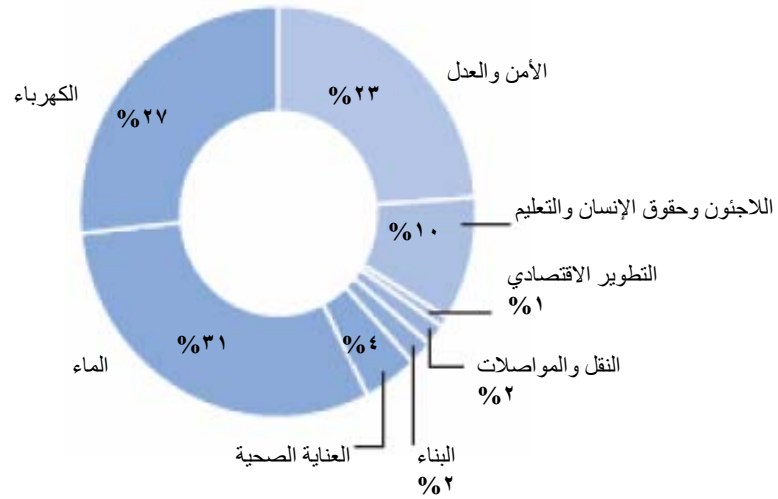

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها
٢	\$٠,٣٦	-	-
٨٣	\$٢٣٣,٤٧	١	\$٠,١٠
٢٢٧	\$٢٥٢,٢١	١١	\$١٨,٤٣
٩٠	\$٣٤,٣٣	٨	\$٤,٨٨
٣٦	\$١٠,٣٨	٤	\$٥,٤٤
١١٩	\$٢,٦٥	٤	\$١١,٣٩
٥٥٧	\$٥٣٣,٤٠	٢٨	\$٤٠,٢٤

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

نظرة إجمالية على المحافظات

كردستان في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	أكلاف مشاريع صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF) \$٢٣٣ (2)
	أكلاف مشاريع صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$١٩
	أكلاف مشاريع صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٤٩
	أكلاف مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$٢٢
التمويل العراقي دولار	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ٢,٣٥ مليار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ٣
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٦
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة أيار/مايو ٢٠٠٧
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ٢
	أعمال عقود برنامج العراقيين أولاً ٥٣
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ١٢,٧٢٥
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٢٠,٧٤٦
	عدد مستعملي الإنترنت ٥٣٠,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ١٦
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٤,٢١٣
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٨١,١٤ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٨٩ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٩/٢٠ ١,٠٤٦
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٦٩
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٦,٤٧ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ١-٣ لمعرفة المصادر.

تحديثات فريق إعادة إعمار المحافظات

تشكل محافظات دهوك وأربيل والسليمانية منطقة إقليم كردستان، التي تحكمها حكومة إقليم كردستان. كجزء من برنامج فريق إعادة إعمار المحافظات، تدير الولايات المتحدة فريق إعادة إعمار المحافظات (PRT) في أربيل.

تبصرات القيادة: تعالج مشاريع صندوق الاستجابة السريعة في المنطقة عدة احتياجات لم تلبى، بضمنها: (٤٠٥)

- الفرص الاقتصادية للمرأة
- ملاجئ لضحايا العنف نحو المرأة
- تدريب المحامين الشباب
- المحافظة على التراث الثقافي الكردي في فنون النسيج.

يركز فريق إعادة إعمار المحافظات في أربيل على بناء قدرات المنطقة لزيادة الدعم المالي الحكومي للمشاريع والبرامج. عبر الفريق عن قلقه من الفساد المحتمل والحاجة لنظام سياسي متنوع أكثر والانفصال بين النخبة الحاكمة والشعب وضرورة وجود نظام مصرفي أفضل. (٤٠٦) بالإضافة إلى ذلك، لم يتمكن فريق إعادة إعمار المحافظات من الاستفادة من الفرص لتوسيع مشاركته مع حكومة إقليم كردستان بسبب التقييدات اللوجستية. (٤٠٧)



مدرسة مجددة في أربيل (صورة من سلاح الهندسة في الجيش الأمريكي)

بناء القدرات: في ربيع السنة هذا، ساهم برنامج "تطوير" في تدريب ١٣٥ موظفاً حكومياً وأمن برنامج الحكم المحلي تدريب ٩٢ موظفاً حكومياً. (٤٠٨) قدمت ست مقررات دراسية شملت حصصاً في إدارة المشتريات والأداء، وورش عمل لمدة يومين للفنيين والمهندسين من مراكز نظام المعلومات الجغرافية في أربيل ودهوك والسليمانية ونيوى والتأميم.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
أنظر الجدول ٣-٢ للاطلاع على موجز المشاريع الجاري تنفيذها والمشاريع المكتملة في كردستان.

العناية الصحية: في آذار/مارس ٢٠٠٨، بدأ إنشاء عيادة للطوارئ في مدينة سرسنگ، بقيمة ١٩٤ ألف دولار. اكتملت الأعمال في آب/أغسطس ٢٠٠٨، وتقدر فرقة منطقة الخليج أن حوالي ١٠ آلاف مواطن

عراقي سوف يستفيدون من هذا المرفق.^(٤٠٩) استمر العمل خلال ربع السنة هذا على إنشاء مركز الأيتام - **المسنين في أربيل** (٣,٧ مليون دولار) لبناء أجنحة منفصلة تستطيع أن تستوعب ١٦٥ ولداً و ١٨٠ فتاة و ٦٠ مُسنًا.^(٤١٠)

الماء: في ربع السنة هذا استمرت أعمال إنشاء شبكتي مياه مسكة وجامع بيني من أجل تزويد أنابيب مياه مع صمامات وفتحات صيانة لتحسين إمكانية الوصول إلى المياه الصالحة للشرب لحوالي ٧٥ ألف عراقي يقطنون في ضاحيتين لمدينة دهوك.^(٤١١) أصبح العمل مكتملاً الآن بنسبة تزيد عن النصف ومن المتوقع ان تكتمل أعمال الإنشاء في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨.^(٤١٢) تعزز المرحلة الثانية من المشروع المشترك وادي روستي، توفير فرص العمل المحلي في أربيل. يعمل في إنجاز هذا المشروع حوالي ٢٠٠ عامل محلي.^(٤١٣) اكتمل المشروع بنسبة ٢٤ بالمئة فقط ولكن من المتوقع ان يخفض إنشاء سدود صغيرة وأقنية ري الأضرار التي يسببها فيضان المياه لحوالي ٣٠ ألف مقيم في وادي روستي.^(٤١٤)

الأمن والعدل: أكتمل العمل خلال ربع السنة هذا على مشروع أكاديمية شرطة أربيل الممكن أن تستوعب ٦٥٠ طالباً عسكرياً.^(٤١٥) تستمر أعمال إنشاء سجنين في محافظة السليمانية هما: المرحلة الأولى من **سجن قلعة سوز وسجن شمشال**. مشروع سجن قلعة سوز هو مشروع بكلفة ٥,٥ مليون دولار أصبح الآن مكتملاً بنسبة ٣٠ بالمئة. يتم حالياً تحديث المرفق الموجود وتوسيعه لتأمين ٦٨٩ سريراً إضافياً بأمن متوسط. تقدر قيمة مشروع سجن شمشال بحوالي ٢٧,٥ مليون دولار وهو مشروع تحويل قلعة موجودة إلى سجن يحتوي ٢٠٠٠ سرير بأمن متوسط و ١٠٠٠ سرير أمن عالي.^(٤١٦) اكتمل تنفيذ نصف المشروع تقريباً ومن المقرر أن يكتمل تماماً في نهاية شباط/فبراير ٢٠٠٩.

التعليم: منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧، كان يجري بناء المدرسة الفنية المهنية في السليمانية وأصبح المشروع الآن مكتملاً بنسبة ٣١ بالمئة. التاريخ المقدر للإنجاز هو كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. وعند اكتمال بنائها سوف تستعمل هذه المدرسة المؤلفة من ١٦ صفاً لتقديم التدريب إلى الحرفيين المحليين.^(٤١٧)

الجدول ٢-٣
مشاريع فرقة منطقة الخليج في كردستان

المحافظة	المشاريع الجارية تنفيذها	قيمة المشاريع الجارية تنفيذها (بملايين الدولارات)	المشاريع المنجزة	قيمة المشاريع المنجزة (بملايين الدولارات)	المعلومات الرئيسية حول المشروع
دهوك	٨	\$١٢,٦٩	١٦٠	\$٩٩,٢٥	خمسة مشاريع مخططة بقيمة ٥,٦٤ مليون دولار
أربيل	٥	\$١٠,٩٢	٧٩	\$٣١٠,٦٢	بدأت فرقة منطقة الخليج بتنفيذ مشروع واحد خلال ربع السنة هذا بقيمة ٧٥٠,٠٠٠ دولار.
السليمانية	٢٠	\$٦٦,٠٩	٩٥	\$١١٤,٩٥	تم إنفاق حوالي ٥٥ مليون دولار على مشاريع الأمن والعدل. في المجموع، بدأت فرقة منطقة الخليج بتنفيذ ٦ مشاريع خلال ربع السنة هذا بقيمة ١١,٦ مليون دولار.

ملاحظة: تم تزويد معلومات حول المشروع المنجز لأربيل إلى المفتش العام وقت النشر. تتأثر الأرقام بالتدوير. المصدر: فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث معلومات التقرير الشهري، إدارة المشاريع، تموز/يوليو ٢٠٠٨، استجابة فرقة منطقة الخليج لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٥ و ٢٠٠٨/١٠/٢٠.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في كردستان

الديمقراطية ونظام الحكم	الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات
<p>برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): يسهل برنامج الحكم المحلي الثاني الترتيبات لإعداد مسودات القوانين ويستضيف ورش عمل حول الحكم البرلماني لأعضاء الجمعية الوطنية لإقليم كردستان والفرع التنفيذي. سهل البرنامج أيضاً إقامة مقررين حول عدادات الكهرباء وإعداد الفواتير لموظفي التحصيل في وزارة الكهرباء في أربيل ومديرية الكهرباء في دهوك. اتصل المدير العام لعدادات الكهرباء في وزارة الكهرباء في حكومة إقليم كردستان ببرنامج الحكم المحلي لمناقشة إنشاء نظام عدادات الكهرباء وإعداد الفواتير عبر كردستان بكاملها.</p> <p>صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (ORF/IRAP): تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) منظمة غير حكومية محلية في دهوك لتدريب معلمين من ١٢ مدرسة ثانوية حول أفضل الممارسات لإدارة العدائية والإجهاد لدى المراهقين، المراهقين الذين يعانون من مشاكل نفسية والجانحين الأحداث في برنامج مدته سبعة أشهر. سوف يستفيد حوالي ١٢ ألف طالب من هذه الهبة.</p> <p>برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): أعد برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق تقيماً للنزاع في كل محافظة من محافظات إقليم كردستان لتفحص الاحتياجات المحددة للمجتمع المحلي بالإضافة إلى مصادر النزاع لتطوير مشاريع سريعة التأثير.</p> <p>برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): يجري حالياً تنفيذ ٧٣ مشروعاً لبرنامج عمل المجتمع المحلي الثاني في إقليم كردستان بضمنها برنامج تدريب للشباب العاطلين عن العمل، تجديدات لمدارس، رفع مستويات شبكة الطاقة للمجتمع المحلي، تحسينات على شبكات توزيع المياه وإنشاء مركز أبحاث زراعية.</p>	<p>برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم برنامج "تجارة" خمس مؤسسات للتمويلات الصغيرة في إقليم كردستان. دهوك (مؤسسة واحدة): ٨٧٩ قرصاً أنفقوا منذ بدء العمل، بقيمة ٢,٥٥١,٤٥٠ دولار و ٧٥٢ قرصاً معلقاً بقيمة ١,٥٣٩,٢٠٩ دولار. أربيل (مؤسستان): ٣,٧٤٢ قرصاً أنفقوا حتى هذا التاريخ، بقيمة ١٠,٣١٠,٧٣٠ دولار و ٢,٠٨٣ قرصاً معلقاً حتى هذا التاريخ، بقيمة ٣,٧٤٨,٣٨١ دولار. السليمانية (مؤسستان): ٥٣٠ قرصاً أنفقوا منذ بداية العمل، بقيمة ١,٣٢١,٩٧٠ دولار و ٤٣٨ قرصاً معلقاً بقيمة تقدر بـ ٥٦٢,٩٩٠ دولار.</p> <p>المشروع الزراعي "إنماء": بدأ برنامج "إنماء" تسهيل تصدير الرمان من منطقة السليمانية عبر تجار في دبي. أنجز البرنامج مؤخراً دراسة حول الشحن بالطائرات إلى دبي. أكبر مستورد للفاكهة والخضار في الإمارات العربية المتحدة أصبح جاهزاً لإرسال طلبات الشراء.</p> <p>برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" أكثر من ٦,٧٧٢ مسؤولاً من إقليم كردستان في الإدارة العامة من خلال ٨ مقررات لمستويات كفاءة مختلفة. تشمل المواضيع الدراسية القيادة، الاتصالات، تكنولوجيا المعلومات. ومكافحة الفساد، كما إدارة المشاريع، الموارد البشرية والإدارة المالية.</p> <p>برنامج استقرار المجتمع المحلي: لا يعمل هذا البرنامج في المنطقة.</p>


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر^(و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

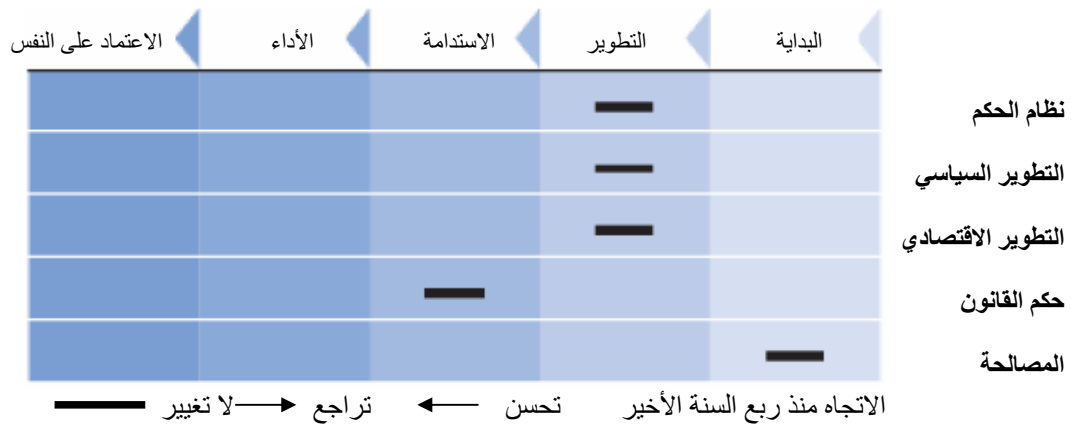

كافة المشاريع حسب القطاع (ح)

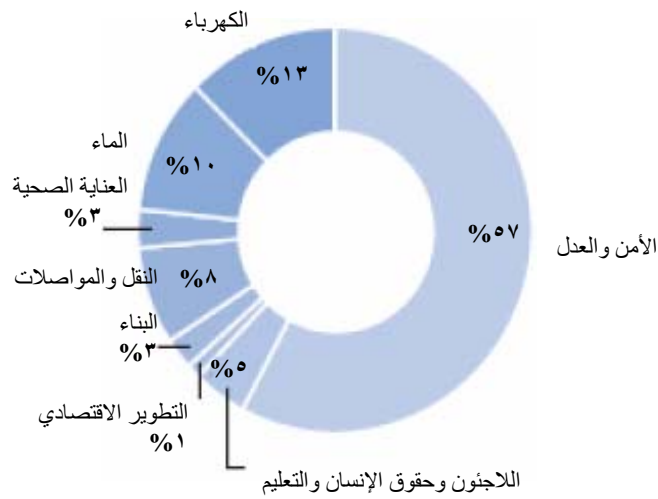

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها	
٢	\$٠,٠٨	-	-	النفط والغاز
١١١	\$١٢١,٨٩	٣	\$٧,٧٢	الكهرباء
٥٠٠	\$٩٠,٣٠	٦	\$١٩,٧٢	الماء
١٧٤	\$٣٠,٩٠	٨	\$٠,٧٤	العناية الصحية
٣١٢	\$٧٨,٠٢	٥	\$٠,٨٤	النقل والمواصلات
٦٤	\$٢٦,٥٦			البناء
١,١٦٣	\$٣٤٧,٧٤	٢٢	\$٢٩,٠٢	المجموع

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:


- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ ٢٠٠٨؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

نينوى في لحظة سريعة		
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2)	\$316
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)	\$311
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	\$32
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)	\$72
التمويل العراقي دولار	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام 2008	357,70 مليون
الأمن	مجموع الاعتداءات 2008/7/1-2008/4/1	1,041
	مجموع الاعتداءات 2008/9/30-2008/7/1	924
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة	أذار/مارس 2009
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع	13
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً	588
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة	9,751
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة)	19,359
	عدد مستعملي الإنترنت	18,000
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة	9
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل	158,683
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية 2006 والسنة المالية 2007)	27,43 مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات	60 بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة 2008/7/1-2008/9/20	1,063
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي	62
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي	3,04 مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات 1-3 لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات
تبصرات القيادة: رغم أن محافظة نينوى شهدت هبوطاً في عمليات العنف خلال الأشهر التسعة الماضية فلا زالت تصنف كأحدى الأماكن الأشد عنفاً في العراق. أبلغ فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى أن المقيمين وعلى وجه الخصوص سكان المناطق الريفية، تنقصهم الوسائل الملائمة للوصول إلى الخدمات الأساسية. علاوة على ذلك، يبقى تنفيذ الموازنة بطيئاً ولا يتم الإبلاغ بصورة شفافة عن بيانات الإنفاق.^(٤١٨)

تستمر البطالة في أن تكون مشكلة في المحافظة. الجفاف يعرض الأمن الاقتصادي لحوالي ٧٥ ألف عائلة ريفية للخطر.^(٤١٩) خصصت الحكومة العراقية مبلغ ١٦٧ مليون دولار للإغاثة بسبب الجفاف لثلاث محافظات ولكن لم تكفي الأموال لمواجهة المشاكل في نينوى. استفاد من التمويل عدد صغير فقط من أصحاب الأراضي وتستمر نينوى تعاني من النقص في إمدادات الديزل والبنزين والغاز.



سد الموصل على نهر دجلة في نينوى (صور من ديجيتال فيو ٢٠٠٧ وورلد فيو ٢٠٠٨)

لا يزال يُنتظر أن يولد مبلغ ١٠٠ مليون دولار إضافي قد خصصهم مكتب رئيس الوزراء لإعادة الإعمار فوائد ملموسة للمحافظة.^(٤٢٠) تخضع أقسام عديدة من محافظة نينوى لسيطرة حكومة إقليم كردستان ولا تزال مسألة الحدود الداخلية تغرق المجموعات داخل المحافظة.^(٤٢١) بلغ فريق إعادة إعمار المحافظات ان الغالبية العربية السنية تبقى مستنناة بدرجة كبيرة من الحياة السياسية والاقتصادية في المحافظة. تُشكل أفراد الطائفة السنية أكبر مجمع للمجندين المتمردين. يملك الأكراد مزية واضحة في الأمن المادي والاقتصادي.^(٤٢٢)

الأمن والعدل: في ربع السنة هذا وللمرة الأولى زار فريق حكم القانون التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات رئيس القضاة في منطقة الموصل لتقييم أعمال المحاكم ومناقشة إجراءات المحاكمة والمسائل اللوجستية لوزارة الداخلية.^(٤٢٣) لكن ابلغ فريق إعادة إعمار المحافظات في نينوى ان حكم القانون لا يزال غير مطبق في المحافظة وان التفريق الاثني والطائفي يعقد تجنيد أفراد للجيش ولقوات الشرطة.^(٤٢٤)

التعليم: ساعدت وزارة التعليم في العراق ومجلس محافظة نينوى في إدخال البرنامج الدراسي "مكتبتي العربية" إلى المحافظة. وفي خريف هذه السنة سوف يتم تزويد كتب مدرسية عربية إلى ٤٦٠ مدرسة لطلاب الصف الأول حتى الصف السادس.^(٤٢٥)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
أبلغت فرقة منطقة الخليج (GRD) عن ١٢ مشروع يجري تنفيذهم بقيمة ١٦,٣٩ مليون دولار.^(٤٢٦) بنهاية ربع السنة هذا اكتمل تنفيذ ٤٧٨ مشروعاً بقيمة ٢٦٨,٧٥ مليون دولار.

الأمن والعدل: استمر خلال ربع السنة هذا العمل على إعادة تأهيل مشروع قيادة عمليات نينوى^(٤٢٧) الذي يحول جزءاً من قاعدة العمليات المتقدمة الأميركية إلى مركز عمليات للجيش العراقي ومنطقة دعم

لوجستية. سوف تستعمل المنطقة للتنسيق بين قوات الائتلاف وفرق الانتقال العسكرية وعمليات الجيش العراقي. يجري حالياً تنفيذ مشروع بقيمة ١,٧ مليون دولار لتحسين مقرات الضباط.^(٤٢٨)

الماء: يستمر العمل على محطة الحاضر لمعالجة مياه الشرب التي سوف تحسن إمكانية وصول سكان الموصل إلى مياه الشرب. يشمل المشروع إصلاح المضخات وتركيب أنابيب جديدة بطول ١٦ ألف متر بالإضافة إلى أعمال كهربائية. تقدر قيمة المشروع بـ ٢,٤ مليون دولار وقد اكتمل تنفيذه في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨.^(٤٢٩) من المتوقع أن تؤدي هذه التحسينات إلى رفع إمكانية الوصول إلى مياه الشرب لأكثر من ٢٢ ألف عراقي.^(٤٣٠)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة نينوى

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): ضمن إطار المشاريع المستندة إلى نظام التوزيع العام، أعد برنامج الحكم المحلي ثمانى مجموعات من المشاريع الجديدة للحصول على تمويل من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP-I) في العراق وقدم ثمانى استثمارات تسمية لمجموعات المدارس. يقدم البرنامج المشورة حول المقترحات الواردة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق لمرافق تابعة لسبع مدارس جديدة وثلاثة مشاريع لتعبيد الطرق ومشروع لإنارة الشوارع في الموصل باستعمال الطاقة الشمسية.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): بموجب برنامج مهارات التفاوض وإدارة النزاعات تم تدريب ٦٠ طالباً وطالبة من جامعة الموصل على مهارات التفاوض وإدارة النزاعات، للمساعدة في تكوين "بناة السلام" ضمن الجسم الطالبى.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/TRAP): تدعم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) منحة عبر آلية صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق لتمويل شراء كراسي مدولبة لتوزيعها على ١٣٠٠ طفل عن طريق منظمة الهلال الأحمر العراقي.

صندوق مرلا روزيكا لضحايا الحرب: ينفذ في نينوى ٣٥ مشروعاً ممولين من صندوق مرلا روزيكا لضحايا الحرب (٢٨ مشروعاً في الموصل). تساعد هذه المشاريع ضحايا الحرب على استرداد المداخيل التي خسروها وتجهيز المستشفيات وتسهيل الإنتاج المحلي، وتوزيع الكراسي المدولبة.

برنامج عمل المجتمع المحلي (CAP II): ضمن إطار برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني، ينفذ ٢٧ مشروعاً في نينوى لدعم التعليم، وتقديم الخدمات على نطاق صغير، وتدريب المتدرجين وبناء سقيفات للحافلات في الموصل وفي مدن أخرى.


الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

برنامج استقرار المجتمع المحلي (CSP): تخرج أكثر من ٢،٦٣٨ شخصاً من برامج التدريب المهني في الموصل وتلعفر، ويتابع حالياً ٧٤٥ آخرين الدروس التي تقدمها البرامج. وافق برنامج استقرار المجتمع المحلي على تقديم ٨٥٢ منحة في المحافظة بقيمة ٧,١ مليون دولار، لتوفير أكثر من ٦٠٦ فرصة عمل طويلة الأمد.

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات التمويل الصغيرة في المحافظة بأكثر من ٣ مليون دولار على شكل قروض أعطيت إلى ١،٣٥٧ شركة أعمال. بلغت نسبة تسديد القروض ٩٧ بالمئة. لا يزال ٥٦٦ قرصاً بقيمة ٩٤٢،٧٨٤ دولار معلقين في الوقت الحاضر.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" أكثر من ٢،٥١٨ موظفاً حكومياً من نينوى على العمل في الإدارات العامة من خلال إدخال ٨ مقررات ذات مستويات كفاءة مختلفة. شملت المواضيع القيادة والاتصالات، إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد.


مكتب المساعدات الخارجية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: درب مكتب المساعدات الخارجية في حالة الكوارث ٤٠ موظفاً طبياً في تلعفر على إدارة أمراض الأطفال، الالتهابات التنفسية الحادة، ذات الرئة والإسهال كما على العناية بالأم والوليد. استفاد حوالي ٢٠ ألف مهجر إلى الداخل من هذه الخدمات.

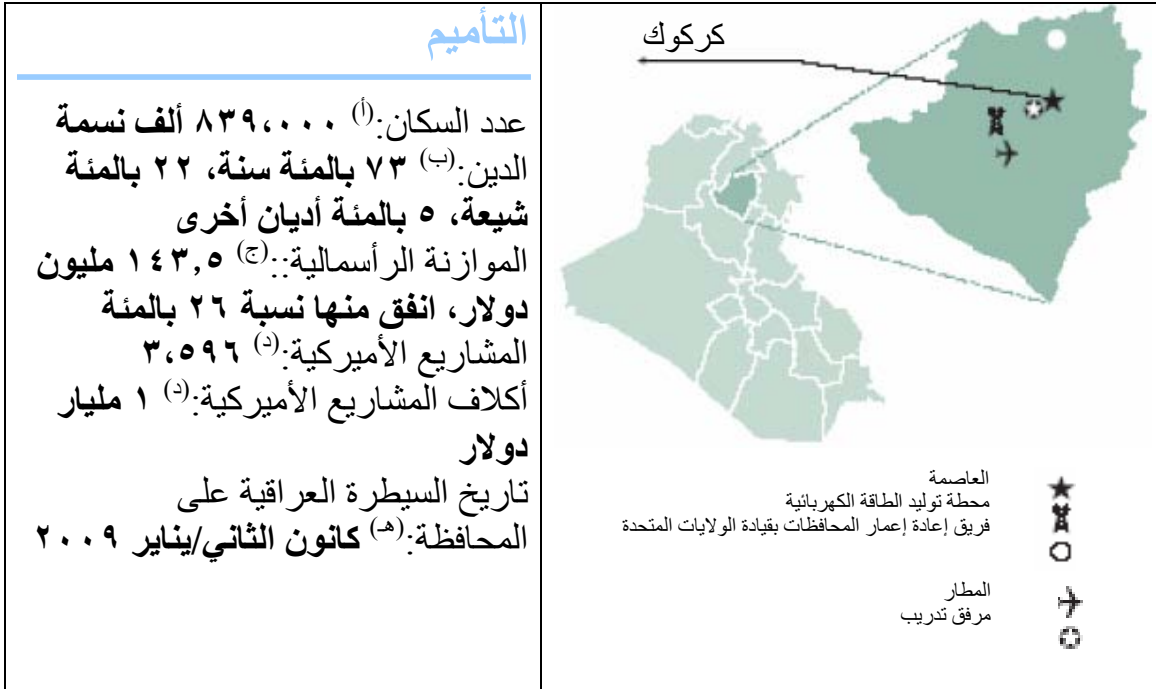


العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

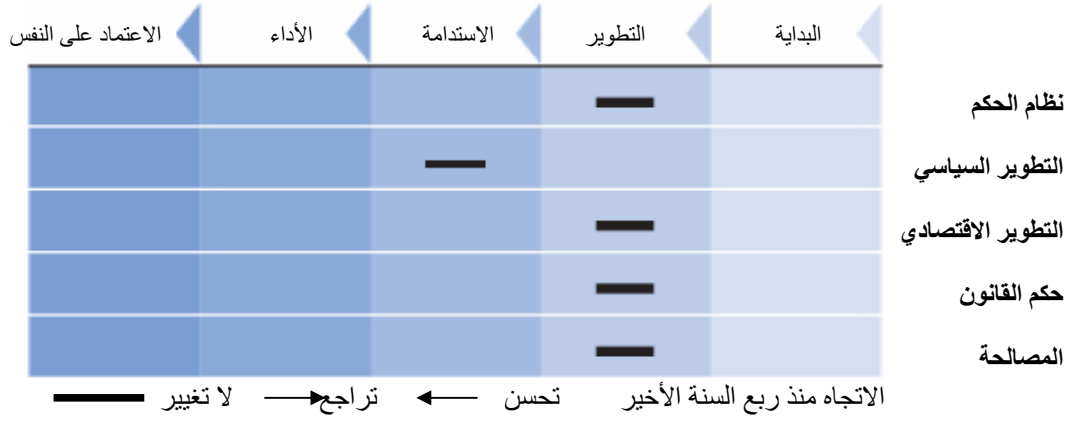

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

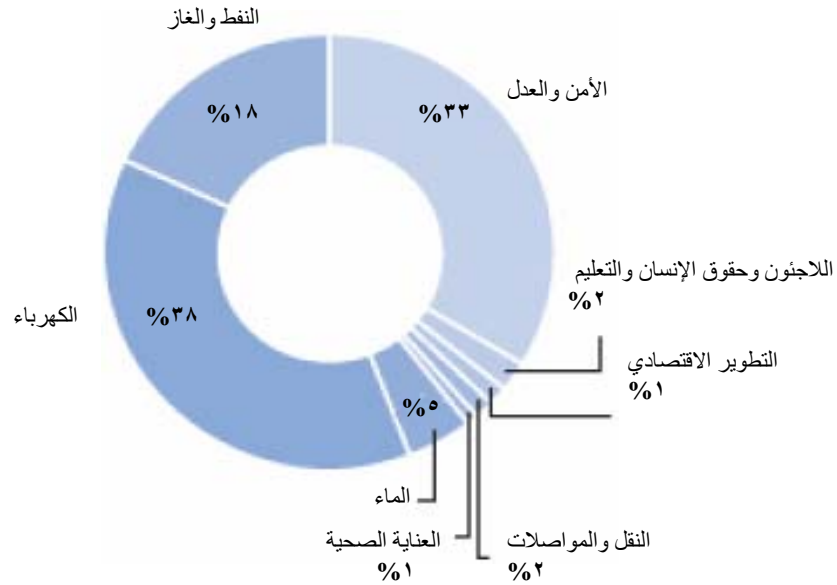

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط) (بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها	
٥٧	\$١٦٨,٨٢	-	-	النفط والغاز
١٢١	\$٣٥٦,٦٤	٢	\$٣٨,٢٦	الكهرباء
١٧٢	\$٤٤,٣٠	٤	\$٢,٣٢	الماء
٨٣	\$٨,٧٤	١	\$٠,٥٩	العناية الصحية
٧٤	\$١٥,٤٤	١	\$٠,٤٤	النقل والمواصلات
١١١	\$٣,٩٠	١	\$٠,١٩	البناء
٦١٨	\$٦١٥,٨٤	٩	\$٤١,٨٠	المجموع

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبيرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢/١٠/٢٠٠٨.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ١/١٠/٢٠٠٨. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ١٣/١٠/٢٠٠٨؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٣٠/٩/٢٠٠٨، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٨.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ١/١٠/٢٠٠٨. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٣/١٠/٢٠٠٨. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ١/١٠/٢٠٠٨. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٣/١٠/٢٠٠٨. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

نظرة إجمالية على المحافظات

التأمين في لحظة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$١,٢٠٣
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$٢٧٤
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٢٦٧
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$١٧٧
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ١٤٣,٥٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ٢٤٨
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٢٤٥
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ٤
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ٧٤٨
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٤,٢٩١
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٧,٣٧٣
	عدد مستعملي الإنترنت ٣٠,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٥
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٥٩,٥٤١
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٢٧,١٠ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٦٥ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٣٥٣
	(٢٠٠٨/٩/٢٠-٢٠٠٨/٧/١)
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٦٠
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٢,٨٩ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ٣-١ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات تبصرات القيادة: يستمر موظفو فرق إعادة إعمار المحافظات في كركوك وبرنامج الحكم المحلي الذي تنفذه الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) في التشديد على تطوير القدرة المؤسساتية للمحافظة. يشمل هذا التطوير القدرة التشغيلية والإدارية كما عملية تطوير الموازنة المرافقة^(٤٣١) خلال ربع السنة هذا، بادر فريق إعادة إعمار المحافظات وفرقة منطقة الخليج إلى تطوير خطة رئيسية لأنظمة المجاري الصحية ومياه الأمطار في مدينة كركوك. تم تطوير هذا المشروع بالتعاون الوثيق مع مديرية المجاري الصحية في كركوك ودوائر حكومية أخرى في المحافظة وشكل أول استراتيجية شاملة للبنية التحتية المدنية في العراق.

طور فريق إعادة إعمار المحافظات نطاق عمل وخطة إصلاح المرفق الوحيد القائم حالياً لمعالجة المياه المهدورة الذي تملكه الدولة في مدينة كركوك. تم ربط هذا المرفق بشبكة أنابيب لتجميع المياه بقيت غير مشغلة لجوالي عقدين تقريباً، وسوف يُعاد تجهيزه من خلال منحة بقيمة ٤٩٠ ألف دولار من صندوق الاستجابة السريعة^(٤٣٢).



حقول النفط في محافظة التأميم (صورة من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي)

وضع فريق إعادة إعمار المحافظات في كركوك دراسة جدوى اقتصادية لمشروع محتمل في نهر عال. من المتوقع أن يطور المشروع محطة ضخ للرفع العالي وشبكة أنابيب ونظام ضخ يستطيع نقل ومعالجة المياه من نهر دجلة إلى سكان مدينة كركوك. تقدر كلفة المشروع بحوالي ٢٨٥ مليون دولار، وسوف تدعمه فرقة منطقة الخليج والمديريات العراقية وفرق إعادة إعمار المحافظات. سوف يتم تنفيذ المشروع بالكامل خلال ثلاث إلى أربع سنوات^(٤٣٣). قامت أيضاً فرق إعادة إعمار المحافظات بتطوير وإنشاء محطة تجريبية لمعالجة المياه تعتمد على الترشيح الرملي البطيء بمثابة حل للمدى القصير. تستخدم وحدة إنتاج مياه الشرب هذه تكنولوجيا متدنية الكلفة يمكن تشغيلها وصيانتها بسهولة^(٤٣٤).

خلال ربع السنة هذا، أكملت العيادة الصحية النقالة في كركوك أول شهرين من العمل في القسم الجنوبي الشرقي لمحافظة التأميم. فرق إعادة إعمار المحافظات في كركوك وقوات الائتلاف والمدير العام للصحة في كركوك باشرت تنفيذ هذا المشروع في أوائل العام ٢٠٠٨ وتديره الآن السلطات العراقية.

الأمن: لا زالت مسألة السيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط من دون حل. ولذلك، يبقى الأمن في محافظة التأميم دقيقاً مع انفجار التوترات الاثنية العنيفة من وقت لآخر^(٤٣٦) وتستمر أيضاً مجموعات المتمردين، وبضمنها تنظيم القاعدة في العراق وجيش الإسلام وجيش النقشبندي، في نشاطها في المحافظة. تعمل قوات الائتلاف وقوات الأمن العراقية وفرق أبناء العراق بصورة مجتمعة لمواجهة الإرهاب في المحافظة^(٤٣٧).

التعليم: في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، نظم فريق الاقتصاد والزراعة في فرقة إعادة إعمار المحافظات أول عملية تدريب شهرية على الكفاءة في عيادات الطب البيطري. سوف يتلقى أكثر من مئة مشارك من نقابة الأطباء البيطريين في كركوك كتباً دراسية جديدة، كتيبات لتشغيل العيادات، سماعات فحص، مقاييس حرارة، مجموعات خاصة بالتوليد وإمكانية الوصول إلى مجهر من خمسة عشر مجهراً موجودة في عيادات عبر المحافظة^(٤٣٨). سوف تركز جلسات تدريب أخرى على مواضيع الإنتاج الزراعي والصحة العامة.

المرافق: قام فريق إعادة إعمار المحافظات في محافظة التأميم بالتنسيق مع أعضاء من السلاح الجوي الأميركي العاملين في شمال العراق بالعمل على مساعدة العراقيين في تحسين ممارسات إدارة النفايات في المنطقة. ساعد موظفون عسكريون في تدريب العراقيين على المحافظة على المعدات المشتراة حديثاً المستعملة لجمع النفايات في كركوك. اشترت فرقة إعادة إعمار المحافظات شاحنات جديدة ووظفت خبراء لإجراء إصلاحات شاملة على نظام إدارة النفايات في المدينة. يجري حالياً وضع خطط لإيجاد مراكز نقل لاستيعاب النفايات وهي في طريقها إلى موقع مطمر النفايات المحسن الذي سيخدم أكثر من ٧٠٠,٠٠٠ من سكان محافظة التأميم. تم إنشاء محطة نقل واحدة سوف تكون جاهزة للعمل قبل تسليم الشاحنات التي تبرعت بها فرقة إعادة إعمار العراق^(٤٣٩).

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
تنفذ فرقة منطقة الخليج (GRD) ٦ مشاريع في محافظة التأميم ممولة بمبلغ ٤,٣ مليون دولار^(٤٤٠) حتى هذا التاريخ تم إنفاق مبلغ ٨٦ مليون دولار على أشغال إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج في مدينة كركوك فقط^(٤٤١).

الماء: خلال ربع السنة هذا، استمرت أشغال إنشاء مشروع مياه الاطربان الذي تقدر قيمته بمبلغ ٨٧٢,٠٠٠ دولار^(٤٤٢) سوف يتم بموجب هذا المشروع تركيب أنابيب ومضخات وخزانات لنقل المياه من نهر دجلة وتزويد مياه الشرب إلى حوالي ٨ آلاف عراقي^(٤٤٣). اكتمل تنفيذ المشروع في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨^(٤٤٤).

التعليم: أكملت فرقة منطقة الخليج مشروع تحويل مدرسة الكوخ الطيني في كومباتلار الذي تقدر قيمته ب ٨٩,٠٠٠ دولار. حل محل المدرسة المبنية من الطين مبنى حديث يضم ست غرف تدريس ويستوعب ١٠٠ طالب^(٤٤٥).

العناية الصحية: اكتمل خلال ربع السنة هذا إنشاء مرفق التصوير بالرنين المغنطيسي في كركوك، المرفق الذي يؤمن خيارات تشخيص وعلاج أكبر للمرضى في مدينة كركوك^(٤٤٦).

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة التأميم

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

برنامج استقرار المجتمع المحلي (CSP): خلال ربع السنة هذا، تم تأمين ما يزيد عن ٢٤٠٠ فرصة عمل للمدى القصير وحوالي ٧٥٠ فرصة عمل للمدى الطويل بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي، تخرج ما يزيد عن ١٨٠٠ متدرب من مقررات تتعلق بالإنشاءات وغير الإنشاءات تحت رعاية برنامج استقرار المجتمع المحلي وتم تسجيل حوالي ٥٤٥ متخرج، من مقررات التدريب المهني في برامج التدرج وأمن برنامج استقرار المجتمع المحلي ٦٥٩ فرصة عمل أخرى للمدى الطويل من خلال تقديم منح لشركات الأعمال.

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات التمويل الصغيرة من خلال ٢١٦٩ قرصاً معلقاً بقيمة ٢،٩٧١،٧٦٩ دولاراً. منذ إنشاء هذا البرنامج، تم منح ٨٤٦٠ قرصاً بقيمة إجمالية بلغت ١٩،١٣٧،٦٤٦ دولاراً.

المشروع الزراعي: برنامج "إنماء" يطور مصادر إضافية لنبات البرسيم لتطوير علف الحيوانات. لكن التقدم يعتمد على توفر المياه وموافقة وزارة الزراعة على استعمال البذور المحسنة.

برنامج برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): لا يوجد نشاطات لبرنامج "تطوير" في هذه المحافظة.

مكتب المساعدات الخارجية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية: يزود مكتب المساعدات الخارجية في حالة الكوارث خدمات الصحة الأساسية إلى عائلات المهجرين إلى الداخل الأشد احتياجاً في محافظة التأميم مع إعطاء الأولوية إلى الأطفال والنساء. تم تنفيذ أعمال المشروع بالاشتراك مع المديرية العامة للصحة. تزود الخدمات بدون مقابل في المراكز الصحية النقالة.

الديمقراطية ونظام الحكم


برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): قَدّم البرنامج الثاني للحكم المحلي ٩ دورات تدريب حول قانون المحافظات الجديد لأعضاء ٨٥ مجلس حكم محلي. بالإضافة إلى ذلك، اشترك ١٤ منسفاً في المجالس المحلية في ٣ دورات تدريب على النظام الداخلي للمجلس. يستمر أعضاء هيئة الموظفين في برنامج الحكم المحلي على مقابلة المسؤولين في المحافظة لمناقشة خطة المحافظة لتطوير كركوك التي سوف تشمل قائمة نهائية للمشاريع الرئيسية لعام ٢٠٠٩.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): يدعم تمويل صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق مركز تدريب في غرفة موجزات أنباء وسائل الإعلام في كركوك ومركز تدريب في شبكة مبنى المحافظة في كركوك. تدعم المنح أيضاً مركزاً للتدريب الزراعي.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): سوف يتم تزويد منظمة غير حكومية بكافة المواد والأجهزة الضرورية (آلات كمان وأدوات رسم) لإنشاء مركز تدريب على الموسيقى والفنون من أجل تدريب الشباب والفتيات. سوف تضم الدورات التدريبية ٤٠ شاباً وشابة من مجموعات إثنية متعددة في مدينة كركوك.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): ينفذ البرنامج الثاني لعمل المجتمع المحلي ٤٠ مشروعاً في محافظة التأميم لصالح المجتمع الأهلي، بما في ذلك برنامج تدرج مهني للشباب العاطلين عن العمل، إعادة تأهيل المدارس، رفع مستويات شبكة إمداد الطاقة، تحسينات على شبكات توزيع المياه وإنشاء بُرك لتطهير الأغنام، مستودعات للبذور، وغرف تدريس. يزود أيضاً هذا البرنامج معدات كمبيوتر وتجهيزات للمدارس مطلوبة بالحاج.


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢

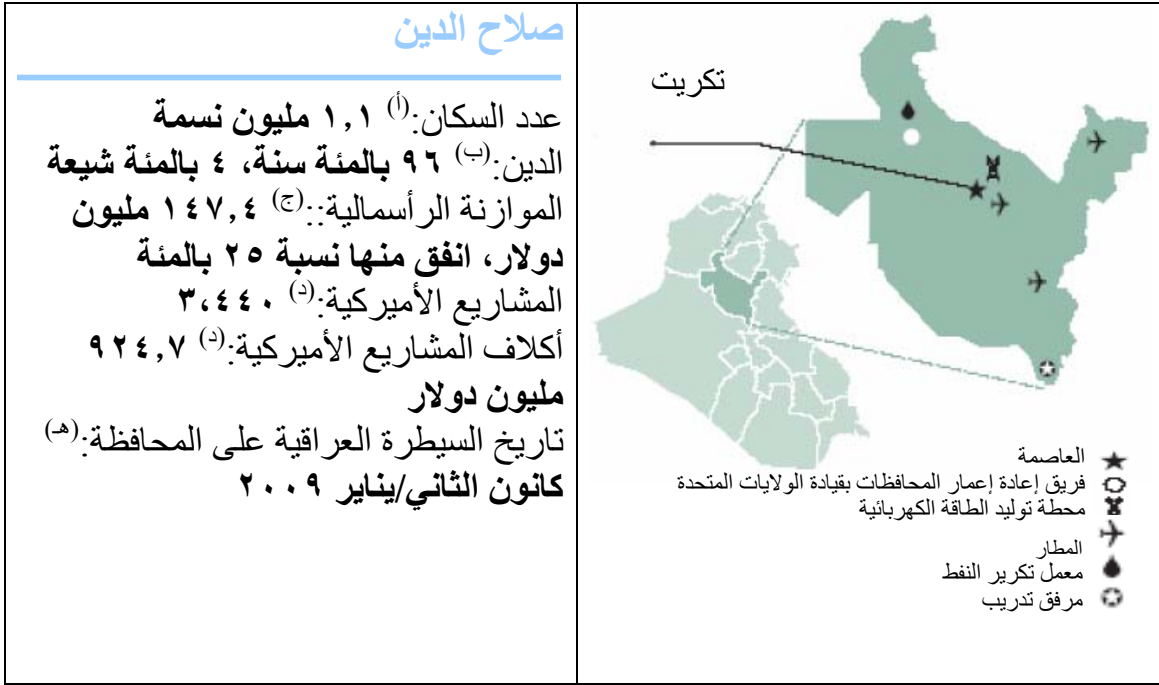


العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

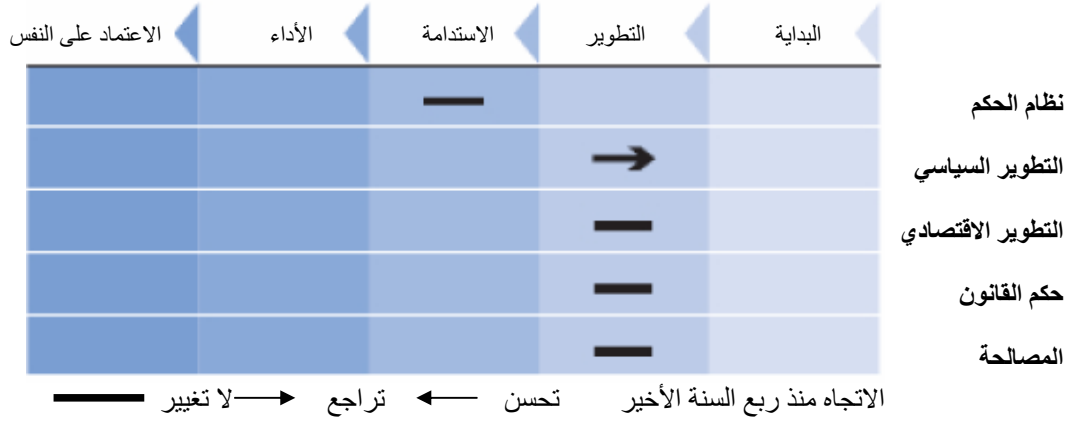

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

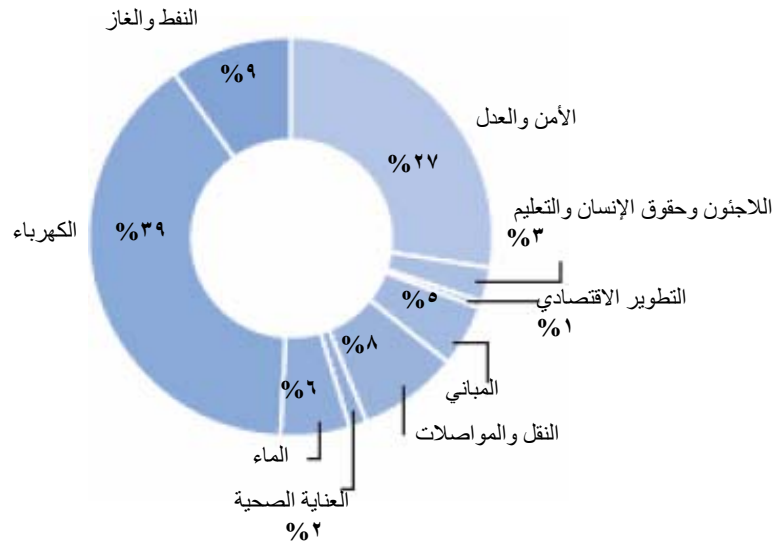

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها
٢١	\$٢٨,١٤	١٠	\$٦٢,٤٧
٢٢٣	\$٣٥٨,٨١	٥	\$٥,٢٧
٣١٦	\$٤٩,٠٢	٨	\$٢,٥٣٢
١٥٧	\$١٥,٠٩	٤	\$٠,٠٣
٢٣٢	\$٣٧,٣٩	٩	\$٣٦,٨٢
١١	\$٣٩,٣٩	٢٢	\$٤,٧٩
٩٦٠	\$٥٢٧,٨٥	٥٨	\$١١١,٩١

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ ٢٠٠٨؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

صلاح الدين في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$٦٤٢
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$١٨٧
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٢٩٠
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$١٨٥
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ١٤٧,٤٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ٧١٧
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٤٨٦
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ٥
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ٤,٧٣٣
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٥,٣٥٩
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٨,٧٥٤
	عدد مستعملي الإنترنت ٥٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٨
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٨٧,٠٦٥
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٢٤,٣٠ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٤٤ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٤٩
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ١٠٩
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٤,٣١ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ٣-١ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات تبصرات القيادة: أبلغ فريق إعادة إعمار المحافظات في صلاح الدين وجود علاقة عمل وثيقة مع شريكة فريق القتال في اللواء، وخلال ربع السنة هذا نسق نشاطاته مع سلطات المحافظة بشأن عدة نشاطات: (٤٤٧)

- توفر عملية الموافقة من لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRDC) لدعم كافة مشاريع البنية التحتية وليس فقط تلك الممولة من الحكومة الأميركية.
- فرقة منطقة الخليج تدمج سلطات المحافظة في عملية منح العقود الخاصة لمشاريعها والإشراف عليها.
- تقوم لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات بتأمين الفحص الدقيق لمشاريع البنية التحتية التي ينفذها برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق من أجل التأكد من انها تلبى المقاييس العراقية وأنه جرى الالتزام بإنفاق الأموال العراقية على عمليات التشغيل والصيانة مع ان هذا العمل غير مطلوب منها القيام به.

شاركت أيضاً فرق إعادة إعمار المحافظات مع لجنة الاستثمار في المحافظة لزيادة الوعي لدى المستثمرين من الدول المجاورة بوجود فرص استثمار في القطاع الخاص. (٤٤٨)



محطة تكرير النفط في بيجي (صور من ديجيتال غلوب ٢٠٠٦، وورلد فيو ٢٠٠٨)

الأمن: تعمل فرقة إعادة إعمار المحافظات للتخفيف من الاكتظاظ وتحسين ظروف الحياة السيئة في السجون في تكريت. عمل خبراء من الأقسام الصحية والقضائية لدى فرق إعادة إعمار المحافظات مع عراقيين لتحسين الإصلاحات وتدريب محققى الشرطة المحلية كجزء من هذا الجهد. (٤٤٩)

نظام الحكم: تم تسليم برنامج قاعدة البيانات الذي طورته فرق إعادة إعمار محافظة صلاح الدين لتحسين تعقب مشاريع البنية التحتية إلى مجلس المحافظة في ربع السنة هذا. (٤٥٠) سوف يساعد البرنامج حكومة المحافظة على إدارة موارنتها وعملية منح العقود. (٤٥٢)

التعليم: فرق قامت إعادة إعمار المحافظة ومجلس المحافظة وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي بتنسيق جهودها لوقف تنفيذ ٢٣ مشروعاً لبناء مدارس بسبب النوعية السيئة لعمل المقاول. أصبح المقاولون الآن مسؤولين عن منتجاتهم. (٤٥٢)

الزراعة: بالتعاون مع مستشار زراعي وطبيب بيطري من الفرقة المتعددة الجنسيات في الشمال تساعد فرق إعادة إعمار المحافظة في إعادة تنشيط صناعة الدواجن بواسطة منحة من صندوق الاستجابة السريعة قيمتها ٥٠ الف دولار مقدمة إلى جمعية منتجي الدواجن في صلاح الدين التي تأسست حديثاً. (٤٥٣) سهلت فرق إعادة إعمار المحافظة تشكيل فريق عمل زراعي الذي عرف القادة الزراعيين في المحافظة بمجموعة من التكنولوجيات والأساليب التقنية الجديدة. (٤٥٤)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
في ربع السنة هذا، بدأت فرقة منطقة الخليج بتنفيذ ٢٦ مشروعاً جديداً في محافظة صلاح الدين مما يجعل مجموع المشاريع التي هي قيد التنفيذ ٤٥ وتقدر قيمتها بحوالي ٢٥٨,٠٩ مليون دولار. ^(٤٥٥) أكملت فرقة منطقة الخليج تنفيذ ٢٩٨ مشروعاً حتى هذا التاريخ بقيمة تقدر بأكثر من ٧٤١,٨٣ مليون دولار. ^(٤٥٦)

التعليم: في ربع السنة الأخير، بدأت أعمال إنشاء المدرسة الابتدائية للبنات في صبا-مشروع بقيمة ١٦٢,٠٠٠ دولار. ^(٤٥٧) أصبح المشروع مكتملاً حالياً بنسبة ٢٠ بالمائة وسوف يحل محل المدرسة المبنية من الطين في صبا. سوف تشمل المدرسة ست غرف تدريس، وملعب ومياه شرب. ^(٤٥٨)

الأمن والعدل: اكتملت خلال ربع السنة هذا مشاريع تحويل مستودع بيجي إلى ثكنات مما وفر مساكن مؤقتة لحوالي ٦٥٠ جندياً عراقياً. ^(٤٥٩) حول هذا المشروع الذي تبلغ قيمته ٢ مليون دولار مستودعي ذخيرة إلى ثكنات مؤقتة لموظفي الأمن العراقيين الذين يحرسون محطة تكرير النفط في بيجي. ^(٤٦٠)

النفط: منذ أيار/مايو ٢٠٠٨، استمر العمل على تنفيذ المرحلة الخامسة لمنطقة حظر خط أنابيب النفط الممتد من بيجي إلى بغداد. أنجزت نسبة ٢٩ بالمائة من المشروع ومن المتوقع ان يكتمل بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. أبلغت فرقة منطقة الخليج ان ١٥ كيلومتراً من الخنادق والحوافي والحفريات والتنظيفات أصبحت مكتملة الآن. يهدف المشروع إلى خفض التبعيات على خط الأنابيب الذي يعيق تسليم النفط الخام والمكرر. ^(٤٦١)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة صلاح الدين

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): نظم البرنامج الثاني للحكم المحلي منتديات في الأقضية والنواحي لتشجيع الشفافية والمشاركة الشعبية الأوسع في انتقاء المشاريع وتقديم التوصيات لموازنة العام ٢٠٠٩ وسهل إكمال خطة تنمية المحافظة. قدم البرنامج أيضاً تدريباً فنياً لأربع مئة موظف حكومي محلي رئيسي على خدمات إدارة وتشغيل وصيانة مشاريع البنية التحتية الأساسية.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): يقدم صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق دعماً مالياً للمكتب الانتخابي لمحافظة صلاح الدين كما لبرنامج تدريب النساء على تشغيل الكمبيوتر ويقدم معدات للتدريب وكتب دراسية طبية ويدعم كلية الطب في صلاح الدين.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): بادر برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق بتفحص احتياجات المجتمعات المحلية في محافظة صلاح الدين وتاريخ ومصادر النزاعات التي تحدث ضمن هذه المجتمعات من أجل إعداد مشاريع سريعة التأثير.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): ضمن إطار البرنامج الثاني لعمل المجتمع المحلي، ساهم ٣٥ مشروعاً للمجتمع المحلي في تزويد برنامج للتدرج المهني للشباب، إعادة تأهيل لمدارس، رفع مستويات شبكة الطاقة الكهربائية، تحسينات على شبكات توزيع المياه، إصلاح مكتبة، وإنشاء مركز لمساعدة المعوقين.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: يجري تنفيذ ١٣٥ مشروعاً في محافظة صلاح الدين بضمنها إنشاء مخبز سمارا، إنشاء وتوسيع عدة متاجر (تزويد المون للمنازل، محلات بقالة، هواتف نقالة، وأدوات كهربائية)، إعادة تأهيل مجموعة أدوات المعالجة المائية العلمية في مستشفى دجلة وتزويد معدات إلى المدارس والمستشفيات.

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات التمويل الصغيرة عبر ٤٣٨ قرصاً معلقاً بقيمة ٥٦٢،٩٩٠ دولاراً. ومنذ بدء نشاط هذه المؤسسات، تم منح ٥٣٠ قرصاً بلغ مجموعها ١،٣٢١،٩٧٠ دولاراً. يزداد أيضاً برنامج "تجارة" المساعدة الفنية والتدريب وبناء القدرات لمراكز تطوير مؤسسات الأعمال الصغيرة التي يملكها عراقيون، كمنظمة الصحراء للتطوير الاقتصادي. بصورة عامة، تقدم مراكز تطوير مؤسسات الأعمال الصغيرة التدريب والاستشارات إلى المجتمع المحلي.


المشروع الزراعي "إنماء": ساعد برنامج "إنماء" مصنع بلد للتغليب في استعادة تأمين إمدادات الكهرباء والماء الضرورية لاستئناف إنتاج رقائق البطاطا والمياه المعبأة والمشروبات المنكهة بالفواكه.

برنامج استقرار المجتمع (CSP): في ربيع السنة هذا، جرى تأمين ٢٠٠ فرصة عمل للمدى القصير و ٧٠ فرصة عمل للمدى الطويل بموجب برنامج استقرار المجتمع. بدأ العمل على تطوير وإعادة تأهيل شارع الاتبعة والحديقة العامة في حي الباشا وموقف السيارات. رعى البرنامج أيضاً تدريب ٢٤٠ ولداً للمشاركة في مباريات لكرة القدم في شهر رمضان ونسق العمل مع مدرسة الصنائع في تكريت ووزارة التعليم لإعداد ٤ مقررات تعليمية حول التجارة.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" ١٠١ موظفاً حكومياً من محافظة صلاح الدين على شؤون الإدارة العامة والإدارة من خلال إدخال ٨ مقررات تعليمية لمستويات كفاءة متنوعة. شملت المواضيع الدراسية القيادة والاتصال، إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد.

الأنبار


عدد السكان: (أ) ١,٣ مليون نسمة
 الدين: (ب) ٩٩ بالمئة سنة، ١ بالمئة شيعة
 الموازنة الرأسالية: (ج) ٣٢٣,٠ مليون دولار،
 انفق منها نسبة ٤٢ بالمئة
 المشاريع الأميركية: (د) ٧,٥٩٣
 أكلاف المشاريع الأميركية: (هـ) ١,٨ مليار دولار
 تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة: (و)
 أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨

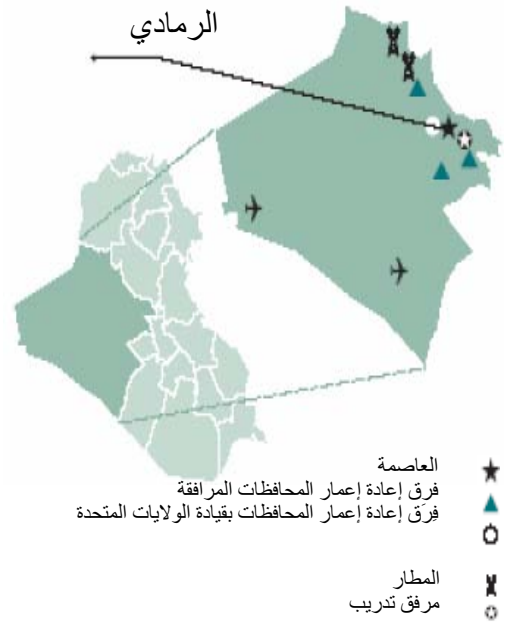

العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

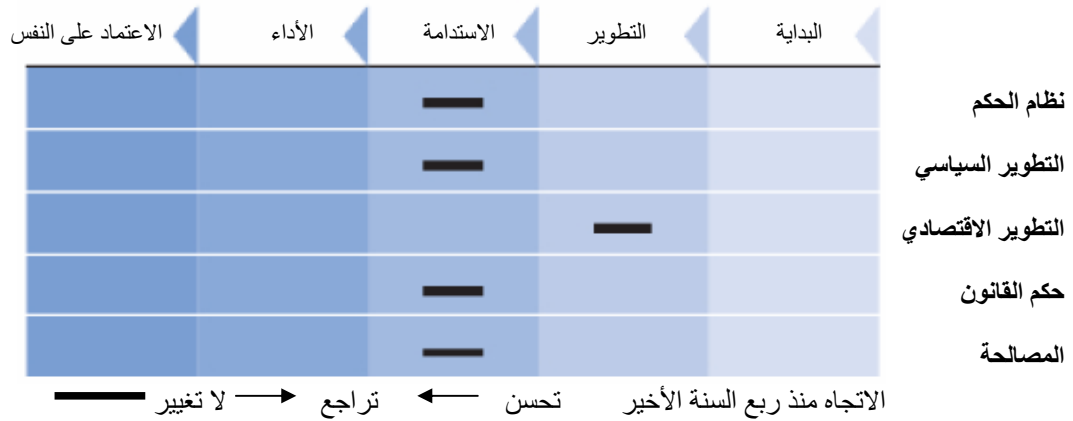

كافة المشاريع حسب القطاع (ح)



مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها
٤١٧	\$٢٢٠,٧١	٣٦	\$٧١,٣٤
٦٠٣	\$١٠٣,٢٩	٤٧	\$٥٥,٢٢
١٦٠	\$٢٧,٥٩	٢٢	\$٦,١٣
٤٠٦	\$٥٥,٨٤	٣٠	\$١٠,١٤
٣٠	\$٣,٦١	٤	\$١٠,٠٢
١,٦١٦	\$٤١١,٠٤	١٣٩	\$١٥٢,٨٥

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

نظرة إجمالية على المحافظات

الأخبار في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$٨٤٥
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$١,٣٠٤
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$١٠٥
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$٣٤٩
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ٣٢٣,٠٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ٢٧٥
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٢٠٩
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ١٦
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ١,٠٢٨
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٤,٧٢٨
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٧,٤٨٨
	عدد مستعملي الإنترنت ٣,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٧
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٧٩,٧٦٣
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٥٢,٢٨ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٥٥ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ١٢١
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ١٢٦
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٣,٥٤ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ٣-١ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات
تبصرات القيادة: نفذت فرق إعادة إعمار محافظة الأنبار عدة مبادرات لتعزيز عمليات تنفيذ موازنة المحافظة^(٤٦٢) بضمنها:

- تأسيس نظام محاسبية لإدارة المشاريع.
- تحسين الحوار بين المسؤولين في الأفضية والمحافظة.
- تدريب موظفي دائرة المحاسبة في المحافظة.
- تطبيق نظام المعلومات الجغرافية لتبيان مواقع مشاريع الاستثمارات الرأسمالية.

لاحظت فرق إعادة إعمار المحافظة المرافقة حصول تحسينات في الوضع الاقتصادي في المحافظة شملت إعادة تنشيط مشاريع تملكها الدولة، مبادرات منح تمويل صغيرة، انخفاض نقص الوقود بعد ان باشرت محطة تكرير في الحسيبة عملياتها وإكمال مشاريع من صندوق الاستجابة السريعة تزيد قيمتها الإجمالية عن ٥,٥ مليون دولار.

رغم التقدم، تبقى هناك تحديات عديدة، منها تحسين قدرات العراقيين للالتزام بتشغيل وصيانة مشاريع إعادة الإعمار المكتملة، التغلب على طبيعة الأرض والطقس وتأمين تمويل مناسب للالتزامات تنفيذ المشاريع^(٤٦٣). ابلغ فريق إعادة إعمار المحافظة المرافق في غرب الأنبار ان " جهود إعادة الإعمار الممولة من الولايات المتحدة" قد تكون ساعدت في تبني ثقافة حق الاستفادة من المساعدات^(٤٦٤).



مرفق معالجة المياه في الفلوجة

الماء: أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات أنه للمرة الأولى خلال ثلاث سنوات سوف تتمكن الفلوجة من الحصول على مياه شرب نظيفة غير مكلفة بعد ان جرى تسليم وحدات معالجة المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية إلى المدينة^(٤٦٥). لا تحتاج هذه الوحدات إلى كهرباء أو وقود او مواد كيميائية لكي تعمل. يتزود السكان بالماء من خزان أو مباشرة من الوحدة. بإمكان كل وحدة ان تنتج ٣٠ ألف غالون من مياه الشرب في اليوم الواحد^(٤٦٦). وبغية توسيع إمكانية الوصول إلى مصدر لمياه الشرب تدرس بعض المواقع أساليب توزيع المياه إلى المنازل عبر صهاريج مياه. تبرعت شركة خاصة بتزويد معدات بقيمة ١,٣ مليون دولار وساعدت فرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة في التركيب^(٤٦٧).

حكم القانون: أبلغت دائرة الشرطة العراقية في الأنبار انها لا تملك معدات ملائمة ومرافق تدريب وموارد. وتعيق عمليات الترقية الداخلية لعناصر الشرطة عدم وجود شفافية وآليات كافية للاحتفاظ بالسجلات^(٤٦٨).

تعزى التهديدات التي يتعرض لها القضاة إلى التجمعات القبلية، ويستمر توسط أعضاء مجلس النواب نيابة عن زعماء القبائل في ان يكون مشكلة^(٤٦٩) ويشعر القضاة أيضاً بخيبة أمل لعدم استجابة مجلس النواب لأوامرهم وطلباتهم. ونتيجة لذلك، تم نقل المحاكمات الجنائية المتعلقة بالتهديدات في الفلوجة إلى محاكم الرمادي.^(٤٧٠)

العناية الصحية: في تموز/يوليو ٢٠٠٨، رعى فريق إعادة إعمار المحافظات المرافق في الأنبار أول مؤتمر رئيسي للصحة يعقد في مدينة الرمادي في المحافظة. حضر المؤتمر ما يزيد عن مئة طبيب عراقي من بينهم ثلاث طبيبات أتين من مستشفى النساء والأطفال.^(٤٧١)

نظام الحكم: في الأول من أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أصبحت الأنبار المحافظة الحادية عشر التي تنقل من إشراف قوات التحالف إلى السيطرة العراقية. بعد أن كانت من أكثر المحافظات عنفاً في العراق، سجلت عملية انتقالها إلى السلطة العراقية معلماً بارزاً لجهود الأنباريين والأميركيين في سبيل الأمن والاستقرار في المنطقة. في نهاية ربع السنة، أعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة الوجود الثابت لمنظمة الأمم المتحدة في المحافظة. وكان برنامج الأمم المتحدة للتنمية (UNDP) أول وكالة للأمم المتحدة تعمل في المحافظة وتبعها مكتب حقوق الإنسان لبعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق.^(٤٧٢)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
أكملت فرقة منطقة الخليج (GRD) عبر كامل محافظة الأنبار ٤٥٣ مشروعاً بقيمة ٧٥١,٤٦ مليون دولار و ٥٠ مشروع يجري تنفيذهم بقيمة تزيد عن ٢٥٢ مليون دولار.^(٤٧٣) وهناك ٤٣ مشروع جرى التخطيط لتنفيذهم بقيمة ١٧٠ مليون دولار.

الكهرباء: كجزء من الجهد المبذول لتوسيع مجالات وصول الطاقة الكهربائية إلى كافة المناطق في الأنبار، يجري تنفيذ أربعة مشاريع لتكريب خطوط هوائية للكهرباء. أكملت فرقة منقطة الخليج إنشاء محطتي تحويل بقوة ٣٣ كيلو فولت، وأعدت تأهيل محطة تحويل، ونفذت مشروع إنارة الشوارع بالطاقة الشمسية وخطوط تغذية تحت سطح الأرض بقوة ٣٣ كيلو فولت.^(٤٧٤) أعيقت هذه الجهود بسبب التحديات على خط النقل وتحويل الطاقة إلى غرب بغداد مما سبب تخفيض إجمالي للطاقة الكهربائية المتوفرة لمدينة الرمادي.^(٤٧٥) يستمر العمل في الفلوجة على تنفيذ مشروع إعادة تأهيل محطة التحويل بقوة ١٣٢ كيلو فولت في الشمال الغربي الذي تبلغ قيمته ١٤,٧ مليون دولار. من المتوقع ان يكتمل تنفيذ المشروع في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨.^(٤٧٦)

الماء: بغية زيادة إمدادات مياه الشرب في محافظة الأنبار، أبلغت فرقة منطقة الخليج ان التحسينات ضرورية على أنظمة الأشغال العامة في الفلوجة والرمادي.^(٤٧٧) كان سكان مدينة الفلوجة لا يملكون في ذلك الوقت خطوط لمياه الصرف الصحي.^(٤٧٨) اما اليوم فقد أكملت فرقة منطقة الخليج ١٠٩ مشاريع مياه في المحافظة بقيمة ٨٧,٨ مليون دولار. يستمر العمل في ٣٣ مشروع أشغال عامة ومياه.^(٤٧٩) انظر القسم ٤ للحصول على تفاصيل نظام معالجة المياه المهدورة في الفلوجة التي فتشها المفتش العام خلال ربع السنة هذا.

النقل والمواصلات: في ربع السنة هذا اكتمل إصلاح خطوط سكة حديد ممتدة من الشمال ومن الجنوب في الأنبار بقيمة ٣,٩ مليون دولار.^(٤٨٠) تبقى قيد التنفيذ ستة مشاريع نقل واتصالات بقيمة ٣٩,٩ مليون دولار.^(٤٨١)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة الأنبار

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم البرنامج "تجارة" مؤسسات التمويل الصغيرة لدى مؤسسة تمويل صغيرة يملكها عراقيون، ثلاثة فروع في الفلوجة والرمادي والقائم، مع ١،٦٠٥ قرض غير مسدد بقيمة ٢،٤٥٦،٧٨٩ دولار. منذ إنشاء هذه المؤسسات تم منح ١،٦٤٧ قرضاً بمجموع ٣،٨٧٢،٠٥٠ دولار.

المشروع الزراعي "إنماء": نفذ برنامج "إنماء" زراعة الذرة والرصد البيئي لأسواق المحاصيل الزراعية الشتوية.

برنامج استقرار المجتمع (CSP): في ربع السنة هذا، تم تأمين ٧،٥٢٦ فرصة عمل للمدى القصير و ٢،٩٣٤ فرصة عمل للمدى الطويل بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي. شارك أكثر من ١٠،٤٠٠ مراهق في نشاطات للشباب يرعاها برنامج استقرار المجتمع، وتخرج ما يزيد عن ١،٣٠٠ متدرب من دورات تدريب نظمها برنامج استقرار المجتمع في مجالات إنشائية وغير إنشائية عبر محافظة الأنبار. تم تسجيل أكثر من ٢٠٠ خريج في برامج التدرج المهني وتم إيجاد حوالي ٢،٦٠٠ فرصة عمل للمدى الطويل من خلال تقديم منح لشركات الأعمال.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" ٢٨٨ موظفاً في محافظة الأنبار على الإدارة العامة والإدارة. يستطيع هذا البرنامج ان يستجيب للاحتياجات المعينة لموظفي الوزارات عبر ورش عمل مصممة خصيصاً لها الغرض وبرنامج تدريب للمدرب يسمح للوزارات بتوزيع منهاجها الدراسي الداخلي.

مكتب المساعدة الأمنية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): يزود مكتب المساعدة الأمنية في حالة الكوارث دعمه للمهجرين إلى الداخل في الأنبار، من خلال خمسة شركاء تنفيذيين في القطاعات التالية: الصحة، السلع غير الغذائية، الحماية، المأوى والإقامة، المياه/تعزيز الوضع الصحي والنظافة، تنسيق المساعدات الإنسانية والمعلومات وأنظمة الاقتصاد والسوق.

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): وقع المحافظ على مذكرة اتفاق تنص على تبني نظام معلومات تعقب المشاريع والمحاسبة في المحافظات (GAPTIS) بعد أن قدمه فريق برنامج الحكم المحلي في أيلول/سبتمبر. ساعد البرنامج أيضاً المسؤولين في المحافظة على إعداد قائمة أولويات للمشاريع الرأسمالية لموازنة والقيام بدور قيادي لتقديم الموازنة إلى المجلس التشريعي والموافقة عليها.


صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): مول صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق توزيع أجهزة راديو نقالة وساعد برامج إذاعية في الفلوجة، كما مكتب الانتخابات لمحافظة الأنبار وإدخال الكمبيوتر إلى مركز حكومة الأنبار.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): جمع برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق ٣٦٠ شخصاً في مباراة رياضية تقام تقليدياً في شهر رمضان.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): ضمن إطار برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني، تم تنفيذ ٤٩ مشروعاً، بما في ذلك تقديم دورات تعليمية على الخياطة والتمريض للنساء، ورفع مستوى شبكة الطاقة الكهربائية، وإعادة تأهيل شبكات توزيع المياه وإعادة تأهيل مدارس وإنشاء مرافق جديدة لمستشفى.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: ينفذ ٧٧ مشروعاً في الأنبار. تشمل هذه المشاريع دورات تدريب للمعوقين، بناء مساكن للعائلات الفردية وتزويد معدات كهربائية للمناجر. كما يتم تزويد مساعدة طارئة إلى عائلات ضحايا العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات التحالف.


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦.

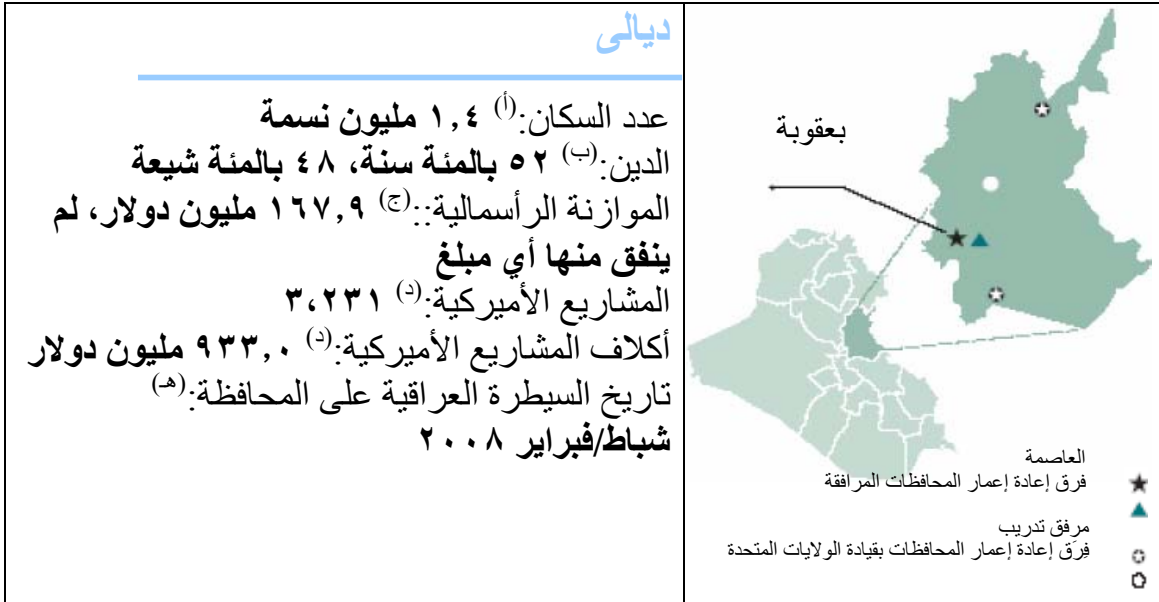


العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

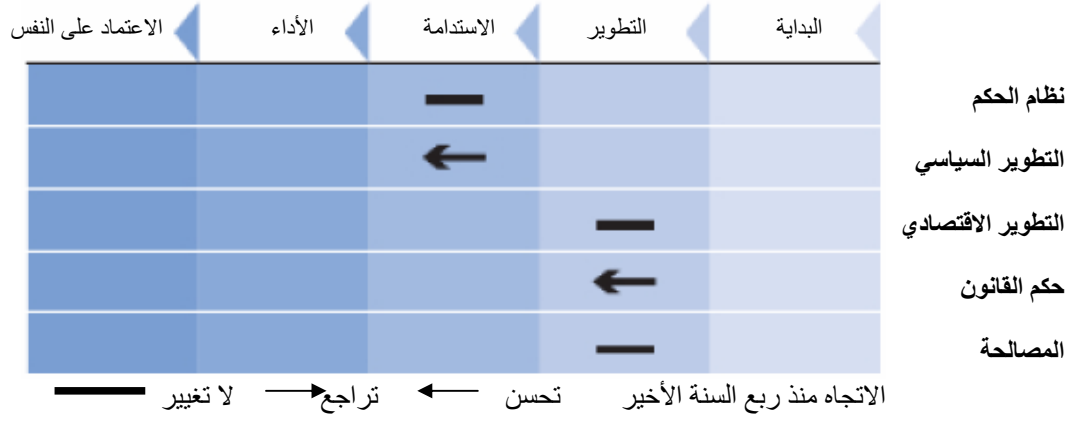

تكلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

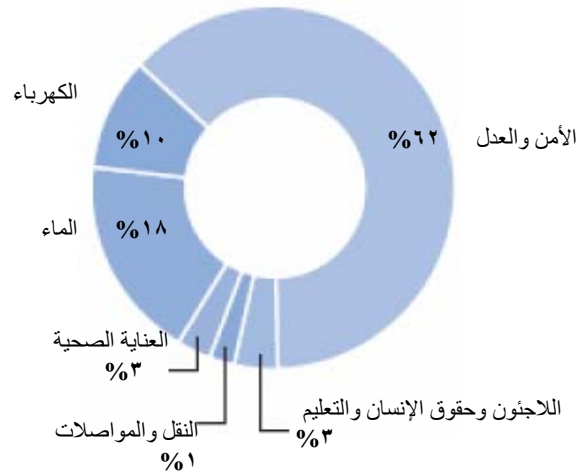

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها
١	\$٢,٨٩		
١٥١	\$٨٧,٧٩	٧	\$٣,٥٠
٣٣٤	\$١٤٣,٨٦	٩	\$٢٧,٥١
١٠٥	\$١٧,٢٦	١٠	\$١٤,١٤
١٩٢	\$١٨,٤١	٦	\$١,١٧
١١	\$٠,٧٦	٤	\$١,٤٩
٧٩٤	\$٢٧٠,٩٧	٣٦	\$٤٧,٨١

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢/١٠/٢٠٠٨.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ١/١٠/٢٠٠٨. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ١٣/١٠/٢٠٠٨؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٣٠/٩/٢٠٠٨، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٨.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ١/١٠/٢٠٠٨. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٣/١٠/٢٠٠٨. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ١/١٠/٢٠٠٨. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٣/١٠/٢٠٠٨. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

ديالى في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$٦٢٢
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$٣١٩
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٢٢
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$١٣٦
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ١٦٧,٩٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ٥٣٧
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٥٣٣٩
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة شباط/فبراير ٢٠٠٨
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ١
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ١٨٣
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٣,٢٥٦
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٥,٢٩٩
	عدد مستعملي الإنترنت غير متوفر
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٩
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٥٥٠,٤٧٧
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٢٤,٣٦ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٧٦ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٧٦ (٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٩/٢٠)
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٧٤
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٣,٢١ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ٣-١ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات
تبصرات القيادة: بالنسبة لمحافظة صنفها الحكومة العراقية على أنها "مفقودة للقاعدة" في منتصف العام ٢٠٠٧، شهدت ديالى تغييرات مذهلة في هذه السنة لكن تبقى التحديات الأمنية موجودة. في ربع السنة هذا أبلغ فريق إعادة إعمار المحافظة المرافق ان نشاطات عنيفة للمتطرفين تستمر في تقييد اتصالات الفريق مع العراقيين المحليين والخطر كبير على المواطنين المحليين الذين يقابلون أعضاء فريق إعادة إعمار المحافظة.^(٤٨٢)

رغم التقييدات على التحرك، أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات في ديالى انها دعمت تنفيذ النشاطات التالية في المحافظة:^(٤٨٣)

- دعم ٤٠ محاكمة في النصف الأول من عام ٢٠٠٨ انطلاقاً من لا شيء في عام ٢٠٠٧.
- إكمال نظام شفاف وتنافسي لمنح العقود.
- تشكيل لجنة فنية في المحافظة لحلول مكان لجنة إعادة إعمار وتنمية المحافظة الملغية.
- إنشاء مركز لعمليات إعادة الاعمار يضم حوالي ٤٠ مهندساً وعدة محامين لتأمين الإشراف على المشاريع في المحافظة.
- تشكيل مؤسسة من القطاع الخاص لتشجيع استعمال التكنولوجيا الحديثة في القطاع الزراعي.

تستعد فرق إعادة الإعمار في محافظة ديالى لتوسيع أعمالها خلال ربع السنة هذا. سافر مندوبون من فرق إعادة إعمار المحافظة إلى قاعدتين للعمليات الأمامية (FOB) لإنشاء مرافق جديدة للعيش والعمل.^(٤٨٤)

يعمل فريق إعادة إعمار المحافظة المرافق في ديالى على تحسين قدرات الحكم في المحافظة. وبتدريب من فريق إعادة إعمار المحافظة المرافق، تم تحسين علاقات العمل بين المسؤولين في الناحية والمخاتير الآخرين الذين يحضرون اجتماعات مجلس ناحية كنعان. بالإضافة إلى ذلك، أبلغ فريق إعادة إعمار المحافظة المرافق ان "تعزيز التعاون الوثيق بين مجالس الناحية والقضاء قد اثبت انه مقاربة ناجحة لزيادة قدرات الحكومة المحلية."^(٤٨٥)



إصلاحية خان بني سعد في محافظة ديالى (صورة من ديجيتال غلوب ٢٠٠٧، ومن وورلد فيو ٢٠٠٨)

الأمن: في تموز/يوليو ٢٠٠٨، تخرجت حوالي ٨٠ امرأة من أول صف تدريب لبنات العراق أقيم في العبارة، ديالى.^(٤٨٦) سوف يتم توظيف الخريجات من قبل قوات التحالف والشرطة العراقية لتفتيش النساء عند نقاط التفتيش والمداخل إلى المرافق الحكومية. هذه الخطوة مهمة لمعالجة الاستعمال المتزايد لفرق الانتحار النسائية في ديالى خلال الأشهر الستة الماضية. قد توسع قوات التحالف نطاق هذا البرنامج عبر المحافظة.^(٤٨٧)

العناية الصحية: المدير العام للصحة في المحافظة منهمك الآن في إعادة إصلاح النظام الطبي في ديالى وزيادة القدرة على تأمين عناية صحية جيدة عبر المحافظة. في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، فتحت في مدينة

الخالص عيادة جديدة للعناية الصحية الأولية، أنشأتها فرقة منطقة الخليج. ومن المقرر فتح أربع عيادات أخرى بحلول شهر تشرين الأول/أكتوبر. (٤٨٨)

في آب/أغسطس ٢٠٠٨، حضر الفريق الصحي في فرق إعادة إعمار المحافظات افتتاح جناحين للطوارئ في المستشفى العام في المقدادية. راقب أيضاً الفريق الصحي في فرق إعادة إعمار المحافظات التدريب على أجهزة تحليل المناعة التي اشتراها صندوق الاستجابة السريعة التابع لفرق إعادة إعمار المحافظات في مستشفى البتول للنساء والأطفال. تسمح هذه القدرة الجديدة بالتشخيص المبكر لداء السكري لدى الأطفال، وتشخيص الشواذات في هرمونات النمو والمراقبة والمساعدة في نطاق عدم القدرة على الإنجاب. (٤٨٩)

الزراعة: ادخل المستشارون الزراعيون في فرق إعادة إعمار المحافظات مفهوم تعاونيات المزارعين في ههب، اختارت التعاونية الجديدة للدواجن في ههب مزرعة للبيض كأول مشاريعها الهادفة إلى تزويد البيض الطازج إلى الأسواق في بعقوبة وبغداد. ساعدت فرق إعادة إعمار المحافظات في تنفيذ هذا المشروع بتقديم منحة من صندوق الاستجابة السريعة أمّنت نسبة ٤٠ بالمئة من الكلفة الأولية للمشروع. سوف تزود التعاونية النسبة المتبقية البالغة ٦٠ بالمئة. (٤٩٠) تتوقع التعاونية تحقيق أرباح خلال سنة. (٤٩١) وتستمر فرق إعادة إعمار المحافظات في مساعدة مزارع تربية الدواجن من خلال عقد حلقات دراسية زراعية في المناطق الشيعية والسنية من محافظة ديالى. (٤٩٢)

الماء: أحدث الجفاف الذي أصاب محافظة ديالى هذه السنة مشقات كبيرة لسكان المحافظة، لكن بمساعدة من فرق إعادة إعمار المحافظات حصل المحافظ على تدفق ماء إضافي من كردستان. وأيضاً أعدت فرق إعادة إعمار المحافظات في ديالى مواصفات فنية لشراء ٢٠ مضخة أفقية لزيادة تدفق الماء للري. (٤٩٣) بالإضافة إلى ذلك بدأت دائرة الأبار بتنفيذ حملة لإعادة تأهيل الأبار القائمة وحفر ١٨٤ بئراً جديداً. بحلول تموز/يوليو ٢٠٠٨، كان قد اكتمل حفر ٤٨ بئراً على أساس حفر ٤ أبار جديدة في كل أسبوع. تستمر أزمة المياه في ديالى ولكن حكومة المحافظة تعالج المشكلة وهي أكثر قدرة على وضع حلول لها. (٤٩٤)

المصارف: تعاني المصارف في ديالى من نقص شديد في العملة الورقية. يدفع هذا النقص حكومة المحافظة إلى تأمين دفع الرواتب وتسديد فواتير المقاولين والمجهزين. في أواخر آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر توقف تماماً تنفيذ الموازنة ودفع رواتب الموظفين والمتقاعدين عندما نفذ الموجود النقدي لدى فروع مصرف الرافدين في المحافظة. (٤٩٥)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
أبلغت فرقة منطقة الخليج (GRD) عن ٩ مشاريع يجري تنفيذها بتمويل قيمته ١٩,٦١ مليون دولار. (٤٩٦)

الأمن: صنفت ديالى ثالث أعنف محافظة في العراق في ربع السنة هذا. (٤٩٧) وكانت المحافظتان اللتان تفوقتا عليها هما بغداد ونيوى. في ربع السنة هذا ازداد النشاط الأمني مع بدء قوات الأمن العراقية بتنفيذ عمليات رسمية وانضمت إلى قوات التحالف لمحاربة القاعدة في العراق. ارتفعت وتيرة العنف من تموز/يوليو ٢٠٠٨ مما اجبر فرقة منطقة الخليج إلى إلغاء تنفيذ ١٩ مشروع إنشاءات لأسباب أمنية. (٤٩٩) وكان قد تمّ إلغاء ١٢ مشروع قبل ذلك بشهر واحد. (٥٠٠)

العناية الصحية: في ربع السنة هذا استمرت فرقة منطقة الخليج في العمل على توسعة المستشفى العام في بعقوبة. جرى تمويل المشروع من صندوق دعم الاقتصاد بمبلغ ٧,٤ مليون دولار وبدأ تنفيذ المشروع في آذار/مارس ٢٠٠٨، وأصبح الآن مكتملاً بنسبة ١٤ بالمئة. من المتوقع ان تكتمل الأشغال في نيسان/أبريل ٢٠٠٩ (٥٠١) على هذا المبنى المؤلف من طابقين الذي يشمل غرفة طوارئ، غرف للعمليات الجراحية ومعالجة الصدمات، وحدة للعناية الفائقة ومناطق دعم مطلوبة أخرى لخدمة سكان يبلغ عددهم ٣٠٠ ألف نسمة. (٥٠٢)

الكهرباء: استمرت أعمال الإنشاء خلال ربع السنة هذا على مشروع إمداد الطاقة لمحطة معالجة المياه في بلد روز^(٥٠٣) وقيمته ٣,٥ مليون دولار بتمويل من صندوق إعادة وإعادة إعمار العراق. وأصبح المشروع على وشك الاكتمال. بعد أن تبدأ العمل سوف تستعمل المحطة لتزويد طاقة كهربائية دائمة لمحطة معالجة المياه في بلدروز التي تزود مياه الشرب إلى حوالي ٧٢ الف مواطن عراقي^(٥٠٤). اكتمل تنفيذ مشروع إعادة تأهيل سد ديالى خلال ربع السنة هذا وسوف يزيد هذا المشروع مساحة الأراضي التي يمكن زراعتها بنسبة تزيد عن ٣٠ بالمئة من السعة الحالية^(٥٠٥).

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة ديالى

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): في ربيع السنة هذا جرى تأمين ١٢٠ فرصة عمل للمدى القصير و ١٧٨ فرصة عمل للمدى الطويل بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي. اكتمل تنفيذ حوالي ١٤ مشروعاً بضمنها مشروع إزالة الردميات والنفايات في المعلمين. شارك أكثر من ٢٨٢ طفل في نشاطات أحداث رعاها برنامج استقرار المجتمع الاهلي وجرى تأمين أكثر من ٧٠ فرصة عمل للمدى الطويل من خلال تقديم منح لشركات الأعمال.

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): بعد صدور تقرير الجدوى الاقتصادية الذي استعملت فيه الاقمار الصناعية والذي أعدته فرق إعادة إعمار المحافظات لبلدروز وتقييم ظروف المياه في خانقين، أوصى البرنامج الثاني للحكم المحلي بإجراء تدريب على التخطيط والإدارة الأساسية للمشاريع الهندسية وعملية تخصيص بنود الموازنة وإدارتها، وتحسين أنظمة الري. دعم البرنامج أيضاً مديرية الأبار عبر تقديم نشاطات تشغيل ورصد في ١٠ مواقع إعادة تأهيل في بلدروز وسلم النص العربي مع الحواشي التفسيرية لخطة العمل الخمسية التي أعدها مستشار الماء لدى فرق إعادة إعمار المحافظات.

المشروع الزراعي "إنماء": نفذ برنامج "إنماء" زراعة الذرة والرصد البيئي لاسواق المحاصيل الزراعية الشتوية.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): يدعم هذا الصندوق وهذا البرنامج مشاريع تهدف إلى زيادة فعالية التوسع الزراعي وإنشاء مزارع ايضاحية حول الزراعة في البيوت البلاستيكية وزراعة البذور الصغيرة.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" أكثر من ٣٤٠ موظف حكومي من ديالى على الإدارة العامة والإدارة من خلال ٨ مقررات تعليمية أدخلت عند مستويات كفاءة متنوعة شملت المواضيع الدراسية القيادة والاتصال، وإدارة المشاريع، الموارد البشرية ومكافحة الفساد.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): بدأ البرنامج بتقييم النزاعات من أجل تفحص احتياجات المجتمعات المحلية في ديالى وتاريخ ومصادر النزاعات داخلها بغية إعداد مشاريع سريعة التأثير.

مكتب المساعدة الأمنية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): يساعد مكتب المساعدة الأمنية في حالات الكوارث في إعادة تأهيل مدرسة القاهرة الابتدائية للصبيان في بعقوبة. من أجل توليد دخل إلى المجتمع المحلي وزيادة إمكانية الوصول إلى التعليم، بدأ مكتب المساعدة الأمنية في حالة الكوارث تنفيذ المشروع من خلال شراكات محلية وبالتنسيق مع وزارة التعليم الأميركية. اصبح المشروع مكتملاً بنسبة ٢٠ بالمئة حتى هذا التاريخ..

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): بموجب هذا البرنامج تم تنفيذ ٣١ مشروعاً لإعادة تأهيل المدارس ورفع مستوى شبكة الطاقة الكهربائية وتحسين شبكات توزيع المياه ورفع الوجود من اقلية الري كما زود البرنامج أيضاً المعدات والتجهيزات المطلوبة بالحاح إلى مدارس ومركز صحي ومختبر في مستوصف بيطري.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: ينقذ ٤٤ مشروعاً في ديالى، بما في ذلك إنشاء قاعة متعددة الأغراض للمعوقين وإنشاء وتوسيع متاجر (ملابس، بقالة، هواتف نقالة، أجهزة كهربائية)


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٦/١٠/٢٠٠٨.




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

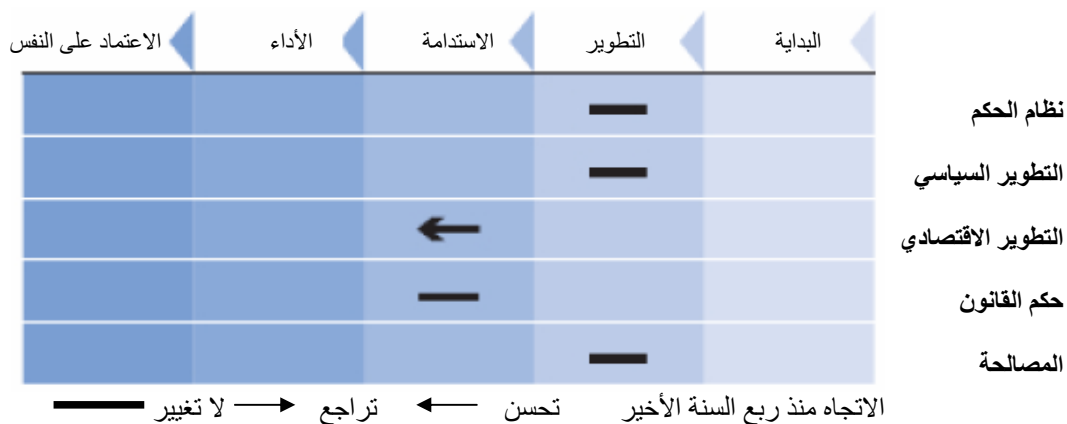

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

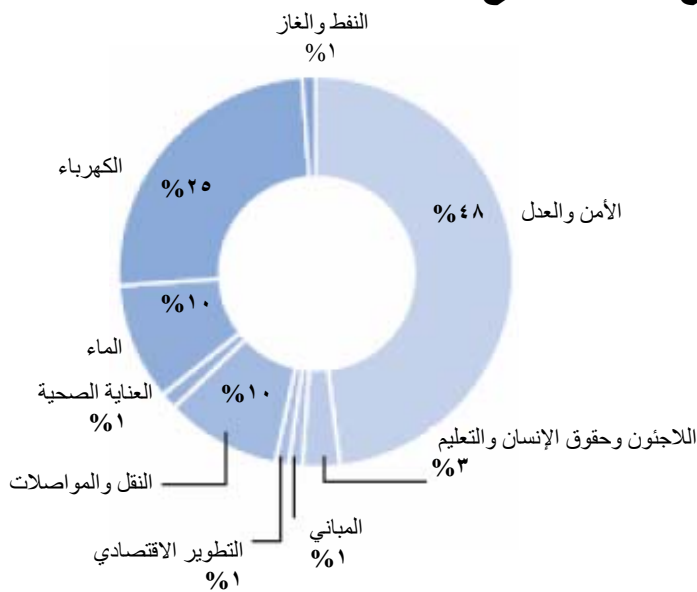

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها
٢٢	\$٢٢,٥٠	٤	\$٢٤,٦٢
٧٣٩	\$١,٢٩١,٥١	٧٥	\$٤١٦,٥
١,١٣١	\$٥٠٩,١٠	١٤٠	\$١٥٤,٥٠
٢٦٢	\$٧٢,٥٣	٣٧	\$١٤,٨٤
٥٢٤	\$٥٨٠,٩٥	٥١	\$٦٠,٢٩
٨٢	\$٣٩,٠٧	٧	\$١,٠٠
٢,٧٦٠	\$٢,٥١٥,٦٢	٣١٤	\$٦٧٠,٩٤

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢/١٠/٢٠٠٨.
- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ١/١٠/٢٠٠٨. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ١٣/١٠/٢٠٠٨؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٣٠/٩/٢٠٠٨، الصفحة ٣٢.
- استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٨.
- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨.
- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ١/١٠/٢٠٠٨. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٣/١٠/٢٠٠٨. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ١/١٠/٢٠٠٨. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٣/١٠/٢٠٠٨. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

بغداد في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$٧٧٢
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$٥٤٥
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$١٥٩
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$١٦٩
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ٨٨٤,٥٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ٢,٢٢١
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٨٦٧
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة أيار/مايو ٢٠٠٩
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ٤٨
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ٥,٣٣١
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٢٨,٨٦٣
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٦٠,٢٤٦
	عدد مستعملي الإنترنت ١٥٢,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٣٠
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ١,٧٨٥,٦٨٠
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ١٤٧,٥٣ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٦٤ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ١,٥٤٣
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ١,٠٧٦
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٣٤,٠٠ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ١-٣ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات تبصرات القيادة: استغلت فرق إعادة إعمار المحافظات في بغداد وفرق إعادة الإعمار المرافقة انخفاض أعمال العنف لتعزيز الخدمات العامة في مناطق المدينة وضواحيها. لاحظت المجموعات عدداً من النجاحات الحديثة: (٥٠٦)

- تعمل اللجان العراقية الأميركية المشتركة لإعادة الإعمار (في ريف بغداد والمناطق المدنية منها) إلى السيطرة العراقية.
- تعزيز تنسيق المشاريع والحوار بين ممثلي المحافظة، الممثلين القوميين وممثلي الأقضية.
- تدريب الصحفيين والناطقين باسم الحكومة على الاتصالات ووسائل الإعلام.
- إنشاء مستوصف قانوني قدم استشارات إلى ٨ آلاف سجين.
- إنفاق مبلغ ٧,٥ مليون دولار على شكل منح من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد إلى شركات أعمال صغيرة.
- دعم نشاطات منظمات غير حكومية باشرت بتنفيذ مشاريع محلية شملت ١٠ عقود لإقامة دورات دراسية حول العمل المكتبي، معرفة القراءة والكتابة، الخياطة والمهارات الحرفية.
- تزويد وقود إلى مدينة الصدر والأعظمية.
- نشر، توزيع ودعم أفكار تولد إيرادات لصحيفة المنصور الجديدة.
- دعم تشكيل ثمانية مجالس للمجتمع المحلي، ثمانية اتحادات زراعية وخمس جمعيات لشركات أعمال حول قضاء المحمودية.



النمران هوب ورايلي من فصيلة البنغال، وقد تبرع بهما مركز حراس الطبيعة في ولاية نورث كارولينا إلى حديقة الحيوانات ببغداد (الصورة من السفارة الأميركية)

ركزت الجهود الريفية اهتمامها على تعزيز القدرة الزراعية. ففي قطاع الدواجن، استخدم مبلغ ٨٠٠ ألف دولار ممول من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لإعادة تأهيل مرافق تربية الدواجن، شراء البيض والعلف. يتم حالياً تنفيذ خطط لإنشاء معمل تصنيع يجذب الاستثمارات إلى هذا القطاع. وفي مناطق أخرى، ساعدت فرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة في إعادة تنشيط ثلاثة معامل تدعم القطاع الزراعي المحلي.

من أجل تعزيز تقديم الخدمات الأساسية، ساعدت فرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة في إنشاء أربع محطات فرعية للأشغال العامة بجوار مراكز الأمن المشتركة. تظل معالجة النقص في كميات مياه

الشرب نقطة تركيز هامة. اشترت الولايات المتحدة الأنابيب الضرورية لإكمال خط أساسي لنقل المياه بين المحمودية والرشيد.

عالجت جهود أخرى التطوير الاقتصادي: (٥٠٧)

- توجيه موظفي البلديات لتحسين الموازنة والتخطيط والاتصالات.
- رعاية معارض تجارية لدعم شركات الأعمال الصغيرة والمتوسطة الحجم.
- عقد اجتماعات مع ممثلي سياسيين ودينبيين لتشجيع المصالحة.

رغم جهود تشجيع المصالحة السياسية، أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات والفرق المرافقة عن وجود عدة شواغر في مقاعد مجلس المحافظة كما عن اغتيال أعضاء في هذا المجلس. (٥٠٨)

الماء: تعمل فرق إعادة إعمار المحافظات في بغداد والفرقة المتعددة الجنسيات-بغداد سوية مع مسؤولين في المدينة لتأمين مياه الشرب إلى مدينة بغداد. تمّ الكشف على مواقع محتملة لتركيب المعدات المزودة من قبل الفرقة للمساعدة في تخفيف حدة النقص في كميات مياه الشرب. سوف تمول أمانة العاصمة ومجلس المحافظة إنشاء شبكات تخزين وتوزيع لمياه الشرب التي تنتجها هذه الوحدات. (٥٠٩)

الجدول ٣-٣
الجهود الأميركية لدعم حديقة الحيوانات في بغداد

اسم المشروع	كلفة الإنشاء	تاريخ الإكمال	النسبة المئوية المكتملة
بلاك ٦٠١، إصلاح مولد الكهرباء في حديقة الحيوانات في بغداد	٨٤,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٧/٧/١٠	%١٠٠
محرقة في حديقة الحيوانات في بغداد	٤٩,٩٠٠,٠٠٠	٢٠٠٥/٥/١٤	%١٠٠
إعادة تأهيل حديقة الحيوانات في بغداد	٢٦,٦٥٠,٠٠٠	٢٠٠٧/٧/٢٩	%١٠٠
بلاك ٦٢٠، منطقة القناذ	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	لم يكتمل	%٥٠
مشى الحصان العربي في حديقة الحيوانات في بغداد	٣,٨٠٠,٠٠٠	٢٠٠٥/٦/١٤	%١٠٠
الذبح الرحيم في حديقة الحيوانات في بغداد	١,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠٥/٤/١٧	%١٠٠

المصدر: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، كتيب اكسيل لدى برنامج المساعدة الطارئة للقائد (CERP)، ١٠٠٨/١٠/٣.

المرافق: لن يتم بعد الآن تمويل خدمات شاحنات القمامة بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي الممول من الولايات المتحدة. عبرت أمانة العاصمة في بغداد عن قلقها من تولي هذه المهمة عبر مدينة بغداد.^(٥١٠)

دعم المجتمع المحلي: في منطقة الكاظمية، عمل موظفو برنامج عمل المجتمع المحلي ومجموعة عمل القائد على تنفيذ مشروع إنشاء مركز إطفاء مزود بفسحة نوم إضافية للإطفائيين وبمعدات لمكافحة الحريق وبموقف مغطى للسيارات.^(٥١١)

السياحة: في آب/أغسطس ٢٠٠٨، تبرع مركز حراس الطبيعة في ولاية نورث كارولينا بنمرين صغيرين من فصيلة البنغال النادرة إلى حديقة الحيوانات في بغداد.^(٥١٢) زودت السفارة الأميركية التمويل لنقل النمرين إلى العراق بكلفة بلغت أكثر من ٦٦ ألف دولار. أقيمت حديقة الحيوانات في موقع آمن وزودت بحراسة أمنية على مدار ٢٤ ساعة في اليوم داخل وخارج بواباتها. يزور الحديقة حوالي ١٠ آلاف شخص كل جمعة وسبت ويزورها ما بين ٢٠٠٠ و ٣٠٠٠ زائر في الأيام الأخرى من الأسبوع. ازداد معدل زيارة حديقة الحيوانات كثيراً منذ عام ٢٠٠٦، عندما كان لا يزورها سوى ١٥٠ شخص تقريباً في اليوم. تعتني حديقة الحيوانات ب ٧٨٨ حيواناً في ٦٢ قفصاً.^(٥١٣) مولت الولايات المتحدة جهود إعادة تأهيل حديقة الحيوانات في بغداد بتقديم مبلغ ١٩٠ ألف دولار من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد. انظر الجدول ٣-٣ للحصول على لائحة بمشاريع حديقة الحيوانات.

العدل: عمل سوية كل من مكتب المساعدة الانتقالية في العراق، فرقة منطقة الخليج وقسم حكم القانون في السفارة الأميركية، وفرق إعادة إعمار المحافظة في بغداد ووكالات أميركية أخرى لإنشاء مبنى المحكمة المركزية الجديد في الرصافة (يعرف أيضاً بقصر العدل). اكتملت الأشغال في الوقت المحدد وأصبحت هيئة المحكمة جاهزة للبدء بالنظر في الدعاوى.^(٥١٤)

مع ان بغداد تستمر في مواجهة عمليات تفجير واعتداءات مسلحة أخرى، فقد هبط المستوى الإجمالي للعنف إلى أدنى حد منذ العام ٢٠٠٤. استناداً إلى وزارة الدفاع، حاولت منظمة القاعدة ان تعيد تنظيم صفوفها حول المناطق الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المدينة.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج

تدعم فرقة منطقة الخليج محافظة بغداد بتنفيذ ١,٣٥٢ مشروعاً بقيمة تزيد عن ٣ مليارات دولار. من بين هذا المجموع اكتمل تنفيذ ١,٢٠٢ مشروع، وبقي ١٠٤ مشاريع قيد التنفيذ، وجرى التخطيط لبدء تنفيذ ٤٦ مشروعاً آخر.^(٥١٦) خصصت النسبة المئوية الأعلى من كلفة المشاريع المكتملة والجاري تنفيذها إلى مشاريع الكهرباء. أفادت فرقة منطقة الخليج ان مشاريع كهرباء تبليغ كلفتها الإجمالية أكثر من ٢٥٥ مليون دولار لا تزال قيد التنفيذ.^(٥١٧)

الكهرباء: حالياً أصبحت نسبة ٧٥ بالمئة من المساكن وشركات الأعمال موصولين بخطوط توزيع الطاقة الكهربائية. وأصبحت عدة مشاريع قريبة من الاكتمال وهي تتعلق بزيادة توليد الطاقة، نقلها وتوزيعها في المحافظة.^(٥١٨) في ربع السنة هذا، اكتمل تنفيذ مشروع خطوط التغذية ١١ كيلو فولت في أبو ديشير الذي زود ١٢ محطة توزيع جديدة. من المتوقع ان يخدم المشروع الذي بلغت كلفته ١,٧ مليون دولار حوالي ٢٠ ألف عراقي. ومن المقرر إكمال مشروعين رئيسيين بحلول كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨.^(٥١٩) واستمر منذ شباط/فبراير ٢٠٠٧ العمل على تنفيذ مشروع توسيع التوربين الغازي في القدس بقيمة ١٦١ مليون دولار. أصبح المشروع الآن مكتملاً بنسبة ٨٥ بالمئة ومن المتوقع ان يزود عند اكتماله الطاقة الكهربائية إلى ١٨٠ ألف مسكن إضافي موصولين بشبكة بغداد/الأنبار. عند اكتمال تنفيذه سوف يساعد مشروع النقل من محطة التحويل جميلة، الفارابي ١٣٢ كيلو فولت التي تبلغ قيمتها ٤٨ مليون دولار حوالي ٧٠ ألف مشتركاً عراقياً.^(٥٢٠)

الماء: تُشكّل المشاريع المتعلقة بالأشغال العامة والمياه ثالث أكبر جزء من تكاليف المشاريع الجاري تنفيذها في بغداد. تهدف هذه المشاريع إلى تمكين كافة المواطنين من الوصول إلى مصادر مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي للمياه. في الوقت الحاضر، فان نسبة سكان بغداد الموصولون بخطوط توزيع المياه ليست سوى ٣٠ بالمئة.^(٥٢١) من أجل زيادة توزيع مياه الشرب يجري العمل على مشروع شبكة مياه الدورة أم ٨٢٦ وقيمتها ١,٢ مليون دولار لإنشاء شبكة أنابيب تخدم حوالي ١٥ ألف مواطناً. حالياً اكتمل المشروع بنسبة ٩٠ بالمئة.^(٥٢٢)

المرافق: اكتملت أعمال بناء مبنى المحكمة المركزية في الرصافة المقصود منها ان تخدم أكثر من مليون مواطن يقطنون في الرصافة.^(٥٢٣) بدأت أعمال إنشاء مبنى المحكمة في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ وتبلغ تكاليف إنشائه ٧,٩ مليون دولار وسوف يخدم كنموذج لمباني المحاكم في المستقبل في العراق.^(٥٢٤)

الاتصالات: تقدر حالياً قيمة مشاريع الاتصالات الجاري تنفيذها في محافظة بغداد بأقل قليلاً من ٧٠ مليون دولار.^(٥٢٥) في ربع السنة هذا، واجه مركز السنترال والاتصالات في المأمون عدة تحديات تتعلق بإعادة تصاميم المشروع وتسليم المواد. أبلغت فرقة منطقة الخليج أن عملية التصميم كانت بطيئة ولوحظ حصول انخفاض في الأيدي العاملة في شهر حزيران/يونيو. تأخر إنجاز هذا المشروع الذي تبلغ قيمته ٢٢,٧ مليون دولار في منتصف إنشاء المركز الذي سيضم المكاتب ومجموعة المفاتيح الكهربائية وبرج الاتصالات.^(٥٢٦)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة بغداد

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

برنامج استقرار المجتمع المحلي (CSP): في ربع السنة هذا، تم تأمين ٢٢,١٢٥ فرصة عمل للمدى القصير و ٤٧٩ فرصة عمل للمدى الطويل بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي. اكتمل إنجاز حوالي ١٦ مشروعاً بضمنها إعادة تنشيط سوق التاجي الذي أوجد ٥٤٩ شهراً من العمل. أعيد تأهيل المركز الصحي في بلاط الشهداء، وجُهِز بالمعدات لتحسين وزيادة الخدمات. رعى برنامج استقرار المجتمع المحلي حوالي ٢٠ ألف شاب عراقي للمشاركة في مباريات كرة القدم ومعارض الفنون الجميلة وتخرج ٣,٦١٥ متدرباً من دورات تدريس للإنشاءات وغير الإنشاءات، رعاها برنامج استقرار المجتمع المحلي في بغداد. مول البرنامج أيضاً التدريب المهني المنتدج ل ١٤٥ متخرجاً من مدارس مهنية. ومن خلال تقديم منح بمبالغ صغيرة جرى تأمين أكثر من ٢٣٠ فرصة عمل للمدى الطويل في القطاع الزراعي تشمل العمل في بحيرات اسماك جاسم في منطقة المحمودية/الرضوانية ومزرعة البيوت البلاستيكية في منطقة الاستقلال.

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم برنامج "تجارة" مؤسستين لتقديم القروض الصغيرة في بغداد وهما البشائر، التي تضم مراكز للقروض الصغيرة يملكها ويديرها عراقيون ويقع مركزها الرئيسي في المنصور، ومؤسسة البيت التعاوني ومركزها الرئيسي في الحلة، بابل. منذ إطلاق هذا المشروع، تم تقديم ١٣,٩٤٨ قرصاً بقيمة إجمالية بلغت ٢٤,٨٠٩,٧٠٢ دولار. في الوقت الحاضر يبقى ٤,٥١٩ قرصاً غير مدفوعاً بقيمة إجمالية تبلغ ٥,٢٣٧,٥٣٩ دولار. يزود برنامج "تجارة" أيضاً مساعدة فنية وتدريباً وبناء قدرات لمراكز تطوير شركات أعمال صغيرة يملكها عراقيون، مثل الجمعية العراقية للمتعاملين بالأوراق المالية. بوجه عام تقدم مراكز تنمية شركات الأعمال الصغيرة التدريب والاستشارات في المجتمع المحلي.


الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): في ربع السنة هذا وافق مجلس محافظة بغداد على خطة تطوير المحافظة للعام ٢٠٠٩ التي وضعت بدعم من البرنامج الثاني للحكم المحلي. تحدد الخطة الأولوية لتنفيذ ٣٢٤ مشروعاً من ٢٢ قطاعاً وسلم مكتب المحافظ هذه الخطة إلى وزارة التخطيط في أيلول/سبتمبر. يمول البرنامج الثاني للحكم المحلي التدريب المهني لثلاثة مناصب في كل واحد من المجالس الخمسة عشر في المنطقة ويبلغ مجموعهم ٢٠ إدارياً و ١٥ مهندساً، و ١٠ محاسبين. مول البرنامج أيضاً التدريب المهني لعشرين مناصباً في مجلس محافظة بغداد، وتم إشغالهم في آب/أغسطس. تم توسيع مركز التدريب في أمانة العاصمة بغداد (بدعم من برنامج الحكم المحلي عام ٢٠٠٤) لزيادة حجم التخطيط وأنظمة المعلومات الجغرافية ومعالجة المياه. يؤمن المركز تدريباً متخصصاً لفحص مياه الشرب وقد جرى خلال ربعي السنة الماضيين إصلاح ٤٤ نظاماً متضرراً لمياه الصرف الصحي وأعيد تأهيل شبكتين للصرف الصحي و ١٠ محطات مضخات. وضع قيد الاستعمال مطمرين للنفايات و ٩ محطات تحويل و ١٨٠ شاحنة لجمع القمامة و ١٤ مركز صيانة.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): يسمح البرنامج لفرق إعادة إعمار المحافظات والفرق المرافقة بتمويل نشاطات لدعم تنفيذ خطط التنمية والتطوير بضمنها خطة عمل فرق إعادة إعمار المحافظات، فرق عمل إعادة إعمار المحافظات المرافقة، الخطة المشتركة الموحدة المحلية (UCP) واستراتيجية تطوير المحافظات. أسس صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق صحفيين، إحداهما تستهدف الشباب وأخبار الرياضة والأخرى صحيفة عامة للاستهلاك الجماهيري، وساعد صحيفة البلاد اليوم المستقلة. كما مول البرنامج إنشاء غرفة لتقديم موجزات الأخبار للجنة الإعلام التابعة لمجلس محافظة بغداد وإعادة تأهيل مستوصف الطب البيطري في حور رجب وسوق السمك في السيدية وأسواق ٩ نيسان.

الديمقراطية ونظام الحكم	الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات
<p>برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): أكمل البرنامج عملية تقييم النزاعات لتفحص احتياجات المجتمعات المحلية في بغداد وتاريخ ومصادر النزاعات داخلها من أجل تطوير مشاريع سريعة التأثير. مَوَّل البرنامج أيضاً عملية تدريب نساء محرومات من الامتيازات في الأعظمية، وهو مشروع يركز على تجهيز الأرامل بوسائل بديلة لتأمين سبل العيش. استضاف مشروع آخر ماراتون يوم الشبيبة العالمي، للاحتفال بالتنوع خلال "يوم الكرامة" بمشاركة معوقين. كان الهدف من الماراتون جمع خليط متنوع يضم أكثر من ألف شاب عراقي للمشاركة في مباريات رياضية صحية.</p>	<p>المشروع الزراعي "إنماء": يقدم برنامج "إنماء" عدة مبادرات زراعية في محافظة بغداد. الأمثلة تشمل مشاريع عرض البيوت البلاستيكية في التاجي وإعادة تأهيل سوق بغداد الجديدة، وتوزيع بذور من النوعية العالية والبلاستيك للبيوت البلاستيكية في التاجي ومنطقة أبو غريب، كما تزويد مضخات مياه لا تعمل بالطاقة الكهربائية للمساحات المزروعة بالعلف وللمشاتل.</p>
<p>برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): ضمن إطار هذا البرنامج تم تنفيذ ٧٢٧ مشروعاً لبناء مدارس، مركز للإنترنت والاتصالات، وعيادة فحص بالأشعة فوق الصوتية، رفع مستوى شبكة الطاقة الكهربائية، تحسين شبكة توزيع المياه، إنشاء دور للمسنين، مخازن للبيع بالمفرق، متاجر بقالة، مصانع ومزارع مواشي ودواجن. زوّد المشروع أيضاً معدات وتجهيزات مطلوبة بالحاح لمستشفيات ومدارس.</p>	<p>برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" أكثر من ٧,٤٠٠ موظف حكومي من بغداد على الإدارة العامة والإدارة من خلال ٨ مقررات تعليمية أدخلت عند مستويات كفاءة مختلفة. تشمل المواضيع القيادة والاتصالات، وإدارة المشاريع، والموارد البشرية والإدارة المالية والمشتريات، وتكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد. يستطيع البرنامج أن يستجيب لاحتياجات محددة لموظفي الوزارات بتنظيم ورش عمل مصممة خصيصاً لهم وبرنامج لتدريب المدرب الذي سمح للوزارات بوضع مناهجها الدراسية الداخلية.</p>
<p>مكتب المساعدة الأمنية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): يساعد مكتب المساعدة الأمنية في حالة الكوارث الأشخاص المهجرين إلى الداخل في بغداد من خلال ثلاثة شركاء ينفذون المشاريع في هذه القطاعات: الصحة، اللوجستيات، وبيع الإغاثة، الحماية، الملجأ والإسكان، الماء، النظافة والصحة العامة، الاقتصاد وأنظمة السوق.</p>	<p>صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: ينفذ ٤٦٨ مشروعاً بتمويل من صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب في بغداد بما في ذلك إقامة مشاغل خياطة للنساء، ومتاجر قرطاسية وبقالة، إنشاء مساكن لعائلة واحدة، وتزويد معالجة طبية وعلاج طبيعى للمرضى. تقدم الأطراف الصناعية والمساعدة الطارئة للضحايا وعائلاتهم الذين تضرروا بسبب عمليات قوات التحالف.</p>


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦.

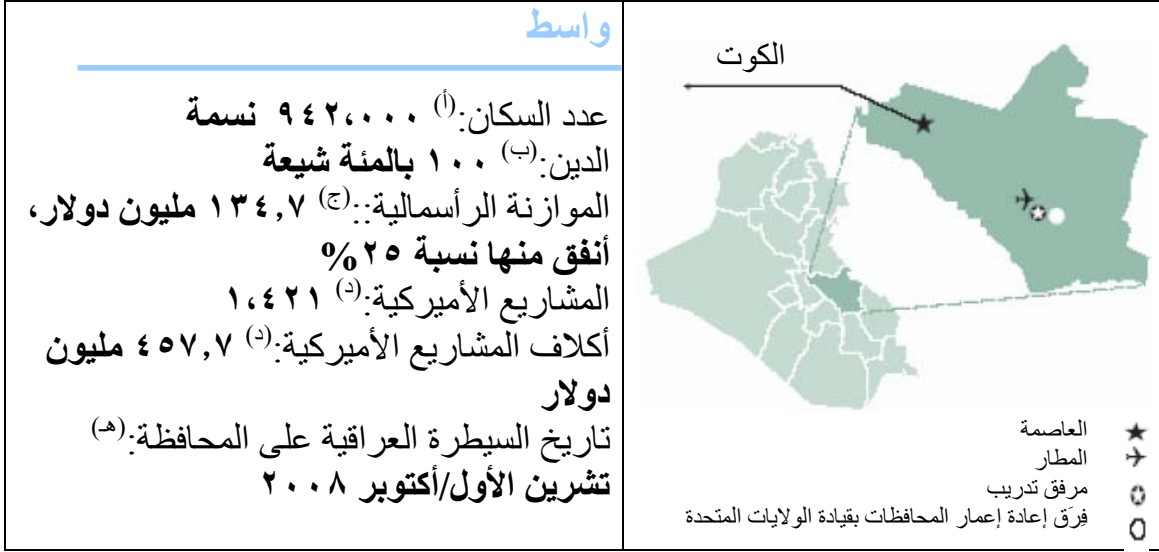


العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ج)

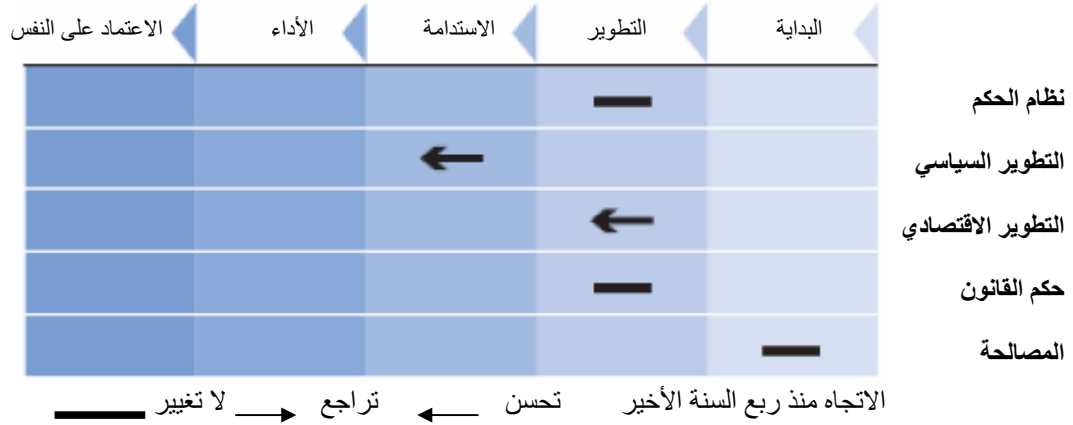

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

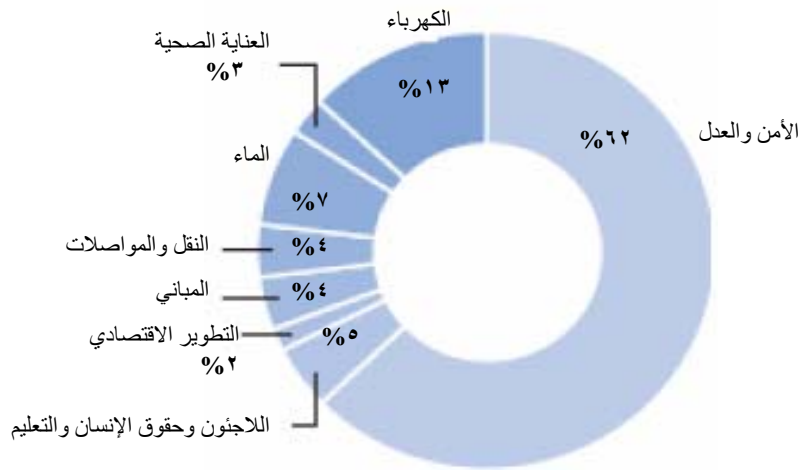

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها	
١٢٨	\$٥٣,٣٨	٣	\$٦,٧٨	الكهرباء
٢٢١	\$٣١,١٢	١٠	\$٢,٠٢	الماء
٩٠	\$١١,٦٩	٤	\$٠,٨٩	العناية الصحية
٨٢	\$١٧,٥٦	٤	\$٠,٨٩	النقل والمواصلات
٨٨	\$١٢,١٦	٢	\$٥,٦١	البناء
٦٠٩	\$١٢٥,٩١	٢٣	\$١٦,١٨	المجموع

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين أبلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

واسط في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$٤٤٧
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$١٥٥
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٨٢
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$٦٨
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ١٣٤,٧٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ٣٤
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٨
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ١
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ٢٨٣
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٣,٠٨٩
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٦,٩١٤
	عدد مستعملي الإنترنت ١,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٧
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٦,١٧٩
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٢٧,٩٢ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٩١ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٣٨٥
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٨١
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٤,٣٦ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ٣-١ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات تبصرات القيادة: أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات في واسط عن حصول زيادة في المشاركة السياسية خلال ربع السنة هذا. تتوق الأحزاب السياسية في واسط لإظهار تقدم أكبر إلى ناخبيهم مع اقتراب موعد اجراء الانتخابات. تزود الانتخابات فرصة محايدة للمنافسة مع مختلف الأحزاب والمنظمات السياسية كما مع ممثلي المجتمع المدني.^(٥٢٧)

أعيق الدعم الذي تقدمه فرق إعادة إعمار المحافظات لعملية إعادة الإعمار بسبب عدم وجود مراقبة على تمويل عمليات التشغيل والصيانة. يتنافس محافظ واسط ومجلس المحافظة على السيطرة على موازنات برنامج إعادة إعمار القطاع الزراعي والتطوير. طلب المحافظ ومجلس المحافظة من فرق إعادة إعمار المحافظة التوسط لإيجاد حل وسط حول الموازنة التكميلية للعام ٢٠٠٨.^(٥٢٨)



المستوصف الذي اكتمل إنشاؤه مؤخراً في الكوت (صورة من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي)

الزراعة: حددت فرق إعادة إعمار المحافظات في واسط قطاع الزراعة وقطاع التصنيع على أنهما "الآلات لدفع الازدهار الاقتصادي المحلي إلى الأمام."^(٥٢٩) من خلال برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات اشترت فرق إعادة إعمار المحافظات في واسط ٥٠ بطاقة تسجيل لإرسال مزارعين، ومهندسين ومهنيين آخرين في مجال الأعمال إلى مركز تطوير شركات الأعمال الصغيرة المحلي للتدريب خلال ربع السنة هذا.^(٥٣٠)

التعليم: في ربع السنة هذا، رعت فرق إعادة إعمار المحافظات في واسط أول مؤتمر صحفي في جنوب العراق. نظم المؤتمر مهنيون عراقيون من قطاع الإعلام والتعليم وتركزت المناقشات حول دور الصحافة الحرة في تثبيت الديمقراطية في العراق والتغلب على التحديات الحالية التي يواجهها الصحفيون العراقيون. انتهى المؤتمر الذي دام ثلاثة أيام في ٢٣ تموز/يوليو ٢٠٠٨ في الكوت.^(٥٣١)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج أفادت فرقة منطقة الخليج عن ٦ مشاريع يجري تنفيذها في محافظة واسط بقيمة ١٢,٤٧ مليون دولار.^(٥٣٢)

العناية الصحية: انتهى العمل في ربع السنة هذا على المركز الصحي في الجماهير الذي بلغت قيمته ٣٠٠,٠٠٠ دولار. بدأ العمل على هذا المركز في آب/أغسطس ٢٠٠٦.^(٥٣٣)

الاتصالات: اكتملت في ربع السنة هذا إعادة تأهيل طريق بطول ٢٥ كيلو متر. شمل هذا المشروع وهو بقيمة ٢,٤ مليون دولار طريق الأحرار-النعمانية وجزءاً من طريق النعمانية-الزبيدية في واسط.^(٥٣٤)

الماء: منذ تموز/يوليو ٢٠٠٦، بدأ تنفيذ أشغال إنشاء محطة جديدة لمعالجة المياه لقرية الجزائر. شملت الأشغال تركيب محطة معالجة للمياه بوحدة معالجة ذات سعة ٥٠ متراً مكعباً بالساعة وخزان فوق الأرض وتمديد ١٠,٢ كيلومتراً خطياً من شبكات المياه.^(٥٣٥)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة واسط

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

برنامج استقرار المجتمع المحلي (CSP): لا يعمل في محافظة واسط.

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات التمويل الصغيرة عبر ٣٣٧ قرصاً غير مسدد تبلغ قيمته حوالي ٥٩٨،٤٠٠ دولار.

المشروع الزراعي "إنماء": ينفذ برنامج "إنماء" تجربة لعرض الطماطم في الكوت مع مجموعة مختارة من الفلاحين. الغرض من التجربة هو إظهار الفائدة المحتملة من إنتاج أنواع جديدة من الطماطم القاسية جداً. يزود برنامج "إنماء" أيضاً، البذور والأسمدة وخدمات اختبار التربة والمساعدة الفنية.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" أكثر من ١،٠٣٠ موظفاً حكومياً من محافظة واسط على الإدارة العامة والإدارة من خلال ٨ مقررات دراسية أدخلت عند مستويات كفاءة متنوعة. تشمل المواضيع: القيادة والاتصالات، إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد.

مكتب المساعدة الأمنية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): يساعد مكتب المساعدة الأمنية في حالة الكوارث (OFDA) المهجرين إلى الداخل في محافظة واسط من خلال ثلاثة شركاء في القطاعات التالية: الصحة، اللوجستيات وبيع الإغاثة، الحماية، الملجأ والمأوى، الماء، النظافة، والصحة العامة، التنسيق والمعلومات الإنسانية، والاقتصاد وأنظمة السوق.

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): في ربع السنة هذا، أمّن البرنامج الثاني للحكم المحلي تدريب ١٠٠ شخص على إعداد الموازنات العامة والتدقيق كما على أنظمة المحاكم الإدارية، تطوير المؤسسات، الانتخابات، التفاوض حول المشاكل وحلها، التنمية الاقتصادية الريفية، تنفيذ المشاريع، الإدارة الأساسية واستراتيجيات إعادة إعمار الأضية. زود هذا البرنامج تدريباً إضافياً حول القيادة والإدارة للمجالس المحلية ومجالس المحافظات بضمنه وسائل الإعلام ولجان العلاقات العامة وتدريب موظفين رئيسيين آخرين.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): يسمح البرنامج لفرق إعادة إعمار المحافظات والفرق المرافقة بتمويل نشاطات لدعم تنفيذ خطط التطوير وإعداد خطة العمل لفرق إعادة إعمار المحافظات وفرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة والخطة المشتركة الموحد المحلية (UCP) واستراتيجية تطوير المحافظات.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): أعد برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق تقيماً للنزاعات لتفحص احتياجات المجتمعات المحلية في محافظة واسط وتاريخ ومصادر النزاعات داخلها من أجل تطوير مشاريع سريعة التأثير.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): بموجب هذا البرنامج خصصت ٦ مشاريع لإعادة تأهيل المرافق وتزويد أجهزة للأشخاص الضعيفي السمع والتكلم في مختبرات تكنولوجيا المعلوماتية المقامة في ٥ مدارس مهنية.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: ليس هناك من مشاريع ينفذها صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب في محافظة واسط.

المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢ و ٢٠٠٨/١٠/٦.

بابل


عدد السكان: (أ) ١,٤ مليون نسمة
 الدين: (ب) ٥ بالمئة سنة، ٩٥ بالمئة شيعة
 الموازنة الرأس مالية: (ج) ٢٠٠,٨ مليون دولار،
 أنفق منها نسبة ٤٣%
 المشاريع الأميركية: (د) ٢,٢٧٧
 أكلاف المشاريع الأميركية: (هـ) ٤٥١,٢ مليون
 دولار
 تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة: (و)
 تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

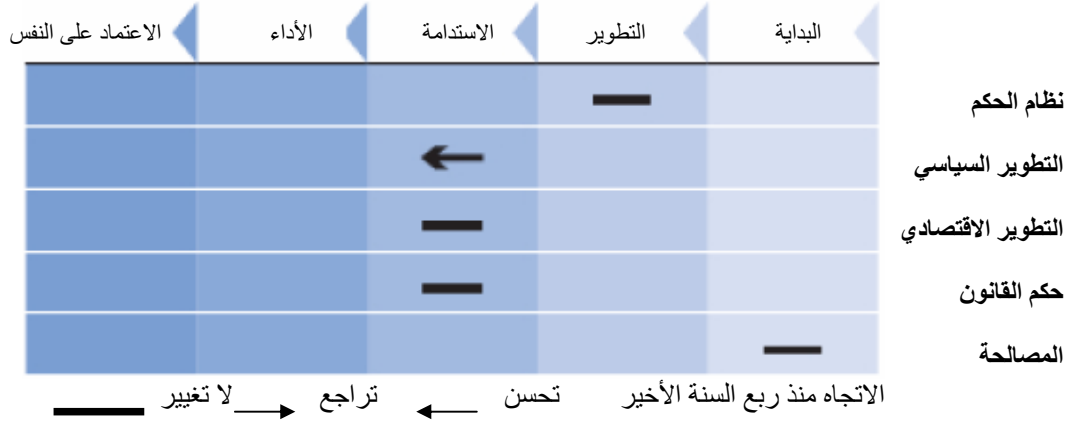

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

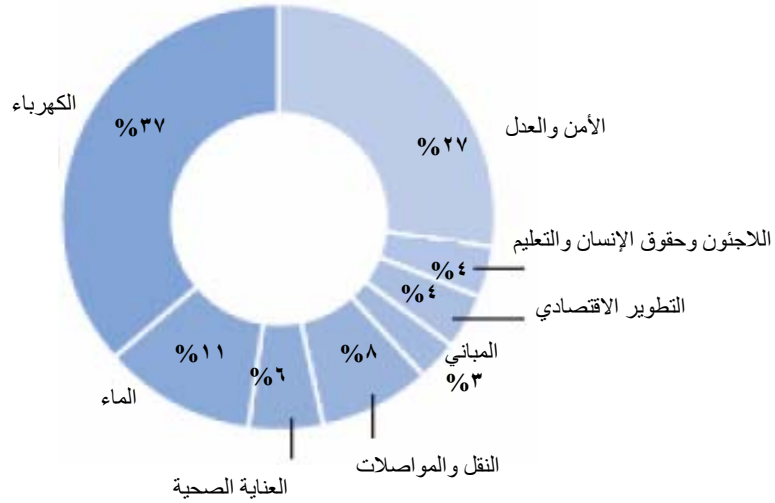

مشروعات البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط) (بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها	
١٤٥	\$١٦١,٧٤	٥	\$٢,٤٨	الكهرباء
٢٢٦	\$٦٤,٠٢	١٤	\$٥,٣٣	الماء
٩٢	\$١٧,٧١	٨	\$٧,٦٤	العناية الصحية
١٧٥	\$٢٥,٣٦	٨	\$١١,٦٧	النقل والموصلات
٦٤	\$٩,٧٤	٢	\$٤,٧٣	البناء
٧٠٢	\$٢٦٠,٥٧	٣٧	\$٣٢,٢١	المجموع

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

نظرة إجمالية على المحافظات

بابل في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$٢١٦
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$٣١
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٤٠
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$١٢٣
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ٢٠٠,٨٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ٨١
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٥٤
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ١٠
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ٣٨١
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٤,٣٨٧
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٩,٦٧٨
	عدد مستعملي الإنترنت ٣,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٧
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٢٥,٨٣٩
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٢٦,٨٥ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ١٢٦ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٤١٢
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٩٥
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٦,٨٧ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ٣-١ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات
تبصرات القيادة: أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات في بابل وفرق إعادة إعمار المحافظات المرافقة عن تحولها الواضح من التركيز على مشاريع إنشاءات البنية التحتية وحاجات الأمن الفورية إلى مبادرات تطوير القدرات وتأمين الاستدامة. أنشأت فرق إعادة إعمار المحافظات منذ سنة ٢٠٠٦ مدارس وعيادات صحية متعددة بالإضافة إلى البرامج والمشاريع الأميركية التالية:^(٥٣٦)

- تمويل بمبلغ ٣,٢ مليون دولار لمشروع ممول من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد لإنشاء سوق المزارعين والمركز الزراعي في الفرات الأوسط (تدعمه أيضاً وزارة الزراعة).
- تشكيل لجنة فنية للمياه/الصرف الصحي تضم أعضاء من مجلس المحافظة المحلي ومدراء عامين من أجل تطوير خطة لمدة عشر سنوات لقطاع المياه.
- تدريب مستشارين زراعيين جدد لفرق إعادة إعمار المحافظات.
- تطوير مؤسسات للتمويلات الصغيرة بمنحها مبلغ ٣٧٠ ألف دولار من خلال منظمة غير حكومية هي "ازدهارنا" للتطوير الاقتصادي.



مستشفى التوليد في المسيب قيد الإنشاء في بابل (صورة من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي)

لاحظت فرق إعادة إعمار المحافظات أيضاً حصول تحديات ذات شأن لأعمالها:^(٥٣٧)

- التوترات الأمنية بين قوات التحالف وهيئات المحافظة التي برزت بعد نقل ٢٠ سجيناً من الحراسة العراقية بدون وجود أي سجل يبرر نقلهم. تعمل فرق إعادة إعمار المحافظات لإشراك معتدلين من جيش المهدي وقوات الجيش عند إطلاق زعيم حزب سياسي.
- الموافقة على مشاريع تزيد قيمتها عن ٢٥ ألف دولار يستغرق وقتاً طويلاً. فعلى سبيل المثال، سببت التأخيرات في إنشاء طريق جانبي حول الحلة في استئارة "مشاعر سيئة في عاصمة المحافظة".

الصحة: تتعامل سلطات المحافظة بنجاح في مواجهة تفشي مرض الكوليرا في بابل. تمكنت هذه السلطات من فحص ومعالجة حالات مرضية مشتبه بها باستعمال الموارد المتوفرة.^(٥٣٨) في شهر آب/أغسطس ٢٠٠٨، تلقى أكثر من ٤٠٠ عراقي من قرية الجزيرة خدمات صحية أساسية من مكتب الشؤون المدنية ومكتب المساعدة في المشتريات في العراق وأطباء وممرضات من مستشفى الحلة وفريق من الأطباء والمساعدين الطبيين التابعين للقوات الخاصة الأميركية. زود مكتب الشؤون المدنية أيضاً تجهيزات للمدارس والعيادات و مواد للصحة الشخصية إلى المواطنين.^(٥٣٩)

الزراعة: خصصت الحكومة العراقية مبلغ ٥٠٠ ألف دولار للمساعدة في استبدال خطوط التبريد في معمل الحلة للتخزين البارد. يعزز هذا الجهد العناصر الأخرى لمشروع بقيمة ١,٨ مليون دولار نفذه برنامج الاستجابة الطارئة للقائد ويمثل "مشروعاً تعاونياً رئيسياً للبنية التحتية". سوف يوسع هذا

المشروع النشاطات الزراعية بينما تنتظر المحافظة تسلم معدات جديدة لنظام التبريد كالمضاطات والمكثفات والمبخرات.^(٥٤٠)

الأمن: تخرج حوالي ٧٥٠ متدرباً من الشرطة العراقية وسوف يتم إدخالهم في لواء الطوارئ الجديد للشرطة العراقية المقرر نشره في جنوب محافظة بابل. تلقى المتدربون أكثر من شهرين من التعليم النظري والعملي في القانون وحقوق الإنسان والمجالات العسكرية. نقلت الولايات المتحدة السيطرة الأمنية إلى قوات الأمن العراقية في ٢٣ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨.^(٥٤١) يفيد قادة عسكريين أميركيون ان تحسّن على قدرات قوات الأمن العراقية المحلية ومساهمات تنظيم أبناء العراق قد أرست بيئة يشعر فيها السكان بأنهم أصبحوا أكثر أماناً ويستطيع فيها الاقتصاد بالتوسع المتواصل.^(٥٤٢)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
أبلغت فرقة منطقة الخليج عن ١٦ مشروعاً يجري تنفيذها في محافظة بابل بقيمة ٣٠,٢٠ مليون دولار.^(٥٤٣)

العناية الصحية والتعليم: تُشكّل الأبنية والعناية الصحية والتعليم نسبة ٤٢ بالمئة من إجمالي كلفة المشاريع الجاري تنفيذها ويبلغ مجموع قيمتها ١٢,٦ مليون دولار. في ربع السنة هذا استمر تنفيذ أشغال بناء مستشفى التوليد في المسيب بقيمة ٥ ملايين دولار.^(٥٤٤) بدأت أعمال إنشاء المستشفى في تموز/يوليو ٢٠٠٧، وأصبح المشروع مكتملاً بنسبة ٧٠ بالمئة الآن. اكتملت في ربع السنة هذا أشغال المستشفى الطبي والأطفال في الحلة التي بلغت تكاليفها ٢,٨ مليون دولار. أنجز هذا المشروع إعادة التأهيل المطلوبة لجعل المستشفى يتوافق مع القوانين العراقية والدولية.^(٥٤٥)

في ربع السنة الأخير، منح عقد لتنفيذ مشروع مدرسة الحسن بقيمة ٤٠٠ ألف دولار. وفي ربع السنة هذا، بدأت أشغال بناء مدرسة مؤلفة من ١٢ صف تدرّس بما في ذلك المعدات والأثاث.^(٥٤٦)

الأمن والعدل: يستمر العمل في ربع السنة هذا على إنشاء مبنى محكمة الحلة الجديد. أصبح هذا المشروع وقيّمته ٦,٦ مليون دولار مكتملاً بنسبة ٦١ بالمئة^(٥٤٧) تقدر فرقة منطقة الخليج ان الأشغال ستكتمل في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨.^(٥٤٨)

النقل: في ربع السنة هذا، كان يجري تنفيذ ثلاثة مشاريع للنقل والمواصلات بكلفة مجموعها ٥,٩ مليون دولار.^(٥٤٩) كان الشارع ٨٠ من طريق بابل الذي تنفذه لجنة إعادة إعمار وتنمية المحافظات النقطة المركزية للأشغال في هذا القطاع وتقدر كلفته بحوالي ٤,٢ مليون دولار. أنجز المشروع تعبئة طريق للسيارات بطول ١٠,٦ كيلو متراً مكون من ٤ ممرات في الحلة.^(٥٥٠)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة بابل

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج استقرار المجتمع المحلي (CSP): يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات تمويل صغيرة الحجم عبر ١٩٩ قرصاً غير مسدداً بقيمة ٦٥٥,٩٠٠ دولار. منذ البداية تم دفع ٨٧٩ قرصاً بقيمة مجموعها ٢,٥٥٢,٤٥٠ دولار. يزود برنامج "تجارة" أيضاً مساعدة فنية وتدريب وبناء القدرات لمراكز تطوير مؤسسات الأعمال الصغيرة المملوكة من قبل عراقيين. بصورة عامة تقدم هذه المراكز التدريب والاستشارات في المجتمع المحلي.

المشروع الزراعي "إنماء": يحسن برنامج "إنماء" مزارع تربية الأسماك عبر محافظة بابل في العراق، حيث تعمل ٧٠ بالمئة من مجموع المسامك العراقية، بما في ذلك مزرعة أسماك الفرات. أنشأ البرنامج خمس سفانف للتوضيب تزود مدينة بغداد لتحسين لنوعية وطريقة مناوله وتعبئة وتسويق الفاكهة والخضار المنتجة محلياً.

برنامج استقرار المجتمع المحلي (CSP): في ربع السنة هذا، تم تأمين حوالي ٢,٥٨٠ فرصة عمل للمدى القصير، و ١,٣٠٠ فرصة عمل للمدى الطويل بموجب برنامج استقرار المجتمع المحلي. رعى البرنامج مباريات في كرة القدم شارك فيها حوالي ١,١٠٠ ولد، ونظم حملة لمحافظة على الماء وأحداثاً أخرى في المجتمع المحلي. سجل برنامج استقرار المجتمع المحلي ١٨٣ خريجاً من مدارس مهنية في برامج تدرج مهني ورعى تسجيل ٧٥٠ متدرباً في دورات دراسية على الإنشاءات وغير الإنشاءات. قدم برنامج استقرار المجتمع المحلي حوالي ٣٢٥ منحة بقيمة مجموعها ١,٤ مليون دولار.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" أكثر من ٧٥٥ موظفاً حكومياً من محافظة بابل على مواضيع الإدارة العامة والإدارة.

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): يستمر برنامج الحكم المحلي الثاني في تزويد التدريب على قانون المحافظات الجديد لأعضاء مجلس المحافظة والمجلس المحلي. ساعد البرنامج أيضاً في تنظيم مؤتمر إقليمي حول المشاركة السياسية للنساء ضم أكثر من ٢٧٥ مشاركاً من الدوائر الحكومية المركزية ومسؤولين في المحافظات من خمس محافظات تقع في الجنوب الأوسط من البلاد، كما منظمات غير حكومية وجامعات. ساعد برنامج الحكم المحلي الثاني مجلس محافظة بابل في تنظيم مؤتمر لتعزيز خدمات التوسع الزراعي المزودة للمزارعين. حضر المؤتمر مسؤولون في الحكومة المركزية والحكومة المحلية من المحافظات الخمس في المنطقة.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): مول البرنامج شراء تجهيزات أساسية لمدارس الأطفال وتوزيع معلومات أصدرتها الحكومة العراقية حول الانتخابات وتسجيل الناخبين كما إعادة تأهيل مرافق المجلس الاقتصادي في خضر ومنطقة قبيلة الغوروني وقسماً من الشبكة الكهربائية في الحلة.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): أعد البرنامج تقييماً للنزاعات لتفحص احتياجات المجتمعات المحلية في محافظة بابل وتاريخ ومصادر النزاعات من أجل تنفيذ مشاريع سريعة التأثير.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): يجري حالياً تنفيذ ١٥ مشروعاً بموجب البرنامج الثاني لعمل المجتمع المحلي بضمنها مشاريع لإعادة تأهيل مدرسة ابتدائية ورفع مستوى شبكة الطاقة الكهربائية وتزويد معدات طبية لمستوصف محلي.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: تم تنفيذ مشروعين من صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب في محافظة بابل لتزويد المواشي إلى عائلات الضحايا.

المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام لليبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦.

القادسية


عدد السكان: (أ) ٨٦٧,٠٠٠ ألف نسمة
 الدين: (ب) ١٠٠ بالمئة شيعة
 الموازنة الرأسمالية: (ج) ١٣٢,٤ مليون دولار،
 أنفق منها نسبة ١٨ بالمئة
 المشاريع الأميركية: (د) ١,٤٧٩
 أكلاف المشاريع الأميركية: (هـ) ٢٩٨,٣ مليون
 دولار
 تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة: (و)
 تموز/يوليو ٢٠٠٨




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

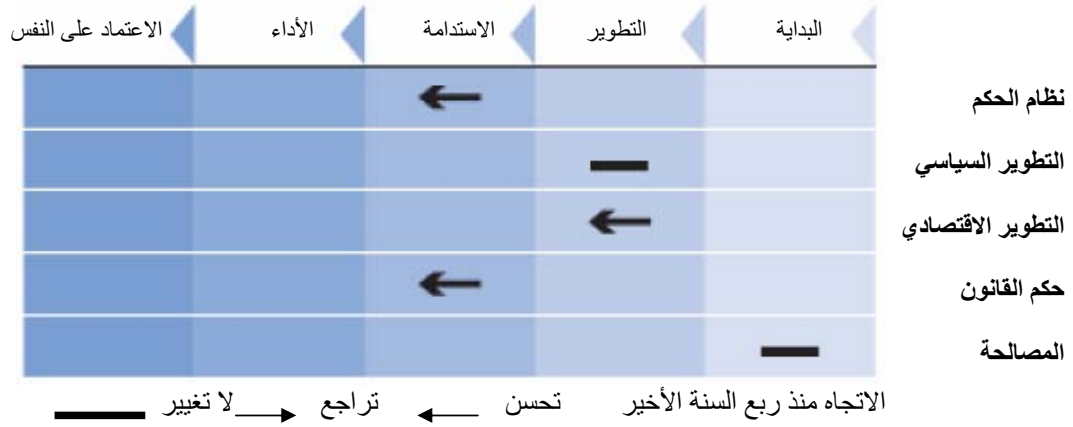

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

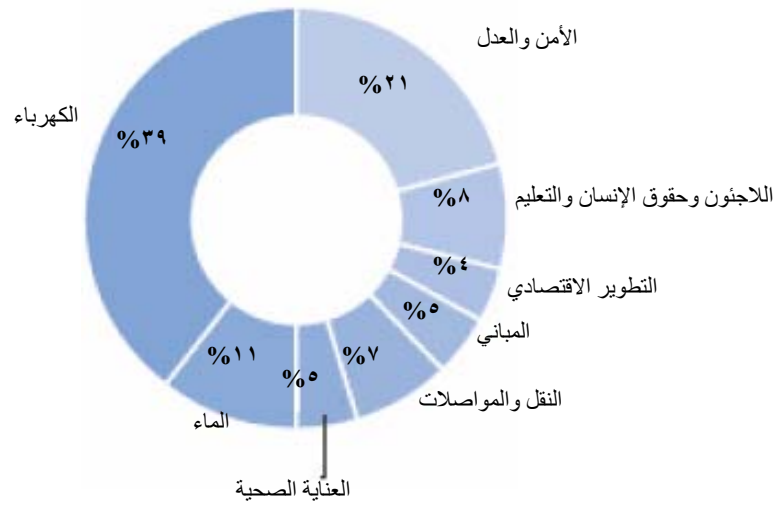

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها	
١٢٦	\$٩١,٣٨	٢	\$٢٦,٣٥	الكهرباء
١٨٦	\$٢٨,٧٢	١٤	\$٣,١٣	الماء
٧٦	\$١٣,٧٩	١	\$٠,٥٦	العناية الصحية
٧٠	\$٢١,٣٢	٢	\$٠,٩٩	النقل والمواصلات
٥٦	\$١٣,٦٦			البناء
٥١٤	\$١٦٨,٨٧	١٩	\$٣١,٠٣	المجموع

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

القادسية في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$٢٤٤
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$٦٧
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٣٢
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$٩٥
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ١٣٢,٤٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ١٧
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٧
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة تموز/يوليو ٢٠٠٨
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ٤
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ٢٦٦
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٢,٩٢٥
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٥,٧٦٠
	عدد مستعملي الإنترنت ٨,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٥
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٨٤٣
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٢٤,٦٣ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٧٥ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٢٧١
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٦٠
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٥,٦٨ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ٣-١ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات تبصرات القيادة: أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات في القادسية أن الظروف الأمنية تحسنت بدرجة هائلة في المحافظة وعلى وجه الخصوص منذ أن تم نقل السيطرة الأمنية إلى قوات الأمن العراقية في تموز/يوليو ٢٠٠٨.^(٥٥١)

أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات في القادسية أنها تواجه تحديات في التنسيق مع قوات التحالف.^(٥٥٢) لم تتمكن هذه الفرق من تأمين قيام الوحدات العسكرية بإجراء تقييم كامل لنتائج المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، أو أنها تستلم موافقة السلطات العراقية عليها قبل تنفيذها. أوصت فرق إعادة إعمار المحافظات أن تنسق قوات التحالف مع مستشاري فرق إعادة إعمار المحافظات بالنسبة للمشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق.^(٥٥٣)



اكتمل الآن إنشاء محطة التحويل ١٣٢ كيلو فولت في الديوانية، محافظة القادسية (صورة من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي)

الأمن: خصصت وزارة الداخلية مبلغ ٦ ملايين دولار لبناء مركز لتدريب الشرطة في المحافظة. اعتمد في السابق المسؤولون الحكوميون في محافظة القادسية على المحافظات المجاورة لتزويد مرافق التدريب.^(٥٥٤)

الماء: تستمر إمكانية الوصول إلى مياه الشرب النظيفة تقلق مجلس المحافظة. أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات أنه خلال ربع السنة هذا استمر العديد من سكان المحافظة في شراء مياه معبأة بسبب عدم كفاءة محطة معالجة المياه الرئيسية في القادسية.^(٥٥٥)

بعد تفشي وباء الكوليرا في ربيع السنة هذا في محافظة ميسان، اتخذ المسؤولون الصحيون في القادسية احتياطات لمنع انتشار هذا الوباء. وزعت وزارة الصحة أدوية إلى الأقضية والقرى النائية في محافظة القادسية.^(٥٥٦)

الزراعة: أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات ان أشجار النخيل مهددة في ربيع السنة هذا بالأمراض والحشرات بسبب عدم توفر مبيدات الحشرات والدعم الحكومي المناسب في السنوات الأخيرة. تفاقم هذا الوضع بسبب ظروف الطقس السيئة.^(٥٥٧)

النقل: أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات في القادسية ان مشروع إنشاء الطريق الرئيسية عبر ضاحية المقداد اصبح مكتملاً بنسبة ٥٠ بالمئة. من المتوقع ان يكتمل في نهاية السنة مشروع الطريق الذي يشكل جزءاً من استراتيجية المحافظة للعام ٢٠٠٨.^(٥٥٨)

التعليم: اكتمل إنشاء ٨ مدارس جديدة وإعادة تأهيل ١٤ مدرسة خلال ربيع السنة هذا في الوقت المناسب لبدء السنة المدرسية الجديدة. أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات أنه لوحظ ازدياد عدد الطلاب المسجلين في المدارس نتيجة تحسن الظروف الاقتصادية والوضع الأمني في المحافظة.^(٥٥٩)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
أبلغت فرقة منطقة الخليج عن تنفيذ ٥ مشاريع في محافظة القادسية بقيمة إجمالية تبلغ ٣٣,٦٧ مليون دولار.^(٥٦٠)

التعليم: في جهد لدعم التعليم للطالبات الفقيرات في القادسية، يستمر العمل على إنشاء مدرسة الإرشاد الثانوية للبنات بكلفة ١,٢ مليون دولار التي سوف تقدم التعليم العالي للطالبات المتفوقات اللواتي لا يستطعن تسديد تكاليف التعليم العالي. سوف تقبل الطالبات في المدرسة من خلال عملية اختيار من جانب مديرات مدرستهن المحليات كما من جانب محافظ القادسية. سوف تستطع المدرسة بعد اكتمالها استيعاب ٣٦٠ طالبة.^(٥٦١)

العناية الصحية: منذ آذار/مارس ٢٠٠٨، استمر العمل على إنشاء مركز للعناية الصحية الأولية في القادسية. اصبح المشروع، وقيمه ٥٠٠ ألف دولار مكتملاً الآن بنسبة ٤٠ بالمئة. سوف يخدم عند اكتماله حوالي ١٥ ألف مواطن تقريباً يعيشون في ضاحية منكوبة. قدرت فرق منطقة الخليج ان المشروع سوف يكتمل في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨.^(٥٦٢)

الكهرباء: أنجز في ربيع السنة هذا أكبر مشروع في القادسية وهو محطة التحويل ١٣٢ كيلو فولت في الديوانية بقيمة ٢٤,٨ مليون دولار. سوف تخفض محطة التحويل العبء عن محطتي التحويل الموجودتين وسترفع الطاقة الكهربائية المزودة إلى حوالي ٤٠٠ ألف مواطن.^(٥٦٣)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة القادسية

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج استقرار المجتمع المحلي (CSP): لا يعمل في القادسية.

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات التمويل الصغيرة عبر ٦٣ قرصاً غير مسدداً بقيمة ١٧٣،٤٠٠ دولار. يستمر البرنامج أيضاً في تزويد مساعدة فنية، وتدريب وبناء القدرات إلى مركز المرشد الذي يملكه عراقيون، وهو أحد مراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة في العراق.

المشروع الزراعي "إنماء": لا يعمل برنامج "إنماء" في القادسية.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" أكثر من ٦٢٩ مسؤولاً من محافظة القادسية على الإدارة العامة والإدارة من خلال ٨ مقررات دراسية أدخلت عند مستويات كفاءة متنوعة. تشمل المواضيع الدراسية القيادة والاتصالات، إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد. يستطيع البرنامج أن يستجيب لحاجات معينة لموظفي الوزارات بإقامة ورش مصممة خصيصاً لهم وتنفيذ برنامج تدريب المدرب الذي يسمح للوزارات بإعداد مناهجها التدريبية الداخلية.

مكتب المساعدات الأجنبية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): يساعد المكتب لمهجرين إلى داخل البلاد في القادسية من خلال ثلاثة شركاء في القطاعات التالية: الصحة، اللوجستيات وسلع الإغاثة، الوقاية، الملجأ والمأوى الماء/النظافة والصحة العامة، تنسيق المساعدات الإنسانية والمعلومات، والاقتصاد وأنظمة السوق.

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): خلال ربع السنة هذا وقعت سلطات المحافظة على مذكرة تفاهم تنص على تركيب نظام محاسبة ومعلومات تعقب المشاريع في المحافظات (GAPTIS) بعد أن عرض البرنامج هذا النظام. درب البرنامج أيضاً أكثر من ١٠٠ موظف حكومي محلي ومن المحافظة على شؤون المحاكم الإدارية، لتطوير المؤسسات، أنظمة الانتخاب، التفاوض حول المشاكل، التنمية الاقتصادية الريفية، تنفيذ المشاريع، الإدارة الأساسية واستراتيجيات إعادة إعمار المحافظات. تلقى أيضاً مسؤولون في مجلس المحافظة وإداريون رئيسيون التدريب على القيادة والإدارة.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): يدعم تمويل البرنامج المكتب الانتخابي في المحافظة. مشروع مبنى المحكمة أفاق.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): نظم البرنامج معرضاً ثقافياً لعرض المواهب الفنية لـ ٨٠٠ مشارك من المنطقة جمع المعرض مجموعة متنوعة من المنظمات، الأديان والقوميات بهدف تعزيز الشعور القومي من خلال التنوع. يخطط البرنامج أيضاً إلى إنشاء ملاعب رياضية عبر المحافظة لإلهاء الأولاد عن العنف وتشجيع الروابط بين النظراء.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): بموجب هذا البرنامج خصصت خمسة مشاريع لتجديد مرافق، لتزويد معدات كمبيوتر إلى المدارس، لدعم حملة نشر القراءة والكتابة بين الإناث ولإنشاء ملعب رياضي للصغار.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: لم توجد في القادسية أية مشاريع ممولة من صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب.


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦.




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)



كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

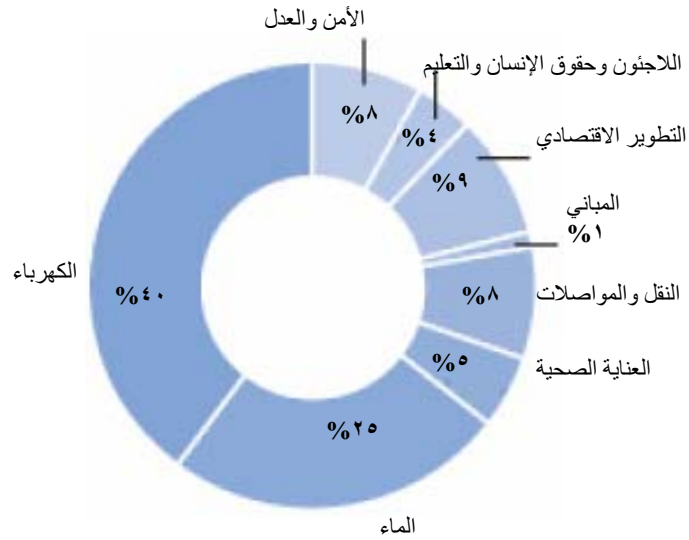

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط) (بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها	المجموع
٤٨	\$٨٠,٣٦	٥	\$٠,٤٠	ال كهرباء
٦٩	\$٤٤,٨٢	٤	\$٥,٢٠	الماء
٥٩	\$١٠,٤٣	٦	\$٠,٣٦	العناية الصحية
٤٠	\$١٠,١٨	٨	\$٦,١٤	النقل والمواصلات
٢٧	\$٢,٣٤			البناء
٢٤٣	\$١٤٨,١٤	٢٣	\$١٢,١٠	

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

نظرة إجمالية على المحافظات

كربلاء في لحظة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$187
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$1
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$58
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$70
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام 2008 20,115 مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات 2008/7/1-2008/4/1 1
	مجموع الاعتداءات 2008/9/30-2008/7/1 4
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة تشرين الأول/أكتوبر 2007 2007
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع 3
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً 14
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة 3,035
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) 6,222
	عدد مستعملي الإنترنت 15,000
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة 7
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل 562
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية 2006 والسنة المالية 2007) 23,31 مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات 70 بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة 307
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي 74
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي 8,90 مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات 1-3 لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات
تبصرات القيادة: أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات في كربلاء ان المواطنين والموظفين الحكوميين لا يدركون مدى الإنفاق الكبير للأموال الأميركية على مشاريع مدنية في المحافظة، مثل إنشاء محطة رئيسية لمعالجة مياه الصرف الصحي و عدة محطات تحويل كهربائية.

ما عدا ذلك، لاحظت فرق إعادة إعمار المحافظات حصول تحسينات سريعة في المحافظة: (٥٦٤)

- عودة المحافظة إلى السيطرة العراقية في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧.
- أمن متزايد
- قدرة متزايدة للإدارات الحكومية



يسير المسلمون من السنة والشيعة إلى مقام الإمام الحسين في كربلاء، خلال رحلة حج عند الاحتفال بالأربعين وبعاشوراء. (صورة من صلاح الهندسة في الجيش الأميركي)

تميز ربع السنة هذا بتحقيق نجاح ملحوظ في مجال حكم القانون في المحافظة. جرت محاكمة زعيم جيش المهدي المطلوب بجرائم قتل وجرائم أخرى في أواخر آب/أغسطس ٢٠٠٨، وقد حكم عليه بالإعدام. لاحظت فرق إعادة إعمار المحافظات ان الاتهام والحكم يمثلان انتصاراً لحكم القانون لم يكن ممكناً تصوره قبل سنة عندما أطلق زعماء المحافظة حملتهم لوضع حد لحرية تحرك جيش المهدي وغيره من الميليشيا في كربلاء.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج

أكملت فرقة منطقة الخليج ٧٧ مشروعاً في المحافظة بقيمة إجمالية بلغت ٦٣,٦٥ مليون دولار وبقية ٩ مشاريع قيد التنفيذ بقيمة ١١,٤٣ مليون دولار. (٥٦٦) معظم الأشغال الجاري تنفيذها تتعلق بمشروعين يعالجان البنية التحتية للاتصالات والماء. (٥٦٧)

الاتصالات: اكتمل خلال ربع السنة هذا مشروع الغدير العسكري المهندسين بقيمة ٢,١ مليون دولار. (٥٦٨) هدف المشروع إلى إنشاء شبكة اتصالات في ثلاث ضواحي في كربلاء.

بدأ المقاولون أيضاً تنفيذ مشروعين بقيمة ٣٠٠ ألف دولار يشملان إنشاء مباني للاتصالات في الحسينية والغدير. اتخذ المقاول في موقع مشروع الغدير خطوات تصحيحية خلال ربع السنة هذا لتحسين الأداء بعد تلقيه رسالة تعبر عن القلق من النتائج الهامشية التي تحققت. (٥٦٩)

الماء: أصبحت الآن شبكة مياه الحسين مكتملة بنسبة ٧٥ بالمئة^(٥٧٠) سوف يعتمد حوالي ٦ آلاف مواطن على شبكة وخطوط إمداد المياه التي تم إنشاؤها بموجب هذا المشروع. زود المشروع أيضاً فرصة لتدريب موظفين محليين يعملون في قطاع الماء^(٥٧١).

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة كربلاء

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG):
يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات تمويل صغيرة عبر ٢٩٢ قرصاً غير مسدداً بقيمة تقدر بحوالي ٧١٩,٩٠٠ دولار. يزود برنامج "تجارة" أيضاً مساعدة فنية وتدريب وبناء قدرات لمراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة التي يملكها عراقيون، مثل منظمة تمكين المرأة. بوجه عام، تقدم مراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة التي يملكها عراقيون التدريب والاستشارات إلى المجتمع المحلي.

المشروع الزراعي "إنماء": قدم برنامج "إنماء" عروضا لشراب التمر العالي القيمة كبديل عن التصدير الصناعي للتمر.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" ٧٠٠ موظفاً حكومياً من كربلاء على الإدارة العامة والإدارة عبر ٨ مقررات دراسية أدخلت عند مستويات كفاءة متنوعة. شملت مواضيع القيادة والاتصالات، إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيات المعلوماتية ومكافحة الفساد. يستطيع البرنامج الاستجابة إلى حاجات محددة لموظفي الوزارات من خلال تنظيم ورش عمل مصممة خصيصاً لهم وبرنامج تدريب المدرب الذي يسمح للوزارات بإعداد منهاجها التدريبي الداخلي.

مكتب المساعدات الأجنبية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): يقدم المكتب المساعدة للمهجرين إلى الداخل في كربلاء من خلال شريكين في القطاعات التالية: الصحة، الحماية، الملجأ والمأوى، اللوجستيات و سلع الإغاثة، الماء/النظافة والصحة العامة، تنسيق المساعدات الإنسانية والمعلومات، الاقتصاد وأنظمة السوق.

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): ساعد برنامج الحكم المحلي الثاني على تنظيم مؤتمر إقليمي حول المشاركة السياسية حضرته أكثر من ٢٧٥ مشاركة من الحكومات المركزية في المحافظات و٥ محافظات في الجنوب الأوسط، كما من منظمات المجتمع المدني والجامعات وزعماء القبائل وشخصيات مرموقة حفلة الافتتاح الكبرى لوحدة المشاركة العامة في كربلاء. أكثر من ١٠٠ شخص بضمنهم أعضاء في مجالس محلية ومجلس المحافظة، مندوبين عن منظمات المجتمع المدني.


صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): يدعم هذا الصندوق والبرنامج عملية تنسيق توزيع معلومات الحكومة العراقية حول الانتخابات وتسجيل أسماء الناخبين.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): يدعم أحد المشاريع المساواة بين الرجل والمرأة، التنوع وتطوير المجتمع المحلي من خلال تنظيم شبكة من المعلمين والطلاب وقادة المجتمع المحلي. في ربع السنة هذا، تم تدريب ٣٠ طالبة في كليات مختلفة على مفاهيم المجتمع المدني وحل النزاعات وبناء الفرق والتسامح.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): ينفذ البرنامج ٢٩ مشروعاً للمجتمع المحلي في كربلاء، بضمنها برنامج تدرج مهني للشباب العاطل عن العمل، إعادة تأهيل المدارس، رفع مستويات شبكة الطاقة الكهربائية للمجتمع المحلي، إصلاح نظام مياه الصرف الصحي، تحسين شبكات توزيع المياه، إنشاء مرافق جديدة لمركز يساعد المعوقين، وإنشاء مركز نسائي، محطة إذاعة ومركز أبحاث زراعية. كما زود أيضاً هذا البرنامج معدات وتجهيزات مطلوبة بإلحاح للمدارس.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: مشروع واحد في كربلاء، أعاد إعمار منزل لعائلة واحدة.


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٦/١٠/٢٠٠٨.

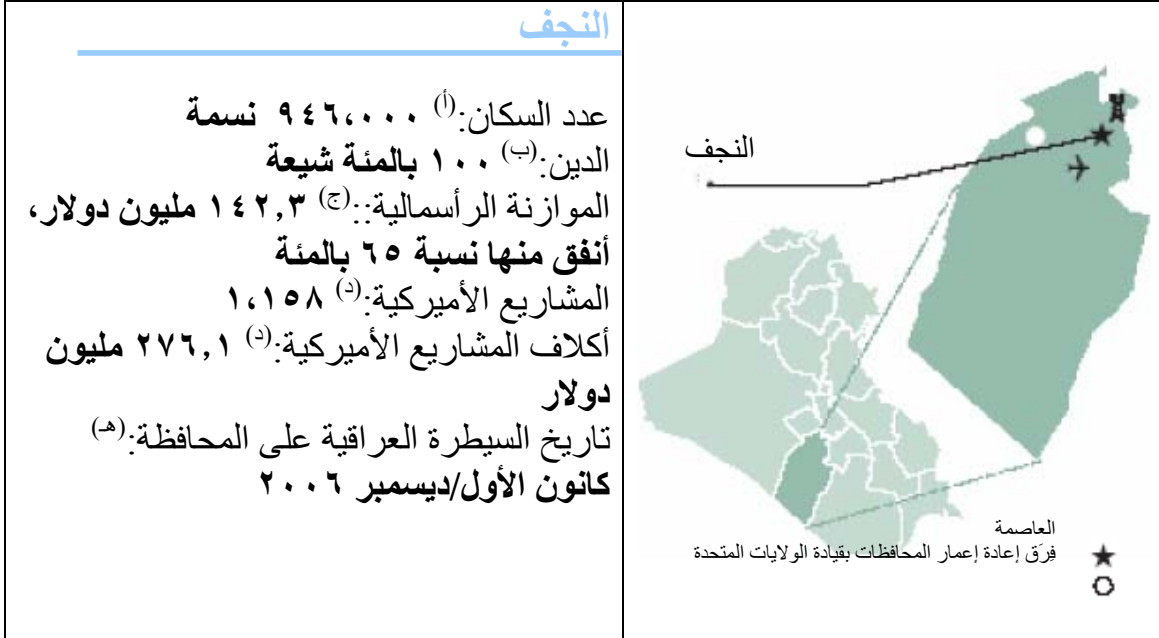


العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

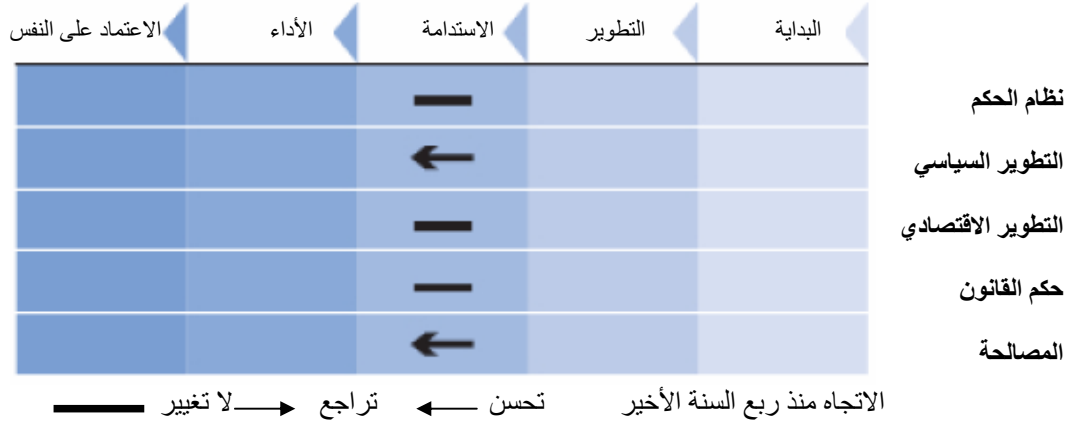

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

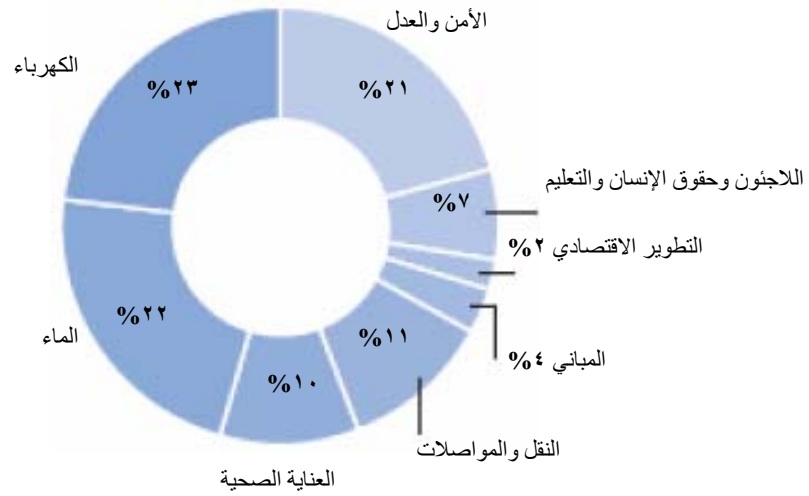

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها	
٢٢	\$٤٩,٢٢	١	\$١٤,٧٠	الكهرباء
١٠٣	\$٣٦,٩٣	١٣	\$٢٥,٣٠	الماء
٥٢	\$٢٨,٤٤	٢	\$٠,٢٩	العناية الصحية
٧٥	\$٢٧,١٨	٢	\$٢,٨٤	النقل والمواصلات
٤٤	\$٩,١٢	١	\$٠,٦٣	البناء
٢٩٧	\$١٥٠,٨٩	١٩	\$٤٣,٧٦	المجموع

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:


- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

النجف في لمحة سريعة		
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2)	\$٢٦٧
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)	\$٧١
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	\$٥٣
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)	\$٤١
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨	١٤٢,٣٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١	٤
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١	١
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة	كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع	٥
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً	١٥
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة	٣,٩٩٩
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة)	٨,٥٢٥
	عدد مستعملي الإنترنت	١١,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة	٦
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل	غير متوفر
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧)	٢٥,٧٢ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات	٣٣ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة	٣٩٢
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي	٦٨
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي	٢,٨٥ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ٣-١ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات
تبصرات القيادة: مع أن سلطات المحافظة لا تحتاج إلى مساعدة الحكومة الأميركية لتنفيذ مشاريع واسعة النطاق لإعادة الإعمار، فإنها تشجع فرق إعادة إعمار المحافظات في النجف والفرق المتعددة الجنسيات- في وسط العراق على التنسيق مع مقاولين بشأن هذه الجهود.^(٥٧٢)

في ربيع السنة هذا ساعدت فرق إعادة إعمار المحافظات سلطات المحافظة في افتتاح مطار النجف الدولي وأفادت أنها تستخدم الآلاف من المواطنين المحليين وشركات محلية عديدة في نشاطات الإنشاءات. تهدف فرق إعادة إعمار المحافظات إلى إعادة تجربة هذا الشكل من الشراكة في نشاطات تقوم بها على وجه الخصوص في قطاعي السياحة والزراعة.^(٥٧٣)

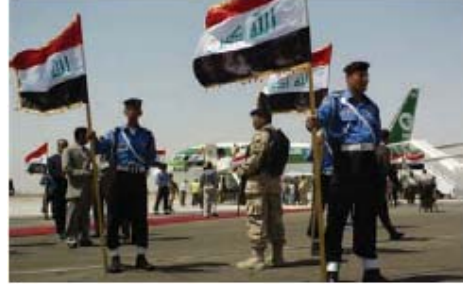

يقف ضباط الشرطة العراقية للحراسة خلال حفلة افتتاح مطار النجف الدولي في ٢٠ تموز/يوليو ٢٠٠٨ (الصورة من الفرقة المتعددة الجنسيات في العراق)

نظام الحكم: بدأ تطبيق نظام المحاسبة ومعلومات تعقب تنفيذ المشاريع ويقوم مسؤولون في برنامج الحكم المحلي بإعداد دورات تدريبية لموظفي وحدة المحاسبة في المحافظة. يهدف هذا المشروع الممول من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركائها إلى ربط المحافظة مع ٢٥٠ دائرة تابعة للوزارات بحلول نهاية العام ٢٠٠٨.^(٥٧٤)

يستمر العمل أيضاً على مشروع إنشاء قاعة الاجتماعات لمجلس قضاء الكوفة، الذي كان نصفه منتهياً في ٢٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨. تلقت القاعة نظام ميكروفون Wi-Fi، أجهزة كمبيوتر، قطع أثاث وأجهزة عرض. يدرس الآن مجلس القضاء كيفية تنفيذ أكشاك الخدمة الحكومية الإلكترونية لتسليم تراخيص إلى مواطني القضاء.^(٥٧٥)

التطوير الاقتصادي: زار فريق المهتمات لتحسين الأعمال وعمليات الاستقرار محافظة النجف في ربيع السنة هذا لتفتيش مصنع الألبسة في النجف. كانت فرقة المهتمات تتابع عملية تصنيع كبيرة محتملة لتزويد دروع جسدية حديثة لأفراد الجيش العراقي.^(٥٧٦)

الزراعة: من أجل معالجة النقص في الطاقة الكهربائية المزودة إلى مضخات مياه الري العاملة بالطاقة تدرس فرق إعادة إعمار المحافظات استعمال طاقة الرياح والطاقة الشمسية في المحافظة. في ربيع السنة هذا قابل مسؤولون في فرق إعادة إعمار المحافظات ممثلين عن مركز مشاتل النخيل في النجف ودائرة خدمة توسيع الزراعة من أجل صنع نموذج للطواحين الهوائية ومضخات تعمل بالطاقة الشمسية تمول من صندوق الاستجابة السريعة. تنوي فرق إعادة إعمار المحافظات تمويل تركيب خمس طواحين هوائية في المحافظة.^(٥٧٧)

التعليم: زود مسؤولون في فرق إعادة إعمار المحافظات أكثر من ٤٠٠ كتاب قانون باللغة العربية إلى كلية الحقوق في جامعة الكوفة بتمويل من صندوق الاستجابة السريعة.^(٥٧٨) طلب عميد الجامعة أيضاً بأن يلقي مستشار من فرقة إعادة إعمار المحافظات عدة محاضرات حول الدستور الأميركي.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
في ربع السنة هذا، كان لدى فرقة منطقة الخليج ٤ مشاريع قيد التنفيذ في محافظة النجف بقيمة ٤٢,٨٩ مليون دولار. جرى تمويل مشاريع أمنية وصحية وتعليمية بقيمة ٣٠ مليون دولار.^(٥٧٩)

الماء: بدأت الحكومة العراقية تنفيذ مشروع إمداد مياه المشكاب الذي تديره حالياً فرقة منطقة الخليج.^(٥٨٠) يهدف المشروع إلى زيادة كمية وتحسين نوعية مياه الشرب المتوفرة للسكان المحليين في مدينة المشكاب وسكان المناطق المجاورة. سوف تقام المحطة على ضفاف نهر الفرات بسعة تكفي لخدمة أكثر من ١١٠ آلاف مواطن.^(٥٨١)

النقل والمواصلات: اكتمل تنفيذ سبعة مشاريع للنقل والمواصلات في النجف.^(٥٨٢) في ربع السنة هذا اكتمل تنفيذ مشروع بقيمة ١,٧ مليون دولار لترميم شارع الحزام الممتد بين شارع كربلاء وشارع العدالة. كما اكتمل أيضاً في ربع السنة هذا مشروع الجسر الثالث في الكوفة الذي بنى جسراً من الخرسانة بطول ١٢ متراً عبر نهر الفرات بكلفة ٦,٥ مليون دولار.^(٥٨٣)

التعليم: خصصت معظم التمويلات للمشاريع المكتملة لفئة المباني والصحة والتعليم. وهناك مشروع تعليمي آخر قد أصبح مكتملاً تقريباً في جامعة الكوفة.^(٥٨٤) بدأ تنفيذ مشروع بقيمة ٢,٨ مليون دولار لإنشاء جناح هندسة ميكانيكية في مبنى كلية الهندسة في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧ ومن المتوقع أن يكتمل المشروع في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨.^(٥٨٥)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة النجف

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج استقرار المجتمع المحلي (CSP): لم يعمل هذا البرنامج في النجف.

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات تمويل صغيرة عبر ١٨٧ قرصاً غير مسدداً بقيمة ٦٦٠،٩٨٠ دولار. منذ تأسيس هذا البرنامج تمّ تقديم ٥٣٠ قرصاً بقيمة إجمالية تبلغ ١،٣٢٦،٩٧٠ دولار. يزود برنامج "تجارة" أيضاً مساعدة فنية وتدريب وبناء القدرات لمراكز تطوير شركات الأعمال الصغيرة المملوكة من قبل عراقيين، مثل منظمة تمكين المرأة. بصورة عامة، تقدم مراكز تنمية شركات الأعمال الصغيرة المملوكة من قبل عراقيين التدريب والاستشارات في المجتمع المحلي.

المشروع الزراعي "إنماء": لم يعمل برنامج "إنماء" في النجف.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" ٦٦٠ موظفاً حكومياً من محافظة النجف على الإدارة العامة والإدارة من خلال ٨ مقررات دراسية تم إدخالها عند مستويات كفاءة متنوعة. شملت المواضيع: القيادة والاتصالات، إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد.

مكتب المساعدات الأجنبية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): يقدم المكتب المساعدة للمهجرين إلى الداخل في كربلاء من خلال ثلاثة شركاء في القطاعات التالية: الصحة، الحماية، الملجأ، والمأوى، اللوجستيات وبيع الإغاثة، الماء/النظافة والصحة العامة وتنسيق المساعدات الإنسانية والمعلومات، الاقتصاد وأنظمة السوق.

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): زود برنامج الحكم المحلي الثاني مساعدة فنية لأربعة مكاتب حكومية في المحافظة هي: دائرة الطرق والجسور، حول مسك دفاتر حسابات الإيرادات المحلية، تحسين إجراءات تحصيل الإيرادات والطلبات المصرفية على الحساب المصرفي لإيرادات الودائع الفعلية، وحدة المحاسبة لمجلس المحافظة، حول توضيح تنفيذ موازنة العام ٢٠٠٨، والإعداد المحسن للتقارير ونشاطات تشغيلية أخرى. مكتب المفتش العام للمحافظة، حول نظام التدقيق العام للحسابات الحكومية لدعم جهود محاربة الفساد ورصد المخالفات المالية. دائرتا الصحة والكهرباء، حول تعليمات تنفيذ موازنة العام ٢٠٠٨ وإعداد تقارير حول النشاطات التشغيلية واحتساب معدلات تنفيذ بنود الموازنة.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): يدعم هذا الصندوق والبرنامج تنسيق توزيع معلومات الحكومة العراقية حول الانتخابات وتسجيل أسماء الناخبين.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): أعد البرنامج تقييماً للنزاعات لدرس احتياجات المجتمعات المحلية في محافظة النجف وتاريخ ومصادر النزاعات فيها من أجل تطوير مشاريع سريعة التأثير. يزود المشروع أيضاً تدريباً على المهارات للشباب في عمر العمل على مهارات صيانة الكمبيوتر والتلفزيون والمولدات الكهربائية الصغيرة المطلوبة بدرجة عالية في محافظة النجف.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): ينفذ برنامج المجتمع المحلي الثاني سبعة مشاريع في النجف تشمل إعادة تأهيل المباني وتزويد المعدات المطلوبة بالحاج للمدارس ومراكز الشباب وإنشاء ملعب رياضي للأطفال..

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: نفذ صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب مشروع إعادة إعمار منزل لعائلة واحدة وتزويد جردة لكشك بائع.


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦.




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

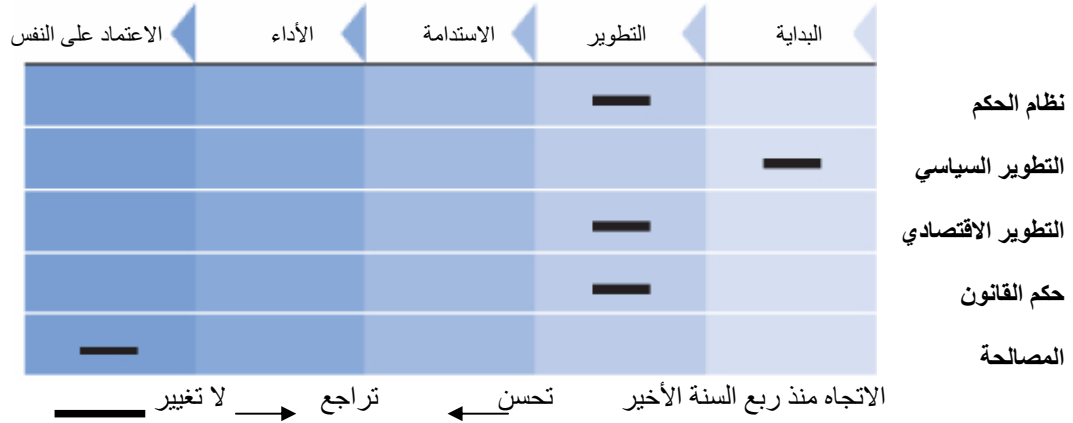

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

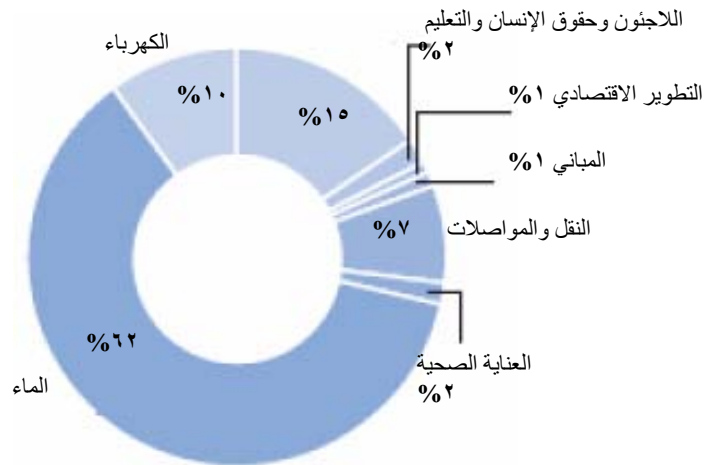

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها
٣	\$٠,٤٧		
٦١	\$٢٧,٣٧	٢	\$٤,٠٨
٩١	\$١٥١,٩١	٢	\$٤١,٥١
٣٧	\$٥,٠١	١	\$٠,٠٢
٤٩	\$١٩,٥٢	٣	\$٤,٠١
٢٩	\$٣,٣٠		
٢٧٠	\$٢٠٧,٥٨	٨	\$٤٩,٦٢

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ ٢٠٠٨؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

نظرة إجمالية على المحافظات

التمثلي في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$٦٦٤
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$٥
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٧٧
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$٤٦
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ٨٣,٤٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ٢
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ١
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة تموز/يوليو ٢٠٠٦
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ٣
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ١٠
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٢,٣٨٠
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٤,٦١٠
	عدد مستعملي الإنترنت غير متوفر
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٣
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٢٨١
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٢٤,٩٥ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٥٠ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٢٦٤
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٦٠
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ١,٧٨ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ١-٣ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات
تبصرات القيادة: يسهل مكتب الأمن الإقليمي في السفارة الأميركية والكنيية الأولى لسلاح الفرسان في اللواء الرابع التنقل اليومي لموظفي فرق إعادة إعمار المحافظات. تسهل فرق إعادة إعمار المحافظات الكثير من الاتصالات مع زعماء عشائر والمدنيين ورجال الأعمال. مع ان الانتباه كان مكرساً بصورة أولية للاتصال بالعشائر، لكن فرق إعادة إعمار المحافظات بدلت الآن مقاربتها لتشمل العمل الاستراتيجي مع مجلس المحافظة^(٥٨٦) لدى برنامج صندوق الاستجابة السريعة ١٣٨ مشروعاً قيد التنفيذ واكتمل تنفيذ أكثر من ٥٠ مشروعاً آخر^(٥٨٧). ابلغ قادة فرق إعادة إعمار المحافظات ان مهندسيها يعملون عن كثب مع عراقيين لتأمين نجاح المشاريع. يتصل موظفو فرق إعادة إعمار المحافظات بمكتب المحافظة في أحيان كثيرة ويقابلون المدراء العاميين على أساس منتظم^(٥٨٨).

التعليم: في ١٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ دربت فرق إعادة إعمار المحافظات موظفين من دائرة التعليم في المثني وأقامت ورشة عمل ثانية للمعلمين المحليين الذين تلقوا أجهزة كمبيوتر محمولة عبر مبادرة كمبيوتر محمول لكل ولد^(٥٨٩) أنشأت وزارة التعليم لجنة لتقييم البرنامج لدرس إمكانية تطبيقه عبر العراق. من المقرر ان يستلم طلاب مسجلين في ثلاث مدارس في المثني حوالي ٢٥٥ كمبيوتر محمول بنهاية تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨^(٥٩٠).

مشاركة المجتمع المحلي: قادت فرق إعادة إعمار المحافظات ثلاث حملات توزيع أمنت الطعام إلى ٦٠٠ عائلة احتفالاً بإفطار رمضان^(٥٩١). عمل مسؤولون ورجال شرطة وجنود أميركيون مع فرق إعادة إعمار المحافظات على جمع وتوزيع الطعام.

الزراعة: حضر قائدان من فرق إعادة إعمار المحافظات حفل قص شريط الافتتاح لتشغيل أربع مضخات ري جديدة مما مهد الطريق أمام اجراء مناقشات حول مسائل زراعية محلية. عالج موظفون من فرق إعادة إعمار المحافظات وقادة من التعاونية الزراعية وأعضاء من العشيرة المحلية الاحتياجات المالية والمادية لصيانة مضخات الري وتطبيق سياسات فرق إعادة إعمار المحافظات ومعالجة الخلافات العشائرية^(٥٩٢).

العناية الصحية: قدم أعضاء في فرق إعادة إعمار المحافظات وضباط من الجيش الأميركي إلى مستشفى محلي أجهزة ومعدات لإزالة وفحص رجفان القلب. خلال الزيارة، لاحظ موظفو المستشفى وجود عدد من النواقص بضمنها كتب مدرسية لطلاب السنة الأولى في كلية الطب وآلات للتصوير بالرنين المغنطيسي ومعدات لقنطرة القلب وآلات لغسل الكلي^(٥٩٣).

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
أبلغت فرقة منطقة الخليج أن ٥ مشاريع يجري تنفيذها حالياً في محافظة المثني بقيمة ٤٤,١٢ مليون دولار^(٥٩٤).

النقل: في ربيع السنة هذا اكتمل في آب/أغسطس تنفيذ مشروعين لإنشاء الطرق: مشروع طرق قرية المثني بقيمة ٢,٩ مليون دولار. تم بموجب هذا المشروع تعبيد ٣٤ كيلومتراً من الطرق الريفية^(٥٩٥) في أيلول/سبتمبر اكتمل تنفيذ مشروع طريق الخضر-آثار الوركاء بقيمة ١,٦ مليون دولار. تم بموجب هذا المشروع تعبيد ١١ كيلو متراً من الطريق الممتدة من الخضر إلى آثار الوركاء^(٥٩٦).

الكهرباء: بدأ العمل في ربيع السنة هذا على تنفيذ مشروع السماوة لخطوط الكهرباء الممددة تحت سطح الأرض ٣٣ كيلو فولت الذي تقدر قيمته ب ١,٨ مليون دولار^(٥٩٧).

الماء: مع إغلاق الصندوق في ربيع السنة هذا بقيت بضعة مشاريع لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق غير منفذة، لكن أصبحت عدة مشاريع كبيرة على وشك الاكتمال. فعلى سبيل المثال، أصبح مشروع مصرف الفرات الشرقي، الذي تبلغ كلفته ٣٨ مليون دولار، مكتملاً بنسبة ٦٣ بالمئة. بدأت أعمال الإنشاء

نظرة إجمالية على المحافظات

في ٢٥ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦، ومن المتوقع ان تكتمل بحلول آذار/مارس ٢٠٠٩. سوف تشمل أشغال المشروع إنشاء جسور للسيارات.^(٥٩٨)



أعضاء من فرق إعادة إعمار المحافظات في المثنى يلتقون مع صناعيين محليين (صورة من السفارة الأميركية)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة المثني

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج استقرار المجتمع المحلي (CSP): لا يعمل هذا البرنامج في المثني.

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات تمويل صغيرة عبر ٨٩ قرصاً غير مسدداً بقيمة ٢٣٩,٣٠٠ دولار.

المشروع الزراعي "إنماء": لا يعمل برنامج "إنماء" في المثني.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب البرنامج "تطوير" ٦٥٠ موظفاً حكومياً من محافظة المثني على الإدارة العامة والإدارة من خلال تقديم ٨ مقررات دراسية تم إدخالها عند مستويات كفاءة متنوعة. شملت المواضيع القيادة والاتصالات، إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد. يستطيع البرنامج ان يستجيب لحاجات معينة لموظفي الوزارات بإقامة ورش عمل مصممة خصيصاً لهم او تنفيذ برنامج تدريب المدرب الذي يسمح للوزارات بإعداد مناهجها التدريبية الداخلية.

مكتب المساعدات الأجنبية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): يقدم المكتب المساعدة للمهجرين إلى الداخل في محافظة المثني من خلال شريك واحد في القطاعات التالية: الصحة، الحماية، الملجأ، والمأوى، اللوجستيات وبيع الإغاثة، الماء/ النظافة والصحة العامة، تنسيق المساعدات الإنسانية والمعلومات، الاقتصاد وأنظمة السوق.

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): أقام البرنامج خمس دورات تدريب على قانون المحافظات الجديد لأعضاء مجلس محافظة المثني. كما استمر أيضاً فريق أنظمة المعلومات الجغرافية في برنامج الحكم المحلي في دمج ٥٣ خريطة تغطي كافة المناطق الواقعة ضمن حدود مدينة السماوة ورسم أول خريطة لقاعدة إلكترونية للمنطقة. تحت عنوان "النساء شريكات أساسيات في المجتمع"، نظم برنامج الحكم المحلي مؤتمراً نسائياً للتعامل مع العنف والمشاركة السياسية والقراءة والكتابة. شمل المشاركون أعضاء في المجالس المحلية ومجلس محافظة المثني وأعضاء في المديرية الحكومية ومنظمات نسائية لخدمة المجتمع المحلي.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): أعد البرنامج تقييماً للنزاعات درس بموجبه حاجات المجتمعات المحلية في المثني وتاريخ ومصادر النزاعات فيها من أجل تطوير مشاريع سريعة التأثير. تجمع في ربع السنة هذا أكثر من ١٤٠ شاباً قادمين من مناطق واثنيات مختلفة في المثني للاشتراك في مباريات رياضية، مما زود وسيلة للتفاعل البناء الإيجابي من خلال تنفيذ نشاطات وإجراء مناقشات حول مسائل مختلفة لحل النزاعات.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): ليس هناك أية مشاريع جديدة لبرنامج الحكم المحلي الثاني في محافظة المثني.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: ليس هناك أية مشاريع لضحايا الحرب في محافظة المثني في ربع السنة هذا.


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٦/١٠/٢٠٠٨.




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)



كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

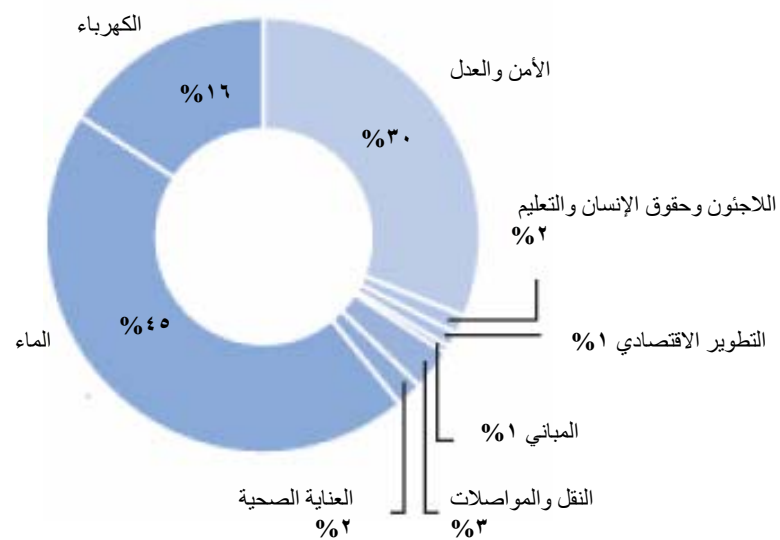

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها
٣	\$٠,٤٣		
٦٦	\$١٣٢,٢٥	٤	\$١٣,٨١
١٦٩	\$٣٨٣,٣٠	١٥	\$٢٦,٨٢
٨٠	\$١٧,١١	١٣	\$٠,٥٠
١١٢	\$٢٦,٧٦	٦	\$١,٣٤
٩٤	\$٥,٩٩	١	
٥٢٤	\$٥٦٥,٨٤	٣٩	\$٤٢,٤٧

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١. عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

ذي قار في لمحة سريعة		
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2)	\$1,013
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)	\$121
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF)	\$41
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)	\$29
التمويل العراقي مليون دولار	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام 2008	215,80
الأمن	مجموع الاعتداءات 2008/7/1-2008/4/1	17
	مجموع الاعتداءات 2008/9/30-2008/7/1	21
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة	أيلول/سبتمبر 2006
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع	2
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً	836
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة	6,030
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة)	9,215
	عدد مستعملي الإنترنت	2,000
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة	8
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل	1,966
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية 2006 والسنة المالية 2007)	25,80 مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات	43 بالمائة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة (2008/7/1-2008/9/20)	453
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي	63
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي	6,21 مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات 3-1 لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات
تبصرات القيادة: أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات في ذي قار أن التقييد الرئيسي لتطوير المحافظة هو عدم وجود خبرات في جميع الحقول تقريباً^(٥٩٩) في وقت سابق، ركزت فرق إعادة إعمار المحافظات على تطوير البنية التحتية ولكن مؤخراً بدأت تشدد على بناء القدرات في جميع المشاريع. تعمل فرق إعادة إعمار المحافظات على إنجاز نظام تسجيل جديد للمشاريع يعزز الكفاءة في إدارة المشاريع الجاري تنفيذها وتحسين التنسيق بين الأطراف.^(٦٠٠)

التعليم: في ربيع السنة هذا، زودت فرق إعادة إعمار المحافظات في ذي قار فرصة للأطباء الجراحين المحليين لتعلم تقنيات جديدة لمعالجة التقرم. كما أدارت فرق إعادة إعمار المحافظات حلقات دراسية حول حكم القانون أشرف عليها أساتذة إيطاليون وشملت مواضيع كحرية الدين وحقوق المرأة وجمع الأدلة لمفتشي الشرطة. عرّفت دورات تدريب أخرى مهنيين عراقيين بالمقاييس الدولية المتعلقة بحقول اختصاصهم.^(٦٠١)

في آب/أغسطس ٢٠٠٨، استقطب الأسبوع الثقافي للناصرية ما بين ٢٠٠ و ٣٠٠ شخص في اليوم. قدمت خلال هذا الأسبوع الثقافي نشاطات في الهواء الطلق ومسرحيات وأفلام سينمائية وتنقلت المكتبة النقالة عبر المدينة توزع كتباً عربية في المعارف العامة.^(٦٠٢)



مرفق سجن الناصرية (صورة من ديجيتال غلوب ٢٠٠٦، ٢٠٠٧)

الزراعة: مَوَّل صندوق الاستجابة السريعة مشتل الجاتروفا الذي يجري إنشاؤه في مركز التدريب في معسكر ميتينكا. سوف يربي هذا المرفق الشتول لزراعتها في قطعة أرض اختبارية في الجامعة المحلية ويجري المهندسون الزراعيون في الكلية تدريباً على إدارة مشاتل النبات. تنتج بذور الجاتروفا زيتاً يمكن استعماله محلياً كوقود بيولوجي أو تصديره إلى الخارج لصنع الأدوية ولاستعمالات أخرى.^(٦٠٣)

نظمت فرق إعادة إعمار المحافظات أيضاً دورات تدريبية حول الطرق الأكثر فعالية لتصنيع منتجات الحليب وحول الأساليب الآمنة لحصاد التمر.^(٦٠٤)

الماء: في ربيع السنة هذا، زودت فرق إعادة إعمار المحافظات وحدة نقالة لتنقية المياه إلى معسكر ذي قار الخاضع للسيطرة العراقية. تزود وحدات تنقية المياه هذه مياه الشرب إلى حوالي ١,٥٠٠ جندي. بعد أن يتم إصلاح محطة تنقية المياه الثابتة الأكبر حجماً في معسكر ذي قار سوف يتم نقل الوحدة النقالة إلى القرى المحتاجة.^(٦٠٥)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج أبلغت فرقة منطقة الخليج عن وجود ٢٣ مشروعاً يجري تنفيذهم في محافظة ذي قار بكلفة إجمالية تبلغ ١٦٠,٦٢ مليون دولار.^(٦٠٦) تعالج المشاريع الكبرى الجاري تنفيذها الأمن والأشغال العامة والماء والكهرباء.^(٦٠٧)

العدل: اكتمل إنجاز المرحلة الأولى من مرفق سجن الناصرية خلال ربع السنة الأخير. يستمر العمل على تنفيذ المراحل المتبقية لمشروع السجن. تقرر بذل جهود لبناء أربع مجموعات خلايا إضافية.^(٦٠٨) أصبح المشروع حالياً، مكتملاً بنسبة ٤١ بالمئة وتبلغ كلفته ٦,٢ مليون دولار. بدأ تنفيذ المرحلة الثالثة لمبنى السجن، وأصبح الآن مكتملاً بنسبة ٥ بالمئة وتبلغ قيمة هذا المشروع ٧,٣ مليون دولار.^(٦٠٩)

الماء: تبني الحكومة العراقية حالياً أحد أكبر مشاريع المياه في محافظة ذي قار من خلال برنامج هبة مع فرقة منطقة الخليج. أصبح مشروع إنشاء محطة ضخ مياه الصرف في الناصرية وقيمته ٢٠ مليون دولار^(٦١٠) مكتملاً بنسبة ٧٢ بالمئة^(٦١١). ومع اقتراب المشاريع الكبيرة في المحافظة من بدأ الاكتمال، تنفيذ عدة مشاريع اصغر حجماً.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة ذي قار

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG):
يدعم برنامج "تجارة" مؤسسات التمويل الصغيرة
عبر ١٢٨ قرصاً غير مسدداً بقيمة ٢٥٤,٦٠٠
دولار. كما يزود برنامج "تجارة" المساعدة الفنية
والتدريب وبناء القدرات لمراكز تطوير شركات
الأعمال الصغيرة التي يملكها عراقيون
(SBDC)، كمنظمة تمكين المرأة. بوجه عام تقدم
هذه المراكز التدريب والاستشارات إلى المجتمع
المحلي.

المشروع الزراعي "إنماء": لا يعمل برنامج
"إنماء" في محافظة ذي قار.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب
برنامج "تطوير" أكثر من ١,٧١٠ موظفاً حكومياً
في محافظة ذي قار على الإدارة العامة والإدارة
من خلال تقديم ٨ مقررات دراسية تم إدخالها عند
مستويات كفاءة متنوعة. شملت المواضيع القيادة
والاتصالات، إدارة المشاريع، إدارة الموارد
البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا
المعلوماتية ومكافحة الفساد.

مكتب المساعدات الأجنبية في حالة الكوارث
(OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
(USAID): لا يعمل هذا المكتب في محافظة ذي
قار.

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): أدار
برنامج الحكم المحلي الثاني ورشة عمل حول تنفيذ
قانون الموازنة للعام ٢٠٠٨ لموظفي مكتب المحافظ
وأعضاء مجلس المحافظة واللجنة المالية ولموظفي
وحدة المحاسبة وللمدراء العامين. يستمر عمل
البرنامج في رسم وتنفيذ الخرائط في مديريات
التخطيط المدني وأصبحت هذه المهمة مكتملة تقريباً.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة
السريعة للعراق (QRF/IRAP): يمول برنامج
المساعدة السريعة للعراق مكتب الانتخابات لمحافظة
ذي قار كما اتحاد رجال أعمال ذي قار ومركز
تطوير شركات الأعمال الصغيرة في الناصرية.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع
المحلي في العراق (ICCM): يعالج البرنامج
النزاع القائم بين العشائر في قرية الحاجي كميز
بالقرب من الناصرية. وقد أنشأ آلية للتعاون بين
الشباب من خلال وضع قواعد مشتركة تعترف بها
كل عشيرة. المقاربة هي عملية تثقيفية وتنظيمية قيمة
لتخفيف التوترات بين الشباب في القرية.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II):
بموجب هذا البرنامج تم تنفيذ ١٥ مشروعاً للمجتمع
المحلي لإعادة تأهيل المدارس، رفع مستوى شبكة
الطاقة الكهربائية للمجتمع المحلي، إصلاح نظام
الصرف الصحي، تحسين شبكات توزيع المياه، إنشاء
مركز لمساعدة المعوقين وإقامة مركز للنساء. كما
زود البرنامج معدات وتجهيزات مطلوبة بالحاج إلى
المدارس.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: نفذ الصندوق
سنة مشاريع للمساعدة في تأسيس شركات أعمال
صغيرة في ذي قار، كمتجر للسجاد وإعادة تجهيز
الأكشاك.

المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦.

ميسان


عدد السكان: (أ) ٧٤٣ ألف نسمة
 الدين: (ب) ١٠٠ بالمئة شيعة
 الموازنة الرأسمالية: (ج) ١٢٠,٥ مليون دولار،
 أنفق منها نسبة ٤١ بالمئة
 المشاريع الأميركية: (د) ٧٥٦
 أكلاف المشاريع الأميركية: (د) ٣٢٣,٤ مليون
 دولار
 تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة: (هـ)
 نيسان/أبريل ٢٠٠٧




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

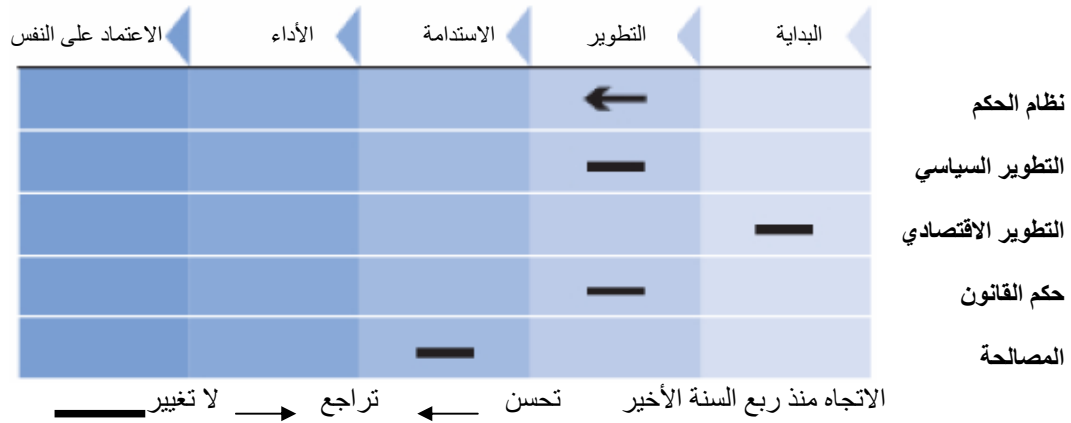

كلفة المشاريع حسب القطاع (ح)

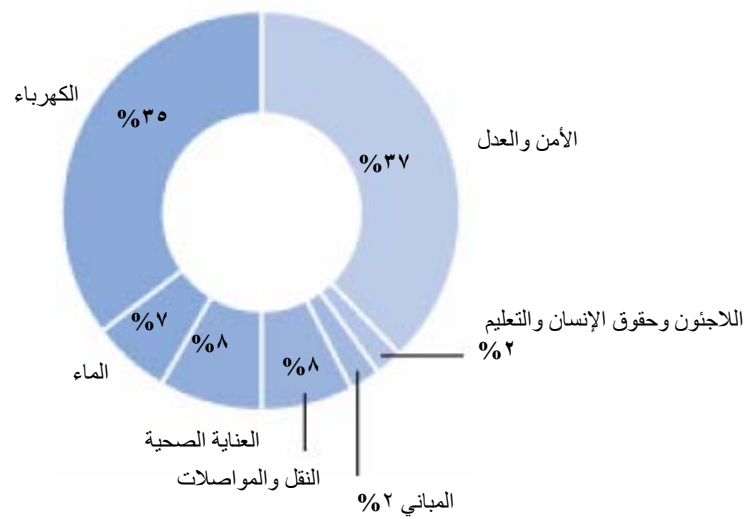

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط) (بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها
٣	\$٠,٨٠		
٣٥	\$٩٦,٣٥	١	\$١٧,٣٨
٩٨	\$٢٠,١١	١	\$٠,٩١
٢٦	\$٤,٩٤	٣	\$٢١,٧٠
٢٤	\$١٦,١١	٢	\$٨,٥٦
١٨	\$٧,٩٤		
٢٠٤	\$١٤٦,٢٤	٧	\$٤٨,٥٤

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ ٢٠٠٨؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

نظرة إجمالية على المحافظات

ميسان في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$٣٤٩
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$١٠٣
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٨٥
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$٣٠
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ١٢٠,٥٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ١٢
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٤٣
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة نيسان/أبريل ٢٠٠٧
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ٤
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ٤
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ٢,٧٤٧
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٦,٢٢٢
	عدد مستعملي الإنترنت ١,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ٤
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٢٨١
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٢٥,٩٤ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٧٣ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٣٣٩ (٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٩/٢٠)
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٧٩
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٦,١٢ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ١-٣ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة إعادة إعمار المحافظات تبصرات القيادة: تلقت فرقة إعادة إعمار محافظة ميسان الترخيص في ربع السنة هذا بالسفر إلى المحافظة ونظراً للتفاعل المتزايد مع مسؤولي المحافظة دُعيت هذه الفرق إلى الاستقرار هناك والعمل بدوام كامل.^(٦١٢) لكن عضوية الفرقة بخمسة موظفين فقط بسبب وضعها السابق ولذلك يجب أن تأمين عدد أكبر من الموظفين.^(٦١٣)

في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، أمضى موظفو فرقة إعادة إعمار محافظة ميسان أول ليلة لهم في المحافظة. يجري حالياً تأمين المكاتب والإقامة للسماح بعدد أكبر من أعضاء الفرقة بأن يمضوا عدة أيام وليالي في المحافظة.^(٦١٤)

تستمر فرقة إعادة إعمار المحافظات في ميسان في إشراك مجلس المحافظة في العمل عبر التوترات السياسية ودفع المبادرات قُدماً. كما تنشط فرقة إعادة إعمار المحافظات أيضاً في تزويد التدريب على الانتخاب لقيادة المحافظة.^(٦١٥)



عمال عراقيون يعملون على بناء مستشفى الجراحة الجديدة في العمارة. (صورة من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج حتى هذا التاريخ، اكتمل تنفيذ ١٥٢ مشروعاً في محافظة ميسان بقيمة ١٤٠,٢١ مليون دولار. معظم التمويل كان لدعم قطاع الكهرباء (٦٨,٨ مليون دولار) وقطاع الأمن (٥٠,٤ مليون دولار).^(٦١٦) كان لدى فرقة منطقة الخليج ٥ مشاريع قيد التنفيذ بقيمة تقارب ٢٥ مليون دولار.^(٦١٧)

النظافة والصحة: في ربع السنة هذا استمر العمل على إعادة تأهيل موقع مطمر العمارة. سوف يزود هذا المشروع إلى سكان العمارة مطمراً ومحرقاً حديثين. يستمر خلال ربع السنة هذا تنفيذ المرحلتين ١ و ٢ من مستشفى ميسان.^(٦١٨)

النقل: استمر العمل منذ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٦ على مشروع طريق السيارات بين العمارة والمأمونية الذي يشمل بناء ثلاثة جسور و ٤٠ كيلومتراً من طريق سريع بمسارين. أصبح هذا المشروع وقيمه ٦,٢ مليون دولار، مكتملاً بنسبة ٨٥ بالمئة.^(٦١٩)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
ملخص جهود الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في محافظة ميسان

الاقتصاد والزراعة وتطوير القدرات

برنامج استقرار المجتمع (CSP): هذا البرنامج لا يعمل في ميسان.

برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات (PEG): يدعم البرنامج "تجارة" مؤسسات التمويل الصغيرة عبر ١٥٢ قرصاً غير مسدداً بقيمة ١٨٠,٣٥٠ دولار.

المشروع الزراعي "إنماء": برنامج "إنماء" لا يعمل في محافظة ميسان.

برنامج تطوير القدرات القومية (NCD): درب برنامج "تطوير" أكثر من ٨٨٠ موظفاً حكومياً في محافظة ميسان على الإدارة العامة والإدارة من خلال تقديم ٨ مقررات دراسية تم إدخالها عند مستويات كفاءة متنوعة. شملت المواضيع القيادة والاتصالات، إدارة المشاريع، إدارة الموارد البشرية، الإدارة المالية، المشتريات، تكنولوجيا المعلوماتية ومكافحة الفساد. يستطيع البرنامج ان يستجيب إلى احتياجات موظفي الوزارات بإقامة ورش عمل مصممة خصيصاً لهم وبرنامج تدريب المدرب الذي يسمح للوزارات بإعداد مناهجها التدريبية الداخلية.

مكتب المساعدات الأجنبية في حالة الكوارث (OFDA)/الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID): هذا المكتب لا يعمل في محافظة ميسان.

الديمقراطية ونظام الحكم

برنامج الحكم المحلي الثاني (LGP II): أقام برنامج الحكم المحلي الثاني دورة تدريبية حول الموازنة العامة وتدقيق حسابات الحكومة المحلية، بما في ذلك تقديم عروض لنظام محاسبة المحافظات ومعلومات تعقب تنفيذ المشاريع (GAPTIS). وقع مسؤولون في المحافظة مذكرة تفاهم بشأن تركيب النظام. يستمر عمل برنامج الحكم المحلي الثاني في المحافظة في رسم وتنقيح الخرائط في مديريات التخطيط المدني وقد أصبح هذا العمل مكتملاً تقريباً.

صندوق الاستجابة السريعة/برنامج المساعدة السريعة للعراق (QRF/IRAP): يدعم الصندوق تمويل المقاولين المحليين والمهنيين من خلال مشروع السجاد لأهالي الطيب ويجعل إقامة حلقات دراسية وتوزيع معلومات حول الصحة العامة أمراً ممكناً.

برنامج تخفيف النزاعات الناشئة في المجتمع المحلي في العراق (ICCM): أعد البرنامج تقييماً للنزاعات يتفحص احتياجات المجتمعات المحلية في ميسان وتاريخ ومصادر النزاعات فيها من أجل تطوير مشاريع سريعة التأثير. مشروع آخر يتمثل بتنظيم ماراتون ميسان لتوحيد العناصر الاجتماعية المختلفة في المجتمع. تترك المنافسات الرياضية تأثيراً هاماً على التواصل بين، الشباب وتشرك الحكومة المحلية منظمات الشباب ومنظمات غير حكومية في التخطيط لهذا الحدث.

برنامج عمل المجتمع المحلي الثاني (CAP II): تنفذ بموجب برنامج عمل المجتمع المحلي ثلاثة مشاريع لمساعدة المقاولين المحليين بالتدريب وبإعادة تأهيل العيادات المحلية.

صندوق مارلا روزيكا لضحايا الحرب: ليس للصندوق أية مشاريع في ميسان.


المصدر: استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦.




العدد الإجمالي للأحداث الأمنية في الشهر (و)



تقييم التقدم حسب فريق إعادة إعمار المحافظات (ز)

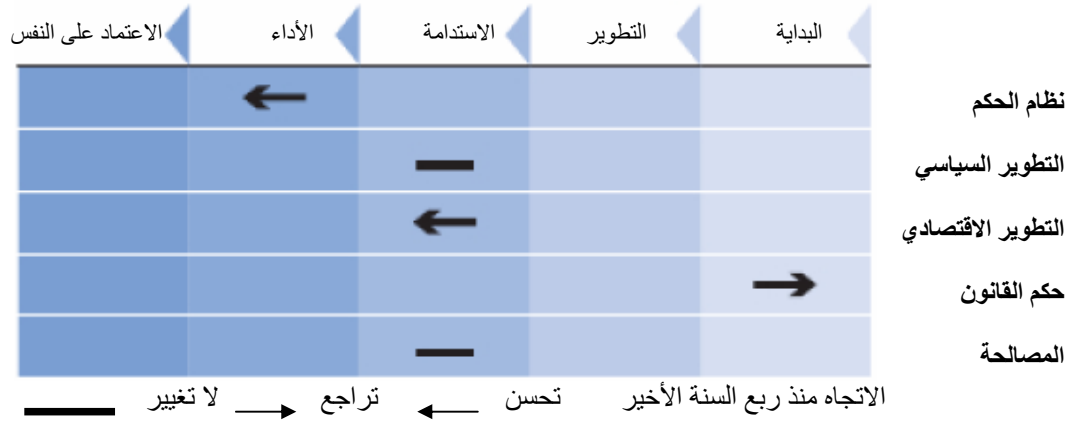

كافة المشاريع حسب القطاع (ح)

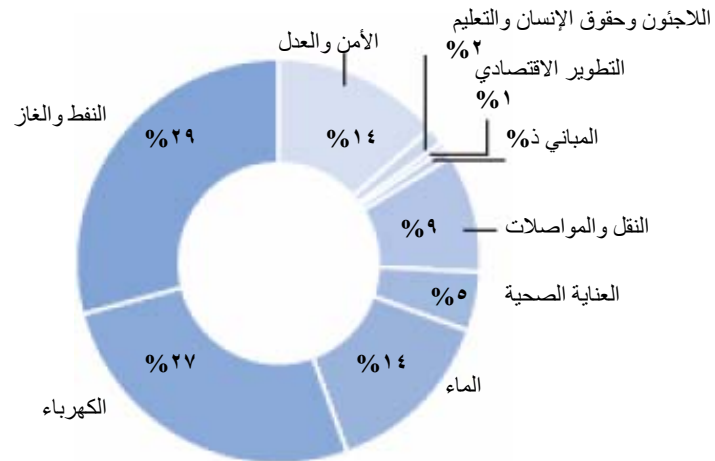

مشاريع البنية التحتية الجاري تنفيذها والمكتملة (ط)
(بملايين الدولارات)

عدد المشاريع المكتملة	كلفة المشاريع المكتملة	عدد المشاريع الجاري تنفيذها	كلفة المشاريع الجاري تنفيذها
١٤٦	\$٦٢٤,٥٠	٣	\$١٨,٧٤
٤٧٤	\$٥٦٢,٣١	٥	\$٢٢,٧٥
٢٩٤	\$٢٨٠,٩٩	٧	\$٢٥,٠٠
١٥٩	\$٦٤,٤٩	١٣	\$٣٦,٨٧
٢١٦	\$١٧٤,٨٧	١٣	\$٣٥,٩٩
٢٧٠	\$١٣,١٢	١	\$٠,٤٤
١,٥٥٩	\$١,٧٢٠,٢٨	٤٢	\$١٣٩,٧٩

ملاحظات: المواقع الظاهرة على الخريطة هي تقريبية. الأرقام تتأثر بالتدوير.

المصادر:

- (أ) مكتب الأمم المتحدة لتنسيق المساعدات الإنسانية (UNOCHA): "سكان العراق حسب المحافظة"، ١٩ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧.
- (ب) المنظمة الدولية للهجرة: بيانات المهجرين إلى الداخل التي استعملها موقع الإنترنت لوكالة الاسوشيتدبرس، أيار/مايو ٢٠٠٨ www.iom.iraq.net.
- (ج) وزارة المالية، التقرير الرأسمالي، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، زودته وزارة المالية الأميركية في بغداد ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (د) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/١٣؛ ٢٠٠٨؛ عدد المشاريع وكلفتها قد يختلفان عن العدد والكلفة الذين ابلغ عنهما خلال ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. الأرقام للمصدر (د) تشمل المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة وتبرر استعمال أموال صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، وصندوق قوات الأمن العراقية (ISFF)، وصندوق دعم الاقتصاد (ESF)، وبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- (هـ) وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" ٢٠٠٨/٩/٣٠، الصفحة ٣٢.
- (و) استجابة مكتب وزير الدفاع لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- (ز) استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- (ح) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. يشمل فقط المشاريع الجاري تنفيذها والمكتملة. قد يختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق. استناداً إلى هذه المصادر، يمثل قطاع النفط والغاز نسبة تقل عن نصف بالمئة من إجمالي التمويل.
- (ط) نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)- الملف النهائي لمكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١. نظام إدارة إعادة إعمار العراق، كتيب إكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣. قد تختلف عدد وكلفة المشاريع عن تلك المبلغ عنها في تقرير ربع السنة الأخير لأنه تم الحصول على بيانات الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) من مكتب إدارة إعادة إعمار العراق.

نظرة إجمالية على المحافظات

البصرة في لمحة سريعة	
التمويل للشخص الواحد	كلفة المشاريع الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) \$١,٥٧٧
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق قوات الأمن العراقية (ISFF) \$١٥٩
	كلفة المشاريع الممولة من صندوق دعم الاقتصاد (ESF) \$٢٢٦
	كلفة المشاريع الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP) \$١٤٧
التمويل العراقي	تخصيصات المحافظة من الموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨ ٣٠٦,١٠ مليون دولار
الأمن	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٧/١-٢٠٠٨/٤/١ ١٠٨
	مجموع الاعتداءات ٢٠٠٨/٩/٣٠-٢٠٠٨/٧/١ ٢٦
	تاريخ السيطرة العراقية على المحافظة كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٧
الاقتصاد	مؤسسات تملكها الدولة-مصانع ٩
	أعمال عقود وفق برنامج العراقيين أولاً ٤٤١
البنية التحتية	متوسط الحمل المزود (ميغا واط/ساعة) لربع السنة ١٥,٥٧٦
	متوسط الطلب (ميغا واط/ساعة) ٢٠,٩٦٦
	عدد مستعملي الإنترنت ٥٣,٠٠٠
	مراكز العناية الصحية الأولية الممولة من الولايات المتحدة ١١
نظام الحكم	عدد المهجرين إلى الداخل ٤٦,٠٦٠
	إجمالي المبالغ المخصصة في موازنة لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات (السنة المالية ٢٠٠٦ والسنة المالية ٢٠٠٧) ٦٦,٩٥ مليون دولار
	النسبة المئوية الممنوحة بموجب عقود من المبالغ المخصصة للجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات ٧٣ بالمئة
	عدد المتدربين في برنامج "تطوير" حسب المحافظة ٣٨٧
	مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ١٢٥
	قيمة مشاريع برنامج عمل المجتمع المحلي ٨,٣٢ مليون دولار

ملاحظة: الأرقام تتأثر بالتدوير.
المصدر: أنظر جدول مقارنات المحافظات ٣-١ لمعرفة المصادر.

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرق إعادة إعمار المحافظات
تبصرات القيادة: يدعم فريق الحكم في فرقة إعادة إعمار المحافظات خطة العمل لتنفيذ موازنة البصرة التي تدمج جهود الولايات المتحدة، المملكة المتحدة وبرنامج التنمية للأمم المتحدة من أجل تحسين عمليات الموازنة. بالإضافة إلى ذلك، يجري هذا الجهد المشترك تحاليلاً لآليات الإدارة والعقود ويعزز تنمية القدرات من خلال نظام معلومات لتعقب تنفيذ المشاريع بصورة فعالة أكثر. أبلغت فرق إعادة إعمار المحافظات في البصرة أن "التقدم واضح"، مشيرة إلى الالتزام الكامل بالموازنة الرأسمالية للعام ٢٠٠٨.^(٦٢٠)

تحاول أيضاً فرق إعادة إعمار المحافظات والسفارة الأميركية تحسين تطوير البنية التحتية، وخاصة الكهرباء. في صيف هذا العام، عانى سكان البصرة من درجات الحرارة المرتفعة لم تتأمن لهم الكهرباء سوى ثماني ساعات باليوم. تحاول فرق إعادة إعمار المحافظات مساعدة حكومة المحافظة على تحسين إمكانية الوصول إلى هذه الخدمة الأساسية لكن السيطرة على محطات توليد الطاقة والشبكة الوطنية للكهرباء تظل تحت الإشراف المركزي في بغداد من قبل وزارة الكهرباء.^(٦٢١) ازدادت موافقات وعقود ومعدلات إنجاز مشاريع صندوق الاستجابة السريعة خلال فصل الصيف، لكن تسعى فرق إعادة إعمار المحافظات إلى إيجاد شريك جديد لإدارة المشروع منذ أن أصبح القسم الجنوبي من فرق منطقة الخليج عاجزاً عن تقديم هذه الخدمة إلى فرق إعادة إعمار المحافظات.

في ربع السنة هذا، وزعت فرق إعادة إعمار المحافظات في البصرة تقريراً سنوياً حول عمليات إعادة الإعمار والتنمية والتطوير كجزء من جهد لنشر الخطط العراقية بموجب بيان موارد المحافظة للعام ٢٠٠٨ ولدعم وزارة المالية في تطبيق هذه الخطط على جميع المحافظات.^(٦٢٢)

التطوير الاقتصادي: استمرت خلال ربع السنة هذا نشاطات تشجيع الاستثمار في البصرة. زارت مجموعة تمثل مطارات دولية رئيسية مطار البصرة الدولي لمناقشة استثمارات ممكنة قد تشمل تدريب موظفي الدعم.^(٦٢٣)



عمال يقومون بإصلاح مدرسة سجد في البصرة. (صورة من سلاح الهندسة في الجيش الأميركي)

يشجع فريق الاقتصاد في فرق إعادة إعمار المحافظات الاستثمار من خلال مساعدة حكومة المحافظة في تشكيل لجنة الاستثمارات في البصرة.^(٦٢٤) ونشاطات استثمارية أخرى.^(٦٢٥)

- بانتظار بدء اكتمال إعادة تجهيز مرافق لجنة الاستثمارات في البصرة، حدد تاريخ بدء عمل لجنة الاستثمارات في البصرة في الأول من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٨.

• تمّ التأكيد رسمياً على زيارة مستثمرين جديدين، ويتسمر المستشار الأميركي للجنة الاستثمارات في البصرة في التفاوض مع السلطة المحلية في أيرلندا الشمالية لكي تقيم علاقة دائمة بين البصرة والمستثمرين هناك.

• وافقت لجنة الاستثمارات الوطنية على تولي لجنة الاستثمارات في البصرة مراقبة موازنتها بدلاً من وزارة المالية. لكن لم يكن تمويل الحكومة العراقية للعام ٢٠٠٨ كافياً لتنفيذ ذلك، ولهذا سوف تزود فرق إعادة إعمار المحافظات الموارد الإضافية.

البنية التحتية: ينفذ برنامج استقرار المجتمع الأهلي (CSP) ٣٤ مشروعاً للبنية التحتية في البصرة ويوجد قيد التخطيط ١٢ مشروع آخر. في السنة المالية ٢٠٠٨، قدم البرنامج ٣٢٨ هبة لتطوير شركات الأعمال. يستمر فريق الاقتصاد في فرق إعادة إعمار المحافظات في دراسة الطرق لتوسيع القروض كي تشمل الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم.^(٦٢٦)

نظام الحكم: دعم فريق الحكم في فرق إعادة إعمار المحافظات في البصرة تطوير خطة الخدمات الأساسية، التي تهدف إلى توجيه الانتباه الدولي إلى تحسن مناطق الخدمة الأساسية للصرف الصحي والماء والكهرباء وإزالة النفايات. تعمل المبادرة مع أصحاب المصلحة العراقيين إعداد استراتيجية متوسطة المدى لمجها مع استراتيجية تطوير المحافظات للأعوام ٢٠١٠-٢٠١٣.^(٦٢٧)

تحديث المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها فرقة منطقة الخليج
أكملت فرقة منطقة الخليج ٢٦٩ مشروعاً في محافظة البصرة بقيمة ١,٠٢ مليار دولار.^(٦٢٨) في ربع السنة هذا، كان يجري تنفيذ ١٦ مشروعاً بقيمة تزيد عن ١١٢ مليون دولار.

العدل: اكتمل في ربع السنة هذا إنشاء المبنى الملحق لمرفق حماية الشهود في البصرة. بدأ تنفيذ هذا المشروع، وقيمتها ٢,٠ مليون دولار، في تموز/يوليو ٢٠٠٦. كما اكتمل في ربع السنة هذا إنشاء مبنى محكمة البصرة الجديد بقيمة ٨,٣ مليون دولار.^(٦٢٩)

الصحة: أصبح مستشفى الأطفال في البصرة مكتملاً بنسبة ٩٤ بالمئة بعد ان واجه المشروع عدة تأخيرات.^(٦٣٠) من المقرر ان تكتمل الأشغال في ٣١ كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩. وسوف يتم تزويد الخدمات من خلال مرفق عيادة خارجية، غرف للعمليات الجراحية وعيادات للتصوير الشعاعي والعلاج الفيزيائي. تبقى ستة مشاريع قيد التنفيذ بضمنها مشروعين بقيمة ٣٠٠ ألف دولار لإنشاء مراكز للعناية الصحية الأولية في حي الحسين والخليج العربي.^(٦٣١)

الكهرباء: شارفت عدة مشاريع لإعادة تأهيل محطات التحويل على الانتهاء. أبلغت فرقة منطقة الخليج ان مشاريع إعادة تأهيل محطات التحويل ١٣٢ كيلو فولت في الميناء، حمار، الغرمة، القرنة وطوبا، والتي تبلغ قيمتها ٥٠,١ مليون دولار، أصبحت مكتملة بنسبة ٩٥ بالمئة.^(٦٣٢)

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

تدقيقات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
تحقيقات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
خط الاتصال المباشر للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
مواقع الإنترنت للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
تحديث التشريعات

القسم ٤

إشراف المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

تدقيقات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
تحقيقات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
خط الاتصال المباشر للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
مواقع الإنترنت للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
تحديث التشريعات

القسم ٤

تدقيقات المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

أكمل المفتش العام بين الأول من آب/أغسطس ٢٠٠٨ و ٣٠ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، سبع عمليات تدقيق جديدة علماً أن المفتش العام اصدر 91٢ تقرير تدقيق منذ آذار/مارس ٢٠٠٤. أنظر الجدول ٤-١ الذي يدرج تقارير التدقيق هذه.

في ربيع السنة هذا، عالجت تقارير التدقيق التي أعدها المفتش العام مجموعة متنوعة من المسائل والبرامج:

- نقاط القوة والضعف في جهود إدارة برنامج بناء الديمقراطية في العراق التي تقوم بها وزارة الخارجية الأميركية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وفرص تقوية إدارة النتائج.
- المحدودية المستمرة لإمكانية الوثوق بالبيانات وفائدة البيانات المتعلقة بعدد قوات الأمن العراقية الذين تم تعيينهم وتدريبهم.
- ثلاثة تقارير حول مسائل العقود: يزود أحد التقارير البيانات المتوفرة حول عدد مقاولي الأمن الخاص، العاملين في العراق والالتزامات المترافقة مع ذلك، ويركز التقرير الثاني الاهتمام على إنهاء العقود والأعمال المحدودة المتخذة ضد المقاولين من أصحاب المشاكل، والثالث هو الثامن في لسلسلة متواصلة من تدقيقات العقود المركزة التي تتعامل مع النتائج والتكاليف ومسائل الإشراف المترافقة مع عقود إعادة الإعمار الرئيسية في العراق.
- لماذا كانت معدلات الإنفاق على الالتزامات الخاصة بنشاطات صندوق دعم الاقتصاد المنفذة بموجب اتفاقيات بين الوكالات التي حددتها وزارة الخارجية أدنى من معدلات الإنفاق من التخصيصات الأخرى المستعملة في العراق.
- لماذا لم يستلم دائماً السفير الأميركي في العراق معلومات حول المشاكل والتأخيرات المترافقة مع مشاريع إعادة الإعمار.

ينفذ المفتش العام أعمال التدقيق بموجب مقاييس تدقيق حكومية مقبولة عامة.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

أعطت تقارير المفتش العام عشرات من التوصيات المصممة لتحقيق تحسينات على الإدارة ولاقتراح أعمال تصحيحية مطلوبة في نشاطات إعادة الإعمار والإغاثة. يعتبر تطبيق توصيات التدقيق أمر حاسم. يتابع مدققو المفتش العام بانتظام التوصيات المفتوحة لتحقيق التطبيق الكامل لها إلى المدى العملي.

- أنظر الملحق (ط) للحصول على معلومات حول كافة مشاريع التدقيق التي يقوم بها المفتش العام كما كانت في تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨.
- أنظر موقع الإنترنت www.sigir.mil للمفتش العام للحصول على النص الكامل لجميع تقارير التدقيق النهائية.
- أنظر الملحق "ي" للحصول على معلومات حول وضع تطبيق توصيات تدقيق المفتش العام والتوصيات التي بقيت مفتوحة.

الجدول ٤-١

تقارير التدقيق للمفتش العام منذ الأول من آب/أغسطس ٢٠٠٨

رقم التقرير	عنوان التقرير	تاريخ إصدار التقرير
09-001	فرص تعزيز الاستراتيجية الأميركية لبناء الديمقراطية في العراق	٢٠٠٨/١٠
09-002	استمرار التحديات في الحصول على بيانات موثوقة ومفيدة حول قوات الأمن العراقية	٢٠٠٨/١٠
09-003	الكلفة والنتائج والإشراف على عقود برنامج الحكم المحلي الموقعة مع معهد مثلث الأبحاث (Research Triangle Institute)	٢٠٠٨/١٠
09-004	تمثل عمليات إنهاء مشاريع إعادة الإعمار في العراق مجموعة من الأعمال	٢٠٠٨/١٠
09-005	تحتاج الوكالات إلى تحسين التقارير حول البيانات المالية لمقاولي الأمن الخاص	٢٠٠٨/١٠
09-006	وضع اتفاقات وكالات صندوق دعم الاقتصاد الذي تديره وزارة الخارجية الموقعة مع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي في العراق	٢٠٠٨/١٠
09-007	التحسينات المطلوبة في إعداد تقارير الوضع حول مشاريع إعادة الإعمار المرفوعة إلى رئيس البعثة.	٢٠٠٨/١٠

بالإضافة إلى التوصيات المحددة لتحسين عمليات الإدارة، حدد المفتش العام أيضاً دروساً عديدة تعلمها في العراق قد تنطبق أيضاً على أحداث طارئة جارية ومتوقع حدوثها في المستقبل.

عمليات التفقيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

ينسق عمل المفتش العام بشكل جيد مع هيئات تدقيق اخرى تشارك في أعمال تتعلق بالعراق. يعزز هذا التنسيق ممثلو هذه الهيئات الذين يجتمعون في كل ربع سنة في مجلس المفتشين العاملين في العراق (IIGC) لمنع الازدواجية في الجهود ولتقاسم المعلومات والتجارب المكتسبة من نشاط التدقيق الجاري تنفيذه. في ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٨، اجتمع أعضاء مجلس المفتشين العاملين في المركز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، فرجينيا، وشارك بعض الأعضاء عبر الهاتف من بغداد ومن مواقع أخرى في الولايات المتحدة. ضم المشاركون ممثلين عن المفتش العام، مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع، مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية، مكتب المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، وكالة تدقيق العقود الدفاعية، وكالة التدقيق في الجيش الأميركي ومكتب المحاسبة الحكومية.

التقارير النهائية لتدقيقات المفتش العام لإعادة إعمار العراق لربع السنة هذا

فرص تعزيز الاستراتيجية الأميركية لبناء الديمقراطية في العراق
(تقرير المفتش العام SIGIR-09-001، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨).

المقدمة

التزمت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بانفاق ما يزيد عن ١,٩ مليار دولار منذ عام ٢٠٠٤ لتنفيذ برامج تنمية الديمقراطية في العراق. نص القانون العام-110 28 على ان يزود وزير الخارجية لجان التخصيصات المالية في مجلس الشيوخ ومجلس النواب "استراتيجية شاملة، طويلة المدى مع الأهداف والنتائج المتوقعة لتعزيز وتقديم الديمقراطية في العراق". في تموز/يوليو ٢٠٠٧، أصدرت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية استراتيجية إجمالية للديمقراطية ونظام الحكم في العراق للأعوام ٢٠٠٧ حتى ٢٠١٠. الهدف الإجمالي من هذه الاستراتيجية هي ان يتعاون المواطنون العراقيون والمجتمع المدني والمؤسسات الديمقراطية من أجل تخفيض أعمال العنف وبناء نظام حكم مستدام، يخضع للمحاسبة والمساءلة ويستجيب لمطالب الناس. من أجل المساعدة في تحقيق هذا الهدف، تحتوي الاستراتيجية على ثلاثة أغراض استراتيجية هي:

١. إضفاء الإطار المؤسسي على العمليات التشريعية والسياسية الديمقراطية التي تحل النزاعات بشكل سلمي.
٢. تحسين القدرات والمساءلة والمحاسبة عند كافة المستويات الحكومية.
٣. تعزيز البيئة وتطوير المجتمع المدني ووسائل الإعلام في العراق للعمل بصورة مستقلة، حرة وفعالة في سبيل تعزيز الديمقراطية والشفافية والتسامح واحترام حقوق الإنسان.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

أظهرت مراجعة قام بها المفتش العام لمكتب المحاسبة الحكومية السابقة أن مكتب المحاسبة الحكومية حدد ست خصائص لاستراتيجية قومية فعالة تزود صانعي السياسات ووكالات التنفيذ بأداة إدارية تساعد في المساءلة والمحاسبة وتحقق نتائج أكثر فعالية. حدد مكتب المحاسبة والمساءلة الحكومية هذه الخصائص الست المرغوب بها بالاستناد إلى الدعم الممكن أن تقدمه في مجال الإرشاد التشريعي أو التنفيذي والوثيرة التي أشير إليها في مصادر أخرى. فيما يلي الخصائص الست وفق ما تم اقتباسها لهذه المراجعة:

- وضوح الغرض والنطاق والمنهجية.
- مناقشة مفصلة للمشاكل والمخاطر والتهديدات التي تنوي الاستراتيجية معالجتها.
- الأهداف والغايات المرغوب بهم وإجراءات الأداء المتعلق بالنتائج.
- وصف لموارد الولايات المتحدة المطلوبة لتنفيذ الاستراتيجية.
- تحديد واضح للأدوار والمسؤوليات وآليات التنسيق التي تقوم بها الحكومة الأميركية.
- وصف كيفية دمج الاستراتيجية داخلياً بين الوكالات الأميركية وخارجياً مع الحكومة العراقية والمنظمات الدولية.

تتماشى هذه الخصائص مع المبادئ الموجهة نحو النتائج المفصلة في قانون الأداء الحكومي والنتائج. كانت أهداف إعداد المفتش العام للتقارير تحديد المدى الذي يتم فيه:

- احتواء الاستراتيجية الأميركية للديمقراطية والحكم في العراق على خصائص استراتيجية فعالة.
- جهود وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية لتقييم التقدم الذي حققناه في تلبية أهداف وغايات الاستراتيجية.

النتائج

أعدت وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية استراتيجية أميركية لتطوير وتعزيز الديمقراطية ونظام الحكم في العراق. تحتوي الاستراتيجية على عدد من الخصائص الضرورية لخطة استراتيجية فعالة. وفي نفس الوقت، يمكن تعزيز الاستراتيجية كأداة تخطيط وكوسيلة لإعلام الكونغرس حول التقدم الحاصل في مجال تحقيق الغايات الاستراتيجية للخطة. أظهر تحليل المفتش العام للاستراتيجية ما يلي:

- إنها تشمل غرض ونطاق محددين بوضوح، ويؤكد ان مشاركة الولايات المتحدة أمر حاسم في المساعدة على بناء حكومة عراقية تمثيلية وديمقراطية وتستجيب لمطالب الناس.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- إنها تعترف بالحاجة إلى تطوير حكومة تسعى لحل الاختلافات في العراق بصورة سلمية وتعالج في نفس الوقت الانقسامات الطائفية والعرقية.
- توفر وصفاً شاملاً للأهداف والاستراتيجية وقياس الأداء لتقييم التقدم الحاصل في إنجاز الأهداف والغايات المحددة.
- إنها لا تحتوي على التكاليف الحالية والمستقبلية لتنفيذ الاستراتيجية، مثل تكاليف بناء قدرات الحكومة العراقية على المستوى القومي ومستوى المحافظات.
- لا تعين بوضوح المساءلة والمحاسبة عن تطبيق الجوانب الرئيسية للاستراتيجية.
- لا تعالج كيفية دمج الأهداف والأغراض الأميركية مع أهداف وغايات الحكومة العراقية والمنظمات الدولية.

لاحظ المفتش العام أيضاً أن بإمكان وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحسين عمليات تقييم التقدم الحاصل في مجال تحقيق الأهداف الاستراتيجية للاستراتيجية. مع أن وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية تعقدان اجتماعات ربع سنوية لتقييم تطبيق الاستراتيجية، لكنهما لا تعقدان تقارير مكتوبة توثق نتائج هذه الاجتماعات. ذكر مسؤولون في وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن المراجعات الربع سنوية تستند إلى تقارير تقدم العمل الخاصة ببرامجها الفردية لبناء الديمقراطية. تتلقى وزارة الخارجية تقارير ربع سنوية لتقدم العمل من الذين منحتهم المشاريع وتسلم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تقارير شهرية، أو ربع سنوية أو نصف سنوية حول تقدم العمل حسب البرنامج الفردي. ومع أن هذه التقارير تصف تقدم البرامج الفردية، فإنها لا تظهر بالكامل التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الواسعة الثلاثة أو النتائج المتوقعة للاستراتيجية، كتحسين القدرات والمساءلة والمحاسبة لكافة مستويات الحكم. بالإضافة إلى ذلك، لا تلقي على أي مكتب مسؤولية تقييم التقدم في تحقيق الأهداف الاستراتيجية الثلاثة.

يخطط المفتش العام بأن يجري في المستقبل القريب عملية متابعة حول إدارة البرنامج والإشراف على هبات محددة قدمتها وزارة الخارجية.

التوصيات

من أجل زيادة فعالية الاستراتيجية كأداة للتخطيط وللتحسين فائدتها بالنسبة إلى الكونغرس، يوصي المفتش العام بأن يوجه وزير الخارجية التعليمات لتنفيذ الأعمال التالية:

- الطلب من مدراء برامج وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان يراجعوا الاستراتيجيات بحيث تشمل التكاليف الحالية والمستقبلية الضرورية للتنفيذ.
- توضيح أدوار ومسؤوليات وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تطبيق الاستراتيجية وذكر كيفية دمج الأهداف والغايات الأميركية مع أهداف وغايات الحكومة العراقية والمنظمات الدولية.
- تسمية مكتب يكون مسؤولاً عن الإشراف على التقدم نحو تحقيق الأغراض الاستراتيجية الثلاثة.
- الطلب من مدراء برامج وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية توثيق نتائج الاجتماعات ربع السنوية لدراسة تقدم العمل التي يقيمون خلالها تطبيق الاستراتيجية.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

زودت وزارة الخارجية تعليقات حول التقرير الإجمالي ولكنها لم تعالج التوصيات بصورة محددة.

استمرار التحديات في الحصول على بيانات موثوقة ومفيدة حول قوات الأمن العراقية (تقرير المفتش العام SIGIR-09-002، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨).

المقدمة

بموجب القسم 9204 من قانون التخصيصات التكميلية للعام ٢٠٠٨، القانون العام -110/252، يتوجب على وزير الدفاع ان يقدم تقريراً كل ربع سنة إلى الكونغرس يعرض فيه مجموعة شاملة من مؤشرات الأداء وقياسات التقدم في مجال الاستقرار العسكري والسياسي في العراق. ورد مؤشران في تقرير أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، الذي أصدرته وزارة الدفاع "قياس الاستقرار والأمن في العراق" وهما عدد قوات الأمن العراقية المعيّنين وعدد الذين تم تدريبهم. تم استخراج عدد قوات الأمن العراقية الذي جرى تعيينهم من بيانات جدول الرواتب لوزارة الدفاع العراقية ووزارة الداخلية العراقية. يمثل عدد الأفراد الذين جرى تدريبهم أولئك الذين اكملوا المستوى الأساسي المحدد من دورة التدريب، كما أفادت عن ذلك فرق التدريب التابعة لقوات التحالف.

في نيسان/أبريل ٢٠٠٨ اصدر المفتش العام تقريراً مرحلياً حول موثوقية وفائدة الإبلاغ عن عدد أفراد قوات الأمن العراقية والمنهجية المستعملة لتحديد ومراجعة صحة هذه الأرقام. استنتج المفتش العام انه رغم ان وزارة الدفاع تبذل جهوداً لتحسين إمكانية الوثوق بهذه

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

المعلومات، كانت هناك ضرورة لاتخاذ الحذر فيما يخص دقة وفائدة هذه المعلومات. علاوة على ذلك، ابلغ المفتش العام ان وزارة الدفاع بذلت جهوداً لتقييم إمكانية الوثوق بهذه البيانات، لكن إمكانية الاطلاع على البيانات ستصبح أقل عندما تتولى الحكومة العراقية سيطرة أكبر على تدريب قواتها. وأخيراً، ابلغ المفتش العام عن جهود مكننة أنظمة الموارد البشرية وجدول الرواتب من اجل تحسين دقة وموثوقية البيانات داخل وزارة الدفاع العراقية. يزود هذا التقرير معلومات إضافية حول هذه المواضيع:

- عملية جمع البيانات حول أفراد قوات الأمن العراقية المعيّنين والمدربين، بضمنهم دقة وفائدة البيانات المستعملة لإعداد التقارير الأميركية وإمكانية مقارنتها خلال فترات إعداد التقارير.
- وضع وتحديات تحسين دقة وموثوقية البيانات من خلال تطوير أنظمة مكننة للموارد البشرية وجدول الرواتب التي سوف تستعملها وزارة الدفاع ووزارة الداخلية العراقية.

النتائج

تستمر البيانات حول عدد وأفراد وقوات الأمن العراقيين المدربين في احتواء الأخطاء، ولذلك فان إمكانية مقارنتها في التقارير ربع السنوية لوزارة الدفاع الأميركية تكون صعبة بسبب التعريفات والمقاييس المتغيرة. تستمر في ظهور الأخطاء في البيانات لان أنظمة جداول الرواتب في العراق تحتوي وثائق تقارير غير ملائمة حول أعمال الموظفين والموظفين غير المخولين. كما احتوت أيضاً معلومات غير منسجمة نتيجة الفساد والممارسات غير النظامية. علاوة على ذلك، فإن فائدة البيانات حول عدد أفراد قوات الشرطة العراقية المعيّنين والمدربين تستمر في أن تكون محدودة لأنه لم يتم تدريب جميع أفراد الشرطة المعيّنين وبالإضافة إلى ذلك، لا يلتحق جميع الذين جرى تدريبهم من أفراد الشرطة والجيش بالخدمة: فبعض الذين ابلغ عن تعيينهم اكملوا واجباتهم، وبعضهم في إجازة او يتغيّبون بدون إذن، وآخرون أصيبوا او قتلوا. ونظراً لتغير المقاييس والتعريفات في كتابة التقارير يبقى من الصعب إجراء تحليل مفيد للمنحى الذي تتخذه هذه البيانات.

تستمر الجهود الأميركية والعراقية في مكننة أنظمة الموارد البشرية وجدول الرواتب وتحسين قدرات وزارة الدفاع ووزارة الداخلية العراقية في تأمين إدارة افضل لموظفيها. رغم ان الأنظمة تؤمن بعض الإمكانيات، فهي لا تزال غير كاملة ولم تنفذ بالكامل. استناداً إلى مسؤولين، وزارة الدفاع الأميركية فان المشاكل المترافقة مع إدخال البيانات وتدريب الموظفين والكفاءة ودعم البنية التحتية تعيق التطبيق الكامل لنظام إدارة معلومات الموارد البشرية في وزارة الدفاع العراقية (HRIMS) والنظام الإلكتروني لوزارة الداخلية

العراقية. بالإضافة إلى ذلك، فإن التحديد السيئ للشروط والأداء غير المرضي للمقاول أعاقا تطوير هذا النظام، الذي كلف ٢١,٢ مليون دولار من الأموال الأميركية المخصصة من صندوق قوات الأمن العراقية. تمول الحكومة العراقية النظام الإلكتروني لوزارة الداخلية العراقية وقيمه ٢٧,٨ مليون دولار. لكن من المحتمل أن تؤثر معارضة المساءلة والمحاسبة وتعريف الأفراد على دقة البيانات المدخلة وأن تخفض قدرة النظام الإلكتروني للوزارة في تزويد معلومات يمكن الوثوق بها بعد إكمالها.

الدروس المكتسبة

لم تشمل القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان ولا القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق نتائج محددة أو يمكن قياسها في بيان العمل لعقد نظام إدارة معلومات الموارد البشرية (HRIMS). ونتيجة لذلك، ورغم أن المسؤولين لم يكونوا راضين عن أداء المقاول لكنهم لم يتمكنوا من إنهاء العقد لأنهم كانوا عاجزين عن اتهام المقاول بالتخلف عن تلبية شروط العقد. فإذا كانت الحكومة الأميركية تنوي جعل المقاولين مسؤولين عن الأداء السيئ، يتوجب عليها ان تحدد بوضوح في نص العقد ما كانت تتوقعه من "النتائج" وتنفيذ العقد.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

قدمت القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق تعليقات على مسودة هذا التقرير تتفق فيها، بوجه عام مع استنتاجات التقرير والدروس المكتسبة.

الكلفة، النتيجة والإشراف على عقود برنامج الحكم المحلي الموقعة مع معهد مثلث الأبحاث

(تقرير المفتش العام SIGIR-09-003، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨).

المقدمة

نصّ تعديل أدخل في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦ على قانون تمكين المفتش العام على ان المفتش العام يجب أن يُعد تقرير تدقيق شرعي حول الأموال التي توفرت لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق. مدد قانون الترخيص لوزارة الدفاع عام ٢٠٠٨ هذا الشرط ليشمل صناديق تمويل أخرى بضمنها صندوق دعم الاقتصاد. بموجب هذا الشرط أجرى المفتش العام مجموعة من المراجعات المركزة على العقود لتفحص عقود رئيسية لإعادة إعمار العراق. تهدف هذه التدقيقات إلى تفحص كلفة العقد ونتيجته والإشراف الإداري عليه والتشديد على مسائل تتعلق باحتمالات التعرض للتزوير والهدر وإساءة الاستعمال.

عمليات التفيتش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

يدرس هذا التقرير، وهو الثامن في سلسلة من المراجعات المركزة للعقود، عقدين يتعلقان بنشاطات برنامج الحكم المحلي لمساعدة العراقيين في خلق بيئة أفضل للحكم المحلي ولبناء قدرات المجالس التمثيلية ومكاتب وزارات الحكومة المركزية في المناطق من أجل إدارة خدمات الزبائن بصورة أكثر فعالية وكفاءة واستجابة لمطالبهم. في عامي ٢٠٠٣ و ٢٠٠٥، منحت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عقدين إلى معهد مثلث الأبحاث. وفي ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٨ بلغت القيمة الإجمالية للعقدين لبرنامج الحكم المحلي الأول وبرنامج الحكم المحلي الثاني ٦٢٦،٢١٨،٥٩٨ دولار.

كانت أهداف المفتش العام تتمثل في تحديد تكاليف ونتائج عمل معهد مثل الأبحاث بموجب العقدين الموقعين معه وتقييم إشراف الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على هذه العقدين.

النتائج باختصار

التكاليف لا ترتبط بسهولة بالنتائج

في ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٨، بلغت القيمة الإجمالية لعقدي برنامج الحكم المحلي الأول وبرنامج الحكم المحلي الثاني ٦٢٦،٢١٨،٥٩٨ دولار، منها مبلغ ٣٢٢،٣١٧،٢٣٩ دولار لعقد برنامج الحكم المحلي الأول ومبلغ ٣٠٠،٩٠١،٣٥٨ دولار لعقد برنامج الحكم المحلي الثاني. وأبلغ أنه تم إنفاق ٣٣٦،٣٢٧،٥١٣ من هذا المبلغ: ٣٢٢،٣١٧،٢٣٩ دولار من عقد برنامج الحكم المحلي الأول و ١٤،٧١٠،٢٧٣ دولار من عقد برنامج الحكم المحلي الثاني. قبل نيسان/أبريل ٢٠٠٧، لم تعرف تقارير معهد مثلث الأبحاث تكاليف النشاطات الفردية، بل أتم تعريف هذه التكاليف بشكل إجمالي. وبالتالي، لم يتمكن المفتش العام خلال السنوات الأربع الأولى من العقد تقييم النتائج المترافقة مع كلفة النشاطات الفردية. انظر الجدول ٤-٢ للحصول على تفاصيل التزامات كل عقد والمبالغ المنفقة منه.

تم تمويل عقد برنامج الحكم المحلي الأول من خلال تخصيصات متعددة شملت:

- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF-1) (القانون العام 11-108).
- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF-2) (القانون العام 106-108)
- صندوق دعم الاقتصاد (ESF) الذي تديره الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)
- صندوق تنمية العراق (DFI).

زود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول (IRRF-1) حوالي ١٠٤،٧ مليون دولار وزود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF-2) ١٢٥،٧ مليون دولار. زود صندوق دعم الاقتصاد (ESF) حوالي ٦ ملايين دولار، وزود صندوق تنمية العراق

(DFI) حوالي ٢,٩ مليون دولار. جرى تمويل عقد برنامج الحكم المحلي الثاني من قبل صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني وصندوق دعم الاقتصاد. زود صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني حوالي ١٠٧ ملايين دولار وزود صندوق دعم الاقتصاد حوالي ٢٥١ مليون دولار.

كانت نتائج العقدين غير واضحة في بادئ الأمر

منذ ان وافقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على خطة رصد أداء العقد الأول لمعهد مثلث الأبحاث في نيسان/أبريل ٢٠٠٧، بدأت نتائج البرنامج في أن تصبح موثقة بدرجة أفضل. لكن مع ان العمل الذي يقوم به المفتش العام حالياً يوحى بأن النتائج الحالية لهذا البرنامج إيجابية، لم يتمكن المفتش العام من تحديد ما إذا كانت الحكومة حققت قيمة مناسبة مقابل المبلغ المستثمر خلال مدة هذين العقدين وذلك لسببين: السبب الأول، هو انه لم تتم أية عملية خلال السنوات الأربع الأولى للمشروع لتحديد أغراض المشروع وتقييم النتائج، والسبب الثاني، هو انه تم الإبلاغ عن تكاليف البرنامج على المستوى الإجمالي للسنوات الأربع الأولى وليس على مستوى النشاطات الأمر الذي يحول دون اجراء تقييم للكفاءة والفعالية أو قيمة النشاطات الفردية.

وجد تقريران أصدرهما المفتش العام الإقليمي لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID/RIG) انه خلال السنوات الأربع الأولى لم تطبق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية شرطها الذي ينص على قيام المقاول بتقديم الخطط وتقارير تقدم العمل الضرورية لتحديد النتائج بما في ذلك:

- خطة مراقبة أداء نقاط الارتكاز والأهداف.
- خطط عمل ربع سنوية (دُميت لاحقاً بخطط التطبيق ربع السنوية) لتحديد النشاطات التي خطط معهد مثلث الأبحاث لتنفيذها.
- تقارير مراقبة الأداء نصف السنوية التي تبين مدى التقدم باتجاه تحقيق نقاط الارتكاز والأهداف.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الجدول ٤-٢

قيمة عقود ومدفوعات برنامج الحكم المحلي كما كانت في ٢٠٠٨/٦/٣.

العقد	فترة الأداء	الالتزامات	المدفوعات
برنامج الحكم المحلي الأول EDG-C-00-03-00010-00	٢٠٠٣/٣/٢٦ - ٢٠٠٥/٥/٩	\$٢٣٩,٣١٧,٣٢٢	\$٢٣٩,٣١٧,٣٢٢
برنامج الحكم المحلي الثاني 267-C-00-05-00505-00	٢٠٠٥/٥/٩ - ٢٠٠٨/١٢/٣١	\$٣٥٨,٩٠١,٣٠٠	٢٧٣,٧١٠,٠١٤
المجموع		\$٥٩٨,٢١٨,٦٢٢	\$٥١٣,٠٢٧,٣٣٦

ملاحظة: لم يدقق المفتش العام البيانات او يتحقق من صحة أدوات مراقبة نظام الكمبيوتر لمعهد مثلث الأبحاث.
المصدر: مراجعة المفتش العام للعقود الموقعة مع معهد ثلث الأبحاث والتقارير المالية لمعهد مثلث الأبحاث وفواتير معهد مثلث الأبحاث.

بالنتيجة، استنتج المفتش العام الإقليمي لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية انه لا يستطيع تحديد ما إذا كانت العقود تحسن قدرات الحكم المحلي في العراق.

نظرت مراجعة المفتش العام بشكل خاص إلى البرنامج منذ آخر تقرير أعده المفتش العام الإقليمي لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (تموز/يوليو ٢٠٠٧) الذي أشار إلى انه في نيسان/أبريل ٢٠٠٧، وافقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على خطة مراقبة أداء معهد مثلث الأبحاث وقدم هذا المعهد خطته الأولى ربع السنوية للتنفيذ. راجع المفتش العام هذه الخطط والخطط التالية وتقارير تقدم العمل ووجد أنها تحتوي على المعلومات المطلوبة حول النشاطات الحالية للمقاول سوية مع نقاط الارتكاز لتقييم مدى التقدم. تظهر هذه الوثائق سوية انه خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية حصل تقدم في تحسين الحكم المحلي. اختار المفتش العام نشاطين للتقييم وهما تطوير استراتيجيات تنمية وتطوير المحافظات ونظام المعلومات الجغرافية لمساعدة العراقيين على تخطيط البنية التحتية الحكومية، ووجد ان النتائج موثقة بدرجة افضل. قابل المفتش العام أيضاً موظفين ملمين بنشاطات برنامج الحكم المحلي، بضمنهم موظفين من وزارة الخارجية مسؤولين عن شؤون المحافظات وموظفين عسكريين ومدنيين يعملون في المحافظات. وأيد كافة هؤلاء الموظفين البرنامج.

لاحظ المفتش العام أيضاً أن تقارير نشاط معهد مثلث الأبحاث، بالأخص التقارير حول نشاط التدريب، لا ترتبط في بعض الأحيان بالأهداف والغايات المحددة للبرنامج. مع ان قياس تأثير التدريب صعب بدون أي شك، يعتقد المفتش العام أن بالإمكان تحقيق تحسينات في هذا المجال.

إدارة العقد والإشراف تحسناً مع مرور الوقت

مع أن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لم تضع عملية لتحديد أهداف المشروع وتقييم نتائج هذه العقود خلال السنوات الأربع الأولى من النشاط، فقد حسنت التغييرات الحديثة عملية الإشراف. فعلى سبيل المثال، وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، حولت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مسؤولية الإشراف الأكبر على البرنامج إلى ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المعيّنين للعمل مع فرق إعادة إعمار المحافظات. ساعد هؤلاء الممثلون، الذين يعرفون باسم مدراء النشاط، في الإشراف على تنفيذ العقود. ووضعت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية دليل عمليات يحدد بصورة رسمية دور الممثل في فرق إعادة إعمار المحافظات، ولكن هذا الجهد لا يزال بحاجة إلى صياغة نهائية. حدد المفتش العام عدداً من مشاكل الإدارة والإشراف على عقود أخرى شملت:

- في بادئ الأمر، لم تعين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية عدداً كافياً من الموظفين لإدارة العقد. خلال معظم الفترة المحددة لأداء العقد تم تعيين ضابط فني مطلع. إن عدد الضباط الفنيين المطلعين مسألة يعود قرارها للوكالة، لكن المفتش العام يعتقد أن ضابطاً فنياً مطلعاً لا يستطيع إدارة هذه العقود بفعالية بسبب حجم ونطاق عقود برنامج الحكم المحلي (٥٩٨ مليون دولار ونشاطات في ١٨ محافظة) والمسؤوليات الممنوحة للضابط الفني مطلع. من المتوقع أن يؤدي تعيين ممثلي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في فرق إعادة إعمار المحافظات للمساعدة في عملية الإشراف إلى تحسين هذا الوضع.
- يطلب من الوكالة الأميركية للتنمية الدولية إجراء تقييم لأداء المقاول سنوياً، ولكن في السنوات الثلاث الماضية أنجزت عمليات التقييم في وقت متأخر. لم ينتهي تقييم الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لنشاطات معهد مثلث الأبحاث للسنة المنتهية في أيار/مايو ٢٠٠٦ حتى ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٧. ولم ينتهي التقييم للسنة المنتهية في أيار/مايو ٢٠٠٧ حتى ٢٩ آب/أغسطس ٢٠٠٧. مع ذلك، طبقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية فترتين اختيارييتين لبرنامج الحكم المحلي الثاني، في تموز/يوليو وفي كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٦، بدون تزويد معلومات أساسية حول الأداء الممكن أن يركز إليها القرار. ذكر المفتش العام الإقليمي لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ذلك في تقريره المؤرخ في تموز/يوليو ٢٠٠٧. وجد المفتش العام أن تقرير التقييم للفترة المنتهية في أيار/مايو ٢٠٠٨ لم ينتهي، ولكن في ٢٣ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ زودت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية المفتش العام وثائق تظهر أن عملية التقييم للعام ٢٠٠٨ قيد التنفيذ.

عمليات التفقيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- مراجعة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية و عملية الموافقة على فواتير ومستندات الدفع العائدة لمعهد مثلث الأبحاث غير ملائمة. ينص القسم G-1 من عقد برنامج الحكم المحلي الثاني ان الضابط الفني المطلع هو الممثل المخول من الحكومة للمصادقة على مستندات الدفع بموجب هذا العقد. وينص أيضاً كتاب التعيين الموقع من قبل الضابط الفني المطلع ان يزود هذا الضابط الموافقة الإدارية على مستندات الدفع او فواتير المقاول. لكن نظراً لان العقد ينص على وجوب ان يتم الدفع بواسطة كتاب اعتماد مصرفي، يسحب معهد مثلث الأبحاث الأموال مسبقاً. نتيجة ذلك لا يوافق الضابط الفني المطلع على مستندات الدفع هذه. الضابط الفني المطلع يكون في الوضع الأفضل لتحديد ما إذا كانت نفقات معهد مثلث الأبحاث المدرجة في الفواتير الشهرية ملائمة. لم يجد المفتش العام أي دليل يؤكد الموافقة الخطية للضابط الفني المطلع على فواتير معهد مثلث الأبحاث.
- خلال فترة عمله على تنفيذ عقد برنامج الحكم المحلي، خسر معهد مثلث الأبحاث مبلغ ١٨٥,٠٠٠ دولار. بالاتفاق مع ضابط العقود، طالب معهد مثلث الأبحاث التعويض عن هذه الخسارة على أساس نفقة مسموح بها وقدم فاتورة بالمبلغ الذي خسره. شملت الفاتورة الرسوم العامة والإدارية لمعهد مثلث الأبحاث ورسومه الثابتة لهذه الرسوم. دفعت الحكومة لاحقاً إلى معهد مثلث الأبحاث مبلغ ٥٦,٩٠٦ دولار تسديداً لهذه الرسوم. يتساءل المفتش العام عن صحة قرار دفع رسوم على المال المفقود.

التوصيات

يوصي المفتش العام بأن يتخذ مدير بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في العراق الإجراءات التالية:

- أن يأمر موظفي الوكالة الأميركية للتنمية الدولية بإعداد إطار زمني لإكمال دليل العمليات الذي يزود الإرشاد إلى مدراء النشاطات للإشراف على أداء المقاول.
- أن يأمر الضابط الفني المطلع بالمراقبة والمصادقة على مستندات الدفع والفواتير المقدمة من معهد مثلث الأبحاث حسب ما تنص عليه شروط العقد كما أن يطلب من الضابط الفني المطلع الاحتفاظ بوثائق المصادقة في ملف العقد.
- أن يأمر باتخاذ اجراء لاستعادة الرسوم العامة والإدارية والرسوم الثابتة المدفوعة إلى معهد مثلث الأبحاث على مبلغ ١٨٥,٠٠٠ دولار الذي خسره.

الدروس المكتسبة

يحدد النجاح الإجمالي للعقد بنجاح نشاطاته أو مهماته الفردية. بالتالي، تحتاج الإدارة إلى معلومات على مستوى النشاط حول النتائج المتوقعة والتقدم نحو تحقيق النتائج والاكلاف لتحديد كيفية مساهمة النشاطات المنفصلة في تحقيق أهداف وغايات البرنامج الإجمالية. يصح ذلك بصورة خاصة بالنسبة لعقود قيمتها كبيرة بالدولارات.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

وافقت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية على نتائج التقرير وحددت الخطوات التي تتخذها لمعالجة كل توصية. استناداً إلى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، فهي قد أصدرت إرشادات إلى ممثلها في فرق إعادة إعمار المحافظات التي توضح دورهم وحسنت عمليات مراجعة المستندات والفواتير التي تقوم بها. كما وافقت أيضاً على أن المبالغ المدفوعة إلى معهد مثلث الأبحاث عن الأموال التي خسرها كانت غير ملائمة وذكرت أنها سوف تشمل هذه المسألة كجزء من عملية التصفية.

عمليات إلغاء مشاريع إعادة إعمار العراق تمثل مجموعة من الأعمال (تقرير المفتش العام SIGIR-09-004، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨).

المقدمة

خصصت الحكومة الأميركية منذ العام ٢٠٠٣ أكثر من ٥٠ مليار دولار لإعادة إعمار العراق. تم تخصيص أكثر من ٤٦ مليار دولار عبر أربعة حسابات لإعادة إعمار العراق أدارتهما مبدئياً وكالتان تابعتان لوزارة الدفاع هما:

- فرقة منطقة الخليج (GRD) التابعة لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي.
- القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A).

وفي تموز/يوليو ٢٠٠٨، كان قد تم التعهد بإنفاق مبلغ ٣٨,٣٧ مليار دولار تقريباً معظمه بموجب ترتيبات تعاقدية.

يسأل المفتش العام في أحيان كثيرة حول المشاكل في البرنامج الأميركي لإعادة إعمار العراق، بما في ذلك المدى الذي يتم عنده إلغاء العقود بسبب الأداء السيئ للمقاولين. تتضمن العقود الحكومية بوجه عام على شروط تسمح للحكومة الأميركية بإلغاء عقد لعدد من الأسباب تشمل:

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- في حال انتفاء الحاجة إلى التجهيزات او الخدمات.
- في حال اصبح أداء المقاول غير مرضي
- في حال تطور وضع آخر يبرر إنهاء العقد.

من أجل المعالجة الأولية لمسألة إلغاء العقود، أعد المفتش العام في السابق تقريراً مرحلياً حول توفر المعلومات الإجمالية حول نشاطات هذه العقود المتعلقة بإعادة إعمار العراق التي تديرها وكالات تنفيذ تابعة لوزارة الدفاع. زود ذلك التقرير المرحلي نظرة إجمالية لعملية إلغاء العقد لملائمة ذلك وللتقصير كما معلومات حول إلغاء العقود. يزود تقرير المتابعة هذا تبصرات إضافية على العوامل والظروف المتعلقة بإلغاء العقود العائدة لمشاريع مختارة وأسباب هذا الإلغاء.

في هذا التقرير كانت أهداف المفتش العام تحديد:

- أعداد وأنواع وأسس جميع عمليات إلغاء عقود إعادة إعمار العراق لوزارة الدفاع كما خصائص بعض عمليات الإلغاء المختارة.
- ما إذا كانت المشاريع الملغية قد نتج عنها هدر في الموارد الحكومية.
- ما إذا كانت وكالات وزارة الدفاع قد تأكدت من نزاهة وأهلية الشركات المختارة لتنفيذ العقود التي ألغيت بسبب التقصير وما إذا كانت قد اتخذت عملاً مناسباً، مثل التوقيف المؤقت والحظر، ضد المقاولين ذوي الأداء السيئ.
- ما إذا ما زالت الأموال ملتزم بها إزاء العقود الملغية.

كانت مراجعة المفتش العام محدودة نوعاً ما بسبب عدم اكتمال ملفات عقود المشاريع التي جرت مراجعتها مما جعل من الصعب إجراء تقييم شامل لعمليات الإلغاء المبلغ عنها. مع ان معظم الملفات احتوت على تعديلات او إنذارات حول الإلغاء فقد احتوى عدد قليل منها فقط الوثائق الإدارية المطلوبة، مثل سجل المراجعة القانونية المطلوبة للعقود الممنوحة، حقوق الأطراف وإجراءات الإلغاء، المسؤوليات، اقتراحات واتفاقيات التسوية وأمور تعاقدية أخرى. احتوى عدد قليل جداً من الملفات على معلومات حول نسبة العمل الذي أكمله المقاول عند الإلغاء. وعندما كانت هذه النسبة تذكر، فقد كانت ببساطة حساباً لمجمل الأموال المنفقة. وأيضاً، لم تتضمن ملفات العقود إلا نادراً سجلات لآعمال الوكالات من اجل تحديد العقود السابقة والأداء السابق للمقاول قبل منحه العقود الجديدة.

النتائج

اعتباراً من حزيران/يونيو ٢٠٠٨، حدد المفتش العام ٢٦٢، ١ مشروعاً ألغتها وزارة الدفاع بضمنهم ٧٣٢ لملائمة الحكومة، و ٥٣٠ لتقصير المقاول. كانت لهذه المشاريع الملغية

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

إلتزامات أولية تبلغ حوالي مليار دولار من بينها مبلغ يقارب ٦٠٠ مليون دولار دفع للمقاولين بضمنه ٨٩,٧ مليون دولار دفعوا إلى مقاولين عن مشاريع ألغيت بسبب التقصير. مع ان بضعة مشاريع فقط كانت على وشك الاكتمال في ذلك الوقت، فان غالبيتها لم تكن كذلك. اختار المفتش العام ١٩٥ مشروعاً ملغى لإجراء مراجعة مفصلة عليها مستنداً بدرجة كبيرة على مشاريع بقيمة مليون دولار او اكثر التي تُشكّل نسبة حوالي ٨٠ بالمئة من المبالغ الملتمزم بها مبدئياً.

راجع المفتش العام ١٣٥ عملية إلغاء للملاءمة و ٥٦ عملية إلغاء بسبب التقصير و ٤ عمليات إلغاء بسبب تحديدها الخاطئ في نظام إدارة إعادة إعمار العراق. وجد المفتش العام أن العقود التي ألغيت للملاءمة كانت في أحيان كثيرة نتيجة تغييرات في النطاق او الشروط أو بسبب مشاكل الأمن أو عدم الحاجة بعد الآن لهذه المشاريع. في حالات قليلة ألغيت المشاريع لأن الحكومة العراقية لم تزود الدعم المتوقع. ألغيت عدة مشاريع للملاءمة رغم وجود ما يشير إلى أن أداء المقاول لم يكن جيداً.

لاحظ المفتش العام أيضاً ان عدة مقاولين آخرين تلقوا عقوداً لإكمال العمل الذي كان قد الغي للملاءمة.

راجع المفتش العام ٥٦ عملية إلغاء بسبب التقصير: ٣٩ من فرقة منطقة الخليج، ١٦ من القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان، وواحدة من القوات المتعددة الجنسيات في العراق. الغي معظم العقود بسبب الأداء السيئ للمقاولين والمقاولين من الباطن ولكن بعض العقود ألغيت لأسباب أمنية. أنجزت بعض هذه المشاريع فيما بعد من قبل مقاولين آخرين.

يمكن أن يحصل الهدر في حال ألغيت المشاريع قبل إكمالها ولم يتم لاحقاً إكمالها او استعمالها. حدد المفتش العام عدة مشاريع كبيرة كان قد بوشر بتنفيذها وألغيت (بعضها اكثر من مرة واحدة) ولم يتم إكمالها لاحقاً. ألغيت مشاريع اخرى بعد وقت قصير من بدء تنفيذها مما فرض على الحكومة الأميركية ان تسدد النفقات التي تحملها المقاول. قد يبدو ان ملايين من الدولارات قد هدرت على مثل هذه المشاريع.

فيما يخص المشاريع التي تمت مراجعتها، لم يجد المفتش العام أية سجلات تشير إلى أي عمل اتخذ لإيقاف المقاولين المقصرين بسبب أداءهم السيئ. ولقد منح بعض المقاولين عقوداً إضافية. مع ان الأنظمة الفدرالية للتملك لا تفرض على الوكالات ان توقف مؤقتاً او أن تضع حظراً على المقاولين بسبب الأداء السيئ، بل تسمح للوكالات بأن توقف مؤقتاً او تضع حظراً على المقاولين بسبب تخلفهم أو رفضهم تنفيذ العقد، ولأي عمل جسيم آخر يؤثر على المسؤولية.

وجد المفتش العام انه في حالتين منحت الحكومة عقوداً جديدة لإعادة الإعمار إلى شركات موقفة مؤقتاً او محظورة مدرجة على نظام لائحة الأطراف المبعدين، بالاستناد إلى نشاطات لا علاقة لها بالمشاريع التي راجعها المفتش العام بالإضافة إلى ذلك، حدد المفتش العام مقاولين اثنين مدرجين على نظام لائحة الأطراف المبعدين يستمران في العمل على عقود منحت لهما قبل توقيفهما المؤقت. وبالتالي، بدأت وزارة الدفاع تنفيذ خطوات لإلغاء أحد هذين العقدين. وتأخر إلغاء العقد الآخر لان الحكومة العراقية لم تؤمن ملكية الأرض التي كانت المدرسة سوف تبنى عليها. في الخلاصة تستمر وزارة الدفاع في استخدام مقاولين اثنين كانوا قد أوقفوا مؤقتاً بسبب مسائل تتعلق بالاحتيال والمسؤولية.

وأخيراً، وجد المفتش العام ان المشاريع الملغية تتضمن حوالي ١٦,٦٢ مليون دولار من الالتزامات التي لم تصفى بعد وقد تتمكن الحكومة من إلغائها. اعتبر مسؤولون في القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان انه ممكن أن لا يكون المسؤول عن إلغاء العقود قد حرر هذه الأموال. غير أمن مسؤولين في فرقة منطقة الخليج قالوا انه يجب على نظام الإدارة المالية في سلاح الهندسة في الجيش الأميركي تحديد سبب حجز الأموال. وبعد ان ابلغ المفتش العام في حزيران/يونيو ٢٠٠٨ وكالات وزارة الدفاع بهذه الالتزامات التي لم تصفى بعد، ذكرت هذه الوكالات أنها سوف تحقق بكافة الالتزامات وتتخذ التدابير الضرورية لإلغاء الالتزام بالأموال غير الضرورية. في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨ بقي مبلغ ١٤,٥٠ مليون دولار على شكل التزامات لم تصفى بعد.

التوصيات

يوصي المفتش العام بان تشدد فرقة منطقة الخليج والقيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان على أهمية غرلة المقاولين من اجل التحقق من أنهم لم يوقفوا عن العمل ولم يوضع حظر عليهم.

يوصي المفتش العام أيضاً فرقة منطقة الخليج والقيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان ومركز القوات الجوية للهندسة والبيئة بأن يراجعوا جميع العقود الملغية للتحقق من إلغاء الالتزام بالأموال غير الضرورية.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

زودت فرقة منطقة الخليج والقيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان تعليقات كتابية تتفق في الرأي مع توصيات المفتش العام. كما زودت فرقة منطقة الخليج والقيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان والقوات المتعددة الجنسيات في العراق والفيلق المتعدد الجنسيات في العراق تعليقات فنية أخذت في الاعتبار عند الإعداد النهائي لهذا التقرير.

تحتاج الوكالات إلى إعداد تقارير أفضل حول البيانات المالية لمقاولي الأمن الخاص (تقرير المفتش العام SIGIR-09-005، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨).

المقدمة

منذ نيسان/أبريل ٢٠٠٣، قامت شركات من القطاع الخاص وأفراد يعرفون عادة بأنهم مقاولين للأمن الخاص بتقديم خدمات أمنية خاصة لحماية الأفراد، المرافق وأملاك الحكومة الأميركية ومقاوليها، ومقاوليها من الباطن وأطراف أخرى يدعمون البعثة الأميركية في العراق. طلب قانون تفويضات الدفاع القومي للسنة المالية ٢٠٠٨ من المفتش العام أن يعد "خطة شاملة لإجراء سلسلة من تدقيقات العقود وأوامر المهمات والتسليم" تتعلق بأداء وظائف الأمن وإعادة الإعمار في العراق. كجزء من هذا التفويض، راجع المفتش العام البيانات المتوفرة من وزارة الدفاع، ووزارة الخارجية، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وغيرهم من المصادر الحكومية حول خدمات أمنية خاصة ممولة من الحكومة الأميركية ومزودة إلى الحكومة الأميركية ومقاوليها ومتلقي الهبات في العراق. حددت هذه الخدمات في هذا التقرير على أنها تحمي المواقع (الأمن المستقر)، وتقدم المرافقة لقوافل الأفراد والمعدات وتزود المشورة الأمنية والتخطيط الأمني.

هدف هذا التقرير إلى تحديد مدى تلقي الوكالات الفدرالية بصورة نظامية بيانات مالية حول الخدمات الأمنية الخاصة في العراق منذ العام ٢٠٠٣ ومحاولة تحديد عدد عقود وتكاليف الخدمات الأمنية الخاصة في العراق من مصادر البيانات المتوفرة.

النتائج

لم يطلب من وزارة الدفاع ووزارة الداخلي والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن يحددوا بصورة نظامية البيانات المالية المتعلقة بخدمات الشركات الأمنية الخاصة. بناء على ذلك، لا تحصل أنظمة الإدارة المالية بصورة روتينية على بيانات تظهر إجمالي الالتزامات المالية والمبالغ المنفقة لهذه الخدمات الفردية. استناداً إلى البيانات التي حصل عليها من مصادر حكومية متعددة، حدد المفتش العام ما يلي:

- ٧٧ شركة أمنية خاصة مترافقة مع التزامات بقيمة ٥,٣ مليار دولار تقريباً بموجب عقود مباشرة وعقود من الباطن لتزويد خدمات أمنية إلى مشاريع وبرامج ممولة من الحكومة الأميركية منذ العام ٢٠٠٣.

- ٢٣٣ شركة أمنية خاصة إضافية مترافقة مع التزامات بقيمة ٦٦٢ مليون دولار تقريباً لعقود تزويد خدمات أمنية قد تكون لتزويد حراس او مرافقين ولكن وصف

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

العمل كان على درجة من العمومية بحيث يمكن أن يعزى إلى خدمات أخرى كتزويد الأمن لشبكة المعلومات.

هذه هي أفضل المعلومات المتوفرة لأنه لم يطلب من الوكالات أن تحدد وتجمع هذه البيانات بصورة خاصة. كما من المحتمل أن تعني أن الالتزامات المحددة من المصادر الحكومية المختلفة أقل مما هي في الواقع. فعلى سبيل المثال:

- لم تتوفر معلومات مالية حول الالتزامات لـ ١٩١ شركة تمّ تحديدها في قواعد البيانات المختلفة على أن لديها عقود لتقديم الخدمات الأمنية.
- البيانات المالية محدودة حول عقود الباطن للمقاولين الأصليين، الذين ينفذون برامج إعادة الإعمار. لم يطلب من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أن تقوم بالتتبع الروتيني لهذه الاكلاف بصورة عامة ولا ان تفعل ذلك بالنسبة للاكلاف الأمنية. لكن استناداً إلى قواعد بيانات مختلفة ومصادر أخرى، حدد المفتش العام مبلغ ١,٢ مليار دولار على شكل أكلاف لعقود أمنية من الباطن. يبدو هذا الرقم ضئيل على اعتبار ان البيانات المحدودة المتوفرة حول عقود الباطن المحددة.

الحصول على بيانات مالية مكتملة اكثر قد يزود المدراء بمعلومات افضل في مجالين رئيسيين لدعم القرارات المستقبلية حول استثمار الموارد. أولاً بما أن جهد إعادة الإعمار ينطلق من مشاريع للبنية التحتية واسعة النطاق ومن مشاريع لبناء القدرات من المحتمل ان يُشكّل الأمن المادي جزءاً أكبر من مجموع كلفة العقد. تستطيع هذه الزيادة ان تجعل من المهم اكثر مقارنة القيمة المحتملة لنتيجة المشروع مقابل الأكاليف الأمنية المحتمل ان تكون أكبر. ثانياً، والى مدى سحب القوات الأميركية، وعلى افتراض بقاء بعثات ذات شأن للمساعدة الفنية لمدنية، من المحتمل ان تزداد طلبات الخدمات الأمنية الخاصة لوزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للتعويض عن الدعم المزود سابقاً من قبل الجيش. قد تزداد أيضاً الطلبات على شركات أمنية خاصة لان الانخفاض الحديث لأعمال العنف يساهم في تمكين الموظفين من التحرك أكثر ضمن العراق ولكن مع استمرار الحاجة للدعم من الشركات الأمنية الخاصة لكافة الرحلات خارج المناطق المحمية من الولايات المتحدة.

وأخيراً توجد أكاليف إضافية مترافقة مع تزويد الأمن ذات صلة وثيقة أيضاً، بضمنها تزويد سيارات مدرعة، وتقوية مكاتب ومسكن الموظفين، والنفقات العامة التي يحملها المقاول الأساسي والتي تقيد في حساب العقود الأمنية من الباطن. قد تسمح المعلومات الفنية لهذه

العقود للوكالات الأميركية بتقييم أكلافها الأمنية المتعلقة بالفوائد والاكالاف المتوقعة للمشاريع كما قد تكون مفيدة للتخطيط لعمليات طارئة.

التوصيات

يوصي المفتش العام بأن يتخذ وزير الدفاع ووزير الخارجية ومدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية الخطوات التالية:

- ١- تصميم عمليات للجمع الروتيني للمعلومات المالية بالنسبة لكافة العقود العائدة للخدمات الأمنية الخاصة. يجب ان يشمل هذا العمل أيضاً الأكالاف الإضافية مثل المعدات التي تجهزها الحكومة وتقوية المكاتب.
- ٢- أن يأخذ مدراء البرامج مباشرة في اعتبارهم الاكالاف الأمنية المتعلقة بالفوائد المتوقعة من جميع المشاريع الجديدة.
- ٣- تعريف الأكالاف الأمنية على مستوى المقاول من الباطن لجميع المشاريع الجديدة.

الدروس المكتسبة

عند بداية نشاطات إعادة الإعمار في عام ٢٠٠٣، لم تكن الاكالاف المرتفعة المترافقة مع تزويد الأمن للموظفين الاميركيين العاملين في العراق ظاهرة بسهولة. علاوة على ذلك، ونظراً لعدم وجود شرط لتعقب هذه الاكالاف، لم يكن واضحاً تماماً لسنوات عديدة ما إذا كانت الأكالاف الأمنية تستهلك أجزاءاً كبيرة من موازنات إعادة الإعمار. لكن أصبح الآن واضحاً أن هذه الأكالاف كانت مرتفعة للغاية وبالنتيجة يعتقد المفتش العام ان درساً مهماً جرى اكتسابه من تجربة العراق وهو ضرورة شمول الأكالاف الأمنية في إصدار القرارات عند الاشتراك في التعاقد بشأن نشاطات إعادة الإعمار في أية عملية طارئة بضمنها أفغانستان.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

تلقى المفتش العام تعليقات فنية على مسودة التقرير من وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق وعالج هذه التعليقات في التقرير حيث كان ذلك مناسباً. لم يستلم المفتش العام تعليقات من وزارة الدفاع في الوقت المناسب لإدخالها في هذا التقرير.

عمليات التفقيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

وضع اتفاقيات وكالات صندوق دعم الاقتصاد التابع لوزارة الخارجية مع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي في العراق
(تقرير المفتش العام SIGIR-09-006، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨).

المقدمة

صندوق دعم الاقتصاد (ESF) حول حساب للتخصيصات مرخص بموجب قانون المساعدة الأمنية للعام ١٩٦١. تتطلب المبالغ المحددة بالدولار لصندوق دعم الاقتصاد يجب أن تذكر في موازنة الرئيس المقدمة إلى الكونغرس، ويصادق عليها الكونغرس بموجب برنامج وزارة الخارجية للشؤون الدولية -العمليات الأجنبية، برنامج تمويل الصادرات والعمليات المتعلقة بذلك (العمليات الخارجية)، المساعدة الاقتصادية الثنائية الأخرى، وحساب الموازنة. منذ العام ٢٠٠٣، خصص الكونغرس مبلغ ٣,٢٠ مليار دولار إلى صندوق دعم الاقتصاد لإعادة إعمار العراق. تعزز تقديمات صندوق دعم الاقتصاد مصالح السياسة الخارجية الأميركية من خلال:

- زيادة دور القطاع الخاص في الاقتصاد، تخفيف السيطرة الحكومية على الأسواق، تعزيز إيجاد فرص لعمل وتحسين التنمية الاقتصادية.
- تطوير نظام قانوني فعال ومستقل ويمكن الوصول إليه ويعمل تحت حكم القانون.
- المساعدة في الانتقال إلى حكم شفاف ومسؤول وتمكين المواطنين.
- تطوير وتقوية المؤسسات الضرورية للديمقراطية المستدامة.
- تقوية القدرة على إدارة البعد الإنساني للفترة الانتقالية إلى الديمقراطية واقتصاد السوق وللمساعدة في استدامة القطاعات الأشد فقراً من السكان خلال الفترة الانتقالية.

منذ منتصف عام ٢٠٠٦، كانت وزارة الخارجية مسؤولة عبر مدير العمليات الخارجية عن قرارات برامج صندوق دعم الاقتصاد. وقد أعطيت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومكاتب وزارة الخارجية مسؤولية التنفيذ لأموال صندوق دعم الاقتصاد المخصصة للعراق.

وفي عام ٢٠٠٦، دخلت وزارة الخارجية طرفاً في ثلاث اتفاقيات للوكالات مع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لتنفيذ برامج في العراق. في هذه الاتفاقيات عهدت إلى مكتب المساعدة الانتقالية في العراق وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي أدوار لتنفيذ نشاطات صندوق دعم الاقتصاد بالتنسيق مع وزارة الخارجية. كان دور مكتب المساعدة الانتقالية في العراق هو التنسيق والإشراف على عملية الاختيار والمصادقة على المشاريع، وبالأخص تلك المتعلقة باتفاقية وكالات لجنة إعادة إعمار وتنمية المحافظات (PRDC).

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

نص قانون المساعدة الأمنية للعام ١٩٦١ على أن تنفق الوكالات أموال صندوق دعم الاقتصاد على نشاطات وبرامج ومشاريع تبرر فائدتها للكونغرس. ولكن يسمح بإجراء تغييرات على النشاطات، والبرامج والمشاريع في حال تم إبلاغ اللجان المختصة في الكونغرس بذلك.

في عام ٢٠٠٦، نفذت وزارة الخارجية وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي ثلاث اتفاقيات للوكالات بموجب السلطة والتمويل التي يمنحها القانون العام 109-234، الذي زود التمويل من أجل تنفيذ أغراض قانون المساعدة الأجنبية للعام ١٩٦١. التخصيص يبقى نافذاً لسنتين تنتهي فترة نفاذ استعمال الأموال المخصصة في ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٧.

الأهداف

يُسأل المفتش العام في أحيان كثيرة عن سبب الانخفاض النسبي لمعدل الإنفاق من صندوق دعم الاقتصاد في العراق بالمقارنة مع التخصيصات الأخرى المستعملة في العراق. من أجل تحديد سبب هذا الانخفاض، حلل المفتش العام وضع الالتزامات والنفقات الخاصة بثلاث اتفاقيات للوكالات ممولة من صندوق دعم الاقتصاد بقيمة ١,٢٥ مليار دولار والممارسات المستعملة للالتزام بالأموال وإنفاقها.

النتائج

حدد المفتش العام ثلاث مسائل مهمة ومترابطة تؤثر على معدل الالتزامات والإنفاق من تخصيصات صندوق دعم الاقتصاد الذي يمول هذه الاتفاقيات. أولاً: مع ان تخصيصات صندوق دعم الاقتصاد تغطي فترة سنتين، لكن الالتزامات المسجلة المستندة إلى اتفاقيات الوكالات بموجب تفويض قانون المساعدة الأمنية للعام ١٩٦١ لا تلغي تلقائياً الالتزامات بعد انتهاء فترة توفرها. بدلاً من ذلك، تبقى الأموال متوفرة لإلغائها وإعادة الالتزام بها من جديد لاحقاً لفترة أربع سنوات بعد نفاذ تاريخ الالتزامات. ثانياً، رغم ان الأموال المحددة في الاتفاقيات جرى الالتزام بها وقت توقيع الاتفاقيات، فإن المشاريع لا تتوافق دائماً مع الاتفاقيات في ذلك الوقت. أظهرت مراجعة المفتش العام ان سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لم يمنح عقوداً لمبلغ ١٢٦ مليون دولار المتبقي من تخصيصات صندوق دعم الاقتصاد للسنة المالية ٢٠٠٦ (١٥ بالمئة) ولا لمبلغ ٢٢٤ مليون دولار المتبقي من تخصيصات السنة المالية ٢٠٠٧ (٥٨ بالمئة). ثالثاً، الغرض من الاتفاقيات وطبيعتها، أي تطوير القدرات العراقية، يساهمان أيضاً في إبطاء معدل الإنفاق الذي قد يحصل عادة.

كان المقصود من الاتفاقيات الثلاث التي راجعها المفتش العام تمويل مشاريع تدعم:

عمليات التفقيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- فرّق إعادة إعمار المحافظات ولجان تنمية وإعادة إعمار المحافظات.
- الحماية الأمنية للبنية التحتية العائدة لقطاعات النفط، الماء والكهرباء.
- الاستدامة وتنمية القدرات الفنية في قطاعات الكهرباء، الماء، الصحة، النقل والمواصلات.

ينفذ سلاح الهندسة في الجيش الأميركي مشاريعاً بموجب هذه الاتفاقيات بعد ان يتم تحديدها والموافقة عليها من قبل مكتب المساعدة الانتقالية للعراق الذي يختار المشاريع بعد مراجعة الطلبات الواردة من عناصر برامج أخرى في العراق. بعد ان يوافق مكتب المساعدة الانتقالية للعراق على تنفيذ مشروع وبعد أن يمنح سلاح الهندسة في الجيش الأميركي عقداً لتنفيذه، يسجل العقد كالترام فرعي بالأموال مقابل الأموال التي تم الالتزام بها لتسديد أكلاف المشاريع.

أظهرت مراجعة المفتش العام للأموال الملتزم بها بموجب هذه الاتفاقيات ان المبلغ الإجمالي الحالي للاتفاقيات يبلغ تقريباً ١,٢٥ مليار دولار، اعتباراً من ٢٢ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨. دفع سلاح الهندسة في الجيش الأميركي من هذا المبلغ حوالي ٥٨٧ مليون دولار، أي حوالي ٤٧ بالمئة من القيمة الإجمالية للاتفاقيات. معدل الإنفاق منخفض جزئياً لأن نسبة ٧٢ بالمئة فقط من مبلغ ١,٢٥ مليار دولار هي التزامات فرعية، مما يعني ان سلاح الهندسة في الجيش الأميركي منح عقداً لمشروع محدد. لم يمنح سلاح الهندسة في الجيش الأميركي عقود بمبلغ ٣٥٠ مليون دولار (٢٨ بالمئة) من أموال صندوق دعم الاقتصاد. تبقى هذه الأموال متوفرة لاستعمال وزارة الخارجية.

التوصيات

تمّ إعداد هذا التقرير للإعلام فقط ولا يحتوي أية توصيات.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

تلقي المفتش العام تعليقات مكتوبة من وزارة الخارجية، فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق على مسودة هذا التقرير. تساءلت جميع هذه الإدارات حول صحة بيان المفتش العام بأنه يجري إنفاق الأموال بموجب هذه الاتفاقيات بمعدل أبطأ مما كان سيحصل نموذجياً. أضاف المفتش العام قسماً إلى مسودة التقرير يبحث معدلات الإنفاق. زودت فرقة منطقة الخليج أيضاً تفاصيل إضافية حول المشاريع الممولة بموجب هذه الاتفاقيات لإظهار كيفية استعمال الأموال. يوافق المفتش العام على المعلومات المزودة ويعتقد أنها تضيف إلى الشرح المعطى بشأن وتيرة الإنفاق. عبرت وزارة الخارجية عن قلقها من ان مسودة التقرير احتوت معلومات غير دقيقة واستنتاجات مضللة حول السلطات القانونية التي تتمتع بها وزارة الخارجية وطبيعة الإنفاق. لا يتساءل المفتش العام حول سلطة وزارة الخارجية في

الدخول في هذه الاتفاقيات كما لا يعتقد ان إدارة وزارة الخارجية لهذه الاتفاقيات غير ملائمة. لكن كان الغرض من الدراسة تحديد لماذا جرى إنفاق ٤٧ بالمئة من الأموال التي ابلغ بأنه تم الالتزام بها بالكامل قبل حوالي سنتين تقريباً. حدد المفتش العام سببين لمعدل الإنفاق المنخفض في المسودة الأصلية واستناداً إلى التعليقات المكتوبة التي تلقاها أضاف المفتش العام سبباً ثالثاً يعود إلى طبيعة الاتفاقيات. يعتقد المفتش العام ان هذه الأسباب تشرح بدقة معدلات الإنفاق لهذه الاتفاقيات الثلاث.

تحسينات مطلوبة في إعداد التقارير حول وضع مشاريع إعادة الإعمار المرفوعة إلى رئيسي البعثة
(تقرير المفتش العام SIGIR-09-007، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨).

المقدمة

في تموز/يوليو ٢٠٠٨، أثار السفير الأميركي في العراق (رئيس البعثة) أسئلة حول توفر المعلومات الإدارية المطلوبة للإشراف على مشاريع إعادة الإعمار التي تنفذها الوكالات. ونزولاً عند طلب رئيس البعثة، بدأ المفتش العام مراجعة لتحديد ملاءمة العمليات المستعملة لإبلاغ الوضع الحالي لمشاريع إعادة الإعمار إلى رئيس البعثة.

في ٢٣ أيار/مايو ٢٠٠٧، وضع تقرير السفارة الأميركية في بغداد حول التنظيم والموظفين الإطار الرسمي لعدد من التغييرات المصممة لتحسين الكفاءة والفعالية الإجمالية للمنظمات من اجل دعم العمليات والجهود الجاري تنفيذها للفترة الانتقالية في العراق. أوصى التقرير عقد اجتماعات محددة على مستوى المركز للسماح بإجراء تنسيق أكبر حول المسائل المتقاطعة والموجزات اليومية المرفوعة إلى رئيس البعثة.

يلعب وزير الاقتصاد دوراً مهماً في الترافف التنظيمي الجديد، ويعمل كمنسق لفترة الانتقال الاقتصادي في العراق. ينسق برنامج الانتقال الاقتصادي في العراق سياسة الحكومة الأميركية حول التنمية الاقتصادية في العراق، بضمنها تنسيق كافة العناصر الوثيقة الصلة بالموضوع في السفارة الأميركية، من أجل تسهيل فترة انتقال هادئ من الحكومة الأميركية والمساعدة الخارجية الأخرى. تُشكّل إدارة دفع المعلومات عنصراً رئيسياً لهذه المسؤولية. يرفع منسق الانتقال الاقتصادي في العراق تقاريره مباشرة إلى رئيس البعثة ونائب رئيس البعثة.

النتائج

تتوفر لوزارة الخارجية طرق مختلفة لإيصال المعلومات حول مشاريع إعادة الإعمار في العراق، ولكن جميع هذه الطرق تفشل في أن تؤمن لرئيس البعثة معلومات حاسمة لاتخاذ

عمليات التفقيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

القرارات حول مشاريع إعادة الإعمار. تشمل العملية الحالية الإبلاغ رئيس البعثة عن وضع مشاريع إعادة الإعمار ثلاث مصادر معلومات هي:

- المجموعة الأساسية لإعادة الإعمار، التي تجتمع اسبوعياً مع ممثلين من منظمات إعمار رئيسية لإعادة الإعمار، هي المصدر الأول الذي يعتمد عليه رئيس البعثة بالنسبة للمعلومات المتعلقة بالمشاريع.
- يقدر تقرير القسم 2207، وهو تقرير ربع سنوي يرفع إلى الكونغرس، كلفة إكمال المشاريع الفردية الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF).
- يزود نظام إدارة إعادة إعمار العراق ببيانات مجملة حول جهود إعادة إعمار العراق الممولة من الحكومة الأميركية.

بالرغم من آليات إعداد التقارير هذه لا توجد سياسات أو إرشادات رسمية لتحديد ماذا ومتى وكيف تعد التقارير المتعلقة بوضع مشاريع إعادة الإعمار إلى رئيس البعثة. علاوة على ذلك، لا توجد عملية أو معايير نظامية لتحليل الكلفة، برنامج العمل، الأداء أو التأثير المترافق مع ذلك التي تؤدي تلقائياً إلى البدء بتقديم التقارير إلى رئيس البعثة بالاستناد على هذه المعايير. يترك أمر إعداد التقارير عن المشاريع إلى مدراء المشاريع، الخبراء بموضوع البحث، والى القادة الآخرين فعلى سبيل المثال، كان رئيس البعثة حتى وقت قريب يجهل مختلف المسائل التي تؤثر على الإكمال الناجح لمشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة، وهو مشروع مياه الصرف الصحي الوحيد المبني "من الأساسات". هموم الأمن، التصميم غير الملائم، الأداء السيئ للمقاول، والتوقف عن العمل بسبب عدم دفع فواتير المقاول سببت تأخيرات متكررة في إنجاز المشروع. بدون وجود عملية رسمية لإعداد التقارير، أو معايير ثابتة لإعداد التقارير، فإن المعلومات حول المشاريع المتعلقة بالتأخيرات المهمة، الأكلاف المتصاعدة، الاهتمامات الأمنية، أو المسائل الأخرى ذات المخاطر العالية قد لا تصل إلى رئيس البعثة، فيؤدي ذلك على الأرجح إلى اتخاذ قرارات إدارية سيئة وهدر أموال دافع الضرائب.

التوصيات

يوصي المفتش العام بأن يتخذ السفير الأميركي في العراق الخطوات التالية:

١- وضع ونشر سياسة وإرشادات من أجل إعداد تقارير موحدة حول وضع مشاريع إعادة الإعمار لتقديمها إلى السفير الأميركي. يجب أن تأخذ السياسة والإرشادات في الاعتبار تحديد أولويات المشاريع الواجب إعداد تقارير عنها إلى السفير الأميركي. بالإضافة إلى ذلك، يجب أن تضع السياسة والإرشادات وسيلة للتعريف بالعناصر الرئيسية للمشروع، مثل الكلفة وبرنامج العمل والأداء، من أجل تزويد وضع مشروع بطريقة موضوعية.

٢- توجيه منسق الانتقال الاقتصادي في العراق لكي يضع عملية تستند إلى الإرشادات السياسية الجديدة من أجل التأكد من دقة التقارير المرفوعة إلى السفير الأميركي حول كافة مشاريع إعادة الإعمار، بغض النظر عن مصدر التمويل أو إدارة الوكالة. في حال تأخر تنفيذ أو إلغاء برنامج، يجب أن يأخذ المنسق في اعتباره أيضاً تأثير ذلك على نوعية الحياة والعلاقات الدبلوماسية. أي مشروع ينحرف عن المعايير الموضوعية يجب يبلغ به السفير الأميركي.

تعليقات الإدارة والاستجابة للتدقيق

في التعليقات المكتوبة في مسودة هذا التقرير، كان رأي نائبة رئيس البعثة واللواء القائد لسلاح الهندسة في الجيش الأميركي، وفرقة منطقة الخليج متوافقاً مع التقرير، وذكرت نائبة رئيس البعثة أن العمل جار على تطبيق توصيات المفتش العام. ذكرت نائبة رئيس البعثة أنها طلبت من منسق فترة الانتقال الاقتصادي في العراق أن يصمم عملية لإعداد تقارير عن وضع المشاريع التي تعاني من مشاكل بقدر ما يمكن من الموضوعية..

اقترحت نائبة رئيس البعثة انه لصالح الوضوح، يجب ان تعاد صياغة التوصية الثالثة التي تشمل "جميع المشاريع، بغض النظر عن مصدر التمويل أو إدارة الوكالة" لتصبح "جميع المشاريع غير العسكرية، بغض النظر عن مصدر التمويل أو إدارة الوكالة"، مما يشير إلى ان رئيس البعثة لا يملك سلطة على المشاريع الممولة من قبل الجيش الأميركي. لم يغير المفتش العام نص التوصية لأن غالبية مشاريع إعادة الاعمار المتبقية ممولة من وزارة الدفاع. بالتالي يعتقد المفتش العام ان العملية التي يجب وضعها لتزويد معلومات إلى رئيس البعثة يجب ان تشمل مشاريع إعادة الإعمار الممولة من قبل وزارة الدفاع. مع ان المفتش العام يدرك انه يوجد تقسيم للمسؤوليات بين السفارة والقوات المتعددة الجنسيات في العراق، فإن ذلك لا يستتني تقاسم المعلومات ذات الفائدة المشتركة. بالإضافة إلى ذلك، أكد الأمر الرئاسي للأمن القومي (١١ أيار/مايو ٢٠٠٤) ان وزير الخارجية سوف يكون مسؤولاً عن

عمليات التفيتش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الإشراف المتواصل والتوجيه العام لكافة المساعدات إلى العراق. نتيجة ذلك، يعتقد المفتش العام ان العملية التي يجري وضعها لتزويد معلومات إلى رئيس البعثة يجب ان تتضمن مشاريع إعادة الإعمار في العراق الممولة من وزارة الدفاع. إن تضمين مثل هذه المعلومات ينسجم مع علاقة العمل التعاوني القائمة بين رئيس البعثة و اللواء قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق. قد يتقرر مدى ونطاق المعلومات كجزء من العملية الجارية التي وصفت في تعليقات نائبة رئيس البعثة.

زودت القوات المتعددة الجنسيات في العراق وفرقة منطقة الخليج تعليقات إضافية تضمنت في معظمها اقتراحات لإدخال تغييرات فنية على التقرير. أخذ المفتش العام هذه التعليقات بعين الاعتبار عند إعداد التقرير النهائي وجرى التغييرات التي اعتبرها مناسبة.

التدقيقات الجارية والمخطط لإجرائها

يقود المفتش العام التدقيقات الأولية للأداء التي تقيّم الاقتصاد والكفاءة والفعالية ونتائج برامج إعادة إعمار العراق، وفي أحيان كثيرة مع التركيز على ملاءمة وسائل المراقبة الداخلية، واحتمال التعرّض للاحتيال والهدر وإساءة الاستعمال. تشمل هذه الأمور سلسلة من التدقيقات المركزة^(٦٣٣) على العقود رئيسية لإعادة إعمار العراق من أجل تمكين المفتش العام من الاستجابة إلى تفويض من الكونغرس لإجراء "تدقيق شرعي" للإنفاق الأميركي المترافق مع إعادة إعمار العراق.

التدقيقات الجارية

يعمل المفتش العام حالياً على التدقيقات التالية:

- SIGIR-8003: مراجعة الإنفاق والأداء لمشاريع إعادة الإعمار لشركة كيلوغ براون أند روت سرفيسيس انك (KBR)، قطاع النفط (تدقيق مركز للعقود).
- SIGIR-8017: مراجعة عقود وزارة الدفاع الأميركية في العراق مع شركة ايجيس الأمنية الخاصة (Aegis Private Security Company).
- SIGIR-8018: مراجعة صندوق الاستجابة السريعة (QRF) وبرنامج المساعدة السريعة للعراق (IRAP).
- SIGIR-8019: مراجعة مشتركة مع مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية لعقد شركة بلاكواتر وأوامر المهمات المترافقة معه لخدمات شركة وورلد وايد برسونال بروتكتيف سرفيسيس (يحل محل مشروع المفتش العام السابق 7018).
- SIGIR-8022: مراجعة فترة انتقال مشاريع إعادة إعمار العراق إلى الحكومة العراقية.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- SIGIR-8031: مراجعة تجارب القادة العسكريين الميدانيين الذين يعملون مع الشركات الأمنية الخاصة في مسرح العمليات في العراق ويديرونها.
- SIGIR-8032: مراجعة عقد ثياتر وايد سيكيورتي سرفيسيس الموقع مع وزارة الدفاع (TWISS).
- SIGIR-8033: مراجعة الخطط الأميركية ونتائج تدريب وتجهيز قوات الأمن العراقية.
- SIGIR-8034: مراجعة فرص زيادة ترتيبات تقاسم أكلاف إعادة إعمار العراق.
- SIGIR-8035: مراجعة برنامج وزارة الدفاع لمساعدة الحكومة العراقية على بدء تشغيل المصانع التي تملكها الدولة.
- SIGIR-8036: مراجعة فعالية استخدام فرق إعادة إعمار المحافظات لمقاييس الأداء في العراق.
- SIGIR-8037: مراجعة عقد الصيانة القومية والعقود ذات الصلة (تدقيق مركز للعقود).
- SIGIR-8038: مراجعة الممارسات الإدارية لوزارة الخارجية المتعلقة بالمنح المقدمة إلى المعهد الجمهوري الدولي والمعهد القومي الديمقراطي بالنسبة لمشاريع بناء الديمقراطية في العراق.
- SIGIR-8039: مراجعة تخطيط وإدارة وتأثير النشاطات الأميركية لبناء القدرات في العراق.

التدقيقات المخطط إجراؤها

تتسجم خطة المفتش العام لإجراء عمليات تدقيق مع هدفين رئيسيين واردين في خطة التدقيق الاستراتيجية للمفتش العام:

- تحسين ممارسة الأعمال وتحمل المسؤولية والمحاسبة في إدارة العقود والهبات المترافقة مع إعادة إعمار العراق.
- تقييم وتقوية اقتصاد وكفاءة وفعالية البرامج والعمليات المصممة لتسهيل إعادة إعمار العراق.

تعترف الخطة الاستراتيجية للمفتش العام بتقويضين قانونيين محددتين يؤثران على تدقيقات المفتش العام. الأول هو التفويض الممنوح للمفتش العام بإنجاز تقرير تدقيق شرعي على كافة الأموال المخصصة أو التي جرى تأمينها بأشكال أخرى لإعادة إعمار العراق قبل ان تنتهي مهمة المفتش العام. كجزء من ذلك الجهد، أنجز المفتش العام ثماني عمليات تدقيق مركزة للعقود تتعاطى مع النتائج والكلفة والإشراف الإداري المترافقين مع العقود الرئيسية

عمليات التفقيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

لإعادة إعمار العراق كما احتمالات التعرض لأخطار الاحتيال والهدر وإساءة الاستعمال. يجري حالياً تنفيذ عملية مراجعة أخرى مماثلة وتم التخطيط لتنفيذ عمليات أخرى. أعطى التفويض الثاني للمفتش العام دوراً رئيسياً في إعداد خطة تدقيق شاملة لسلسلة من عمليات تدقيق عقود الوكالات الفدرالية، العقود من الباطن، أوامر المهمات وأوامر التسليم لأداء وظائف أمنية وإعادة إعمار في العراق بالتشاور مع مفتشين عامين آخرين. يمكن الحصول على نص خطة التدقيق الاستراتيجي للمفتش العام على موقع الإنترنت http://www.sigir.mil/audits/pdf/Audit_Strategic_Plan.pdf.

أنجز المفتش العام خلال ربع السنة هذا، بالتشاور مع مكتب المفتش العام في وزارة الدفاع ومكتب المفتش العام في وزارة الخارجية ومكتب المفتش العام في الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، تدقيقات خطة التدقيق الشاملة لعقود الشركات الأمنية الخاصة. مع ان المفتش العام سوف ينجز بعض عمليات التدقيق المحددة في الخطة، من المتوقع ان تنجز مكاتب أخرى للمفتش العام عمليات تدقيق أخرى. في ربع السنة هذا، أصدر المفتش العام أول تقرير بموجب هذا التفويض (SIGIR-09-005) "الوكالات بحاجة إلى تحسين إعداد تقارير البيانات المالية للشركات الأمنية الخاصة". يجري حالياً تدقيق عقود أخرى لشركات أمنية خاصة. يمكن الحصول على نص هذه الخطة على موقع الإنترنت: <http://www.sigir.mil.audits>.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

في ربيع السنة هذه أجرى مفتشو المفتش العام تسع عمليات تقييم وصادر ثلاثة تقارير حولها. شملت ثلاثة من المشاريع التسعة تقييماً لأعمال الإغاثة وإعادة الإعمار الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP). تضمنت عمليات التقييم الست الأخرى ثلاثة مشاريع ممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق ومشروعين ممولين من صندوق تنمية العراق (DFI) ومشروع واحد ممول من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد.

عالجت عمليات تقييم الإنشاءات المسائل العامة التالية:

- هل مكونات المشروع مصممة بشكل ملائم قبل الإنشاء والتركيب؟
- هل تلبية أعمال الإنشاء أو إعادة التأهيل معايير التصميم؟
- هل كانت برامج المقاول لمراقبة النوعية وبرامج الحكومة الأميركية لضمان النوعية ملائمة.
- هل عولجت مسألة استدامة المشروع وفعاليتيه التشغيلية بصورة ملائمة؟
- هل كانت نتائج المشروع متناسقة مع الأهداف الأصلية؟

يركز تقييم الاستدامة الذي ينفذه المفتش العام على ما إذا كانت المشاريع المسلمة إلى العراقيين تعمل بالقدرة المقررة لها في العقد الأساسي أو وفق هدف أمر المهمة. من أجل تحقيق ذلك حدد المفتش العام ما إذا كانت المشاريع تعمل بالقدرة المقررة لها عندما تسلمتها الحكومة الأميركية، وعند تحويلها إلى مشغلين عراقيين وخلال إجراء التقييم. بالإضافة إلى ذلك حدد المفتش العام ما إذا كانت الاستدامة مخططة بصورة ملائمة وعمّا إذا كان من المحتمل لها أن تستمر.

منذ أن بدأ برنامج التفتيش في صيف عام ٢٠٠٥ أنجز المفتش العام ١٣١ تقرير تقييم للمشاريع و٩٦ عملية تفتيش محدودة في موقع العمل و٦٤٠ عملية تقييم جوية.

في ربيع السنة هذا، قيمت عمليات التفتيش التي قام بها المفتش العام وللمرة الأولى النشاطات الممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، وهذه الأموال هي من صندوق تنمية العراق محولة إلى الولايات المتحدة لإنفاقها وفقاً لإجراءات التشغيل القياسية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق التي أصدرها الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق. تم

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

تمويل مشاريع مدارس القدس والمعلمين والفائز ضمن إطار برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق.

لم تكن مشاريع المدارس الثلاث مكتملة وقت إجراء عمليات التفتيش. أبلغ ممثلو الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) أن المقاول العراقي المحلي طلب تحريره من العقود لأنه تلقى طلبات متعددة لدفع رشاوى من ممثلي الحكومة العراقية. ذكر المقاول العراقي انه رفض دفع الرشاوى وتلقى تهديدات تمس سلامته الشخصية وسلامة زملائه وأفراد عائلته. ابلغ ممثلو الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ان قوات التحالف ألغت العقد وأجرت دفعات جزئية إلى المقاول مقابل العمل المنفذ عند إلغاء العقد.

أبلغ الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق انه تجري محاولات للحصول على مقاول آخر لإكمال التجهيزات.

الجدول ٤-٣
تسعة مشاريع جرى تقييمها خلال ربع السنة هذا (بالآلاف الدولارات)

اسم المشروع	نوع التقييم	المحافظة	الكلفة المقررة	الوكالة المنفذة	مصدر التمويل	المقاول	منطقة فرقة منطقة الخليج
محطة معالجة المياه R3 في مدينة الصدر	إنشاء	بغداد	\$٦٥,٨٤٨	فرقة منطقة الخليج المركزية	صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق	واشنطن انترناشونال إنك/بلاك أند فيتس	الوسطى
محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة	إنشاء	الأنبار	\$٢٩,٥٥٨	فرقة منطقة الخليج المركزية	صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق	شركة فليور أميك	الوسطى
المجاري الصحية، المنطقة (أ)، إنشاء وإصلاح	إنشاء	الأنبار	\$٢,٩٠٦	فرقة منطقة الخليج المركزية	صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق	محلي	الوسطى
المجاري الصحية، محطة المضخات ١ و ٢	إنشاء	الأنبار	\$٧,٢٢٣	فرقة منطقة الخليج المركزية	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد	محلي	الوسطى
المجاري الصحية في الفلوجة-المجرى الرئيسي	إنشاء	الأنبار	\$١,٨٠٤	فرقة منطقة الخليج المركزية	صندوق تنمية العراق	محلي	الوسطى
المجاري الصحية في الفلوجة-حفريات لمشروع معالجة مياه الصرف الصحي WWTP	إنشاء	الأنبار	\$٢,٧٦٩	فرقة منطقة الخليج المركزية	صندوق تنمية العراق	محلي	الوسطى

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الجدول ٤-٣ (تابع)

اسم المشروع	نوع التقييم	المحافظة	الكلفة المقررة	الوكالة المنفذة	مصدر التمويل	المقاول	منطقة فرقة منطقة الخليج
مدرسة القدس	استدامة	بغداد	\$٤٢٠	الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق	محلي	الوسطى
مدرسة المعلمين	استدامة	بغداد	\$٣٨٩	الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق	محلي	الوسطى
مدرسة الفاو	استدامة	بغداد	\$٤٤١	الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق	محلي	الوسطى

كان قد تم في الأصل تخطيط نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة بحيث يكافئ إنجازه ٣٢,٥ مليون دولار على ان يكتمل في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦، وان يخدم مدينة الفلوجة بكاملها. أما الآن فهو سيكلف على الأقل ثلاثة أضعاف المبلغ المخطط له في الأصل وسوف يصبح شغالاً جزئياً في نيسان/أبريل ٢٠٠٩ على أقل تقدير تاريخ وسوف يخدم أقل من نصف المنطقة المقصودة في الأصل.

صممت في الأصل محطة معالجة مياه الصرف الصحي لنظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة باستعمال نظام بحيرة، لكن نزولاً عند إصرار وزارة البلديات والأشغال العامة أعيد تصميمها باستعمال نظام ميكانيكي للحمأة المنشطة. بدا أن العمل المكتمل يلبي مواصفات العقد نتيجة ضمان النوعية الجيدة من قبل الحكومة. يجب التغلب على عدد من المشاكل قبل ان يتمكن أي مقيم في الفلوجة من الاستفادة من نظام معالجة الصرف الصحي:

- يجب توفير إمداد كافٍ من الوقود او الطاقة من الشبكة الوطنية العراقية من أجل التشغيل المتواصل للمولدات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات الضخ.

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- يجب العمل على وصل المنازل بنظام تجميع مياه الصرف الصحي. في الوقت الحاضر لا يتوفر أي تمويل من الحكومة الأميركية أو من الحكومة العراقية لوصل المنازل بالنظام.
- لم يتلقَ عدد من المقاولين عقود مموله من صندوق تنمية العراق دفعات من الحكومة العراقية الأشغال التي نفذوها لفترات طويلة وصلت أحياناً إلى حوالي سنتين. إن عدم تسديد متوجبات المقاولين بسرعة أعاق التقدم وأدى في إحدى الحالات إلى قيام مقاول بمنع استعمال خط الأنابيب الرئيسي إلى نظام معالجة مياه الصرف الصحي من خلال قفل فتحات الدخول وصناديق الصمامات.

الشكل ٢-٤
عمليات تقييم المشاريع

المواقع التقريبية ل ١٣١ مشروعاً عند إجراء عمليات التفتيش وتحليلها وإعداد التقارير عنها حتى هذا التاريخ.



عمليات التفيتش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

كشفت عمليات تفيتش محطة معالجة المياه (آر ٣) في مدينة الصدر الممولة من صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق عن مشروع كان سينفذ بالأساس بموجب عقد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع شركة بكتل ناشونال إنك (بكتل). تعاقدت بكتل مع شركة بارسونز غلوبال سرفيسيس إنك (بارسونز) لتصميم وإنشاء المشروع. عندما أصبح المشروع مكتملاً بنسبة ٨٥ بالمئة غادرت بكتل وبارسونز العراق وسلم المشروع إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لإكماله. تعاقد سلاح الهندسة في الجيش الأميركي مع شركة واشنطن انترناشونال إنك/بلاك اند فيتش لإكمال تصميم وإنشاء المشروع. رغم تحديد وجود مشاكل في التصميم وأعمال الإنشاء بموجب العقد الأصلي، نتج عن الإنشاء الملائم والمراقبة الفعالة للنوعية من قبل المقاول وضمان النوعية من قبل الحكومة الأميركية تحت إشراف سلاح الهندسة في الجيش الأميركي مشروع تقدر نسبة إنجازه حالياً ب ٩٢ بالمئة ويعمل بالقدرة والسعة المقررتين الكاملتين تقريباً.

يبين الجدول ٤-٣ عمليات تقييم المشاريع التي أكملها المفتش العام خلال ربع السنة هذا. أنظر الملحق (ي) للحصول على الجدول الكامل لعمليات تقييم المشاريع التي جرت في أرباع السنة السابقين.

يظهر الشكل ٤-١ الموقع التقريبي لكل مشروع جرى تقييمه في ربع السنة هذا وفي أرباع السنة السابقين.



مشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة. خزان المياه الداخلة ومنشأة الصفيات



مشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة. خزان النفط والرمل وجهاز التصنيف

عمليات تقييم المشاريع من قبل المفتش العام
يزود هذا القسم موجزات لتقارير تقييم المشاريع التي أكملها المفتش العام في ربع السنة هذا.
أنظر موقع الإنترنت للمفتش العام www.sigir.mil.

نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة، الفلوجة، العراق

تقرير المفتش العام SIGIR PA-08-144

تقرير المفتش العام SIGIR PA-08-145

تقرير المفتش العام SIGIR PA-08-146

تقرير المفتش العام SIGIR PA-08-147

تقرير المفتش العام SIGIR PA-08-149

في تموز/يوليو ٢٠٠٨، أعرب السفير الأميركي عن "قلقه البالغ" لكون نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة^(٦٣٤) "انحرف بعيداً جداً عن مساره ولفترة طويلة." وبالتحديد، فإن المشروع الذي خطط له في الأساس بأنه سيكلف ٣٢,٥ مليون دولار ويكتمل إنجازه في ١٨ شهراً في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٦ على يد أحد المقاولين وان يخدم مدينة الفلوجة بكاملها، سوف يكلف الآن ٩٨ مليون دولار وسوف يكتمل جزئياً فقط خلال ٥٦ شهراً في نيسان/أبريل ٢٠٠٩ بموجب العقد الأصلي، و٤٥ عقداً آخر، وسيخدم فقط ٩,٣٠٠ منزل، أي نسبة ٣٨ بالمئة من مجمل منازل مدينة الفلوجة. أعرب السفير عن قلقه ليس فقط لجهة الأكلاف وعدم الالتزام بالوقت ونطاق الانشاء، وأيضاً لتقارير تقدم العمل غير الملائمة. يعالج تقرير التفقيش هذا اهتمامات السفير بشأن الأكلاف، عدم الالتزام بالوقت ونطاق الإنشاء. تعالج مديريةية التدقيق اهتمامات السفير حول تقارير تقدم العمل غير الملائمة في تقرير التدقيق للمفتش العام 09-007 المعنون "التحسينات المطلوبة في إعداد التقارير حول أوضاع مشاريع إعادة الإعمار المقدمة إلى رئيس البعثة."

عمليات التفقيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

في ٢٣ آذار/مارس ٢٠٠٤، منح عقد على أساس تسليم غير محدد/كمية غير محددة، وعلى أساس الكلفة زائداً رسم من أجل إعادة تأهيل، إعادة إنشاء وتطوير مشاريع المياه، مياه الصرف الصحي والنفايات الصلبة للمساعدة في إعادة تأهيل البنية التحتية العراقية إلى شركة فليور اميك (Fluor Amek) من غرينفيل، ساوث كارولينا. في ٢٦ حزيران/يونيو ٢٠٠٤، منح أمر تسليم مقابل العقد بمبلغ ٣٢,٥ مليون دولار لتصميم وإنشاء نظام جديد لمعالجة مياه الصرف الصحي يشمل شبكة جمع مياه المجاري، الخطوط الرئيسية، محطات الضخ ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الفلوجة.

حُدد تاريخ البدء بتنفيذ المشروع في الأول من تموز/يوليو ٢٠٠٤ وكان من المقرر إكمال المشروع خلال ١٨ شهراً. في أيلول/سبتمبر ٢٠٠٥، بعد ان عانى المشروع من تأخيرات في برامج تنفيذ الأعمال ونمو الكلفة بحوالي ٢٥,٨ مليون دولار، الغى مكتب إدارة إعادة إعمار العراق العقد الأصلي الموقع مع شركة فليور اميك. في ذلك الوقت كان قد اكتمل إنشاء قسم واحد فقط من شبكة جمع المياه ومنذ ذلك الوقت جرى منح ٤٥ عقداً منفصلاً إلى مقاولين عراقيين لإكمال أقسام من نظام معالجة مياه الصرف الصحي وتزويد المعدات والتجهيزات الضرورية. خلال إعداد تقييم المفتش العام، كانت كلفة نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة قد ارتفعت إلى ٩٨ مليون دولار من بينها مبلغ ١٨,٧ مليون دولار دفع بموجب أمر التسليم لشركة فليور اميك وجرى الالتزام بمبلغ ٧٩,٣ مليون دولار لتسديد ٤٥ عقداً لإكمال تنفيذ المشروع.

اختار المفتش العام بصورة موضوعية خمسة عقود لمراجعتها في تقرير التقييم الذي أعده. تزود العقود المختارة تغطية لكافة مصادر التمويل الثلاثة والأوجه المتعددة للمشروع بضمنهم المنطقة "أ" لجمع مياه الصرف الصحي والخط الرئيسي. ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

أهداف تقييم المشروع

الهدف من عمليات تقييم هذه المشاريع هو تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار إلى الفرقاء المعنيين للتمكين من اتخاذ العمل المناسب عندما تدعو الحاجة.

أجرى المفتش العام عمليات تقييم هذه المشاريع وفقاً لمقاييس النوعية لعمليات التفقيش التي أصدرها مجلس الرئيس حول النزاهة والفعالية. كان فريق التقييم يتألف من مهندس/مفتش ومدقق/مفتش.

هدف المشروع

الغرض الأساسي لأمر تسليم العقد الموقع مع شركة فليور أميك كان تصميم وإنشاء نظام معالجة لمياه الصرف الصحي لخدمة ما كان يقدر آنذاك بـ ٢٤،٤٠٠ منزل في كامل مدينة الفلوجة. كان من المفترض أن يشمل النظام ثماني شبكات لجمع مياه الصرف الصحي وخط رئيسي وخطوط أنابيب رئيسية وسبع محطات ضخ ومحطة لمعالجة مياه الصرف الصحي ومحطة لضخ الفائض تصب في نهر الفرات.

يعتبر نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة الذي بلغت كلفته ٩٨ مليون دولار تقريباً^(٦٣٦) النظام الرئيسي الجديد الوحيد الذي يجري إنشاؤه وأحد أكبر مشاريع المياه الممولة من الحكومة الأميركية في العراق. حدد هذا المشروع على أنه مشروع يُشكّل أولوية بالنسبة للحكومة الأميركية والحكومة العراقية لأنه يؤمن معالجة مياه الصرف الصحي لمنطقة سنية في غالبيتها.

المسائل التي أثرت على الأكلاف والإنجاز في الوقت المناسب ونطاق الإنشاء

رغم أن عدة عوامل ساهمت في تأخر المشروع كثيراً عن الجدول الزمني الذي كان محدداً له والتكاليف المتصاعدة، فإن الأسباب الرئيسية لذلك تشمل ما يلي:

- توقعات غير واقعية من جانب الحكومة الأميركية فيما يخص الجدول الزمني وتقديرات الأكلاف نظراً للوضع الأمني.
- قرار إعادة تصميم محطة معالج مياه الصرف الصحي من نظام بحيرة إلى نظام للحماة المنشطة.
- مسائل تمويل و عقود.
- تردد الحكومة الأميركية بالنسبة لتحديد مسار تقدم هذا المشروع.
- مجموعة محدودة من المقاولين والمقاولين من الباطن للاختيار بينهم ومسائل النوعية الناتجة عن ذلك.
- مسائل سلامة أماكن العمل في مواقع المشروع.

الاستنتاجات

حددت عملية التقييم ما يلي:

- ١- صممت في الأصل محطة معالجة مياه الصرف الصحي لنظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة كي تستعمل نظام بحيرة. لكن نظراً لرفض وزارة البلديات والأشغال العامة حتى دراسة موضوع نظام البحيرة، وافقت الحكومة الأميركية على إعادة تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي باستعمال نظام

ميكانيكي (وحدات تعمل الحمأة المنشطة). استناداً إلى ممثلي مكتب المساعدة الانتقالية للعراق وسلاح الهندسة في الجيش الأميركي كانت رسوم التصاميم لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات "غير ملائمة من الواجهة الفنية" مما أجبر الحكومة الأميركية على التعاقد مع شركة واشنطن انترناشونال انك/بلاك اند فيتش، لإكمال مجموعة الإنشاء. فعلى سبيل المثال، كان في التصميم الذي قدمه المقاول لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي "العديد من المسائل الفنية" التي تطلبت من شركة واشنطن انترناشونال انك/بلاك اند فيتش أن تضع تصاميماً مفصلة لنظام المعالجة بالكلور، وحدة الغسل ونظام البوليمر. بالإضافة إلى ذلك، طلب إجراء مراجعة للتصميم من نظراء لجعل محطات المضخات "تتوافق مع قوانين السلامة الدولية والهندسية". كما كانت التصاميم الأساسية لكافة أنظمة الجمع الثلاثة غير ملائمة من الواجهة الفنية لأن المهندس الذي وضع التصميم الأساسي كان عاجزاً عن إكمال عمليات مسح للموقع بسبب شؤون أمنية.

بعد أن أعيد تصميم المشروع مرتين منفصلتين بكلفة إضافية مهمة على الحكومة الأميركية، أعيدت في نهاية الأمر مراجعة تصميم ومواصفات العقد لكي تصبح محددة بدرجة كافية لإنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي والمرافق المترافقة معها. أخذ التصميم المراجع في الاعتبار مراحل تتابع العمل والعلاقة مع أعمال عقود أخرى. تبدو الرسوم والمواصفات التي روجعت بأنها كاملة ومتوافقة مع شروط العقد. لكن يجب الملاحظة بأن الاهتمام بالتصميم الأولي من قبل وزارة البلديات والأشغال العامة، لجهة الرائحة التي يولدها نظام البحيرة، لم يعالج في التصميم الأساسي لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ذات وحدات الحمأة المنشطة. تم تحديد ذلك خلال عملية مراجعة التصميم، لكن بسبب القيود المفروضة على تمويل المشروع لم تجري معالجة الأمر. نتيجة لذلك سوف يتعرض سكان الفلوجة لروائح قوية صادرة من محطة معالجة مياه الصرف الصحي، مع ان العديد منهم غير موصولين بنظام المجاري الصحية.



مشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة:
إنشاء جدار حطة المضخات ف ١



مشروع مياه الصرف الصحي في الفلوجة:
إنشاء محطة مضخات الصبيب

٢- لبي معظم العمل الذي جرى تفيتشه استوفى مقاييس التصاميم المراجعة. ونظراً للوضع الأمني تمكن فريق التفيتش من ان يفتش فقط محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة المضخات ف ١. في محطة معالجة مياه الصرف الصحي لم يلاحظ وجود عيوب ذات شأن لكن في محطة المضخات ف ١ لاحظ فريق التفيتش وجود مساحة مغطاة بالخرسانة بشكل غير ملائم. استناداً إلى ممثل من مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة التابع ل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، فرقة منطقة الخليج الوسطى، تم تسجيل العمل الخرساني غير المقبول على لائحة العيوب وسوف يتم تفيتشه لإزالته واستبداله قبل إصدار أمر الدفع النهائي. أستنتج فريق التفيتش ان مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة أمن إشرافاً ملائماً للتأكد من أن الإنشاء يستوفي مقاييس التصميم.

٣- كانت خطط مراقبة النوعية لدى المقاول مفصلة بشكل كافٍ وشملت استعمال تقارير يومية لمراقبة النوعية من اجل توثيق العيوب في الإنشاء. وثقت التقارير اليومية لمراقبة النوعية، عدد العمال في الموقع، نشاطات الإنشاء المنفذة، وزودت صوراً فوتوغرافية عديدة للنشاطات المنفذة في موقع العمل. استناداً إلى ممثلي مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة، كانت التقارير اليومية لمراقبة النوعية مفيدة ولكنها أظهرت ماذا أراد المقاول أن يراه المفتشون. كان برنامج ضمان النوعية للحكومة الأميركية فعالاً في ضمان ملاءمة إنشاء النظام الكامل لمعالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة. كان الوضع الأمني في وحول هذا المشروع غير مستقر للغاية الأمر الذي قيد بشدة قدرة ممثلي مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة على تنفيذ إشراف عميق على ضمان النوعية الضرورية لمشروع بهذا الحجم وهذا التعقيد. التهديد المتواصل لهجمات تنفذ أما على الموقع او خلال التنقل من والى موقع العمل قيد تكرار وفترات زيارات

ممثلي مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة لموقع المشروع إلى ساعة او ساعتين في كل أسبوعين.

تطلبت مسائل الدقة الفنية والسلامة لنظام معالجة مياه الصرف الصحي إشرافاً على ضمان النوعية أكثر مما يستطيع مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة تقديمه بسبب الوضع الأمني. لذلك منح عقد إلى مقاول محلي وظف مهندسين عراقيين من منطقة الفلوجة كممثلين لضمان النوعية من أجل تنفيذ خدمات هندسية وتفتيشات خلال الإنشاء. كان ممثلو ضمان النوعية موجودين في موقع العمل خلال عمليات الإنشاء ورصدوا النشاطات الميدانية واكملوا تقارير ضمان النوعية اليومية التي توثق نشاطات إنشائية ذات شأن وسجلوا في تقاريرهم صوراً فوتوغرافية لأعمال الإنشاء المنفذة خلال اليوم. استناداً إلى ممثلي مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة خدم ممثلو ضمان النوعية بمثابة "عيون وأذان على الأرض."

يُشكّل عدم وجود مقاولين محليين يملكون القدرات الفنية لتنفيذ نشاطات الإنشاء التي تلبي المقاييس الدولية تحدياً مستمراً. استناداً إلى ممثلي مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة، كان هدفهم تحقيق "نوعية بالحد الأدنى المقبول" في مواقع المشروع التي يعتقدون بأنها مقاربة واقعية لإدارة هذا المشروع. يعتقد ممثلو مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة ان هذا الهدف لا يعني تخفيض النوعية بل انه مقاربة عملية عند الأخذ في الاعتبار الأمن والسلامة والرغبة في تقدم المشروع.

أنشأ ممثلو مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة مواصفات محسنة للخرسانة في محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات التي زودت متانة محسنة بدرجة كبيرة بسبب الكثافة الخرسانية الأكبر ونتائج اختبار لقوة ضغط الخرسانة تجاوزت بدرجة كبيرة الحد الأدنى المطلوب للقوة. يعتبر ممثلو مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة ان هذا يُشكّل "سياسة تأمين" للتغلب على "العيوب الكامنة في إنتاج الخرسانة وصبها والموجودة في صناعة الإنشاءات العراقية في الوقت الحاضر". بالإضافة إلى ذلك، يساعد ممثلو مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة المقاولين العراقيين المحليين بتزويدهم بموجزات أمنية وتقنيات الإنشاء. خلال مواصلة تنفيذ هذا المشروع، قام مكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة بتجهيز مركز لترويج السلامة والنوعية لدى المقاولين المحليين. حصلت عدة أحداث في مواقع المشاريع، نتج عنها مقتل أربعة أشخاص. تشهد

هذه الاغتيالات على رفض المقاولين المحليين الالتزام بممارسات السلامة التي أوصى ممثلو مكتب المهندس المقيم في الفلوجة.

عوض برنامج ضمان النوعية القوي لمكتب المهندس المقيم في معسكر الفلوجة عن القيود الفنية والأمنية للمقاولين المحليين. على الأخص شجع هذا البرنامج السلامة والنوعية بينما أمن في نفس الوقت إكمال المشروع.

٤- لم تعالج مسألة الاستدامة بصورة ملاءمة لهذا المشروع. في بداية تنفيذ المشروع أرادت الحكومة الأميركية ان تستعمل محطة معالجة مياه الصرف الصحي نظام البحيرة لأنها تتطلب طاقة كهربائية أقل ولا تتطلب وجود موظفين ماهرين ووجود قدر قليل من الصيانة لتشغيلها. لكن وزارة البلديات والأشغال العامة رفضت نظام البحيرة لأنه مخصص "الدول العالم الثالث". وبدلاً من ذلك طلبت الوزارة استعمال نظام ميكانيكي (وحدة الحمأة المنشطة). في نهاية الأمر وافقت الحكومة الأميركية على اقتراح الوزارة باستعمال نظام ميكانيكي. سوف يكون لهذا القرار تشعبات مهمة لا يمكن تغييرها وطويلة الأمد على مستقبل تشغيل وصيانة محطة معالجة مياه الصرف الصحي والمرافق المترافقة معها.

عندما منح أمر التسليم الأصلي في منتصف العام ٢٠٠٤، كانت الطاقة الكهربائية الدائمة المطلوبة قليلة لأن محطة معالجة مياه الصرف الصحي صممت على أساس استعمال نظام البحيرة. في تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٥ عندما وافقت الحكومة الأميركية على إعادة تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي من بحيرة إلى نظام ميكانيكي، أصبحت الحاجة ماسة لطاقة دائمة يعتمد عليها. في حزيران/يونيو ٢٠٠٦، منح عقد ممول من صندوق تنمية العراق لتزويد الطاقة من اجل تشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي الميكانيكية المصممة من جديد. ومحطة المضخات ف١، وعلى وجه الخصوص خطوط تغذية تصل المحطة ومحطة المضخات بمحطة تحويل محلية.

لكن بحلول تموز/يوليو ٢٠٠٧، أدرك ممثلو الحكومة الأميركية ان الشبكة الكهربائية القومية العراقية لن تؤمن "أية تحسينات مهمة (للطاقة الدائمة) في المستقبل المنظور" وبالنتيجة كان الحل عدم توفر طاقة كهربائية دائمة إعادة تصميم محطة معالجة مياه الصرف الصحي لتشغيلها بواسطة مولدات تستغل بصورة متواصلة بدلاً من مولدات احتياطية.

استناداً إلى ممثلي فرقة منطقة الخليج، سوف يتطلب تشغيل المولدات من أجل التشغيل الكامل لنظام معالجة مياه الصرف الصحي ٥٢٠ غالون من الوقود بالساعة (١٢،٤٨٠ غالون باليوم) (جميع المجموعات الأربع لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات الثلاث لثمانى مناطق تجميع). مع انه يطلب ما بين ٢٠٠ و ٢٥٠ غالون من الوقود بالساعة (٤،٨٠٠-٦،٠٠٠ غالون باليوم) لتشغيل قسم الخدمة المحدد لهذا المشروع (اثنتان من مجموعات محطة معالجة مياه الصرف الصحي الأربع ومحطتا مضخات لثلاث مناطق تجميع).

في الوقت الحاضر، لا يوجد عقد ينص على تزويد الوقود الضروري لتشغيل المولدات في محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات. ابلغ فريق التفتيش ان الوزارة سوف تكون مسؤولة عن تزويد الوقود. لسوء الحظ لم تتعهد وزارة البلديات والأشغال العامة لحد الآن بتزويد الوقود المطلوب لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات الثلاث.

تمثل مسألة الاستدامة هذه مشكلة خطيرة للحكومة الأميركية كما للحكومة العراقية. وعلى وجه الخصوص في حال لم تتمكن الحكومة العراقية من تزويد كمية ملائمة من الوقود للتشغيل المتواصل لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات، لن يعمل نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة وسوف يهدر الاستثمار الهام الذي وضعته الحكومة الأميركية.

٥- لن تنسجم نتائج مشروع نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة مع الأهداف الأصلية أو الأهداف المراجعة للمشروع. كان هدف المشروع في الأصل تزويد نظام شامل لمعالجة مياه الصرف الصحي لمدينة الفلوجة بكاملها. لكن بسبب الزيادة المهمة في الاكلاف والتأخيرات التي واجهها المشروع، تمّ تعديل الأهداف من أجل تأمين العمود الفقري لنظام معالجة مياه الصرف الصحي (أي محطة معالجة مياه الصرف الصحي، محطات المضخات وخطوط الأنابيب) وجعله متوفراً لثلاث مناطق تجميع من أصل مناطق التجميع الثمانية في الفلوجة. كان القصد الأصلي تزويد أنابيب توصيل للمنازل إلى حدود متر واحد من خط الملكية وعلى ان تكون وزارة البلديات والأشغال العامة مسؤولة عن تأمين التوصيلات من كل منزل إلى نظام التجميع. وفي إجراء كان الغرض منه الاقتصاد في النفقات، اقترحت الوزارة السماح لكل صاحب منزل بإجراء الوصل مع نظام التجميع. يقلق ممثلو المهندس المقيم في معسكر الفلوجة بشأن هذا الاقتراح، لأنهم يعتقدون ان أصحاب المنازل سوف يحفرون بكل بساطة حفرة عبر جدران فتحة الدخول، الأمر الذي يلحق الضرر بنظام التجميع. بدون وصل

المنازل بأنظمة التجميع لن توجد أي طريقة لنقل مياه الصرف الصحي من المنازل الفردية إلى نظام معالجة مياه الصرف الصحي. في الوقت الحاضر لم تؤمن لا الحكومة الأميركية ولا الحكومة العراقية تمويلاً لتنفيذ أعمال الوصل بالمنازل لذلك لن يستفيد أي مواطن في الفلوجة من نظام معالجة مياه الصرف الصحي.

بالإضافة إلى ذلك، لم يتلقَ عدد من المقاولين لديهم عقود ممولة من صندوق تنمية العراق منذ مدة طويلة أية مدفوعات مقابل عملهم على نظام معالجة مياه الصرف الصحي. فعلى سبيل المثال، يطالب المقاول الذي أنشأ خط الأنابيب الرئيسي بحوالي ١,٣ مليون دولار من وزارة المالية بموجب عقده. يتابع مكتب المساعدة الانتقالية للعراق تسديد العقود الممولة من صندوق تنمية العراق مع وزارة المالية. أثير نشر مسودة التقرير ذكر ممثلو مكتب المساعدة الانتقالية للعراق انه تم تسديد دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ حوالي ٥٧٠ ألف دولار من قبل وزارة المالية.

استناداً إلى ممثلي الحكومة الأميركية فان وزارة المالية أصبحت مستعدة لتسديد مستحقات المقاول ضمن "أيام معدودة" مع ان هذه الدفعة مستحقة منذ حوالي السنتين. والى ان يتم استلام الدفعة، يمنع المقاول استعمال خط الأنابيب الرئيسي إلى نظام معالجة مياه الصرف الصحي وذلك بإقفال فتحات الدخول وصناديق الصمامات. بدون استعمال خط الأنابيب الرئيسي لن تتدفق مياه الصرف الصحي من محطة المضخات ف ١ إلى محطة معالجة مياه الصرف الصحي.

التوصيات

من أجل حماية استثمار الحكومة الأميركية الذي يبلغ حوالي ٩٨ مليون دولار، يوصي المفتش العام مدير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق:

- تنسيق الجهود مع الحكومة العراقية لتأمين تزويد كمية ملائمة من الوقود إلى ان يتم تزويد طاقة كهربائية دائمة يعتمد عليها لتشغيل محطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطات المضخات.
- تنسيق الجهود مع الحكومة العراقية لتأمين إيجاد حل للطاقة الدائمة لمحطة معالجة مياه الصرف الصحي ومحطة المضخات.

- تنسيق الجهود مع الحكومة العراقية لتأمين تسديد مستحقات المقاولين الآخرين من عقود ممولة من صندوق تنمية العراق.

تعليقات الإدارة

تلقي المفتش العام تعليقات على مسودة تقريره من السفارة الأميركية في العراق تتوافق في الرأي مع التوصيات الواردة في التقرير. كما تم تزويد تعليقات محددة لتوضيح الجوانب الفنية من التقرير. زود سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، فرقة منطقة الخليج، تعليقات فنية أيضاً للتوضيح. راجع المفتش العام هذه التعليقات وأعاد كتابة نص التقرير النهائي حسب ما يلزم. يقدر المفتش العام اتفاق رأي السفارة الأميركية في العراق مع التوصيات الواردة في مسودة التقرير.

محطة معالجة المياه (أر ٣) في مدينة الصدر، بغداد، العراق (تقرير المفتش العام SIGIR-08-143)

بوشر بتقييم هذا المشروع كجزء من عمليات التقييم المتواصلة التي يقوم بها المفتش العام لنشاطات إعادة الإعمار المختارة في قطاع المياه. أجري تقييم هذا المشروع وفقاً لمقاييس النوعية لأعمال التفقيش التي أصدرها مجلس الرئيس حول النزاهة والكفافية. شمل فريق التقييم مهندساً/مفتشاً ومدققاً/مفتشاً مهنيين.

أهداف المشروع

تهدف محطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر إلى تزويد ٤ آلاف متر مكعب (٤ ملايين لتر) بالساعة من مياه الشرب لخدمة حوالي ١٩٢ ألف مواطن في مدينة الصدر. صمم المشروع لتلقي المياه غير المعالجة من نظام إمداد المياه غير المعالجة الموجود وتزويد مياه معالجة صالحة للشرب إلى نظام التوزيع الموجود. من المقرر أن توظف هذه المحطة حوالي ١٥٠ شخصاً في مجالات التشغيل والصيانة والإدارة.

كان المفروض بالأساس إنشاء محطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر بموجب عقد الوكالة الأميركية للتنمية الدولية مع شركة بكتل ناشونال إنك. وقعت بكتل عقداً من الباطن مع شركة بارسونز غلوبال سرفيسيس إنك لتصميم وإنشاء المشروع. عندما أصبح المشروع مكتملاً بنسبة ٨٥ بالمئة غادرت بكتل وبارسونز العراق، وسلم المشروع إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لإكماله. تعاقد هذا الأخير مع شركة واشنطن انترناشونال إنك/بلاك فينش لإكمال تصميم وإنشاء المشروع.



مشروع مدينة المياه في مدينة الصدر

أهداف تقييم المشروع

كان الهدف من تقييم هذا المشروع تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع الإغاثة وإعادة إعمار العراق إلى الفرقاء المعنيين لتمكينهم من اتخاذ الإجراء الملائم عند اللزوم.

الاستنتاجات

حدد التقييم ما يلي:

- 1- كانت الخطط والتصاميم النهائية لمحطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر فعالة لإنشاء المرفق. صممت بكتل وبارسونز في الأساس مباني ومرافق محطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر بموجب عقد موقع مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية. عند نقل المشروع إلى سلاح الهندسة في الجيش الأميركي لإكماله، تعاقد سلاح الهندسة في الجيش الأميركي مع شركة واشنطن انترناشونال انك/بلاك اند فيتش التي أكملت التصميم الأصلي بصورة ملائمة بسبب العيوب التي كان من المفترض توضيحها، أو تغييرها في رسوم و/أو مواصفات العقد المزودة من شركة بكتل وشركة بارسونز. سلاح الهندسة في الجيش الأميركي، فرقة منطقة الخليج ومكتب المساعدة الانتقالية للعراق ومكتب بغداد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية اتخذوا عملاً أولاً لإبلاغ بكتل بنيتهم في رفع قضية للمطالبة بالتعويض عن التصميم وأعمال الإنشاء التي لم تصلح.

طلب من المقاول تصميم وإنشاء خط أنابيب للترسبات الصلبة التي قد تطرح محلول المواد الصلبة المترسبة في قناة الشرطة الموجودة. ونظراً للاهتمامات

البيئية، قرر المقاول إنشاء بحيرة من ثلاث خلايا لترسيب المواد الصلبة الموجودة في محلول المواد الصلبة المترسبة.

أصدرت الحكومة الأميركية اتفاقية منحة مع وزارة الموارد المائية لإنشاء ثلاث بحيرات للحماة المترسبة لمحطة معالجة المياه أُر ٣ في مدينة الصدر بمبلغ ١٧٦،١٦١،٤ دولار. وفي شهر آب/أغسطس ٢٠٠٨، كان إنشاء البحيرة قد تأخر بسبب التردد في تحديد الموقع، والتعرف على هويات مالكي الأراضي وإعادة إسكان المواطنين القاطنين على هذه الأراضي. والى ان يكتمل إنشاء البحيرات سوف يستمر ضخ المواد الصلبة المترسبة من عمليات الترسيب والترشيح في محطة معالجة المياه في مدينة الصدر إلى قناة الشرطة.

٢- بدأ أن أعمال الإنشاء المترافقة مع المشروع تلبى مقاييس التصميم بصورة فعالة. حافظ سلاح الهندسة في الجيش الأميركي وشركة واشنطن انترناشونال انك/بلاك اند فيتش على القيام بدور فعال في إدارة المشروع من اجل ضمان النوعية والالتزام بشروط العقد. فعلى سبيل المثال، أظهر الجدار الشمالي الشرقي لمبنى المرشح إشارات تدل على تنفيذ عمل إصلاحي خرساني مهم عليه. كان الهدف من أعمال الإصلاح تصحيح عيب محدد على قائمة المهمات الصغيرة الواجب إنجازها في نهاية المشروع. لم تكن الماء تتسرب من أعمال إصلاح الخرسانة وقت اجراء التفيتش. لكن إصلاحها قد أدى إلى تأخير التاريخ المحدد لاكمال المشروع وكلف حكومة الولايات المتحدة أموالاً إضافية لإصلاح العيب.

٣- كان نظام مراقبة النوعية لدى المقاول فعالاً في توجيه برنامج مراقبة النوعية لديه. احتوت تقارير مراقبة النوعية اليومية معلومات مطلوبة حول المشروع ونشاط العمل لتوثيق مدى التقدم في الإنشاء وتحديد المشاكل مع العمل الإصلاحي المطلوب. سوف يساعد برنامج مراقبة النوعية المتبع من المقاول في تزويد ٤ آلاف متر مكعب بالساعة من المياه الصالحة للشرب إلى مدينة الصدر.

كان برنامج ضمان النوعية للحكومة الأميركية فعالاً في مراقبة برنامج مراقبة النوعية المتبع من المقاول. حافظ ممثل برنامج ضمان النوعية على وجوده في موقع الإنشاء وزود تقارير يومية لضمان النوعية احتوت معلومات متعلقة بالمشاريع لتوثيق مدى التقدم وتسليط الأضواء على العيوب. اكمل ممثل ضمان النوعية أيضاً التقارير اليومية بإرفاق صور فوتوغرافية تعزز المعلومات المزودة في التقارير.

٤- عولجت مسألة الاستدامة ضمن شروط العقد. نص العقد على ان يدرّب المقاول افراداً مناسبين وان يقدم الدعم للتشغيل والصيانة خلال مراحل إنشاء وبدء تشغيل المشروع ووضع قيود الخدمة الفعلية وان يكمل نشاطات بدء تشغيل ووضع قيود الخدمة الفعلية وأن يزود خيارات للتوسع المحتمل للمحطة.

زودت شركة واشنطن انترناشونال انك/بلاك اند فيتس التدريب على استعمال معدات المختبر، إدارة نظام مياه الشرب، تشغيل مبنى المواد الكيميائية، تشغيل وصيانة الأنظمة الكيميائية، مد الأنابيب واصلاحها، إصلاح الأنابيب المصنوعة من الحديد و ضخ المياه من محطة معالجة المياه. تزود كتيبات تعليمات التشغيل والصيانة نظرة شاملة حول المعدات من خلال تعريف الوحدات الرئيسية للعملية، إدراج الأجزاء المكونة للمعدات وقدراتها وشرح ممارسات التشغيل الرئيسية ومتطلبات الصيانة للمحطة كوحدة كاملة. بالإضافة إلى ذلك تحدد هذه الكتيبات مهمات الصيانة الوقائية والجدول الزمنية لتزبييت المعدات.



مشروع مياه مدينة الصدر: أجهزة قياس المياه غير المعالجة ومحطة مراقبة التدفق

يطلب من مصلحة المياه في بغداد تزويد المواد القابلة للاستهلاك لتشغيل محطة معالجة المياه، كالشيب، الكلور، البوليمر ووقود الديزل، لدعم التشغيل المتواصل. كان التصميم الأساسي للمرفق ينص على تزويد ٤ آلاف متر مكعب بالساعة من المياه الصالحة للشرب. لكن التصميم ينص على إمكانية توسيع القدرة في المستقبل لتزويد ٦ آلاف متر مكعب بالساعة في عمليات توسيع متعددة للخلايا. نص العقد الموقع بين الوكالة الأميركية للتنمية الدولية وشركة بكتل على تزويد

كفالة لمدة سنة واحدة بعد التسليم. تدعم الكفالة المقاول العراقي المحلي من الباطن وهي من مسؤوليته. يكفل كتاب الكفالة الموقع من المقاول العراقي المحلي ان على مقاول الباطن عند استلامه بلاغاً خطياً بوجود عيب ان يؤمن بسرعة، بدون أي كلفة على المقاول او المالك، الأيدي العاملة والمعدات والمواد الضرورية لتصحيح مثل هذه العيوب وجعل العمل يلتزم كلياً بالكفالات السابقة الذكر. حددت شركة واشنطن انترناشونال انك/بلاك اند فيتس ٩٣ عيباً في التصميم والإنشاء بموافقة سلاح الهندسة في الجيش الأميركي. وافقت شركة واشنطن انترناشونال انك/بلاك اند فيتس على إعادة توظيف نفس مقاول الباطن العراقي المحلي لإكمال المشروع. شملت الشروط:

- يكمل المقاول العراقي المحلي البنود المحددة على أنها غير مكتملة من المشروع مقابل الرصيد غير المدفوع على عقد الباطن السابق.
- أية بنود أخرى بضمنها تصحيح العيوب السابقة سوف يتم التعريف عليها على أنها "بنود اكتشاف" تخضع لتعويض إضافي.

نتج عن الاتفاق هذا كلفة إضافية على الحكومة لإصلاح او لاستبدال العيوب.

زودت شركة واشنطن انترناشونال انك/بلاك اند فيتس معلومات فنية إلى المقاول المحلي العراقي لدعم جهود الحكومة الأميركية في تطبيق مطالبات الكفالة. أرسل سلاح الهندسة في الجيش الأميركي إلى مكتب المساعدة الانتقالية للعراق طلباً بإبلاغ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية ان تسجل طلباً للتعويض عن العمل المعيب الذي لم يصلح. أفادت هذه الرسالة ان اكتشاف العمل المعيب نتج عنه ملايين الدولارات من النفقات لإعادة إصلاحه.

٥- من المقترض ان يكون مشروع محطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر مشروعاً عملياً خلال إجراء عملية التقييم أبلغ ان المشروع كان مكتملاً بنسبة ٩٢ بالمئة. فإذا استمرت النوعية الحالية للإنشاء والإدارة الفعالة للمشروع سوف تكتمل محطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر وسوف تتوافق نتائج المشروع مع الأهداف الأساسية.



مدرسة الفاو: القسم الخارجي مدهون



مدرسة المعلمين: القسم الخارجي مدهون

التوصيات

يوصي المفتش العام بما يلي:

١- ان يستمر اللواء القائد لفرقة منطقة الخليج في تزويد معلومات ووثائق لمساعدة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في تقييم التصميم الخاطئ واعمال الإنشاء المعينة.

٢- ان يُقيم مدير بعثة مكتب بغداد للوكالة الأميركية للتنمية الدولية ومدير مكتب المساعدة الانتقالية للعراق المسائل المثارة في تقرير المفتش العام وان يتخذا العمل المناسب.

تعليقات الإدارة

تلقى المفتش العام تعليقات على مسودة تقريره من فرقة منطقة الخليج، مكتب المساعدة الانتقالية للعراق والوكالة الأميركية للتنمية الدولية. استجابت التعليقات للتوصيات الأساسية للمفتش العام التي تطلبت اتخاذ إجراء قانوني للمطالبة بالتعويض عن الأخطاء في التصميم، والإنشاءات. ذكر مكتب المساعدة الانتقالية للعراق والوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضاً انه لم يتوفر لهما الوقت الكافي لدرس ما إذا كان اتخاذ إجراء قانوني له ما يبرره. أشارت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية أيضاً إلى ان البيانات في التقرير احتوت أخطاء، نواقص وإغفالات و/أو إهمالات رغم عدم تقديم أمثلة او نماذج إلى المفتش العام. لم تكن نية المفتش العام طلب اتخاذ عمل قانوني بل التوصية بإجراء تقييم للمسائل المثارة في هذا التقرير ومن ثم اتخاذ الإجراء الملائم.

مدارس القدس والمعلمين والفاو في بغداد، العراق

تقرير المفتش العام SIGIR PA-08-149

تقرير المفتش العام SIGIR PA-08-150

تقرير المفتش العام SIGIR PA-08-151

يقيم المفتش العام المشاريع الممولة من الحكومة العراقية بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP) بغية تزويد معلومات في الوقت الحقيقي حول مشاريع الإغاثة وإعادة الإعمار إلى الفرقاء المعنيين من أجل تمكين اتخاذ العمل المناسب عند الضرورة.

أهداف تقييم المشاريع

كان الهدف من تقييم هذه المشاريع تحديد ما إذا كانت المشاريع تعمل بالقدرة المقررة في العقد الأصلي. لإنجاز هذا الهدف، سعى فريق التقييم إلى تحديد ما إذا كانت المشاريع تعمل بالقدرة أو بالسعة الكاملة عندما قبلتها حكومة الولايات المتحدة وعند تحويلها إلى مشغلين عراقيين وخلال تفتيش موقع العمل في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨. أجرى المفتش العام عمليات التقييم هذه المحدودة النطاق وفقاً لمقاييس النوعية لعمليات التفتيش الصادرة من مجلس الرئيس حول النزاهة والكفاية. شمل فريق التقييم مهندساً/مفتشاً ومدققاً/مفتشاً.

الهدف الإجمالي للمشروع كان إعادة تأهيل مدارس القدس والمعلمين والفاو في ضاحية جميلة في مدينة الصدر، بغداد، العراق يستفيد منها ما بين ٣٥٠ و ٤٠٠ طالب في كل واحدة من المدارس الثلاث.

عمليات التفقيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)



لا توجد ستائر على النوافذ والأنقاض في حديقة المدرسة ظاهرة في ساحة مدرسة القدس



التوصيلات الكهربائية غير الملائمة في مدرسة المعلمين

في ٢٩ حزيران/يونيو ٢٠٠٨، منحت عقود بسعر ثابت إلى مقاول محلي. كان من المقرر ان تكتمل إعادة تأهيل المدارس في ٢٩ تموز/يوليو ٢٠٠٨.

الاستنتاجات

وقت قيام المفتش العام بزيارة المواقع في ١٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، كانت عملية إعادة تحسين مدارس القدس والمعلمين والفاو غير مكتمل. ابلغ ممثلو الفريق المتعدد الجنسيات في العراق ان المقاول العراقي المحلي طلب إعفاؤه من العقود لانه تلقى عدة طلبات لدفع

رشاوى من ممثلي الحكومة المحلية. ذكر المقاول العراقي انه رفض دفع الرشاوى وتلقى تهديدات لسلامته الشخصية وسلامة زملائه وأفراد عائلته. ابلغ ممثلو الفريق المتعدد الجنسيات في العراق ان قوات التحالف أوقلت العقود ودفعت مبالغاً جزئية للمقاول مقابل الأعمال المكتملة وقت إقفال العقود. أبلغ الفريق المتعدد الجنسيات في العراق ان محاولات تجري للحصول على مقاول آخر كي يكمل التحسينات.

خلال زيارته للمواقع لاحظ المفتش العام ان معظم شروط بيان العمل المتعلقة بإعادة تحسين المدارس الثلاث كانت قد نفذت على ما يبدو، لكن بقي عدد من البنود التي يشملها العقد غير مكتملين. على سبيل المثال لم يتم تأمين سلامة منطقة لوحة المفاتيح الكهربائية، وكانت الأنقاض وقطع الأثاث القديمة المفروض نقلها لا تزال في الموقع.

شكل وضع لوحة المفاتيح الكهربائية خطر حصول صدمة كهربائية وحريق، وشكلت الأنقاض وقطع الأثاث المتروكة حالة غير آمنة. عرفت بيانات العمل للعقود بوضوح كاف أقسام المدارس المطلوب تحسينها، على وجه الخصوص مناطق المدارس، المعدات والمرافق الواجب تركيبها او استبدالها. كما تضمنت هذه البيانات أيضاً الشروط المطلوبة التي تنص على استبدال المواد والمعدات بأخرى جديدة وليس بمعدات مستعملة. حددت شروط العقد أيضاً ان نوعية العمل يجب ان تلبى مقاييس وزارة التعليم. وبخلاف ذلك لم تحدد شروط العقد المقاييس الواجب الالتزام بها في تنفيذ العمل او نوعية المواد التي سوف تستعمل. لم يكن بإمكان الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ولواء الهندسة ال ٩٢٦ الحصول على مقاييس وزارة التعليم. نتيجة ذلك، ورغم ان شروط العقد تحدد بوضوح كاف العمل المطلوب، لم تكن المواصفات التي يجب ان يخضع لها العمل الذي سينفذ ملائمة.



مدرسة القدس: القسم الخارجي مدهون

يهدف برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق الذي أنشأته ومولته الحكومة العراقية إلى تمكين القادة من تنفيذ مشاريع إعادة الإعمار الضرورية التي يستفيد منها الشعب العراقي. وينص دليل إجراءات التشغيل القياسي "المال كنظام سلاح" والذي وضعه الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق والذي يوفر الإرشادات إلى برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، على ان النجاح الإجمالي لعملية إعداد تقارير البرنامج يستند إلى نظام العوائق والتوازنات والى إشراف الحكومة العراقية على البرنامج وهو الأمر الذي يتطلب إعداد تقارير كل أسبوعين حول المشاريع الواجب عرضها على الحكومة العراقية لمراجعتها. تستلزم الإرشادات أيضاً ان تكون البيانات حول المشاريع في أنظمة إدارة إعادة إعمار العراق دقيقة ويتم تحديثها أسبوعياً لضمان مزامنة المشاريع بين وزارات الحكومة العراقية.

أوجزت الوثائق المزودة إلى فريق التقييم عملية بدء المشروع مالياً وتعاقدياً، لكن لا الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق ولا لواء الهندسة ال ٩٢٦ يقدمان التقارير كل أسبوعين أو التقارير حول الوضع التي تصف تقدم العمل خلال الإنشاء.



صورة من الجو لمركز عرعر عند نقطة الدخول، أخذت في ٤/٤/٢٠٠٧ و ١٦/٧/٢٠٠٨. يخطط المفتش العام للقيام بتقييم المشروع في هذا الموقع

التوصيات

يوصي المفتش العام بأن يتخذ قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق وقائد لواء الهندسة ال ٩٢٦ الإجراءات التالية:

- ١- منح عقد آخر لإكمال إعادة تحسينات المدارس وبالأخص أقسام العقود التي تطرح مسائل أمنية – مثل لوحة المفاتيح الكهربائية التي تُشكل خطر حدوث صدمة كهربائية وحريق والأنفاض والأثاث المتروك الذين يمثلون وضعاً غير آمن. بالإضافة إلى ذلك، يجب معالجة الكفالة التي لم تعد صالحة من المقاول الأصلي، كما البنود غير المكتملة من العقود الأصلية وعدم وجود ستائر على النوافذ ووحدات تكييف للهواء لا تعمل وتجهيزات مدرسية لم تسلم، وإلى غير ذلك.
- ٢- إن تعرف العقود المستقبلية لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق ليس فقط العمل المطلوب تنفيذه بل وأيضاً المواصفات التي يتوجب على العمل ان ينفذ وفقاً لها.
- ٣- الالتزام بأحكام دليل الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، "المال كنظام سلاح" وعلى وجه الخصوص:

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

- تقديم التقارير حول المشاريع مرة كل أسبوعين لمراجعة الحكومة العراقية.
- تحديث بيانات المشروع في أنظمة إدارة إعادة إعمار العراق على أساس أسبوعي لضمان تزامن المشاريع بين وزارات الحكومة العراقية.

تعليقات الإدارة

تلقى المفتش العام تعليقات غير رسمية على مسودة التقرير الذي أعده من القوات المتعددة الجنسيات في العراق التي أفادت بأن هذه القوات توافق على نتائج التقرير والتوصيات. يقدر المفتش العام اتفاق الرأي من جانب القوات المتعددة الجنسيات في العراق مع توصيات مسودة التقرير.

برنامج المسح الجوي للمشاريع

تجري مجموعة التصوير عبر الأقمار الصناعية التابعة للمفتش العام، ومركزها في ارلنغتون بولاية فرجينيا، تقييمات جوية عبر العراق لمشاريع إعادة الإعمار الممولة من الحكومة الأميركية. يزود محلل صور الأقمار الصناعية لدى مكتب المفتش العام صوراً حديثة، واستخبارات تستند إلى الصور، وخرائط إلى إدارات مكاتب المفتش العام، أي إدارات التفتيش والتدقيق والتحقيق. مكن هذا العمل المفتش العام من تزويد معلومات حديثة حول مواقع العمل النائية وتعقب تقدم الإنشاء في مواقع المشاريع عبر العراق.

في ربيع السنة هذا، أجرى المفتش العام تحليلاً للصور شمل ١٢٩ صورة وأعد ٩٢ منتج صور باستخدام صور الأقمار الصناعية والمعلومات المحدودة المتوفرة حول العقود. تؤمن الصور تقييماً مرئياً لمدى التقدم الحاصل في مواقع إعادة الإعمار عبر العراق. قام محلل الصور لدى المفتش العام بتقييم ومراجعة مشاريع ممولة من برنامج الاستجابة الطارئة للفوائد (CERP)، وصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، التي جرى تقييمها في ربيع السنة هذا. انظر الجدول ٤-٤ للمراجعة الشاملة للصور المنتجة.



صور جوية لمحطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر أخذت في ٢٠٠٦/٦/٢٦ و ٢٠٠٦/١١/٢٤. في ربيع السنة هذا أجرى المفتش العام تقييماً لمحطة معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

تستخدم منتجات الصور الداعمة، بما في ذلك النظرة الشاملة للمواقع وتفاصيل مواقع المشاريع، وتقييم المواقع للإعداد لزيارات تفتيش المواقع ولتحديد المشاكل المحتملة. في ربع السنة هذا، تم إنتاج ٩٢ منتج صور لمساعدة المفتشين في تقييم المشاريع في ٩ مواقع جرى تقييمها خلال ربع السنة هذا ولتزويد تحاليل لمواقع محتملة في المستقبل.

بالمشاركة مع الوكالة القومية لاستخبارات الفضاء الخارجي والمركز القومي للاستخبارات الأرضية نتج عن تحليل المفتش العام للصور ٦٤٠ عملية تقييم لصور الأقمار الصناعية ومنتجات الصور (انظر الشكل ٤-٢).

الجدول ٤-٤

الصور التي جرى تقييمها لدعم تقييمات المشاريع

عدد منتجات الصور	نوع المشروع
١١	محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة
٧	نظام معالجة المياه أر ٣ في مدينة الصدر
٣	مدرسة القدس
٣	مدرسة المعلمين
٣	مدرسة الفاو
٣	مدرسة الاقتدار
٢	مدرسة الصخرة
٢	مدرسة شربيل
تقييمات للمتابعة	
٧	طرق المثنى
٦	مرفق إعادة التأهيل في دهوك
٥	مكتبة كربلاء
٣	المخفر الحدودي في الشيب-ميسان
٣	مركز شرطة بابل- مهمات خاصة
٢	سد الموصل
٢	وزارة الداخلية في كردستان

عمليات التفتيش للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

منتجات إضافية	
١٠	نقطة الدخول في تريبيل - الأنبار
٩	نطة الدخول في عرعر- الأنبار
٤	محطة تكرير النفط في صلاح الدين- بيجي
٤	نقطة الدخول في الوليد- الأنبار
٣	نقطة الدخول في القيام- الأنبار




DigitalGlobe 2008 ©

صور جوية التقطت في ٢٥/٦/٢٠٠٨ لمبنى وزارة الداخلية في حكومة إقليم كردستان التي قيمها المفتش العام في السابق بموجب تقريره SIGIR PA-08-119

عمليات التفقيش للمفتش العام لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الشكل ٢-٤
تقييم الصور الجوية

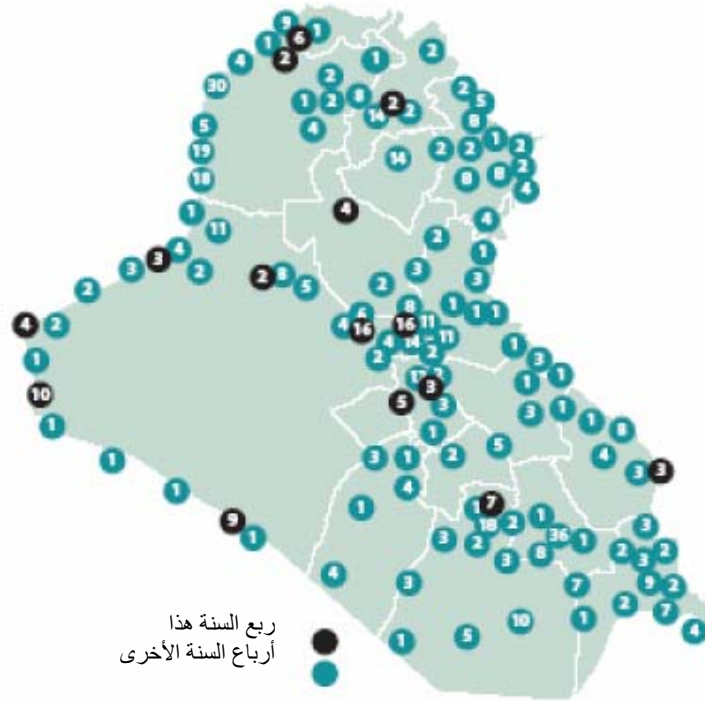

تحقيقات المفتش العام

يستمر المفتش العام العمل على تحقيقاته مع مجموعة واسعة من الشركاء من الوكالات الأميركية لمتابعة الادعاءات بالاحتيال والهدر وإساءة الاستعمال في أعمال إعادة إعمار العراق من خلال تنفيذ ٦٧ عملية تحقيق مفتوحة. في ربع السنة هذا، تم تعيين ٥ مسؤولين في بغداد و ٨ وكلاء خاصين في المركز الرئيسي للمفتش العام في ارلنغتون، فيرجينيا و ١١ وكيل خاص في مكاتب المفتش العام في بنسلفانيا، فلوريدا، أوهايو، ميتشيغن، ماريلاند وتكساس لدعم التحقيقات الجارية وقوات المهمات في تلك المناطق.

حتى هذا التاريخ نتج عن عمليات التحقيق التي أجراها المفتش العام توقيف ١٦ شخصاً، إدانة ١٨ آخرين، إصدار الحكم على ١١ متهم، ٥ أحكام بالسجن وأكثر من ١٧ مليون دولار في غرامات، مصادرات، استعادات واسترجاعات. يواجه حالياً ثلاثة متهمين المحاكمة في المحكمة الفدرالية في ترنتون، نيو جيرسي وينتظر أربعة متهمون آخرون تحديد موعد محاكمتهم.

أنظر الملحق (ل) للحصول على قائمة شاملة بالاتهامات والادانات الصادرة.

الإجراءات القانونية خلال ربع السنة هذا

في ربع السنة هذا، استمر المفتش العام في تحقيقاته ليقود عدداً من الدعاوى تتعلق بإعادة إعمار العراق.

بدء محاكمة جديدة في أيلول/سبتمبر

يواجه حالياً ثلاثة أشخاص متهمون بالتآمر ومن مدبري "خطة بلوم ستاين" المحاكمة في المحكمة الفدرالية في ترنتون، نيو جيرسي. اتهم الكولونيل كيرتيس وايتفورد، العقيد مايكل ويلر والمدني سايمور موريس جونيور ب ٢٥ تهمة بهذه الخطة، بضمنها التآمر، الرشوة، تبييض الأموال وغير ذلك. كان وايتفورد موظفاً كبيراً في سلطة التحالف المؤقتة (CPA) وعمل ويلر مستشاراً لسلطة التحالف المؤقتة لمشاريع إعادة إعمار العراق، وكان موريس يملك ويدير شركة خدمات مالية في قبرص.

وجهت التهم أيضاً إلى شخصين آخرين وهما: الكولونيل دييورا هاريسون، نائبة مراقب الحسابات في سلطة التحالف المؤقتة. في الجنوب الأوسط التي أشرفت على إنفاق أموال سلطة التحالف المؤقتة، الجنوب الأوسط على مشاريع إعادة الإعمار، وزوجها وليام درايفر. اعترفت هاريسون بالتهمة الموجهة إليها، أما درايفر، فسوف يحاكم في وقت لاحق.

عند إرسال هذا التقرير ربع السنوي إلى المطبعة، كانت هيئة المحلفين تناقش الأمر. في تقرير المفتش العام لربع سنة كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨ سوف يزود المفتش العام تفاصيل نتائج المحاكمة. حقق المفتش العام بهذه القضية سوية مع الوكالة الأميركية لفرض قوانين الهجرة والجمارك (JCE) ومصلحة ضريبة الدخل في الولايات المتحدة (IRS) ومكتب التحقيقات الفدرالية.

الرشوة في معسكر عريفجان

في ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٨، اعترف رائد في الجيش الأميركي بتهمة تلقي رشوى والتأمر لارتكاب الرشوة عندما كان ضابط عقود في معسكر عريفجان في الكويت عام ٢٠٠٥، وعام ٢٠٠٦. استناداً إلى اتفاقية الإقرار بالذنب الموقعة في ١٣ آب/أغسطس ٢٠٠٨ في محكمة محلية في مقاطعة كولومبيا، اشترك **الرائد جيمس مومون جونيور** في مؤامرة جنائية لقبول رشوى نقدية من خمس شركات متعاقدة مع وزارة الدفاع زودت سلعاً وخدمات إلى القواعد العسكرية الأميركية في الكويت. ومقابل ذلك، منح عقوداً واتفاقيات شراء إلى هؤلاء المقاولين. وافق مومون على قبول رشوة بمبلغ ٥,٨ مليون دولار من المتأمرين معه كدفعة مقابل أعماله. يواجه مومون حكماً بالسجن لمدة خمس سنوات عن مادة التأمر وحتى ١٥ سنة عن كل رشوى، كما دفع غرامات بقيمة ٢٥٠ ألف دولار عن كل اتهام موجه إليه. وافق مومون أيضاً على الاعتبار ان مبلغ ٥,٨ مليون دولار يعود للخزينة الأميركية.



نظام خزن أقدار المجاري الصحية المنهار في أكاديمية الشرطة في الحلة. مثال للإنشاء السيئ بموجب عقود ممنوحة إلى فيليب بلوم



تعزيز أسطح المبنى المنهار في أكاديمية الشرطة في الحلة، مثال آخر للإنشاء السيئ بموجب عقد منح إلى بلوم

حقق المفتش العام بهذه القضية كما حققت بها كل من قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميركي ووحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية ودائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع، مكتب التحقيقات الفدرالية، وكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك ومصحة ضريبة الدخل.

في ٤ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، ردت هيئة محلفين فدرالية كبرى في مقاطعة كولومبيا إدانة معلقة ضد **مقاول مدني** لاتهامه بدفع رشاوى إلى موظفي العقود في الجيش الأميركي في معسكر عريفجان ولارتكاب عمليات احتيال سلبي (عبر شبكة الاتصالات السلبي). الإدانة المعلقة تتهم المقاول بمادة تأمر واحدة لارتكاب الرشوة، وبمادتين، لتقديم الرشوة. وبمادتين للاحتيال السلبي. أدين المقاول بالأساس في ٢٠ تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧ ووجهت إليه مادة واحدة لتقديم الرشوة إلى مسؤول عقود في الجيش الأميركي في معسكر عريفجان. أدار المقاول عدة شركات كانت لها عقود مع الهيئات العسكرية في الكويت بضمنها شركة فريدم كونسلتنغ اند كاترينغ كومباني (FCC) وشركة توتال غوفرمانت إيجيانس (TGA). عكست الإدانة المعلقة ان شركة فريدم كونسلتنغ اند كاترينغ كومباني وشركة توتال غوفرمانت إيجيانس تلقنا تقريباً ١٧ مليون دولار من عقود لتسليم المياه المعبأة وإقامة سياج أمني لوزارة الدفاع في الكويت والعراق، وتدعي أن المقاول قدم الرشوة إلى رائدين في الجيش الأميركي كانا مسؤولين عن عقود الجيش في معسكر عريفجان بين عام ٢٠٠٤ و٢٠٠٦.

في ٩ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، اعترف ديفيد ريكاردو راميرز موظف عقود وزارة الدفاع في قاعدة بلد الجوية في العراق بذنبه أمام محكمة محلية أميركية، في سان انطونيو، تكساس في تهم تهريب الأموال النقدية وتركيب المعاملات المصرفية لتجنب الإبلاغ عن

تحقيقات للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

الأموال النقدية. في آذار/مارس ٢٠٠٨، أدين راميرز بتهم تهريب الأموال النقدية وتركيب المعاملات. نتيجة الاعتراف بالذنب وافق راميرز على ان يسجن في كانون الثاني/يناير ٢٠٠٩ لمدة ٥٠ شهراً وان تصدر شقة بقيمة ٩٥ الف دولار وقطعة ارض بقيمة ٢٥ الف دولار ودراجة دوكاتي ٢٠٠٧ بقيمة ٣٣ الف دولار، وسيارة لامبورغيني ١٩٨٩ بقيمة ٨٠ الف دولار. كان المبلغ الإجمالي للأموال النقدية المشمولة ١٥٩،٤٢٥ دولار.

أرسلت الأموال المذكورة من قاعدة بلد إلى تكساس حيث أودعت في حسابه من كانون الثاني/يناير إلى تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٧. عمل راميرز مع شركة رديناس مانيجمنت سابورث (RMS) وعمل كمقاول متعاقد مع وزارة الدفاع في قاعدة بلد الجوية من تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٦ إلى تشرين الثاني/نوفمبر ٢٠٠٧. كان لشركة رديناس مانيجمنت سابورث عقود مموله من صندوق قوات الأمن العراقية بقيمة تزيد عن ٣٣ مليون دولار كما عقود مع قيادة السلاح الجوي الأميركي مموله من أموال العمليات والصيانة لقوات السلاح الجوي الأميركي. ساعد راميرز في تخطيط إنشاء مرافق القاعدة الأساسية. لم يفش راميرز عن سجله الإجرامي الطويل الذي شمل حكماً بالقتل من الدرجة الثانية.

يحقق المفتش العام بهذه القضية سوية مع وحدة الكشف عن الاحتيال في مشتريات الجيش الأميركي، مكتب التحقيقات الخاصة للسلاح الجوي الأميركي، وكالة فرض قوانين الهجرة والجمارك ومكتب التحقيقات الفدرالي.

التوقيف والحظر

منذ صدور تقرير المفتش العام ربيع السنوي في تموز/يوليو ٢٠٠٨، أوقف فرع كشف الاحتيال في مشتريات الجيش الأميركي ٣٣ شخصاً وشركة آخرين استناداً إلى ادعاءات بالاحتيال وإساءة السلوك المرتبطة بإعادة الإعمار واحتيال المقاولين في العراق والكويت وأفغانستان مما جعل مجموع الذين أوقفوا عن العمل حتى هذا التاريخ ١٠١ حالة. بالإضافة إلى ذلك، تم اقتراح إدخال ٢٦ فرداً وشركة في الحظر مما جعل مجموع حالات الحظر المقترحة يصل إلى ٦٩. حظر التعامل مع ١٦ شركة إضافية وأفراد إضافيين. أصبح الآن مجموع حالات الحظر ٤١ عملية. منذ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٥ عمل المفتش العام عن كثب مع وزارة العدل قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش، مكتب خدمات التحقيق من الجرائم المرتبطة بوزارة الدفاع وفرع الاحتيال في المشتريات في الدائرة القانونية للجيش الأميركي من اجل التدقيق المؤقت وحظر التعامل مع مقاولين بسبب الاحتيال او الفساد داخل الجيش بضمنهم عقود لإعادة إعمار العراق أو عقود دعم الجيش في العراق وأفغانستان. تنشأ هذه القضايا نتيجة الادانات الجنائية الصادرة من المحاكم المحلية الفدرالية وادعاءات عدم مسؤولية المقاول التي يحتاج إثباتها فحصاً يستند إلى وقائع من قبل المسؤول عن التدقيق المؤقت والحظر في الجيش.

مشروع مراجعة فواتير دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية من قبل المفتش العام

يستمر المفتش العام في دعم مشروع مراجعة فواتير دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية (DFAS) في روما، نيويورك. أطلقت دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع هذا المشروع المتفاعل لتحليل أكثر من ١٠ مليارات دولار دفعت بموجب سندات دفع تتعلق بمشتريات الجيش الأميركي لدعم جهود الحرب في العراق. حدد المشروع نشاطات احتيالية مشكوك بأمرها تتعلق بجهود الحرب في العراق، وتم إحالة قضايا إلى وكالات فريق عمل الفساد في العقود الدولية (TCCTF). بما في ذلك المفتش العام، للتحقيق فيها.

تم الحصول على معلومات حول نظام الذمم الدائنة التجارية (CAPS) من محطات الدفع المنتشرة وأدخلت هذه المعلومات في قاعدة البيانات التي سوف تستعمل لتحديد نشاطات الاحتيال من خلال استخراج البيانات الضرورية منها. يشمل ذلك حوالي ٨٠٠ الف مستند دفع بقيمة إجمالية تتراوح بين ١٣ مليار دولار إلى ١٤ مليار دولار. بالإضافة إلى الجهود التحليلية لرفع القضايا، زودت بيانات مراجعة فواتير الدائرة المالية والمحاسبة الدفاعية لتستعمل من قبل الوكالات المشاركة لدعم التحقيقات الجارية التي تشمل الاحتيال والفساد في العراق.

بدأت دائرة المالية والمحاسبة الدفاعية بتصوير كافة المستندات التاريخية المتعلقة بالدفعات الطارئة لدائرة المالية والمحاسبة الدفاعية في روما. أرسلت هذه الدائرة معدات تصوير (سكانرز) إلى العراق والكويت لتصوير مستندات القيد الجديدة وهي في طور المعالجة لدفعها. سمحت الدائرة بالاطلاع على هذه البيانات من أجل رفع قضايا جديدة ودعم التحقيقات الجارية. سوف تساعد قاعدة البيانات هذه الخاصة بدائرة المالية والمحاسبة الدفاعية سوية مع قاعدة بيانات نظام الذمم الدائنة التجارية المحققين في متابعة قضايا الاحتيال في جنوب غرب آسيا.

تحقيقات للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

تحقيقات أخرى للوكالة في العراق

ينسق المفتش العام بانتظام مع وكالات حكومية أخرى تجري تحقيقات في العراق. راجع الجدول ٤-٥ لمعرفة نشاطات التحقيق التي تقوم بها وكالات أخرى.

الجدول ٤-٥

معلومات زودتها وكالات أميركية أخرى كما كانت في ٢٠٠٨/٩/٣٠.

المحققون في العراق	المحققون في الكويت	قضايا مفتوحة/جارية
٨	٤	٩٦
وحدة الكشف على الاحتيال/في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميركي		
٦	٢	١٣٤
دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع		
٠	٠	٤
مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية		
٤	٢	٧٩
مكتب التحقيقات الفدرالية		
٢	٠	٦
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية		
٢٠	٨	٣١٩
المجموع		

ملاحظة: الأرقام تشمل قضايا معلقة تجري متابعتها مع وكالات أخرى.

خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR)

يسهل خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام إعداد التقارير حول الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء الإدارة، والانتقام في كافة البرامج المترافقة مع جهود إعادة إعمار العراق الممولة من دافع الضرائب الأميركي. عندما يتلقى خط الاتصال المباشر للمفتش العام قضايا، ليس لها علاقة بالبرامج والعمليات الممولة بأموال أميركية مخصصة أو متوفرة لإعادة إعمار العراق، يحول المفتش العام هذه القضايا إلى الجهات المناسبة. يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام زيارات شخصية، أو اتصالات عبر الهاتف، أو بالبريد، أو بالفاكس، أو عبر شبكة الإنترنت من العراق والولايات المتحدة ومن كافة أنحاء العالم.

تقرير ربع السنة الثالث

بحلول ٣٠ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، أدى خط الاتصال المباشر للمفتش العام إلى بدء التحقيق في ٦٨١ قضية، منها ٥٩٢ قضية أغلقت، و ٨٩ قضية لا زالت مفتوحة حالياً. أنظر الجدول ٤-١ للحصول على ملخص هذه القضايا المفتوحة.

القضايا الجديدة

خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، تلقى خط الاتصال المباشر للمفتش العام ١٧ شكوى جديدة ليصبح العدد المتراكم للقضايا ٦٨١ قضية عبر خط الاتصال المباشر. وقد صنفت الشكاوى الجديدة حسب الفئات التالية:

- ١٢ شكوى تتعلق بالاحتيال.
- شكويان تتعلقان بمسائل متنوعة
- شكويان تتعلقان بمسائل شخصية
- شكوى واحدة تتعلق بالهدر

يتلقى خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام معظم تقارير الاحتيال، والهدر، وسوء الاستخدام، وسوء الإدارة، والانتقام بواسطة البريد الإلكتروني. تلقى هذا الخط ١٧ شكوى جديدة عبر الوسائل التالية:

- ١٠ بواسطة البريد الإلكتروني.
- ٥ عبر موقع الإنترنت للمفتش العام.
- ٢ بواسطة اتصالات هاتفية عبر خط الاتصال المباشر للمفتش العام.

القضايا المغلقة

خلال ربع السنة الحالي، جرى إغلاق ٩ قضايا كان قد أُبلغ عنها بواسطة خط الاتصال المباشر:

- ٧ قضايا أُحيلت إلى وكالات أخرى للمفتشين العاميين.
- قضية صُرف النظر عنها لكونها خارج نطاق تحقيقات المفتش العام.
- شكوى واحدة أُغلقت من جانب المحققين لدى المفتش العام.

الجدول ٤-٦

موجز قضايا خط الاتصال المباشر لدى المفتش العام كما كانت في ٣٠/٩/٢٠٠٨.

القضايا المفتوحة				
٧٧	تحقيقات			
١١	تدقيق			
١	تفتيش			
٨٩	مجموع القضايا المفتوحة			
القضايا المغلقة	الربع الأول ٢٠٠٨	الربع الثاني ٢٠٠٨	الربع الثالث ٢٠٠٨	المجموع التراكمي*
قانون حرية الإعلام	٠	٠	٠	٤
مراجعة قيادة الدعم التشغيلي	٠	٠	٠	٢
عمليات مساعدة	١	٠	٠	٤٦
قضايا صُرف النظر عنها	٤	٣	١	١٢٠
قضايا أُحيلت	١٠	١٠	٧	٢٥٩
عمليات تفتيش	٠	٠	٠	٧٩
تحقيقات	١	١	١	٧٣
تدقيقات	٠	٠	٠	٩
مجموع القضايا المغلقة	١٦	١٤	٩	٥٩٢
المجموع التراكمي* للقضايا المفتوحة والمغلقة	٦٨١			

* تغطي المجاميع التراكمية الفترة منذ بدء تشغيل خط الاتصال المباشر أي من ٢٤/٣/٢٠٠٤ إلى ٣٠/٩/٢٠٠٨.

الشكاوى المُحالَة

بعد إجراء مراجعة شاملة أُحيلت عشر شكاوى إلى وكالات خارجية لاتخاذ الإجراء المناسب.

- ٥ شكاوى أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع
- شكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى القوات المتعددة الجنسيات في العراق.
- شكوى واحدة أرسلت إلى مكتب المفتش العام لدى قيادة الجيش

موقع الإنترنت للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق


خلال الفترة التي يشملها هذا التقرير، سجّل موقع المفتش العام على الإنترنت (www.sigir.mil) النشاطات التالية:

- زار أكثر من ٩٤ ألف شخص موقع المفتش العام على الإنترنت خلال ربع السنة هذا، أي أكثر بقليل من ١٠٢٥ زائر باليوم.
- كان معظم الزوّار من داخل الولايات المتحدة (٨٠٪). وجاءت النسبة المتبقية من الزوار البالغة ٢٠٪، من ١٦٥ دولة مختلفة وبصورة رئيسية من أوروبا الغربية (٧٪) وآسيا (٤٪) والشرق الأوسط (٢٪).
- في ربع السنة هذا، تلقى قسم اللغة العربية للموقع ما يزيد عن ١٤٨١ زيارة.
- جاءت نسبة ذات شأن من الزائرين لموقع المفتش العام على الإنترنت من وكالات أميركية حكومية، وبصورة خاصة من وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ومن مجلس النواب الأميركي.
- زار المستخدمون دائماً قسم إعداد تقارير المفتش العام.
- كانت أكثر المستندات التي تمّ استنساخها آخر تقارير المفتش العام ربع السنوية المرفوعة إلى الكونغرس.

أنظر الشكل ٤-٣ للحصول على نظرة عامة حول الزيارات اليومية لموقع المفتش العام على الإنترنت.

الشكل ٣-٣

معدل عدد الزائرين في اليوم لموقع المفتش العام على الإنترنت

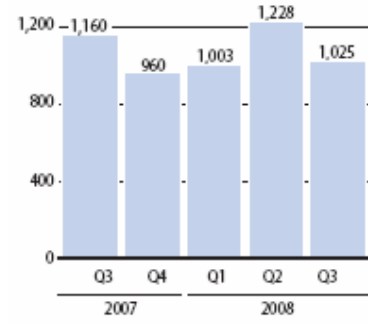

المصدر: تحليلات شبكة الإنترنت، كما كانت في ٢٠٠٨/٩/٣٠.

تحديث معلومات التشريعات

في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، وقع الرئيس القانون رقم 110-417، وهو ن دونكان هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة المالية ٢٠٠٨. أدخل هذا القانون تغييرات مهمة تؤثر على برنامج إعادة إعمار العراق وسياسة التمليك الفدرالي. تبدو عدة تغييرات على أن المقصود منها التعامل مع مسائل أثرت في سياق عمل المفتش العام.

وأيضاً في ١٤ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، وقع الرئيس القانون 110-409، وهو ن إصلاح المفتشين العاملين لعام ٢٠٠٨. غير هذا القانون الطريقة التي سوف تتبعها مكاتب المفتش العام عبر الفروع الحكومية، مثل النص بأن المفتشين العاملين يتلقون مشورة قانونية مستقلة. كانت هذه التغييرات بدرجة كبيرة منفذة بالنسبة للمفتش العام.

قانون دونكان هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة المالية ٢٠٠٩ (القانون العام -110-417).

المقاولون الذين يؤدون مهمات أمنية في مناطق العمليات الحربية. يوسع القسم 853 من قانون دونكان هانتر لتفويض الدفاع القومي للسنة المالية ٢٠٠٩ (القانون) فئات الحوادث التي يجب على مقاولي الأمن الخاص العاملين في مناطق عمليات القتال الإبلاغ عنها. أعاد القانون التشديد على وجوب التزام مقاولو الأمن الخاصين العاملين لدى كافة الوكالات الفدرالية بالأنظمة التي نص عليها وزير الدفاع وقوانين وأنظمة مطبقة أخرى وأوامر وتوجيهات صادرة من القادة في ساحة القتال:

جرائم يرتكبها مقاولون

بموجب القسم 854 من القانون، يطلب من وزير الدفاع أن يبلغ عن الجرائم المرتكبة ضد موظفي المقاولين في العراق وأفغانستان وأن يضمن تلقي هؤلاء الضحايا المساعدة الملائمة. ينطبق هذا القسم على المقاولين المتعاقدين مع وزارة الدفاع ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية وبضمنهم الأفراد او المقاولين من الباطن من أي مستوى كانوا.

قانون القيود على استخدام القوات المسلحة

يوسع القسم 855 من القانون بضع القوانين المتعلقة بالقيود على استخدام القوات المسلحة الأميركية في بعض الظروف.

اتفاقية وضع القوات

يفرض القسم 1212 من القانون تقديم تقرير مفصل عن (أو تزويد نص) حول اتفاقية وضع القوات التي قد تتوصل إليها الولايات المتحدة مع العراق.

فِرَق إعادة إعمار محافظات العراق بقيادة الولايات المتحدة

يفرض القسم 1213 من القانون أن يكون لدى الرئيس استراتيجية تضمن (١) أن تدعم فِرَق إعادة إعمار المحافظات في العراق الأهداف الاستراتيجية والعملائية لقوات التحالف في العراق و(٢) أن تطور فِرَق إعادة إعمار المحافظات في العراق قدرات الحكومة العراقية وغيرها من المؤسسات المدنية بغية تولي مسؤولية متزايدة عن صياغة وتطبيق والإشراف على نشاطات إعادة الإعمار والتنمية.

برنامج الاستجابة الطارئة للقائد

يفرض القسم 1214 من القانون تخصيص مبلغ ١,٧ مليار دولار لنشاطات هذا البرنامج للسنة المالية ٢٠٠٨، و١,٥ مليار دولار للسنة المالية ٢٠٠٩.

يفرض هذا القسم أيضاً حداً بقيمة ٢ مليون دولار على قيمة أموال برنامج الاستجابة الطارئة للقائد التي يمكن المساهمة بها في أي مشروع إنساني أو إعادة إعمار فردي في العراق. يسمح البند لوزارة الدفاع بإلغاء هذا التحديد في حال قرر الوزير ان الإلغاء ضروري لتلبية حاجات إغاثة إنسانية وإعادة إعمار مستعجلة لتقديم المساعدة الفورية الشعب العراقي. لا ينطبق هذا التحديد إذا كانت الأموال المدارة من قبل وزارة الدفاع بموجب برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وردت من خارج وزارة الدفاع. ينص البند أيضاً على وجوب ان يشهد وزير الدفاع او نائبه بان أي مشروع ممول بأموال من برنامج الاستجابة الطارئة للقائد بمستوى مليون دولار أو اكثر يعالج حاجات إغاثة إنسانية وإعادة إعمار مستعجلة لتقديم المساعدة الفورية إلى الشعب العراقي.

يفرض التعديل وجوب إدخال عناصر إضافية في تقارير برنامج الاستجابة الطارئة للقائد المرفوعة إلى لجنتي الدفاع في الكونغرس. وهو يعبر عن شعور الكونغرس بأن على الحكومة العراقية ان تتولى مسؤولية متزايدة لتمويل وتنفيذ مشاريع مموله حالياً من قبل الولايات المتحدة عبر برنامج الاستجابة الطارئة للقائد وان تتولى الحكومة العراقية كافة الاكلاف المترافقة مع تنظيم أبناء العراق بأسرع وقت ممكن.

فِرَق إنتقال رجال الشرطة

ينص القسم 1218 من القانون على إجراء دراسة وإعداد تقرير مع توصيات من قبل وزير الدفاع بالتشاور مع وزير الخارجية والحكومة العراقية، حول فِرَق انتقال رجال الشرطة لتدريب ومساعدة وتقديم المشورة إلى دائرة الشرطة الوطنية العراقية.

القيود على صندوق قوات الأمن العراقية

يخضع القسم 1505 من القانون الأموال المفوضة بموجب القانون، او المخصصة في قانون التخصيصات التكميلية للعام ٢٠٠٨ (القانون العام 110-252) والموضوعة تحت تصرف وزارة الدفاع لصالح صندوق قوات الأمن العراقية، إلى الشروط الموضوعة في الأقسام الفرعية (ب) إلى (ز) من القسم 1512 من قانون تفويض الدفاع القومي للسنة المالية ٢٠٠٨ (القانون العام 110-181). تتعلق هذه الشروط بأنواع المساعدة المسموحة، وهي الطلب بأن يوافق وزير الخارجية بالنسبة للمساعدة المزودة، على بعض سلطات الانتقال وهي الطلب بأن يوافق البيانات والتقارير المطلوب تزويدها إلى الكونغرس وعلى مسائل أخرى.

منع استعمال الأموال الأميركية لمشاريع مرافق معينة في العراق والمشاركة العراقية في اكلاف عمليات معينة

يفرض القسم 1508 من القانون استعمال أموال فوض بتخصيصها بموجب البند الخامس عشر من القانون او في الفصل ٢ من البند التاسع عشر من قانون التخصيصات التكميلية للعام ٢٠٠٨ (وبوجه عام لصندوق قوات الأمن العراقية) أو ان يُلتزم بها أو إنفاقها للتملك، تحويل، إعادة تأهيل أو تركيب مرافق لاستعمال الحكومة العراقية، أو الفروع السياسية في العراق او الوكالات، الدوائر او قوات الحكومة العراقية أو فروعها.

استثنى القسم 1508 برنامج الاستجابة الطارئة للقائد، الإنشاءات العسكرية (كما حددت في القانون) او المساعدة الفنية.

يفرض القسم 1508 أيضاً على ان تبدأ الحكومة الأميركية بالتفاوض من أجل التوصل إلى اتفاق مع الحكومة العراقية لتقاسم اكلاف العمليات المشتركة بين الحكومة العراقية والقوات المتعددة الجنسيات في العراق. ينص البند على ان تعمل الحكومة الأميركية على ضمان استعمال الأموال العراقية لدفع اكلاف التدريب، التجهيز والاستدامة لقوات الأمن العراقية. يجب إعداد تقارير حول جهود الحكومة الأميركية بشأن الأعمال والمفاوضات المذكورة في هذه الفقرة.

مسائل التملك

بالإضافة إلى البنود الثلاثة المذكورة أعلاه (المتعلقة بالأقسام 853 حتى 855 من القانون)،- يتضمن البند الثامن من القانون عدداً من التغييرات الأخرى البعيدة التأثير على قانون التملك الفدرالي:

- ينص القسم 833 على تسريع سلطة التوظيف للقوى العاملة في حقل التملك.
- يفرض القسم 834 أن توضع السياسات ضمن المنظمات الرئيسية لوزارة الدفاع من أجل تزويد مسارات مهنية تستقطب أعلى نوعية من الموظفين العسكريين إلى حقل التملك، بما في ذلك حجز بيوت مختارة لإيواء الضباط العامين وضباط الأركان.

يهدف من القسم 841 إلى تقوية الإجراءات الوقائية الأخلاقية المتعلقة بتضارب المصالح للمقاول عند أدائه مهام تملك مرتبطة بوثوق بمهام حكومية، بما في ذلك إعداد ومنح وإدارة العقود الحكومية.

- يفرض القسم 843 اعتماد استراتيجية تملك لتأمين قانون قواعد الدفاع.
- يفرض القسم 844 إعداد تقارير حول استخدام الشركات التابعة في الخارج من قبل مقاولي العقود الدفاعية.
- القسم 862 يحدد بوجه عام مدة عقود غير تنافسية معينة سنة واحدة على الأكثر.
- يفرض القسم 864 تعديل نظام التملك الفدرالي بحيث يؤمن أنظمة إضافية حول استعمال العقود التي تسترد نفقاتها كما يفرض إعداد تقارير حول هذه العقود من قبل مكتب الإدارة والموازنة ومراجعة المفتشين العامين في وكالات تنفيذية معينة لمسألة تقييد الوكالة بالأنظمة الجديدة.
- يفرض القسم 866 أنظمة إضافية لوكالات غير وزارة الدفاع من أجل تخفيف الاستعمال المفرط لطبقات المقاولين من الباطن الذين لا يضيفون أية قيمة، ومن أجل التحقق من أن المقاولين أو المقاولين من الباطن لا يتلقون أكلاف أو فوائد غير مباشرة عن العمل المنفذ من قبل مقاولين من الباطن من الطبقة الأدنى منهم عندما لا يضيف إليه المقاول من الطبقة الأعلى أية قيمة.
- يفرض القسم 867 وجود رابط بين رسوم المكافأة والحوافز ونتائج التملك في وكالات غير وزارة الدفاع.
- ينص القسم 870 تشكيل "هيئة عقود للطوارئ على نطاق الحكومة" تتألف من موظفين حاليين في الحكومة الفدرالية وأعضاء من القوات المسلحة جاهزين للانتشار من أجل الاستجابة إلى كارثة طارئة أو كبيرة، أو عملية غير متوقعة، تحصل داخل أو خارج الولايات المتحدة.

- ينص القسم 872 على أن يؤسس مدير إدارة الخدمات العامة قاعدة بيانات للمعلومات المتعلقة بنزاهة أداء الأشخاص الذين تمنح لهم عقود من وكالات فدرالية. يجب ان تشمل قاعدة البيانات هذه معلومات حول إذا كان الشخص الذي منح عقد فدرالي أو هبة فدرالية قد أدين بجريمة، وجد في قضية إدارية او مدنية بأنه كان على خطأ فرض عليه دفع غرامة او إعادة دفع مبالغ، استرجاع مبالغ او أضرار من حجم محدد، أو أوقف أو حظر التعامل معه، دخل طرفاً في اتفاقية إدارية لحل مسألة توقيفه أو حظره عن العمل، او جرى إلغاء عقد فدرالي معه او هبة فدرالية مقدمة له بسبب التقصير.

يجب على المسؤول الذي يمنح هبة أو عقد رسمي تتجاوز قيمته حد التملك المبسط أن يراجع قاعدة البيانات ويدرس المعلومات الواردة فيها فيما يخص أي اقتراح أو عند اتخاذ أي قرار مسؤول أو تقييم أداء سابق لمقدم العقد.

الإدارة المدنية لإعادة الإعمار والاستقرار

البند السابع عشر من القانون يدمج العديد من أحكام قانون عام ٢٠٠٨ (HR1084) للإدارة المدنية لإعادة الإعمار والاستقرار الذي صادق عليه مجلس النواب في ٥ آذار/مارس ٢٠٠٨ وقانون مرافق أرسل إلى مجلس الشيوخ رقم S613 الذي أبلغت عنه لجنة مجلس الشيوخ للعلاقات الخارجية في ١٠ نيسان/أبريل ٢٠٠٧ ولكن لم يعمل به من قبل مجلس الشيوخ بكامل أعضائه.

- ينشئ القسم 1605 داخل مكتب منسق إعادة الإعمار والاستقرار في وزارة الخارجية هيئة الجهوزية للاستجابة وهيئة الاحتياط المدني لتزويد المساعدة دعماً لعمليات إعادة الإعمار والاستقرار.
- يوجه القسم 1607 وزير الخارجية بالتشاور مع مدير الوكالة الأميركية للتنمية الدولية نحو وضع استراتيجية للوكالات تستجيب لعمليات الاستقرار وإعادة الإعمار.
- يوجه القسم 1608 وزير الخارجية بأن يقدم تقارير سنوية إلى لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ والى لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب حول تطبيق أحكام العنوان السادس عشر.

إشراف
الوكالات
الأخرى

المقدمة
تدقيقات الوكالات الأخرى
تحقيقات الوكالات الأخرى

القسم ٥

المقدمة

في آذار/مارس ٢٠٠٤، شكل المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR) مجلس المفتشين العامين العراقي (ICG) لتوفير منتدى لمناقشة عملية الإشراف في العراق ولتعزيز التعاون والتشارك بين المفتشين العامين التابعين للوكالات التي تشرف على صناديق تمويل إعادة إعمار العراق. يجتمع في كل ربع سنة الممثلون عن الوكالات الأعضاء في المجلس لتبادل التفاصيل المتعلقة بعمليات التدقيق الحالية والمخطط لتنفيذها، ولتحديد الفرص المتاحة للتعاون ولتخفيف التكرار إلى الحد الأدنى.

عُقد آخر اجتماع في ٢٠ آب/أغسطس ٢٠٠٨ في مكتب المفتش العام في أرلنغتون بولاية فرجينيا. وقد حضرت الاجتماع الوكالات التالية:

- مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع (DoD OIG).
- مكتب المفتش العام لدى وزارة الخارجية (DoS OIG).
- وكالة التدقيق لجيش الولايات المتحدة (USAAA).
- مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG).
- مكتب المحاسبة الحكومية (GAO).
- وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA).
- المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR).

في كل ربع سنة، يطلب المفتش العام معلومات محدثة من المنظمات الأعضاء حول نشاطاتها الإشرافية المنجزة والجاري تنفيذها والمخطط لتنفيذها. يلخص هذا القسم عملية التدقيق والتحقيقات التي أبلغت إلى المفتش العام في ربع السنة هذا من قبل مكتب المفتش العام لدى وزارة الدفاع، مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، مكتب المحاسبة الحكومية ووكالة تدقيق العقود الدفاعية. بالنسبة للمعلومات المحدثة لوكالة تدقيق العقود الدفاعية، أنظر الملحق (م)، لم تكمل وزارة المالية ووزارة التجارة أو تبدأ بتنفيذ أية عمليات تدقيق جديدة في ربع السنة هذا.

تدقيقات الوكالات الأخرى

يحدّث هذا القسم معلومات التدقيق التي نقلتها الوكالات الأعضاء في مجلس المفتشين العامين العراقي (IIGC) إلى مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق (SIGIR).

- أنظر الجدول ١-٥ للاطلاع على تقارير الإشراف المكتملة حديثاً
- أنظر الجدول ٢-٥ للاطلاع على نشاطات الإشراف الجاري تنفيذها من قبل وكالات أميركية أخرى خلال فترة إعداد هذا التقرير.
- أنظر الملحق (م) للحصول على معلومات إضافية حول عمليات التدقيق التي قامت بها وكالات أخرى بضمها موجزات التدقيق.
- أنظر الملحق (ن) للحصول على قائمة تاريخية لعمليات التدقيق والمراجعات حول إعادة إعمار العراق التي قامت بها كافة الهيئات.

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ١-٥

تقارير الإشراف المنجزة مؤخراً على يد وكالات أميركية أخرى حتى ٢٠٠٨/٩/٣٠

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D-2008-137	٢٠٠٨/٩/٣٠	مراقبات حول دورة حياة بطاقة الوصول المشترك للمقاول
وزارة الدفاع (DoD)	D-2008-133	٢٠٠٨/٩/٢٥	تقييم متابعة مشتركة لوضع معدات قوات عملية قوات حرية العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D-2008-135	٢٠٠٨/٩/٢٩	طلب تعريف التردد اللاسلكي في العقود الخاصة بالتجهيزات
وزارة الدفاع (DoD)	D-2008-132	٢٠٠٨/٩/٢٦	دفاعات للنقل باستعمال Power Track
وزارة الدفاع (DoD)	D-2008-131	٢٠٠٨/٩/١٦	تعريف الأمن على التردد اللاسلكي
وزارة الدفاع (DoD)	D-2008-115	٢٠٠٨/٨/٦	وضع سيارات التدريب للقوات البرية الأميركية المنتشرة دعماً لعملية حرية العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D-2008-086	٢٠٠٨/٧/١٨	موجز المسائل التي تؤثر على عمليات حرية العراق والحرية الدائمة التي أبلغت عنها منظمات إشراف رئيسية ابتداء من السنة المالية ٢٠٠٣ حتى السنة المالية ٢٠٠٧
وزارة الدفاع (DoD)	D-2008-107	٢٠٠٨/٧/٣	ادعاءات دفاعية تلقاها خط الاتصال المباشر بشأن عقود أصدرتها قيادة إدارة دورة حياة نظام الاتصالات التكتيكية للجيش الأميركية إلى أنظمة BAE البرية والأسلحة، فرقة الأنظمة البرية.
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000IG-0239.000	٢٠٠٨/٧/٣	المساءلة الحسابية عن الذخائر المزودة إلى قوات الأمن العراقية
وزارة الدفاع (DoD)	IE-2008-010	٢٠٠٨/٧/٣١	تقرير معلومات حول تقييم دعم وزارة الدفاع إلى المفتشين العامين لقوات الأمن العراقية
وزارة الخارجية (DoS)	MERO-IQO-08-01	تموز/يوليو ٢٠٠٨	وضع برامج تأشيرات الدخول الخاصة بالمهاجرين العراقيين
وزارة الخارجية (DoS)	MERO-IQO-08-02	تموز/يوليو ٢٠٠٨	وضع معالجة إعادة استيطان اللاجئين من المواطنين العراقيين إلى الولايات المتحدة
وزارة الخارجية (DoS)	GAO-08-905RSU	٢٠٠٨/٩/٢٦	فرق إعادة إعمار المحافظات في العراق وأفغانستان.
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-08-1144T	٢٠٠٨/٩/١٦	تأمين استقرار وإعادة بناء العراق: الإيرادات، النفقات والفوائض العراقية
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-08-1031	٢٠٠٨/٨/٥	تأمين استقرار وإعادة بناء العراق: الإيرادات، النفقات والفوائض العراقية
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-08-1128R	٢٠٠٨/٩/١٥	الحرب العالمية على الإرهاب في التعهدات المبلغ عنها لوزارة الدفاع
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-08-930	٢٠٠٨/٩/١٠	عملية حرية العراق: الأعمال المطلوبة لتعزيز تخطيط وزارة الدفاع لإعادة تمركز القوات الأميركية الخارجية من العراق

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ١-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-08-966	٢٠٠٨/٧/٣١	إعادة بناء العراق: وزارة الدفاع ووزارة الخارجية حسنتا الإشراف والتنسيق على مقاولي الأمن الخاص في العراق ولكن المطلوب تنفيذ أعمال لاحقة لاستدامة التحسينات
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	GAO-08-1021T	٢٠٠٨/٧/٢٣	تأمين استقرار وإعادة بناء العراق في تقرير تقدم العمل: تحقيق بعض المكاسب، استراتيجية محدثة مطلوبة
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0286-ALL	٢٠٠٨/٩/٣٠	إدارة حاويات الشحن في جنوب غرب آسيا، الكويت
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0287-	٢٠٠٨/٩/٣٠	متابعة تدقيق رؤية الأصول وإدارة الحاويات – عملية حربية العراق- القيادة المركزية الأمريكية
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0255-FFS	٢٠٠٨/٩/٣٠	المساءلة الحسابية للمقاولين في ساحة القتال
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0178-FFI	٢٠٠٨/٧/١	مشتريات تشغيلية لمعدات تكنولوجيا المعلوماتية، الأنظمة والخدمات – قيادة قوات الجيش الأمريكي.
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0182-FFS	٢٠٠٨/٧/١٥	تغيير مؤقت لأوامر المحطات والإسكان للجنود المحشودين
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0190-ALM	٢٠٠٨/٧/٢٢	إعادة ضبط المقاييس- صيانة الاستدامة
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0234-FFF	٢٠٠٨/٩/٢	استعمال لاعبي أدوار للتدريب في مراكز التدريب على القتال
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0213-ALA	٢٠٠٨/٩/٥	مبادرة الحشد الميداني السريع-المكتب التنفيذي لبرنامج الجندي فورت بلقوار، فيرجينيا
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0256-ALM	٢٠٠٨/٩/١٧	الإشراف على العقود لإعادة الضبط إلى المستوى الميداني، قيادة الاستدامة للجيش الأمريكي
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-0179-FFI	٢٠٠٨/٩/٢٥	مشتريات تشغيلية لمعدات تكنولوجيا المعلوماتية، مشتريات وخدمات – العراق والكويت
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	E-267-08-005-P	٢٠٠٨/٨/٥	تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/برنامج عمل المجتمع المحلي العراقي
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	E-267-08-004-P	٢٠٠٨/٧/٣	تدقيق الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/برنامج رصد وتقييم الأداء في العراق

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥

نشاطات الإشراف الجارية على يد وكالات أميركية أخرى حتى تاريخ ٢٠٠٨/٩/٠

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AE-0287-0000	٢٠٠٨/٩/٢٣	استعمال تقييم تهديد النظام في تملك المركبات التكتيكية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AB-0266.000	٢٠٠٨/٩/١٨	القوة العاملة للتملك في وكالة إدارة العقود الدفاعية لجنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AE-0280.000	٢٠٠٨/٩/١٦	عقد نظام اكتشاف الألغام المزروعة في الأرض
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LF-0267.000	٢٠٠٨/٩/١٢	عقود البائع الرئيسي للمعدات الطبية/الجراحية لدعم قوات التحالف في العراق وأفغانستان
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FL-0253.000	٢٠٠٨/٩/٣	وزارة الجيش، صيانة مؤجلة لعربة برادلي القتالية نتيجة الحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000JC-0274.000	٢٠٠٨/٨/٢٨	تحديث المعلومات- تقرير موجز حول التحديات المؤثرة على عمليات حرية العراق والحرية الدائمة المبلغ عنها من قبل منظمات إشراف رئيسية ابتداءً من السنة المالية ٢٠٠٣ وحتى السنة المالية ٢٠٠٨
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FN-0230.000	٢٠٠٨/٨/٢٨	وسائل مراقبة ضمان المعلومات على شبكة مؤسسة القوات البحرية الأميركية القارية في الخارج في علاقاتها بالحرب على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LD-0245.000	٢٠٠٨/٨/٢٧	مرافق مسألة مركزية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AS-0270.000	٢٠٠٨/٨/٢٥	تخطيط التحول إلى عقد البرنامج الرابع لزيادة اللوجستية المدنية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D00SPO-0271.000	٢٠٠٨/٨/١٩	المسألة الحسابية لأجهزة الرؤية الليلية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000JA-0263.000	٢٠٠٨/٨/١٤	شروط وزارة الدفاع لاختبار السترات الوقائية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CD-0256.000	٢٠٠٨/٨/٧	الأبحاث حول عقود وزارة الدفاع للسترات الوقائية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000JC-0258.000	٢٠٠٨/٨/٦	تحديث المعلومات حول مياه الشرب والمياه غير الصالحة للشرب في العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FP-0252.000	٢٠٠٨/٨/١	وزارة القوات الجوية، دفعات عسكرية دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AS-0255.000	٢٠٠٨/٧/٣١	عقود تدعم برنامج مكافحة المخدرات والإرهاب في وزارة الدفاع
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AE-0251.000	٢٠٠٨/٧/٢١	استعمال الجيش لرسوم المنح تفرض عند منح العقود لتدعم الحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AE-0247.000	٢٠٠٨/٧/١٨	التملك السريع وحشد حلول المواد داخل القوات البحرية

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AS-0248.000	٢٠٠٨/٧/١٧	دعم لوجستي للقيادة الأميركية للعمليات الخاصة
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LH-0249.000	٢٠٠٨/٧/١٤	عقود الصيانة وإصلاح المعدات للطائرات ومكونات الطائرات التي تدعم قوات التحالف في العراق وأفغانستان
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LF-0241.000	٢٠٠٨/٧/١٤	العناية الصحية المزودة من مرافق المعالجة العسكرية إلى المقاولين في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LH-0250.000	٢٠٠٨/٧/١٤	اختيار أساليب لنقل المواد دعماً لعمليات في العراق وأفغانستان
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-DINT01-0092.005	٢٠٠٨/٦/١٠	التحقيق في إمكانية استعمال المحتمل لمواد تبديل العقل من قبل موظفي وزارة الدفاع خلال استجواب المحتجزين و/أو السجناء الذين القي القبض عليهم خلال الحرب على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-DIPOE2-0196.000	٢٠٠٨/٥/١٢	مراجعة أعمال العقود المتعلقة بقتل الجندي رايان ماسيث بالصدمة الكهربائية.
وزارة الدفاع (DoD)	2008C003 2/7/2008	٢٠٠٨/٢/٧	تقييم استجابة وزارة الدفاع حول الاعتداء الجنسي في مناطق عمليات الحرية الدائمة وحرية العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-DIP0AI-0086.000	٢٠٠٨/١١/٨	متابعة تدقيق العقود المتعلقة بنشاطات إعادة إعمار العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2006-D000AE-0225.000	٢٠٠٨/٧/١٠	قبول شروط وإنتاج العربات التكتيكية المتوسطة الحجم للجيش لدعم الحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D00LH-0235.000	٢٠٠٨/٦/٢٦	التعاقد لشراء واستئجار عربات غير تكتيكية لدعم عملية حرية العراق وعملية الحرية الدائمة
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FH-0225.000	٢٠٠٨/٦/٢٠	القوات الجوية الأميركية: صيانة مؤجلة للطائرة C-130 نتيجة الحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CH-0236.000	٢٠٠٨/٦/١٩	مشتريات الجيش لمركبات متعددة الأغراض عالية الحركة.
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CE-0221.000	٢٠٠٨/٦/٩	جهود وزارة الدفاع ومقاولي العقود الدفاعية لمنع الاعتداء/المضايقة الجنسية من قبل موظفي المقاول ضمن مناطق عمليات الحرية الدائمة وعمليات حرية العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FC-0208.000	٢٠٠٨/٦/٩	وسائل المراقبة على المعدات غير المصفاة الخاصة بعقود وزارة القوات الجوية الداعمة للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FJ-0210.000	٢٠٠٨/٥/٣٠	وزارة الجيش، صيانة مؤجلة لقوافل دبابات ابرامز نتيجة الحرب العالمية على العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FD-0214.000	٢٠٠٨/٥/٢٠	عقود وكالة اللوجستيات الدفاعية لقطع عربات القتال دعماً للحرب العالمية على الإرهاب

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000JC-0203.000	٢٠٠٨/٥/١٢	تعيين وتدريب ممثلي ضابط العقود في القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000JC-0202.000	٢٠٠٨/٥/١٢	برنامج زيادة عقود القوات الجوية في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FC-0189.000	٢٠٠٨/٥/١٣	وسائل المراقبة على جداول الرواتب العسكرية المدفوعة من قبل القوات البحرية لدعم الحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AB-0193.000	٢٠٠٨/٤/٢٤	استعمال باخرة مواد عضوية لدعم الحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CE-0187.000	٢٠٠٨/٤/٢٣	تملك زجاج باليستي للمركبات المتعددة الأغراض ذات الحركة العالية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000JC-0186.000	٢٠٠٨/٤/٢٣	شراء وتوزيع الوقود من الدرجة الثالثة في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AE-0174.000	٢٠٠٨/٣/١٠	قيام سلاح مشاة البحرية بتنفيذ عملية بيان الحاجة الشاملة المستعجلة للمركبات المحمية من كمان الألغام ومقاومة لها
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CK-0161.000	٢٠٠٨/٢/٢٦	عقد مواد احتياطية للحرب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FP-0132.000	٢٠٠٨/٢/٢٥	وسائل المراقبة الداخلية على الصندوق العام، النقد والأصول النقدية الأخرى للجيش المحتفظ بها في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AB-0133.000	٢٠٠٨/٢/١٩	هليكوبتر للقتال والبحث والإنقاذ للقوات الجوية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-000IG-0141.000	٢٠٠٨/٢/١٣	المساءلة والمحاسبة بالنسبة للذخائر المزودة إلى قوات الأمن العراقية-المرحلة الثانية
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000CG-0123.000	٢٠٠٨/٢/٧	الأسعار المعقولة للعقود في القيادة الأميركية للعمليات الخاصة
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000LA-0199.002	٢٠٠٨/١/٢٤	وسائل المراقبة على دورة حياة بطاقة الوصول المشترك للمقاول في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FI-0083.000	٢٠٠٧/١٢/٢٧	وسائل المراقبة على إعداد تقارير تكاليف النقل دعماً للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FE-0106.000	٢٠٠٧/١٢/١٩	صندوق الاستجابة الطارئة الدفاعية للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000LF-0093.000	٢٠٠٧/١١/٢٨	المعدات الطبية المستعجلة لدعم العمليات في جنوب غرب آسيا
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000AB-0091.000	٢٠٠٧/١١/٢٧	نظام الدعم الناري للحملات العسكرية وبرامج مركبات تنقل داخلياً

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الدفاع (DoD)	D2008-D000FJ-0014.000	٢٠٠٧/١٠/١١	إدارة صندوق ذخائر الأسلحة الصغيرة لدعم الحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000FL-0252.000	٢٠٠٧/٨/٣١	وسائل المراقبة الداخلية وموثوقية البيانات في نظام الإنفاق المنشور
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-DINT01-0092.003	٢٠٠٧/٨/٣١	تدقيق إدارة محلي إشارات استخبارات مكافحة الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000LG-0228.000	٢٠٠٧/٨/٦	مراقبة الاستعمال النهائي للبنود والخدمات الدفاعية المنقولة إلى زبائن أجانب
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000CK-0230.000	٢٠٠٧/٧/١٣	شراء وتسليم عربات محمية مدرعة للخدمة المشتركة
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000FB-0198.000	٢٠٠٧/٦/١٩	الأموال المخصصة لأفغانستان والعراق معالجة عبر صندوق الائتمان العسكري الأجنبي
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000CK-0201.000	٢٠٠٧/٦/١٨	أموال العمليات والصيانة المستعملة لعقود الإنشاءات العسكرية للحرب العالمية على الإرهاب
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-DINT01-0092.001	٢٠٠٧/٦/١٤	مراجعة موارد الاستخبارات عند قوات مهمة الاستخبارات المشتركة لمحاربة الإرهاب وقيادة العمليات الخاصة دعماً لعملية الحرية الدائمة وعملية حرية العراق
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000LD-0129.000	٢٠٠٧/٤/١٣	إدارة سلاح مشاة البحرية لبرامج الاسترجاع وإعادة الضبط
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000FN-0142.000	٢٠٠٧/٢/٢٧	وسائل المراقبة الداخلية على الصندوق العام والنقد والأصول النقدية الأخرى للقوات البحرية المحفوظ بها خارج الولايات المتحدة القارية.
وزارة الدفاع (DoD)	D2007-D000LC-0051.000	٢٠٠٦/١٢/١٤	ممارسات التوظيف المتبعة لتعيين الموظفين لدى السلطات المؤقتة العراقية
وزارة الدفاع (DoD)	D2006-D000AE-0241.000	٢٠٠٦/٨/٤	استعمال وزارة الدفاع للتحويل التكميلي المؤمن للمشتريات والابحاث والتنمية، الاختبار والتقييم
وزارة الدفاع (DoD)	D2006-D000LG-0136.000	٢٠٠٦/٣/١	وسائل مراقبة الصادرات التي تتجاوز البنود الدفاعية الزائدة
وزارة الدفاع (DoD)	D2005-DINT01-0122	٢٠٠٥/٢/١٤	علاقة حكومة الولايات المتحدة مع مجلس النواب الوطني العراقي
وزارة الخارجية (DoS)	03AUD3023	٢٠٠٨/٧	تدقيق عقد الإدارة، التشغيل والمصادقة على NEC بغداد
وزارة الخارجية (DoS)	08 MER03005	٢٠٠٨/٦	مراجعة نشاطات شركة داي كورب انترناشونال وشركة تربيل كاندي بموجب عقود خدمة الحماية الشخصية عبر العالم التابعة لوزارة الخارجية في العراق

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وزارة الخارجية (DoS)	08 MER03004	٢٠٠٨/٦	مراجعة تطبيق توصيات عن تقرير لجنة وزارة الخارجية حول خدمات الحماية الشخصية في العراق (يعرف بصورة شائعة بتقرير كينيدي حول خدمات الحماية الشخصية) في العراق
وزارة الخارجية (DoS)	08 MER03003	٢٠٠٨/٦	مراجعة دور وموظفي وفعالية الأمن الدبلوماسي في تطوير وتطبيق خدمات الحماية الشخصية في العراق
وزارة الخارجية (DoS)	07AUD3034	٢٠٠٧/٤	مراجعة التنافس في المشتريات: مجمع السفارة الجديد في بغداد
وزارة الخارجية (DoS)	08AUD-3016	٢٠٠٨/٣	مراجعة مشتركة لعقد بلاك واطر لخدمات الحماية الشخصية عبر العالم
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	لم يبلغ عنه	٢٠٠٨/٩	جهوزية قوات الجيش العامل/عناصر القوات الاحتياطية
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	لم يبلغ عنه	٢٠٠٨/٩	جهوزية عناصر القوات العاملة والاحتياطية في القوات البحرية وفيلق مشاة البحرية
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351271	٢٠٠٨/٩	خطط وزارة الدفاع لدعم برامج نظام الطائرات غير المزودة بالرجال
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351166	٢٠٠٨/٢	الحواجز والتعويضات والعناية الطبية للمدنيين الفدراليين المعينين في الخارج
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351231	٢٠٠٨/٦	إدارة تقييم تكنولوجيا المنظمة المشتركة لهزيمة أجهزة التفجير المرتجل
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351230	٢٠٠٨/٦	الإدارة الاستراتيجية للمنظمة المشتركة لهزيمة أجهزة التفجير المرتجل
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351236	٢٠٠٨/٦	المتطلبات العاجلة لزمن الحرب
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351172	٢٠٠٨/٣	الطلب على الوقود في المواقع المتقدمة
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320587	٢٠٠٨/٣	وضع صناديق الدعم الاقتصادي للعراق
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	120724	٢٠٠٨/٢	العقود في العراق وأفغانستان
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351155	٢٠٠٨/١	تحليل أكلاف تمويلات السنة المالية ٢٠٠٨ لوزارة الدفاع للحرب العالمية على الإرهاب
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	320557	٢٠٠٧/١٢	قوات الأمن العراقية ونقل مسؤوليات الأمن

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	N/A	٢٠٠٧/١١	المساعدة الأميركية والدولية للاجئين العراقيين والمهجرين إلى الداخل
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351096	٢٠٠٧/١٠	خطط وزارة الدفاع للطائرات غير المزودة بالرجال
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351076	٢٠٠٧/٨	برامج السترات الوقائية واختبارها
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351083	٢٠٠٧/٨	استخدام مقاولي أمن خاصين في العراق
مكتب المحاسبة الحكومية (GAO)	351016	٢٠٠٧/٣	عمليات المنظمة المشتركة لهزيمة أجهزة التفجير المرتجل لتنسيق استخبارات مقاومة أجهزة التفجير المرتجل
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0401.000	4QR/FY 2008	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان- سليرنو وكابول
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0403.000	4QR/FY 2008	عقود الإسكان – مجموعة دعم المنطقة – الكويت
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0501.000	4QR/FY 2008	وسائل المراقبة على المدفوعات إلى البائعين- قيادة العقود في الجيش الأميركي- المنطقة الجنوبية العراقية- الكويت- المرحلة الأولى
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0398.000	4QR/FY 2008	وسائل المراقبة على برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني- بناية وايت
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0685.000	4QR/FY 2008	وظائف عقود سلاح الهندسة في الجيش الأميركي في العراق- المرحلة الثانية
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALA-0640.000	4QR/FY 2008	اختبار السترات الوقائية
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-FFM-0630.000	4QR/FY 2008	تقييم المتطلبات المستقبلية للموازنة الأساسية (تدقيق نقطة المراقبة)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-FFM-0549.000	4QR/FY 2008	تقييم المتطلبات المستقبلية للموازنة الأساسية- مجموعة تقدير برنامج التزويد بالرجل (PEG)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALA-0498.000	4QR/FY 2008	تقييم المتطلبات المستقبلية للموازنة الأساسية- مجموعة تقدير برنامج التجهيز
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-FFF-0647.000	4QR/FY 2008	تقييم المتطلبات المستقبلية للموازنة الأساسية- مجموعة تقدير برنامج التدريب
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALO-0741.000	4QR/FY 2008	تقييم المتطلبات المستقبلية للموازنة الأساسية- مجموعة تقدير برنامج التدريب

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-FFS-0660.000	4QR/FY 2008	تقييم المتطلبات المستقبلية للموازنة الأساسية-مجموعة تقدير برنامج التدريب
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALM-0690.000	4QR/FY 2008	تقييم المتطلبات المستقبلية للموازنة الأساسية-مجموعة تقدير برنامج التدريب
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALE-0090.000	4QR/FY 2008	تقييم المتطلبات المستقبلية للموازنة الأساسية-مجموعة تقدير برنامج التدريب
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-FFS-0443.000	4QR/FY 2008	متطلبات التصديق للجنود المحشودين في قاعدة CONUS
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALA-0468.000	4QR/FY 2008	عملية أهداف التملك المرخص به الجيش (AAO)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008—ALL-0625.000	4QR/FY 2008	متابعة عمليات تدقيق العقود، قيادة العقود في الجيش الأميركي، جنوب غرب آسيا-الكويت (المرحلة الأولى)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0624.000	3QR/FY 2008	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد – العراق
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALM-0306.002	3QR/FY 2008	متطلبات ضبط المستوى الميداني- الحرس القومي للجيش
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0633.000	3QR/FY 2008	سلاح الهندسة في الجيش الأميركي- برنامج تأمين قانون الدفاع عن القواعد العسكرية الرائدة
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALL-0081.005	2Q/FY 2008	إدارة حاويات الشحن في جنوب غرب آسيا-أفغانستان
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALL-0858.000	3Q/FY 2008	عمليات ارتجاعية في جنوب غرب آسيا-الكويت
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALL-0858.001	4Q/FY 2008	عمليات ارتجاعية في جنوب غرب آسيا-الكويت _ دعم المؤخرة
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALL-0887.002	4Q/FY 2008	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق (أفغانستان-فكتوري)
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALR-0259.002	2Q/FY 2008	فواتير احتجاز الحاويات للحرب العالمية على الإرهاب، قيادة الانتشار والتوزيع البري العسكري
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-FFD-0067.000	2Q/FY 2008	السترات الوقائية
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALA-0978.000	4Q/FY 2008	تأثير ممتلكات العربات المحمية من الكمائن المقاومة للألغام على أنظمة أخرى
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALM-0312.000	2Q/FY 2008	بنود إعادة الضبط الأوتوماتيكي-عملية ارتجاعية

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2007-ALM-0306.000	3Q/FY 2008	عقود إعادة الضبط
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-FFS-0101.000	2Q/FY 2008	تدريب قبل حشد احتياطي الجيش
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-FFS-0353.000	1Q/FY 2008	تدريب قبل حشد الحرس القومي
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALR-0307.000	2Q/FY 2008	تعزيز إمداد وحدة سجل الأملاك، فرقة المشاة الثالثة
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALR-0360.000	2Q/FY 2008	تعزيز إمداد وحدة سجل الأملاك، الفرقة الجبلية العاشرة
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALR-0357.000	2Q/FY 2008	تعزيز إمداد وحدة سجل الأملاك، الجيش الأول
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-FFF-0148.000	1Q/FY 2008	استعمال لاعبي أدوار على مستوى الجيش (بدون مراكز التدريب على القتال)
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2007-ALR-0259.001	3Q/FY 2008	تثبيت أسعار شحن الحاويات
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2007-ZBI-0344.003	1Q/FY 2008	برنامج تعليم اللغات الأجنبية في الجيش - عقود
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALM-0311.000	3Q/FY 2008	إعادة ضبط دعم حمل العمل لوزارة العمل
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-FFF-0044.000	2Q/FY 2008	إدارة قوافل العربات الموضوعة مسبقاً في مراكز التدريب على القتال
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALR-0039.000	1Q/FY 2008	تعزيز إمداد وحدة سجل الأملاك-ACP
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALL-0466.000	3Q/FY 2008	متابعة المشتريات غير الموصولة بالخط
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALM-0313.000	3Q/FY 2008	بنود إعادة الضبط الأوتوماتيكي - مستودع
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALM-0247.000	3Q/FY 2008	استدامة المعدات المتروكة في المؤخرة
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-FFD-0098.000	3Q/FY 2008	تدريب متقدم لجنود التخلص من المعدات المتفجرة
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALL-0320.001	2Q/FY 2008	عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان-باغرام
وكالة التدقيق في الجيش الأمريكي (USAAA)	A-2008-ALL-0319.000	2Q/FY 2008	تدقيق عمليات التعاقد في القيادة المشتركة للعقود في العراق/أفغانستان-بلد

إشراف الوكالات الأخرى

الجدول ٢-٥ (تابع)

الوكالة	رقم التقرير	تاريخ التقرير	عنوان التقرير
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0318.000	2Q/FY 2008	تدقيق وظائف التعاقد في العراق لسلح الهندسة في الجيش الأميركي (فرقة منطقة الخليج).
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2008-ALL-0204.000	2Q/FY 2008	تدقيق الأملاك الحكومية المزودة إلى المقاولين- عمليات قاعدة الكويت
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALL-0081.000	4Q/FY 2006	موجز إدارة شحن الحاويات في جنوب غرب آسيا
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALL-0887.001	4Q/FY 2007	تدقيق قيادة العقود المشتركة في العراق، بغداد
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALL-0212.001	4Q/FY 2007	تدقيق عمليات برنامج زيادة الدعم اللوجستي المدني دعماً لعملية حرية العراق-مولدات الطاقة
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2007-ALL-0329.000	1Q/FY 2007	تدقيق قيادة العقود في الجيش الأميركي- جنوب غرب آسيا-الكويت
وكالة التدقيق في الجيش الأميركي (USAAA)	A-2006-ALL-0397.000	3Q/FY 2006	عمليات ارتجاعية في جنوب غرب آسيا
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	لم يبلغ عنه	4QR/FY 2008	متابعة تدقيق برنامج الحكم المحلي في العراق الذي تديره الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	لم يبلغ عنه	4QR/FY 2008	تدقيق البرنامج الثاني للحكم المحلي الاقتصادي في العراق الذي تديره الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	لم يبلغ عنه	4QR/FY 2008	تدقيق برنامج الإشراف على مقاولي الأمن الخاصين في العراق
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)	لم يبلغ عنه	لم يبلغ عنه	برنامج تنمية القدرات الوطنية في العراق الذي تديره الوكالة الأميركية للتنمية الدولية

تحقيقات الوكالات الأخرى

ينسق مكتب المفتش العام أعماله بصورة منتظمة مع الوكالات الحكومية الأخرى التي تقوم بالتحقيق في العراق. للإطلاع على الإحصاءات حول نشاطات التحقيق للوكالات الأميركية الأخرى، أنظر الجدول ٣-٥.

الجدول ٣-٥

وضعية نشاطات التحقيق المنفذة على يد وكالات أميركية أخرى كما كان في ٢٠٠٨/٩/٣٠

الوكالات	عدد المحققين في العراق	عدد المحققين في الكويت	القضايا المفتوحة/المغلقة
قيادة التحقيقات الجنائية في الجيش الأميركي، وحدة كشف الاحتيال في المشتريات الرئيسية	٨	٤	٩٦
دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع	٦	٢	١٣٤
مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية	٠	٠	٤
مكتب التحقيقات الفدرالية	٤	٢	٧٩
الوكالة الأميركية للتنمية الدولية	٢	٠	٦
المجموع	٢٠	٨	٣١٩

* تشمل الأرقام القضايا المعلقة التي يجري العمل بها مع وكالات أخرى داخل مركز العمليات المشتركة

- ١- مقابلة قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I) مع جيم ميكالس، مجلة US Today، ٢٠٠٨/١٢/٢٩، www.mnf-iraq.com، تم الوصول إليها ٢٠٠٨/١٠/١٩.
- ٢- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٣- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٤- استجابة وزارة الخارجية (DoS)، لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، الحصول على بيانات ١٤م ٢٠٠٧/١٠؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٤؛ استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، تقرير المؤشرات الأساسية ٢٠٠٨/١٠/٢، استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٥- مكتب البيت الأبيض للسكرتير الصحفي، "إعلان المبادئ لعلاقة طويلة الأمد من التعاون والصداقة بين الجمهورية العراقية والولايات المتحدة الأميركية"، وصفحة الوقائع: إعلان المبادئ بين الولايات المتحدة والعراق للصداقة والتعاون ٢٠٠٧/١١/٢٦.
- ٦- وزارة المالية، وزارة التخطيط وسلطة الائتلاف المؤقتة، إيرادات ونفقات موازنة جمهورية العراق: تموز/يوليو - كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٣، موجز الموازنة، استجابة وزارة المالية لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات، تشرين الأول/٢٠٠٨.
- ٧- قائد القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، دليل مكافحة التمرد، ٢٠٠٨/٩/١٦، www.mnf-iraq.com، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/١٨.
- ٨- شهادة وزير الدفاع روبرت ام غيتس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "الأمن والاستقرار في أفغانستان والعراق"، ٢٠٠٨/٩/١٠.
- ٩- تدقيق المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق SIGIR 08-015، "التحليل المرحلي للمعلومات المتعلقة بقوات الأمن العراقية التي زودها تقرير وزارة الدفاع، قياس الاستقرار والأمن في العراق ٢٠٠٨/٤/٢٥.
- ١٠- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، اعد بمثابة دخل بيانات التقرير ربع السنوي ٢٠٠٨/١٠/١٠ للمفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق.
- ١١- بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة (UNAMI)، "دعم وكالات الأمم المتحدة لجهود العراق لكبح انتشار الكوليرا"، ٢٠٠٨/٩/١٠.
- ١٢- الأمين العام للأمم المتحدة، "خطاب إلى مؤتمر المراجعة السنوية الأولى للميثاق الدولي مع العراق"، ٢٠٠٨/٥/٢٩، www.un.org، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/١٠.
- ١٣- خطاب رئيس الولايات المتحدة، "نسخة: الرئيس بوش يزور برنامج المحاضرات المميزة في جامعة الدفاع القومي"، وبحث الحرب العالمية على الإرهاب"، ٢٠٠٨/٩/٩، www.whitehouse.gov، تم الوصول إليه ٢٠٠٨/١٠/١٨.
- ١٤- شهادة وزير الدفاع روبرت ام غيتس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "الأمن والاستقرار في أفغانستان والعراق"، ٢٠٠٨/٩/١٠.
- ١٥- شهادة وزير الدفاع روبرت ام غيتس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "الأمن والاستقرار في أفغانستان والعراق"، ٢٠٠٨/٩/١٠.
- ١٦- الأمم المتحدة (UN)، بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة (UNAMI Focus)، "العدد رقم ٢٦، تاريخ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨.
- ١٧- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.

- ١٨- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٩- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الانبار" ٢٠٠٨/٩/١، www.mnf-iraq.com، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/١٩.
- ٢٠- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٢١- تقرير صندوق النقد الدولي (IMF)، رقم ٨٣٠٣، "العراق: أول مراجعة بموجب الترتيب الاحتياطي ومراجعة التأمينات المالية - تقرير الملاك؛ ملحق تقرير الملاك؛ بيان صحفي حول مناقشة المجلس التنفيذي وبيان المدير التنفيذي حول العراق"، أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، www.imf.org، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/١٩.
- ٢٢- استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٣- ملحق وزارة العدل: "تقرير لجنة النزاهة"، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨.
- ٢٤- تقارير تدقيق المفتش العام ١٥١، ١٥٠، ١٤٩، SIGIR PA-08-149، 150، 151، مدارس القدس، المعلمين والفاو تحت برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، ٢٠٠٨/١٠.
- ٢٥- تقرير صندوق النقد الدولي (IMF)، رقم ٨٣٠٣، "العراق: أول مراجعة بموجب الترتيب الاحتياطي ومراجعة التأمينات المالية - تقرير الملاك؛ ملحق تقرير الملاك؛ بيان صحفي حول مناقشة المجلس التنفيذي وبيان المدير التنفيذي حول العراق"، أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، www.imf.org، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/١٩.
- ٢٦- وزارة الخارجية (DoS) والقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "إطار العمل الاستراتيجي لبناء القدرة والاستدامة في حكومات المحافظات العراقية، ٢٠٠٨/٨/٧"، الإستجابة لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/٩/٢٢.
- ٢٧- لجنة حماية الصحفيين، "الصحافيون القتلى عام ٢٠٠٨" www.cpj.org، تم الوصول إليها في ٢٠٠٨/١٠/١٩.
- ٢٨- لجنة حماية الصحفيين، "الصحافيون العراقيون في خطر" www.cpj.org، تم الوصول إليها في ١٠/٥/٢٠٠٨.
- ٢٩- بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة (UNAMI)، "الأمم المتحدة تعبر عن قلقها حول تهجير أكثر من ٩ آلاف مسيحي عراقي من الموصل" ٢٠٠٨/١٠/١٧.
- ٣٠- استجابة السفارة الأميركية لطلب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣١- المفوضية الأوروبية: "تقرير حول تدخل المفوضية الأوروبية لتخفيف حدة وضع اللاجئين والمهجرين إلى الداخل" ٢٠٠٨/٩.
- ٣٢- المفوضية الأوروبية: "تقرير حول تدخل المفوضية الأوروبية لتخفيف حدة وضع اللاجئين والمهجرين إلى الداخل" ٢٠٠٨/٩.
- ٣٣- استجابة وكالة تدقيق العقود الدفاعية (DCAA)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣٤- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-006، "وضع صندوق دعم الاقتصاد لوزارة الخارجية: الالتزامات والنفقات لإعادة إعمار العراق" ٢٠٠٨/١٠.
- ٣٥- البنك الدولي www.worldbank.org/datastatistics/، تم الوصول إليها في ٢٠٠٨/١٠/١٢.
- ٣٦- يستند هذا الرقم إلى التخصيصات التي توفرت لإعادة إعمار العراق بموجب القوانين العامة P.L. 108-7, P.L. 108-11, P.L. 108-106, P.L. 108-287, P.L. 109-13, P.L. 109-102, P.L. 109-148, P.L. 109-234, P.L. 110-28, P.L. 110-92, P.L. 110-116, P.L. 110-137, P.L. 110-149, P.L. 110-161, P.L. 110-252.
- ٣٧- قانون دونكان هانتر للتريخيص الدفاعي القومي للسنة المالية ٢٠٠٩، القانون العام ١١٠-٤١٧ (٢٠٠٨/١٠/١٤).

- ٣٨- قانون دونكان هانتر للترخيص الدفاعي القومي للسنة المالية ٢٠٠٩، القانون العام ١١٠-٤١٧ (٢٠٠٨/١٠/١٤).
- ٣٩- وزارة الخارجية (DoS) "تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٤٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٤١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٤٢- استجابة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤. استجابة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية (USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٤٣- وزارة الخارجية (DoS) "تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٤٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٤٥- وزارة الخارجية (DoS) "تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٤٦- وزارة الخارجية (DoS) "تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١٤. وزارة الخارجية "تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/٧/٩.
- ٤٧- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٤٨- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٤٩- بالمقارنة تم تخصيص حوالي ١٥,٥ مليار دولار لصندوق قوات الأمن الأفغانية للسنة المالية ٢٠٠٣ إلى السنة المالية ٢٠٠٨.
- ٥٠- تقرير رقم D-2008-026 لمكتب المفتش العام في وزارة الدفاع "إدارة صندوق قوات الأمن العراقية في جنوب غرب آسيا، المرحلة الثالثة" ٢٠٠٧/١١/٣٠.
- ٥١- اللجنة الفرعية للإشراف والتحقيقات في لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب: "قف لكي يتم عدك: التحدي المستمر أمام بناء قوات الأمن العراقية"، ٢٠٠٧/٧/٢٧.
- ٥٢- يصف المستويات التي تطلبها وزارة الدفاع (MOD)، ووزارة الداخلية العراقية (MOI)، لتلبية حاجات موازنتيهما والعجز فيهما. وزارة الدفاع (DoD)، "قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩.
- ٥٣- قانون دونكان هانتر للترخيص الدفاعي القومي للسنة المالية ٢٠٠٩، القانون العام ١١٠-٤١٧ (٢٠٠٨/١٠/١٤).
- ٥٤- قانون دونكان هانتر للترخيص الدفاعي القومي للسنة المالية ٢٠٠٩، القانون العام ١١٠-٤١٧ (٢٠٠٨/١٠/١٤).
- ٥٥- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٥٦- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٥٧- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٥٨- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٥٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٦٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٦١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٦٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.

- ٦٣- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، ملف إنهاء مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)،
٢٠٠٨/١٠/١.
- ٦٤- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، ملف إنهاء مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)،
٢٠٠٨/١٠/١.
- ٦٥- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، ملف إنهاء مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)،
٢٠٠٨/١٠/١.
- ٦٦- قانون التخصيصات التكميلية للعام ٢٠٠٨، القانون العام ١١٠-٢٥٢ (٢٠٠٨/٦).
- ٦٧- استجابة وزارة الخارجية (DoS)، لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٧؛ استجابتنا مكتب المساعدة
الانتقالية للعراق (ITAO)؛ لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٨ و ٢/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة فرقة منطقة
الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
(USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)؛ تقرير
المؤشرات الأساسية، ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٦٨- وزارة الخارجية (DoS)، "تقرير القسم ٢٢٠٧"، ٢٠٠٨/٧.
- ٦٩- استجابة وزارة الخارجية (DoS)، لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٧؛ استجابتنا مكتب المساعدة
الانتقالية للعراق (ITAO)؛ لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٨ و ٢/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة فرقة منطقة
الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
(USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)؛ تقرير
المؤشرات الأساسية، ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٧٠- استجابة وزارة الخارجية (DoS)، لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٧؛ استجابتنا مكتب المساعدة
الانتقالية للعراق (ITAO)؛ لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٨ و ٢/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة فرقة منطقة
الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
(USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)؛ تقرير
المؤشرات الأساسية، ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٧١- وزارة الخارجية (DoS)، "تقرير القسم ٢٢٠٧"، ٢٠٠٨/٧.
- ٧٢- استجابة وزارة الخارجية (DoS)، لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٧؛ استجابتنا مكتب المساعدة
الانتقالية للعراق (ITAO)؛ لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٨ و ٢/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة فرقة منطقة
الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
(USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)؛ تقرير
المؤشرات الأساسية، ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٧٣- استجابة وزارة الخارجية (DoS)، لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٧؛ استجابتنا مكتب المساعدة
الانتقالية للعراق (ITAO)؛ لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٨ و ٢/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة فرقة منطقة
الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
(USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)؛ تقرير
المؤشرات الأساسية، ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٧٤- استجابة وزارة الخارجية (DoS)، لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٧؛ استجابتنا مكتب المساعدة
الانتقالية للعراق (ITAO)؛ لطلب المفتش العام للبيانات ٤/١٠/٢٠٠٨ و ٢/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة فرقة منطقة
الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٦/١٠/٢٠٠٨؛ استجابة الوكالة الاميركية للتنمية الدولية
(USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)؛ تقرير
المؤشرات الأساسية، ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٧٥- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-006، "وضع صندوق دعم الاقتصاد لوزارة الخارجية: الالتزامات
والنفقات لإعادة إعمار العراق" ٢٠٠٨/١٠.

- ٧٦- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-006، "وضع صندوق دعم الاقتصاد لوزارة الخارجية: الالتزامات والنفقات لإعادة إعمار العراق" ٢٠٠٨/١٠.
- ٧٧- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-006، "وضع صندوق دعم الاقتصاد لوزارة الخارجية: الالتزامات والنفقات لإعادة إعمار العراق" ٢٠٠٨/١٠.
- ٧٨- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٧٩- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، ملف إنهاء مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٨٠- تقرير المفتش العام SIGIR PA-08-137، "منطقة الحظر حول خطوط أنابيب النفط من كركوك إلى بيجي - المرحلة ٣، ٢٤/٧/٢٠٠٨.
- ٨١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٨٢- قانون دونكان هانتر للترخيص الدفاعي القومي للسنة المالية ٢٠٠٩، القانون العام ١١٠-١١٧ (٢٠٠٨/١٠/١٤).
- ٨٣- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، "أكسيل ووركيوك" ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٨٤- تستند الأرقام إلى مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، المجموعة حسب تسلسل تاريخ بدء إنشائها، نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، "أكسيل ووركيوك" ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٨٥- تستند الأرقام إلى مشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، المجموعة حسب تسلسل تاريخ بدء إنشائها، نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، "أكسيل ووركيوك" ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٨٦- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/٢/١٠.
- ٨٧- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، "أكسيل ووركيوك" ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٨٨- الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-1)، لاحظ إن عدد المشاريع المكتملة المذكورة في الاستجابة لطلب المفتش العام للبيانات يمثل المشاريع المكتملة في تموز/يوليو وأب/أغسطس. استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٨٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/٢/١٠.
- ٩٠- سياسات وإجراءات وأغراض برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق (I-CERP)، مضمنة في "إجراءات التشغيل القياسية لمجموعة صناديق برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/٥، الملحق ج.
- ٩١- مذكرة تفاهم بين المجلس الأعلى لإعادة إعمار العراق (I-SRC)، التابع لسكرتارية مجلس الوزراء والقوات المتعددة الجنسيات في العراق، ٢٠٠٨/٤.
- ٩٢- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 08-013، "التقرير المرحلي حول عمليات إلغاء عقود إعادة إعمار العراق"، ٢٠٠٨/٤/٢٨.
- ٩٣- نظام الإدارة المالية في سلاح الهندسة، "كافة البنود ترفع إلى (PMCON) وكافة البنود ترفع إلى (PMNC)، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٠.
- ٩٤- نظام الإدارة المالية في سلاح المهندسين ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٩٥- نظام الإدارة المالية في سلاح المهندسين ٢٠٠٨/٩/٣٠، استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٠.

- ٩٦- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-004، "إلغاء مشاريع إعادة إعمار العراق تمثل مجموعة من الأعمال"، ٢٠٠٨/١٠.
- ٩٧- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-004، "إلغاء مشاريع إعادة إعمار العراق تمثل مجموعة من الأعمال"، ٢٠٠٨/١٠.
- ٩٨- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-003، "الكلفة والنتيجة والإشراف على عقود برنامج الحكم المحلي مع معهد مثلث الأبحاث، ٢٠٠٨/١٠.
- ٩٩- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-003، "الكلفة والنتيجة والإشراف على عقود برنامج الحكم المحلي مع معهد مثلث الأبحاث، ٢٠٠٨/١٠.
- ١٠٠- شهادة وزير الدفاع روبرت ام غيتس أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس النواب "الأمن والاستقرار في أفغانستان والعراق"، ٢٠٠٨/٩/١٠.
- ١٠١- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٠٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦.
- ١٠٣- نسخة وزارة الدفاع (DoD)، قائد الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق، ٢٠٠٨/٩/٢٢.
- ١٠٤- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "السيطرة العراقية على محافظتي الأنبار وبابل" ٢٠٠٨/١٠/٢٣، www.mnf-iraq.com، تم الوصول إليها ٢٠٠٨/١٠/٢٣.
- ١٠٥- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٠٦- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "السيطرة العراقية على محافظتي الأنبار وبابل" ٢٠٠٨/١٠/٢٣، www.mnf-iraq.com، تم الوصول إليها ٢٠٠٨/١٠/٢٣.
- ١٠٧- استجابة قيادة المنطقة الوسطى للقوات المسلحة الأميركية (CENTCOM)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٠٨- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٠٩- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١١٠- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١١١- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠، البيانات كما كانت في ٢٠٠٨/٨/١٥.
- ١١٢- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠، البيانات كما كانت في ٢٠٠٨/٨/١٥.
- ١١٣- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-002، "استمرار تحديات الحصول على بيانات يعتمد عليها ومفيدة حول قوات الأمن العراقية"، ٢٠٠٨/١٠.
- ١١٤- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-002، "استمرار تحديات الحصول على بيانات يعتمد عليها ومفيدة حول قوات الأمن العراقية"، ٢٠٠٩/١٠.
- ١١٥- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٦.
- ١١٦- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩.
- ١١٧- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩.
- ١١٨- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩.
- ١١٩- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩.

- ١٢٠- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٢١- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، "مديرية الشؤون الداخلية (DoIA)، موجز القيادة" الاستجابة لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٢٢- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "موجز القيادة: فريق التدريب الاستشاري لجيش سلطة الائتلاف ٢٠٠٨/٩/١٣، الاستجابة لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢، الشريحة ٢٠.
- ١٢٣- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، تم اعداد هذه المعلومات كدخل بيانات لتقرير المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، ربع السنوي، ٢٠٠٨/١٠/١٠.
- ١٢٤- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، تم اعداد هذه المعلومات كدخل بيانات لتقرير المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق، ربع السنوي، ٢٠٠٨/١٠/١٠.
- ١٢٥- "الجيش العراقي تحدث بأعداد وقدرات كافية لتنفيذ عمليات مكافحة التمرد مع قوات التحالف في الشكل المناسب للمراقبة وقادر على استدامة وإعادة توليد نفسه مع دعم منخفض لقوات التحالف بقيادة عدد كاف من القادة الكفوئين والمحترفين (نبة قائد فريق التدريب الاستشاري لجيش سلطة الائتلاف: موجز قيادة فريق التدريب الاستشاري لجيش سلطة الائتلاف (CAATT)، القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، موجز قيادة فريق التدريب الاستشاري لجيش سلطة الائتلاف (CAATT)، ٢٠٠٨/٩/١٣، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢، الشريحة التوضيحية ٤.
- ١٢٦- استجابة الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٢٧- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠، استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٢٨- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٨.
- ١٢٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٨.
- ١٣٠- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠، البيانات كما كانت في ٢٠٠٨/٨/١٥.
- ١٣١- القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، مديرية الشؤون الداخلية (DoIA)، موجز القيادة" الاستجابة لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢، الشريحتان ٣ و ٤.
- ١٣٢- عندما أجرى المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق مراجعته للوجستيات وقدرات الصيانة لقوات الأمن العراقية عام ٢٠٠٦، كان الهدف "تطبيق القدرات اللوجستية داخل الجيش العراقي للانتقال إلى سيطرة وزارة الدفاع بصورة دورية. ولتحويل كافة القدرات بحلول الأول من كانون الثاني/يناير ٢٠٠٨. المصدر: قوات الأمن العراقية، مراجعة خطط تطبيق القدرات اللوجستية، تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 06-32، ٢٠٠٦/١٠/٢٨. حدد مكتب المحاسبة الحكومية (GAO) وجود قدرات لوجستية غير كافية لتقرير الاولويات، التدريب واستدامة قوات الأمن العراقية (مكتب المحاسبة الحكومية (GAO-08-143R). بالإضافة إلى ذلك حددت مجموعة الدراسة للعراق عدم وجود خبرة كبيرة وضعف التجربة اللوجستية داخل القوات المسلحة العراقية، الأمر الذي يعيق جهوزيتها وقدراتها. (CSIS)، "تقرير اللجنة المستقلة حول قوات الأمن العراقية، المرفوع إلى الكونغرس، ٢٠٠٧/٩/٦، النتيجة ١٠.
- ١٣٣- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٣٤- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ١٣٥- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٦.
- ١٣٦- القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، "بعض المخازن داخل كل مستودع للعبوات بعجلات وبجنائزير بدأوا مبادرات الانتقال ولكن لم يتم تحديد موعد التسليم إلى ان تكتمل مبادرات

- الانتقال وبيدأ الإنتاج على مقياس منخفض. استجابة القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I)، لطلب المفتش العام للبيانات. "جهود الولايات المتحدة في مساعدة لوجستيات الجيش العراقي"، ٢٠٠٨/٩/٢٩، استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٣٧- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٣٨- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٣٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، "القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) I: نقل وسائل دعم الحياة لوزارة الدفاع العراقية (MOD)، ووزارة الداخلية العراقية (MOI)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٩/٢٢.
- ١٤٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، "القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) I: نقل وسائل دعم الحياة لوزارة الدفاع العراقية (MOD)، ووزارة الداخلية العراقية (MOI)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٩/٢٢.
- ١٤١- استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٧/٧؛ مكتب وزير الدفاع (OSD)، "القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق (MNSTC-I) I: نقل وسائل دعم الحياة لوزارة الدفاع العراقية (MOD)، ووزارة الداخلية العراقية (MOI)، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/٩/٢٢. تشير وثائق أخرى إلى ان هذه العقود السبعة نقلت، مكتب وزير الدفاع (OSD)، "بيانات التدريب: أم ٣٤، تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٨، الاستجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٤٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٤٣- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٤٤- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٤٥- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٤٦- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٤٧- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٤٨- استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٦.
- ١٤٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، "لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣؛ استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٥٠- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٥١- استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٥٢- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٥٣- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير القسم ١٢٢٧، ٢٠٠٨/١/٦.
- ١٥٤- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٥٥- استجابة الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٥٦- بيان صحفي للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "العراق يشتري أسلحة صغيرة عبر مبيعات عسكرية أجنبية" ٢٠٠٧/١٢/٧، بيان صحفي للقوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "الجيش العراقي يستلم معدات بقيمة ٥,٢ مليون دولار عبر مبيعات عسكرية أجنبية"، ٢٠٠٨/٥/٣، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/١٨.
- ١٥٧- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.

- ١٥٨- استجابة وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٥٩- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٦٠- استجابة وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٦١- استجابة وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٦٢- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٦٣- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٦٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، برامج الوضع الحالي نصف الشهرية ٢٠٠٨/٨/١٨.
- ١٦٥- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٦٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٦٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٦٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٦٩- استجابة الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٧٠- استجابة الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٧١- استجابة الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣؛ استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ١٧٢- استجابة الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٧٣- استجابتا الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣ و ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ١٧٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٧٥- سميت، كندال وبولي كيلر، بيان صحفي لفرقة منطقة الخليج (GRD)، "محكمة جديدة تفتتح في بغداد" ٢٠٠٨/٩/١٠.
- ١٧٦- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ١٧٧- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٧٨- استجابة الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٧٩- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير القسم ١٢٢٧، تموز ٢٠٠٨.
- ١٨٠- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٨١- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٨٢- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٨٣- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٨٤- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.

- ١٨٥- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٨٦- استجابة المنسق الأميركي لحكم القانون، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٧.
- ١٨٧- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٨٨- استجابة الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣؛ استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٨٩- استجابة الملحق القضائي الأميركي، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ استجابة السفارة الأميركية "فرق إعادة إعمار المحافظات في الانبار" لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٩٠- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٩١- استجابة الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ١٩٢- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٩٣- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٩٤- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ١٩٥- قد يكون للمحتجزين قضايا متعددة أو أوامر إطلاق سراح تؤثر على العدد الإجمالي للقضايا. استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٩٦- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٩٧- استجابة الملحق القضائي الأميركي لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ١٩٨- استجابة القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، لطلب المفتش العام - بغداد "تحديث BUA، ٢٠٠٨/١٠/٨.
- ١٩٩- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS): كلفة إكمال مشاريع قوات الأمن العراقية (ESF)، ٢٠٠٨/٩/٣٠، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق لوزارة الخارجية (DoS)، ٢٠٠٨/١٠/١؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) التقرير ربع السنوي لفيلق القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤. الأرقام تشمل الالتزامات والانفاقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2) وتمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- ٢٠٠- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٢٠١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٢٠٢- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS): كلفة إكمال مشاريع قوات الأمن العراقية (ESF)، ٢٠٠٨/٩/٣٠، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق لوزارة الخارجية (DoS)، ٢٠٠٨/١٠/١؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) التقرير ربع السنوي لفيلق القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤. الأرقام تشمل الالتزامات والانفاقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF2) وتمويل برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- ٢٠٣- استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق (NEA-1)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٢٠٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢، "تقرير وزارة المالية حول الرأسمال، حزيران/يونيو ٢٠٠٨.
- ٢٠٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢، "الموازنة التكميلية للعام ٢٠٠٨".

- ٢٠٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢. أفادت السفارة ان متوسط الإنتاج لربع السنة هذا بلغ ٢,٥٠ مليون برميل يوميا. حدث مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق هذه المعلومات.
- ٢٠٧- في تقرير المفتش العام تموز/يوليو ٢٠٠٨، ذكر أن متوسط الإنتاج اليومي خلال ربع السنة بلغ ٢,٤٣ مليون برميل، أخذت هذه الأرقام من متوسطات متواصلة لمدة ٣٠ يوماً أبلغت عنها خلية صهر الطاقة (EFC) في ٣٠ نيسان/أبريل، ٢٩ أيار/مايو و ٣٠ حزيران/يونيو ٢٠٠٨. فيما يخص تقرير مكتب المفتش العام لشهر تشرين الأول/أكتوبر ذكر المفتش العام ان أرقام الإنتاج المبلغ عنها حسب ما أورده مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق (NEA-I) في وزارة الخارجية. وقت نشر هذا التقرير لم يكن المفتش العام قد تمكن من الوصول إلى متوسطات الإنتاج ربع السنوي لربع السنة الأخير الذي أعلن عنه مكتب شؤون الشرق الأدنى.
- ٢٠٨- مكتب شؤون الشرق الأوسط في العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤. استعمل مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق أرقام النفط لربع السنة هذا التي زودها مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق. تختلف هذه الأرقام عن أرقام ربع السنة السابق عندما كان مكتب المساعدة الانتقالية للعراق المصدر الأولي لإحصائيات النفط. في ربع السنة هذا أبلغت السفارة الأميركية ان متوسط الصادرات النفطية بلغ ١,٨٣ مليون برميل يوميا وهو رقم يزيد بنسبة ٣% عن متوسط الصادرات النفطية لنفس ربع السنة من عام ٢٠٠٧.
- ٢٠٩- وحدة الاستخبارات: صحيفة "الايكونومست"، تقرير البلدان: العراق، آب/أغسطس ٢٠٠٨.
- ٢١٠- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/٩/١٠، استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق (NEA-I)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤. في ربع السنة هذا ابلغ مكتب المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق إحصائيات النفط استناداً إلى المعلومات التي حصل عليها من مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق (NEA-I)، التي من المحتمل ان تختلف عن الإنتاج التاريخي للنفط وأرقام الصادرات النفطية التي زودها مكتب المساعدة الانتقالية للعراق و خلية صهر الطاقة في تقارير ربع السنة السابقة.
- ٢١١- أبلغت وزارة المالية ان وصولات النفط للمصرف المركزي العراقي حتى آب/أغسطس ٢٠٠٨، بلغت ٤٦,٦ مليار دولار. استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٢١٢- مكتب المحاسبة الحكومية GAO 08-1144T، "تثبيت استقرار وإعادة بناء العراق: الإيرادات والنفقات والفوائض العراقية"، ٢٠٠٨/٩/١٦، وزارة الخارجية (DoS)، التقرير الأسبوعي عن الوضع في العراق، ١٥/٢٠٠٨/١٠/.
- ٢١٣- إدارة معلومات الطاقة: "السعر الأسبوعي الصافي لنفط كركوك في العراق حسب أسعار خليج الولايات المتحدة" دولاراً للبرميل الواحد، ٢٠٠٧/١٠/٥، ٢٠٠٨/١٠/١٠، www.eia.doe.gov، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٢١٤- الحكومة العراقية "التخطيط الاستراتيجي: ٢٠٠٩-٢٠١١" مترجم، بدون تاريخ.
- ٢١٥- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/٩/٢٤.
- ٢١٦- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/٩/٢٤، يتعلق هذا الرقم بالأسبوع المنتهي في ٢٠٠٨/٩/٢١.
- ٢١٧- مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤. ابلغ مكتب شؤون الشرق الأدنى ان أرقامه تختلف عن تلك التي أبلغت عنها السفارة الأميركية في بغداد (من خلال مكتب المساعدة الانتقالية للعراق).
- ٢١٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الحالي الأسبوعي، ٢٠٠٨/٩/٢٦.
- ٢١٩- تبقى بعض المشاريع غير الممولة من فرقة منطقة الخليج قيد التنفيذ. في استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، أبلغت الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) ان على الوكالة ان تنفق مبلغ ٥٩ ألف دولار من أموال

- صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2) الذي تم الالتزام به لتنفيذ برنامج تدريب متعدد الوجوه لوزارة النفط. درب برنامج صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني بقيمة ٢ مليون دولار أكثر من ٥٠٠ مندوب. تشمل النتائج المبلغ عنها للمتخرجين من برامج التدريب الفني/الهندسي عمليات الترويج، التعويض النقدي ومهمات جديدة تستند إلى المهارات المكتسبة. استجابة الوكالة الأميركية للتجارة والتنمية (USTDA) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٢٢٠ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، الخطة الشهرية لإدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٢٢١ - وزارة الخارجية (Dos)، تقرير القسم ٢٢٠٧، ٢٠٠٨/٩.
- ٢٢٢ - في استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، لاحظ مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق انه من غير الواضح ما إذا كان هدف الوصول إلى سعة إنتاج شاملة للنفط الخام قد تحقق فعلاً. ذكر مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق (NEA-I)، "نعتمد ان أنابيب النفط لا تستطيع ان تتعامل مع إنتاج بقيمة ٣ ملايين برميل يومياً وهي في حالتها الحاضرة". استجابة مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٢٢٣ - الأرقام ما قبل الحرب - (DOE) موجز تحليلي للدول أصدرته وزارة الطاقة، اجتماع مع مسؤولين من وزارة الطاقة في ٣١ أيار/مايو ٢٠٠٦.
- ٢٢٤ - في ٤ آب/أغسطس ٢٠٠٨ أبلغت فرقة منطقة الخليج (GRD)، انه كان يوجد أمراً مهمة إداريان بقيا مفتوحين بينما جرى إنهاء أعمال الإقبال. في الأول من تشرين الأول/أكتوبر، ٢٠٠٨ ابلغ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS) عن مشروع واحد مفتوح لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق بقيمة ٥٨,٠٣١,٥٤٤ دولار.
- ٢٢٥ - استجابتا فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- ٢٢٦ - استجابتا فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١ و ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٢٢٧ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، خطة الإدارة الشهرية للمشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٢٢٨ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٢٢٩ - السفارة الأميركية في بغداد - تقرير وزارة المالية حول رأس المال، حزيران/يونيو ٢٠٠٨، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٣٠ - استجابة وزارة المالية الأميركية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٧.
- ٢٣١ - السفارة الأميركية، بغداد "الموازنة التكميلية للعام ٢٠٠٨" استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٣٢ - مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، "تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO) عن الاداء اليومي للوحدات الكهربائية (٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠٠٨/٩/٣٠).
- ٢٣٣ - وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٨/٩/٢٦.
- ٢٣٤ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٣٥ - مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، "تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO) عن الاداء اليومي للوحدات الكهربائية (٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠٠٨/٩/٣٠).
- ٢٣٦ - مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، "تقرير مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO) عن الاداء اليومي للوحدات الكهربائية (٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠٠٨/٩/٣٠).
- ٢٣٧ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٣٨ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.

- ٢٣٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٤٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "الوكالة الأميركية للتنمية الدولية/العراق تساعد في التقاط ما مقداره مليار دولار سنوياً من غاز التوهج لوقود محطة توليد الطاقة، ٢٠٠٨/٩/٨.
- ٢٤١- وزارة الخارجية (DoS)، التقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/٩/٢٤.
- ٢٤٢- أبلغت وزارة الخارجية (DoS) ان "محطات التشغيل والصيانة والدعم عرفت حالات توقف اقل عام ٢٠٠٨ وبلغ متوسطها الشهري نسبة ١٧%." وزارة الخارجية تقرير القسم ٢٢٠٧، ٢٠٠٨/٩/٩.
- ٢٤٣- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦، نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، ملف إنهاء مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، ٢٠٠٨/٩/٢٩.
- ٢٤٤- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، اكلاف إكمال مشاريع صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٢٤٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٤٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٤٧- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، "الكهرباء: توسيع إمكانية الوصول إلى الطاقة الكهربائية"، ٢٠٠٧/٤/١٩، www.usaid.gov.
- ٢٤٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الحالي الأسبوعي، ٢٠٠٨/٩/٢٦.
- ٢٤٩- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، اكلاف إكمال مشاريع صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، ٢٠٠٨/٩/٣٠؛ وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ١٠/١٤/٢٠٠٨. تشمل الأرقام الالتزامات والانفاقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2)، صندوق دعم الاقتصاد وتمويلات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- ٢٥٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "تقرير وزارة المالية حول الرأس المال، حزيران/يونيو ٢٠٠٨"، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٥١- استجابة وزارة المالية، بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٧.
- ٢٥٢- السفارة الأميركية، بغداد "الموازنة التكميلية للعام ٢٠٠٨" استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٥٣- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٢٥٤- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٢٥٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٥٦- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق ٢٠٠٨/٩/٢٦.
- ٢٥٧- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٢٥٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الحالي الشهري، ٢٠٠٨/٨/٣١.
- ٢٥٩- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 08-08، "محطة معالجة المياه R3 في مدينة الصدر- بغداد، العراق، ٢٠٠٨/١٠.
- ٢٦٠- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 08-144, 145, 146, 147, 148، "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة - الفلوجة"، ٢٠٠٨/١٠.

- ٢٦١- تقرير تدقيق المفتش العام 148، 147، 146، 145، SIGIR 08-144، "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة - الفلوجة"، ٢٠٠٨/١٠.
- ٢٦٢- تقرير تدقيق المفتش العام 148، 147، 146، 145، SIGIR 08-144، "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة - الفلوجة"، ٢٠٠٨/١٠.
- ٢٦٣- تقرير تدقيق المفتش العام 148، 147، 146، 145، SIGIR 08-144، "محطة معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة - الفلوجة"، ٢٠٠٨/١٠.
- ٢٦٤- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، اكلاف إكمال مشاريع صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، ٢٠٠٨/٩/٣٠؛ وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤. تشمل الأرقام الالتزامات والانفاقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2)، صندوق دعم الاقتصاد وتمويلات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- ٢٦٥- استجابة السفارة الأميركية ببغداد، "تقرير وزارة المالية حول الرأس المال، حزيران/يونيو ٢٠٠٨"، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٦٦- استجابة وزارة المالية، ببغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٧.
- ٢٦٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٧. في ٢٠٠٨/١٠/١٨، زودت وزارة المالية الأميركية رقما بديلا بلغ ١,٣٤ مليون دولار.
- ٢٦٨- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٢٦٩- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٢٧٠- تقرير تدقيق المفتش العام 06-026، SIGIR، "مراجعة إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمشروع مستشفى الأطفال في البصرة، ٢٠٠٦/٧/٣١.
- ٢٧١- تقرير تدقيق المفتش العام 06-026، SIGIR، "مراجعة إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمشروع مستشفى الأطفال في البصرة، ٢٠٠٦/٧/٣١.
- ٢٧٢- تقرير تدقيق المفتش العام 06-026، SIGIR، "مراجعة إدارة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية لمشروع مستشفى الأطفال في البصرة، ٢٠٠٦/٧/٣١.
- ٢٧٣- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٢٧٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تقرير الوضع الحالي الأسبوعي، ٢٠٠٨/٩/٢٦.
- ٢٧٥- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٧.
- ٢٧٦- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق ٢٠٠٨/٩/٢٦.
- ٢٧٧- نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، اكلاف إكمال مشاريع صندوق دعم الاقتصاد (ESF)، ٢٠٠٨/٩/٣٠؛ وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١؛ نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤. تشمل الأرقام الالتزامات والانفاقات لصندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2)، صندوق دعم الاقتصاد وتمويلات برنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP).
- ٢٧٨- استجابة السفارة الأميركية ببغداد، "تقرير وزارة المالية حول الرأس المال، حزيران/يونيو ٢٠٠٨"، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٢٧٩- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٢٨٠- مكتب شؤون الشرق الأدنى في العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.

- ٢٨١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٩.
- ٢٨٢- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٣/١٠/٢٠٠٨.
- ٢٨٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٢٨٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٩. وزارة الدفاع: "مطار النجف يعزز اقتصاد المحافظات الجنوبية في العراق"، ٢٢/٧/٢٠٠٨، www.defenselink.mil، تم الوصول إليه في ٣/١٠/٢٠٠٨.
- ٢٨٥- الأرقام تقديرية. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨، استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) لطلب المفتش العام للبيانات الحصول على بيانات، ٧/٧/٢٠٠٨.
- ٢٨٦- المستشار الأقدم، الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلوماتية، السفارة الأميركية في بغداد، ١/٩/٢٠٠٦-٢٠٠٨/٣/٣١؛ "إعادة الأعمار في العراق: الاتصالات السلكية واللاسلكية"، ٢٩/٦/٢٠٠٨.
- ٢٨٧- المستشار الأقدم، الاتصالات السلكية واللاسلكية وتكنولوجيا المعلوماتية، السفارة الأميركية في بغداد، ١/٩/٢٠٠٦-٢٠٠٨/٣/٣١؛ "إعادة الإعمار في العراق: الاتصالات السلكية واللاسلكية"، ٢٩/٦/٢٠٠٨.
- ٢٨٨- استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٨.
- ٢٨٩- إنشاء الأبنية، مشروع بقيمة ٢٢,٦ مليون دولار جرى الالتزام به بموجب تمويلات العام ٢٠٠٤ لصندوق إعانة وإعادة إعمار العراق (IRRF)، يشار إليه على أنه اكتمل بنسبة ٥٦% ويقدر أن يكتمل في كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٨. استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ١/١٠/٢٠٠٨.
- ٢٩٠- استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٨.
- ٢٩١- صندوق النقد الدولي (IMF) "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩؛ وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٦/٩/٢٠٠٨.
- ٢٩٢- صندوق النقد الدولي (IMF) "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩.
- ٢٩٣- صندوق النقد الدولي (IMF) "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩.
- ٢٩٤- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "حان الوقت للعراقيين لتحقيق التقدم"، يقول رئيس سياسي في منظمة الأمم المتحدة، ٦/٨/٢٠٠٨، www.uniraq.org، تم الوصول إليه ١٤/١٠/٢٠٠٨.
- ٢٩٥- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 08-024، "معلومات حول برنامج خاص لوزارة الدفاع لتعزيز استعادة العاقبة الاقتصادية في العراق"، ٢٩/٧/٢٠٠٨.
- ٢٩٦- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق ٢٦/٩/٢٠٠٨.
- ٢٩٧- لم يتم تحديث هذه التقديرات التي أعدها المكتب المركزي للإحصاءات منذ حزيران/يونيو ٢٠٠٧. وزارة الدفاع (DoD)، "قياس الاستقرار والأمن في العراق"، ٢٦/٩/٢٠٠٨.
- ٢٩٨- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "حان الوقت للعراقيين لتحقيق التقدم"، يقول رئيس سياسي في منظمة الأمم المتحدة، ٦/٨/٢٠٠٨، www.uniraq.org، تم الوصول إليه ١٤/١٠/٢٠٠٨.
- ٢٩٩- وزارة الخارجية (DoS)، التقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ١٥/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٠٠- وزارة الخارجية (DoS)، التقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ١٠/٩/٢٠٠٨.
- ٣٠١- أبلغت السفارة الأميركية في بغداد ان هذه التحديثات زودت بالاعتماد على التقارير اليومية لإنتاج النفط ومصادر أخرى في السفارة. استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٩.
- ٣٠٢- صندوق النقد الدولي (IMF) "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩.
- ٣٠٣- صندوق النقد الدولي (IMF) "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩.

- ٣٠٤- صندوق النقد الدولي (IMF)، "المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يكمل أول مراجعة لترتيبات القروض الاحتياطية للعراق" ن ٢٠٠٨/٩/٣، www.imf.org، تم الوصول إليه ٢٠٠٨/٥/٩.
- ٣٠٥- مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية (EITI)، "صفحة وقائع مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية"، www.eitransparency.org، تم الوصول إليها ٢٠٠٨/٩/٢٩.
- ٣٠٦- مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية (EITI)، "بيان مبادرة الشفافية في الصناعات التعدينية"، www.eitransparency.org، تم الوصول إليها ٢٠٠٨/١٠/١٩.
- ٣٠٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣٠٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣٠٩- رئيس اللجنة القومية للاستثمارات، منتدى إعادة إعمار العراق، "قانون الاستثمار العراقي الجديد: الوصول العالمي". مرفق الصندوق الدولي لإعادة إعمار العراق (IRFFI)، للاجتماع الخامس للجنة المانحين، اسطنبول، تركيا، ٢٠٠٧/٣/١٩.
- ٣١٠- استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٣١١- الأمم المتحدة، النداء الموحد للعراق ٢٠٠٨"، ٢٠٠٨/٦.
- ٣١٢- استجابة الوكالة الأميركية لخدمة الزراعة الأجنبية لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٣١٣- الأمم المتحدة، النداء الموحد للعراق ٢٠٠٨"، ٢٠٠٨/٦.
- ٣١٤- الحكومة العراقية: "استراتيجية التنمية القومية: ٢٠٠٥-٢٠٠٧"، ٢٠٠٥/٦/٣٠. استجابة لطلب المفتش العام للبيانات لاحظ مكتب شؤون الشرق الأوسط - العراق (NEA-I)، ان "نظام التوزيع العام (PDS)، له تأثيرات مختلفة على الأسواق الزراعية المحلية في العراق. الاعتماد الشديد لنظام التوزيع العام على المستوردات يخفض الطلب المحتمل على منتجات محلية معينة ولكن الحكومة العراقية (GOI) تدفع في أحيان كثيرة أسعاراً أعلى من الأسعار السائدة في السوق العالمية عندما تشتري القمح، الشعير والأرز المنتجين محلياً. تقدم الحكومة العراقية إعانات مالية للإنتاج المحلي للقمح، الأرز والشعير الأمر الذي يثبط همة إنتاج محاصيل ذات قيمة أعلى. وبما ان قسماً كبيراً من إمداد الأغذية لا يخضع لأي تنظيم عبر نظام التوزيع العام، لا يشجع هذا النظام تطور أسواق زراعية بالمفرق وبحرف الاستهلاك باتجاه السلع في سلة أغذية نظام التوزيع العام". استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط - العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٣١٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣١٦- صندوق النقد الدولي (IMF)، "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩، لاحظ تقرير مصلحة خدمات الأبحاث في الكونغرس ان إجمالي دين عهد صدام بلغ ١٢٥ مليار دولار. مصلحة خدمات الأبحاث في الكونغرس "تخفيف الديون العراقية: الإجراء والتضمينات المحتملة لتخفيف الدين الدولي"، ٢٠٠٨/٣/٣١. ابلغ مكتب شؤون الشرق الأوسط-العراق ان الدين الخارجي المتبقي بذمة العراق يتراوح بين ٥٣ و ٨٦ مليار دولار. استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط - العراق لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٣١٧- صندوق النقد الدولي (IMF)، "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩، المرحلة الثالثة من تخفيض الديون للعام ٢٠٠٨، تفترض ترتيبات قروض احتياطية خلال ٢٠٠٥ - ٢٠٠٩.
- ٣١٨- استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٣١٩- استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٣٢٠- صندوق النقد الدولي (IMF)، "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩.
- ٣٢١- صندوق النقد الدولي (IMF)، "تقرير البلدان رقم ٣٠٣/٠٨"، ٢٠٠٨/٩.
- ٣٢٢- استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٣٢٣- استجابة مكتب شؤون الشرق الأوسط-العراق (NEA-I) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣.

- ٣٢٤- وحدة الإدارة المكثفة (IMU)، نظرة شاملة على الزراعة والري في العراق"، ٢٠٠٨/٦.
- ٣٢٥- وحدة الإدارة المكثفة (IMU)، نظرة شاملة على الزراعة والري في العراق"، ٢٠٠٨/٦.
- ٣٢٦- استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٣٢٧- مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG)، رقم التقرير E-267-08-006-P، تدقيق الأعمال الزراعية في العراق"، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٣٢٨- مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG)، رقم التقرير E-267-08-006-P، تدقيق الأعمال الزراعية في العراق"، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٣٢٩- مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG)، رقم التقرير E-267-08-006-P، تدقيق الأعمال الزراعية في العراق"، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٣٣٠- مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG)، رقم التقرير E-267-08-006-P، تدقيق الأعمال الزراعية في العراق"، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٣٣١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣٣٢- مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID OIG)، رقم التقرير E-267-08-006-P، تدقيق الأعمال الزراعية في العراق"، ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٣٣٣- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق ٢٠٠٨/٩/٢٦.
- ٣٣٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣٣٥- استجابة فريق المهمة الأميركي لتحسين الأعمال وعمليات الاستقرار (TF-BSO)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣٣٦- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣٣٧- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٥.
- ٣٣٨- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق ٢٠٠٨/٩/٢٦.
- ٣٣٩- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 08-024، "معلومات حول برنامج خاص لوزارة الدفاع لتعزيز استعادة العافية الاقتصادية في العراق، ٢٠٠٨/٧/٢٩.
- ٣٤٠- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٣.
- ٣٤١- القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان (JCC-I/A)، باثعون عراقيون فقط"، ٢٠٠٨/٩/٤.
- ٣٤٢- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/١٠/٢؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ وزارة الخارجية (DoS) تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١؛ مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، تقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤، استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦. استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٣٤٣- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-001، "فرص تعزيز الاستراتيجية الأميركية لتنمية الديمقراطية في العراق"، ٢٠٠٨/١٠.
- ٣٤٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٣٤٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.

- ٣٤٦- النقاش حول النسب المئوية الطائفية يتعلق بالمستوطنين العرب الذين انتقلوا إلى محافظات كردستان خلال حكم صدام. أعطوا أراض ومساكن لتحفيزهم على الهجرة إلى المنطقة. فإذا عاد هؤلاء المستوطنون إلى مناطق سكنهم الأساسية، يصبح الأكراد أكبر أقلية أثنية. أثير النقاش حول المسائل المركزية التي تتعلق بكيفية التعويض للعرب وأين يمكن إعادة إسكانهم.
- ٣٤٧- السفارة الأميركية في بغداد، "شهادة السفير رايان سي كروكر أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ، ٤/٢٠٠٨؛ مجلس النواب العراقي" قانون الانتخاب، ١٥/١٠/٢٠٠٨، www.parliament.ia/Iraq، تم الوصول إليه في ١٥/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٤٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات، ٢/١٠/٢٠٠٨. القانون الإداري الانتقالي (TAL): الدستور العراقي المؤقت في فترة ما بعد الحرب مباشرة وقع في ٨ آذار/مارس ٢٠٠٥ من قبل المجلس الحاكم في العراق وأصبح نافذ المفعول في ٢٨ حزيران/يونيو ٢٠٠٤ بعد نقل السلطة من سلطة الائتلاف المؤقتة (بقيادة الولايات المتحدة) إلى حكومة عراقية سيدة. ظل القانون ساري المفعول حتى تشكيل الحكومة الحالية في أيار ٢٠٠٦ عندما ألغاه صدور الدستور الدائم الذي صودق عليه باستفتاء عام في ٥ تشرين الأول/أكتوبر ٢٠٠٥.
- ٣٤٩- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "ستافان دي ميستورا بحث على إعادة إدخال المادة ٥٠ في قانون الانتخاب" ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٥٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٥١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٥٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٥٣- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "بدأ تحديث معلومات سجل الناخبين في ١٥ تموز/يوليو ٢٠٠٨"، ١٥/٧/٢٠٠٨.
- ٣٥٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٥٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٥٦- وحدة الاستخبارات: صحيفة "الايكونومست"، تقرير البلدان: العراق، آب/أغسطس ٢٠٠٨.
- ٣٥٧- السفارة الأميركية في بغداد، "مؤتمر صحفي مع المدعي العام ميكائيل بي موكاسي والسفير رايان كروكر، ١٣/٢/٢٠٠٨".
- ٣٥٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٥٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٦٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٦١- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "الأمم المتحدة: تلقت جهود العراق في مكافحة الفساد دعماً من شركاء دوليين"، ٢٩/٩/٢٠٠٨.
- ٣٦٢- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، "الأمم المتحدة: تلقت جهود العراق في مكافحة الفساد دعماً من شركاء دوليين"، ٢٩/٩/٢٠٠٨.
- ٣٦٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٦٤- استجابة الصندوق الدولي للرقابة على المخدرات وتطبيق القانون (INL)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٣/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٦٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٦٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.

- ٣٦٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٦٨- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-001، "فرص تعزيز الاستراتيجية الأميركية لتنمية الديمقراطية في العراق"، ١٠/٢٠٠٨.
- ٣٦٩- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-001، "فرص تعزيز الاستراتيجية الأميركية لتنمية الديمقراطية في العراق"، ١٠/٢٠٠٨.
- ٣٧٠- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، رقم E-267-08-005-P، "تدقيق برنامج عمل المجتمع المحلي في العراق/ الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، ٥/٨/٢٠٠٨.
- ٣٧١- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير القسم ٢٢٠٧، ٧/٢٠٠٨.
- ٣٧٢- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير القسم ٢٢٠٧، ٧/٢٠٠٨.
- ٣٧٣- برنامج الحكم المحلي، "ورشة المحاسبة تعزز الحكم الشفاف في العراق"، ١٠/٨/٢٠٠٨، www.lgp-iraq.org، تم الوصول إليه في ٣/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٧٤- تقرير تدقيق المفتش العام SIGIR 09-003، "الكلفة، النتائج والإشراف على عقود برنامج الحكم المحلي مع معهد مثلث الأبحاث، ١٠/٢٠٠٨.
- ٣٧٥- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير القسم ٢٢٠٧، ٧/٢٠٠٨.
- ٣٧٦- وزارة الخارجية (DoS)، رسالة إخبارية حول صناديق الاستجابة السريعة، ٢٥/٩/٢٠٠٨.
- ٣٧٧- وزارة الخارجية (DoS)، رسالة إخبارية حول صناديق الاستجابة السريعة، ٢٥/٩/٢٠٠٨.
- ٣٧٨- وزارة الخارجية (DoS)، تقرير القسم ٢٢٠٧، ٧/٢٠٠٨.
- ٣٧٩- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)/ العراق، رسالة إخبارية عن العراق، المجلد ١، الإصدار الأول، ٨/٢٠٠٨.
- ٣٨٠- الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)/ العراق، رسالة إخبارية عن العراق، المجلد ١، الإصدار الأول، ٨/٢٠٠٨؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ١٤/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٨١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٨/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٨٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٨٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٨٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٨٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٨٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٨٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٨٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٣٨٩- وزارة الخارجية (DoS)، المكتب الإقليمي للشرق الأوسط، "وضع برامج تأشيرات الدخول الخاصة بالمهاجرين العراقيين"، رقم التقرير MERO-IQO-08-01، ٧/٢٠٠٨.
- ٣٩٠- وزارة الخارجية (DoS)، موجز حول تطورات برامج قبول ومساعدة اللاجئين العراقيين، المنسق الرئيسي لمسائل اللاجئين العراقيين والمستشار الرئيسي لوزير الأمن الوطني اللاجئين العراقيين، واشنطن، دي سي، ١٢/٩/٢٠٠٨.

- ٣٩١- وزارة الخارجية (DoS)، موجز حول تطورات برامج قبول ومساعدة اللاجئين العراقيين، المنسق الرئيسي لمسائل اللاجئين العراقيين والمستشار الرئيسي لوزير الأمن الوطني اللاجئين العراقيين، واشنطن، دي سي، ٢٠٠٨/٩/١٢.
- ٣٩٢- المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، "تقييمات الحاجات الطارئة"، ٢٠٠٨/٩.
- ٣٩٣- المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، "تقييمات الحاجات الطارئة"، ٢٠٠٨/٩.
- ٣٩٤- وزارة الخارجية (DoS)، موجز حول تطورات برامج قبول ومساعدة اللاجئين العراقيين، المنسق الرئيسي لمسائل اللاجئين العراقيين والمستشار الرئيسي لوزير الأمن الوطني اللاجئين العراقيين، واشنطن، دي سي، ٢٠٠٨/٩/١٢.
- ٣٩٥- المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، "تقييمات الحاجات الطارئة"، ٢٠٠٨/٩.
- ٣٩٦- وزارة الخارجية (DoS)، موجز حول تطورات برامج قبول ومساعدة اللاجئين العراقيين، المنسق الرئيسي لمسائل اللاجئين العراقيين والمستشار الرئيسي لوزير الأمن الوطني اللاجئين العراقيين، واشنطن، دي سي، ٢٠٠٨/٩/١٢.
- ٣٩٧- وزارة الخارجية (DoS)، مكتب المتحدث الرسمي، "الولايات المتحدة تتجاوز قبول ١٢ ألف عراقي خلال السنة المالية ٢٠٠٨، المساعدة تسجل ارقاماً عالية جديدة، ٢٠٠٨/٩/١٢.
- ٣٩٨- بيانات تمويل قطاع التعليم من صندوق إعانة وإعادة إعمار العراق الثاني (IRRF 2)، تحتوي ارقاماً للاجئين ولحقوق الإنسان ولا يمكن تحديدها بالضبط. وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٩/١٠/١، نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، التقرير ربع السنوي للفيلق المتعدد الجنسيات في العراق (MNC-I)، ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٣٩٩- تقارير تدقيق المفتش العام 151, 150, 149-SIGIR PA-08، "مدارس القدس، المعلمين والفاو تحت برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، ٢٠٠٨/١٠.
- ٤٠٠- تقارير تدقيق المفتش العام 151, 150, 149-SIGIR PA-08، "مدارس القدس، المعلمين والفاو تحت برنامج الاستجابة الطارئة للقائد في العراق، ٢٠٠٨/١٠.
- ٤٠١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٠٢- استجابة مكتب شؤون المحافظات (OPA)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/٦/٢٩.
- ٤٠٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، "دليل نموذج النضوج: الملاحق"، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/١٤.
- ٤٠٤- السفارة الأميركية في بغداد، "إطار العمل الاستراتيجي لإعادة بناء القدرات والاستدامة في حكومات المحافظات العراقية، ٢٠٠٨/٩/٧.
- ٤٠٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٠٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٠٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/١٧.
- ٤٠٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩/٠٨/١٤-٢٠٠٩/٠٨، ديالى.
- ٤٠٩- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤١٠- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤١١- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤١٢- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.

- ٤١٣- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤١٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤١٥- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤١٦- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤١٧- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤١٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤١٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٢٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٢١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٢٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٢٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٧٠٨-٢٠٠٩٠٨، نينوى.
- ٤٢٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٩/١٠/٢.
- ٤٢٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لطرق إعادة إعمار المحافظات ٢٦٠٨٠٨-٢٠٠٩٠٨، نينوى.
- ٤٢٦- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٤٢٧- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٢٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٢٩- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٣٠- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٣١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٣٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٣٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٣٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٣٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٣٦- قائد الفرقة المتعددة الجنسيات - الشمال، "موجز الأخبار من وزارة الدفاع بحضور اللواء مارك هيرتلنج"، ٢٠٠٨/٨/١١، www.defenselink.mil، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٤٣٧- وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٤٣٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨-٢٠٠٩٠٨، كركوك.
- ٤٣٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "اشتراك السلاح الجوي مع فرق إعادة إعمار المحافظات لتحسين الظروف المعيشية للعراقيين"، ٢٠٠٨/٥/١١.
- ٤٤٠- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٤٤١- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.

- ٤٤٢ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٤٣ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٤٤ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٤٥ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٤٦ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٤٧ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٤٨ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٤٩ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٥٠ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد، حكومة محافظة صلاح الدين تعترف بفريق إعادة إعمار المحافظات، ٢٠٠٨/٩/٢١.
- ٤٥١ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨ - ٢٠٠٩٠٨، صلاح الدين.
- ٤٥٢ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨ - ٢٠٠٩٠٨، صلاح الدين.
- ٤٥٣ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، "مراجعة شاملة للمحافظات"، صلاح الدين، ٢٠٠٨/٦/٢، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/٩/٨.
- ٤٥٤ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٥٥ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٤٥٦ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٤٥٧ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٥٨ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٥٩ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٦٠ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، برامج الوضع الحالي نصف الشهرية ٢٠٠٨/٩/٢٦.
- ٤٦١ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٦٢ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٦٣ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٦٤ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٦٥ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "الشمس تغذي محطات تطهير المياه في الفلوجة"، ٢٠٠٨/٦/١٧.
- ٤٦٦ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٦٧ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٦٨ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٦٩ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٧٠ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.

- ٤٧١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "محافظة الانبار آمنة بدرجة كافية لاستضافة المؤتمر الصحي الأول"،
٢٠٠٨/٨/١٦.
- ٤٧٢- بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (UNAMI)، مجلة (UNAMI Focus)، العدد رقم ٢٦، ٢٠٠٨/٩.
- ٤٧٣- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٤٧٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٧٥- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٧٦- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٧٧- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٧٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٧٩- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٨٠- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٨١- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٤٨٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٨٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٨٤- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/٨/٢٨.
- ٤٨٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٤٨٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "بنات العراق يكملن التدريب الأمني"، ٢٠٠٨/٧/١٦.
- ٤٨٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "بنات العراق يكملن التدريب الأمني"، ٢٠٠٨/٧/١٦.
- ٤٨٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٧٠٩٠٨-٠٤١٠٠٨، ديالي.
- ٤٨٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٦٠٨٠٨-٢٣٠٨٠٨، ديالي.
- ٤٩٠- مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/٨/٢٨.
- ٤٩١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "المزارعون العراقيون يبدأون بتخطيط مصائرهم" ٢٠٠٨/٨/١٩.
- ٤٩٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٨-٢٣٠٨٠٨، ديالي.
- ٤٩٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "الحكومة العراقية المحلية تقوم برد ايجابي تجاه الجفاف"،
٢٠٠٨/٧/٢٥.
- ٤٩٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "الحكومة العراقية المحلية تقوم برد ايجابي تجاه الجفاف"،
٢٠٠٨/٧/٢٥.
- ٤٩٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٧٠٩٠٨-١٤٠٩٠٨، ديالي؛ مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٠٠٩٠٨-١٤٠٩٠٨، ديالي.
- ٤٩٦- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٤٩٧- استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD) لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٦.

- ٤٩٨ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تأثيرات الملاك نصف الشهرية الوضع الحالي، ٢٠٠٨/٨/١.
- ٤٩٩ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تأثيرات الملاك نصف الشهرية الوضع الحالي، ٢٠٠٨/٨/١.
- ٥٠٠ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تأثيرات الملاك نصف الشهرية الوضع الحالي، ٢٠٠٨/٢٠/٦.
- ٥٠١ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٠٢ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٠٣ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٠٤ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٠٥ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٠٦ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٠٧ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٠٨ - استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٠٩ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، "المراجعة الشاملة للمحافظات"، بغداد، ٢٠٠٨/٦، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/٩/٨.
- ٥١٠ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، "المراجعة الشاملة للمحافظات"، بغداد، ٢٠٠٨/٦، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/٩/٨.
- ٥١١ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨ - بغداد، ٢٠٠٩٠٨.
- ٥١٢ - القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "النمران الصغيران يصلان إلى حديقة الحيوانات في بغداد"، ٢٠٠٨/٨/١٤.
- ٥١٣ - القوات المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "النمران الصغيران يصلان إلى حديقة الحيوانات في بغداد"، ٢٠٠٨/٨/١٤.
- ٥١٤ - مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٧٠٩٠٨ - بغداد، ١٤٠٩٠٨.
- ٥١٥ - وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٥١٦ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٥١٧ - استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٥١٨ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥١٩ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٢٠ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٢١ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٢٢ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٢٣ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٢٤ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٢٥ - فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.

- ٥٢٦- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٢٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٢٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٢٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، "المراجعة الشاملة للمحافظات"، واسط، ٢٠٠٨/٦، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/٩/٨.
- ٥٣٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٣١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد، "أول مؤتمر صحفي على الإطلاق يعقد في الكويت، العراق، ٢٠٠٨/٨/١١، usembassy.gov، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- ٥٣٢- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٥٣٣- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٣٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٣٥- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٣٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٣٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٣٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٧٠٩٠٨-١٤٠٩٠٨، بابل.
- ٥٣٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٨-٢٩٠٨٠٨، بابل.
- ٥٤٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨-٢٠٠٩٠٨، بابل.
- ٥٤١- القوة المتعددة الجنسيات في العراق (MNF-I)، "السيطرة العراقية على محافظة بابل"، ٢٠٠٨/١٠/٢٣، www.mnf-iraq.com، تم الوصول إليها في ٢٠٠٨/١٠/٢٣.
- ٥٤٢- وزارة الدفاع (DoD)، "موجز اخباري مع العقيد توم جيمس واللواء عبد الأمير، ٢٠٠٨/٧/٢٤، www.defenselink.mil، تم الوصول إليه في ٢٠٠٨/١٠/١.
- ٥٤٣- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٥٤٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٤٥- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٤٦- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٤٧- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٤٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٤٩- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٥٠- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٥١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٥٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.

- ٥٥٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٥٥٤- السفارة الأميركية في بغداد، "موجز أسبوعي، فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨-٠٧٠٩٠٨.
- ٥٥٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، "فريق إعادة إعمار المحافظة، تقرير الحالة الأسبوعي للفترة ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، القادسية، تم الوصول إليه ٢٧/٩/٢٠٠٨.
- ٥٥٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٩٠٨٠٨-٠٦٠٩٠٨، القادسية.
- ٥٥٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، "فريق إعادة إعمار المحافظة، تقرير الحالة الأسبوعي للفترة ٢ آب/أغسطس ٢٠٠٨-٩ آب/أغسطس ٢٠٠٨، القادسية، تم الوصول إليه في ٩/٨/٢٠٠٨.
- ٥٥٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، "فريق إعادة إعمار المحافظة، تقرير الحالة الأسبوعي للفترة ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، القادسية، تم الوصول إليه ٢٧/٩/٢٠٠٨.
- ٥٥٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت فرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، "فريق إعادة إعمار المحافظة، تقرير الحالة الأسبوعي للفترة ٢١ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، ٢٧ أيلول/سبتمبر ٢٠٠٨، القادسية، تم الوصول إليه ٢٧/٩/٢٠٠٨.
- ٥٦٠- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١٠/٢٠٠٨.
- ٥٦١- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٧/٢٠٠٨.
- ٥٦٢- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٧/٢٠٠٨.
- ٥٦٣- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٧/٢٠٠٨.
- ٥٦٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٥٦٥- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٥٦٦- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠/١٠/٢٠٠٨.
- ٥٦٧- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ١٥/١٠/٢٠٠٨.
- ٥٦٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٧/٢٠٠٨.
- ٥٦٩- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٧/٢٠٠٨.
- ٥٧٠- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٧/٢٠٠٨.
- ٥٧١- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٧/٢٠٠٨.
- ٥٧٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٥٧٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢/١٠/٢٠٠٨.
- ٥٧٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٩٠٨٠٨-٠٦٠٩٠٨، النجف.
- ٥٧٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٩٠٨٠٨-٠٦٠٩٠٨، النجف.

- ٥٧٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٩٠٨٠٨-٠٦٠٩٠٨، النجف.
- ٥٧٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٩٠٨٠٨-٠٦٠٩٠٨، النجف.
- ٥٧٨- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٩٠٨٠٨-٠٦٠٩٠٨، النجف.
- ٥٧٩- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٥٨٠- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٨١- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٥٨٢- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٨٣- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٨٤- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٨٥- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٨٦- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٨٧- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٨٨- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٥٨٩- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨-٢٠٠٩٠٨، المثنى.
- ٥٩٠- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٧٠٩٠٨-١٤٠٩٠٨، المثنى.
- ٥٩١- الإفطار عشاء يقدم لكسر صيام بيوم يوماً كاملاً خلال الشهر الإسلامي رمضان، مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي، لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT): ٠٧٠٩٠٨-٠٤٠٩٠٨، المثنى. مكتب شؤون المحافظات الموجز الأسبوعي، فرق إعادة إعمار المحافظات: ١٤٠٩٠٨-٢٠٠٩٠٨.
- ٥٩٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨-٢٠٠٩٠٨، المثنى.
- ٥٩٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٩٠٨٠٨-٠٦٠٩٠٨، المثنى.
- ٥٩٤- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٥٩٥- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٩٦- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٩٧- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٩٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٥٩٩- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٦٠٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٦٠١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.

- ٦٠٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٣٠٨٠٨-٢٩٠٨٠٨، ذي- قار.
- ٦٠٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٧٠٩٠٨-١٤٠٩٠٨، ذي- قار.
- ٦٠٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٦٠٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨-٢٠٠٩٠٨، ذي- قار.
- ٦٠٦- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٦٠٧- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦٠٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦٠٩- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٦١٠- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦١١- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦١٢- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٦١٣- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٦١٤- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٧٠٩٠٨-٠٤١٠٠٨، ميسان.
- ٦١٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، موقع الانترنت الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، المراجعة الشاملة للمحافظات " ميسان، ٢٠٠٨/٦، تم الوصول إليه ٢٠٠٨/٩/٨.
- ٦١٦- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٥.
- ٦١٧- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٦١٨- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦١٩- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦٢٠- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٦٢١- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٦٢٢- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٧٠٩٠٨-٠٤١٠٠٨، البصره.
- ٦٢٣- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٠٧٠٩٠٨-١٤٠٩٠٨، البصره.
- ٦٢٤- استجابة السفارة الأميركية في بغداد لطلب المفتش العام للبيانات ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ٦٢٥- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ١٤٠٩٠٨-٢٠٠٩٠٨، البصره.
- ٦٢٦- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٩٠٨٠٨-٠٦٠٩٠٨، البصره.

- ٦٢٧- مكتب شؤون المحافظات (OPA)، الموجز الأسبوعي لفرق إعادة إعمار المحافظات (PRT)، ٢٩٠٨٠٨-٠٦٠٩٠٨، البصره.
- ٦٢٨- استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢٠.
- ٦٢٩- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦٣٠- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦٣١- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦٣٢- فرقة منطقة الخليج (GRD)، تحديث المعلومات الشهرية حول إدارة المشاريع، ٢٠٠٨/٧.
- ٦٣٣- أشير إليها سابقا على انها تدقيقات مالية مركزة.
- ٦٣٤- يشار أيضا إلى مشروع معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة في وثائق مختلفة على انه مشروع المجاري الصحية في الفلوجة، مشروع شبكة توزيع المجاري الصحية في الفلوجة وشبكة المجاري الصحية في الفلوجة. من اجل التماسك ضمن هذا التقرير وما لم يذكر ذلك، يشير المفتش العام إلى هذا المشروع على انه نظام معالجة مياه الصرف الصحي في الفلوجة.
- ٦٣٥- في عام ٢٠٠٧، أصبح مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO)، يعرف باسم مكتب المساعدة الانتقالية.
- ٦٣٦- يشمل مبلغ ٩٨ مليون دولار، ١٨٠٧ مليون دولار انفقوا بموجب أمر تسليم عقد فليور امبك و ٧٩,٣ مليون دولار انفقوا على عقود ملتزم بها لإكمال مشروع شبكة المجاري الصحية في الفلوجة. هذا الرقم معرض للزيادة بسبب أعمال العقود الموقوفة مثل تعديلات العقود ومنح عقود جديدة.

مصادر الرسوم البيانية الواردة في مرفق هذا التقرير:

- أ- التمويل الرئيسي والالتزامات حسب مناطق إعادة الاعمار: وزارة الخارجية (DoS)، تقرير الوضع الأسبوعي في العراق، ٢٠٠٨/١٠/١؛ استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة وزارة الخارجية (DoS)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤ و ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ استجابة فرقة منطقة الخليج (GRD) لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦؛ استجابة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/١٤؛ مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO) تقرير المؤشرات الأساسية، ٢٠٠٨/١٠/٢.
- ب- التخصيصات حسب السنة المالية: القانون العام ١٠٨-٧، القانون العام ١٠٨-١١، القانون العام ١٠٦-١٠٨، القانون العام ١٠٨-٢٨٧، القانون العام ١٠٩-١٣، القانون العام ١٠٩-١٠٢، القانون العام ١٠٩-١٤٨، القانون العام ١٠٩-٢٣٤، القانون العام ١١٠-٢٨، القانون العام ١١٠-٩٢، القانون العام ١١٠-١١٦، القانون العام ١١٠-١٣٧، القانون العام ١١٠-١٤٩، القانون العام ١١٠-١٦١، القانون العام ١١٠-٢٥٢.
- ج- مدى والكلفة المتوسطة لمشاريع برنامج الاستجابة الطارئة للقائد: نظام إدارة إعادة إعمار العراق (IRMS)، برنامج العمل اكسيل لبرنامج الاستجابة الطارئة للقائد (CERP)، ٢٠٠٨/١٠/٣.
- د- أسعار النفط: الإدارة الأميركية لمعلومات الطاقة، "الأسعار الأسبوعية الصافية لنفط كركوك، العراق في خليج الولايات المتحدة، ٢٠٠٨/١٠/١٥، www.eia.doe.gov، تم الوصول إليها ٢٠٠٨/١٠/١٧.
- هـ- صادرات النفط: السفارة الأميركية في بغداد، استجابة لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٢، ورقة العمل المفصلة للاستيراد، الإنتاج والتصدير الصادرة من مكتب المساعدة الانتقالية للعراق، ٢٠٠٨/٤؛ خلية صهر الطاقة، تقرير يومي عن النفط، ٢٠٠٨/٤/٣٠، ٢٠٠٨/٥/٢٩ و ٢٠٠٩/١/٣٠.

- و- الإنتاج، الطلب والسعة للكهرباء: مكتب المساعدة الانتقالية للعراق (ITAO)، مكتب إدارة إعادة إعمار العراق (IRMO)، حول الأداء اليومي للوحدات، ٢٠٠٦/٧/١ - ٢٠٠٨/٩/٣٠.
- س- أحداث أمنية: ثلاث لقطات سريعة في الوقت المطلوب: استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات، ٢٠٠٨/١٠/٦.
- ح- أحداث أمنية وتدريب الجيوش: استجابة مكتب وزير الدفاع (OSD)، لطلب المفتش العام للبيانات، وزارة الدفاع (DoD)، قياس الاستقرار والأمن في العراق، ٢٠٠٥/٧، ٢٠٠٥/١٠، ٢٠٠٦/٢، ٢٠٠٦/٥، ٢٠٠٦/٨، ٢٠٠٦/١١، ٢٠٠٧/٣، ٢٠٠٧/٦، ٢٠٠٧/٩، ٢٠٠٧/١٢، ٢٠٠٨/٣، ٢٠٠٨/٦، و ٢٠٠٨/٩.

المختصرات والتعريفات

يتضمن هذا القسم جميع المختصرات الموجودة في تقرير المفتش العام الخاص بإعادة إعمار العراق (SIGIR)

ACRONYMS	DEFINITIONS	ARABIC
AAO	Authorized Acquisition Objective	هدف تملك المرخص
ACCO	Anticorruption Coordination Office	مكتب تنسيق أعمال مكافحة الفساد
ARGENT U.S.	Army Central	القيادة الوسطى لقوات الجيش
ARFORGEN	Army Force Generation	توليد قوات الجيش
ASC U.S.	Army Sustainment Command	قيادة استدامة الجيش
BCT	Brigade Combat Team	فريق اللواء القتالي
BIC	Basrah Investment Commission	لجنة البصرة للاستثمار
BPA	Blanket Purchase Agreement	اتفاقية شراء غفل
BSA	Board of Supreme Audit	مجلس التدقيق الأعلى
CA	Civil Affairs	شؤون مدنية
CAATT	Coalition Army Advisory Training Team	فريق التدريب الاستشاري لقوات الائتلاف
CAP	Community Action Program	برنامج عمل المجتمع المحلي
CAPS	Commercial Accounts Payable System	نظام حسابات الدفع التجاري
CBI	Central Bank of Iraq	البنك المركزي العراقي
CCC-I	Central Criminal Court of Iraq	المحاكم الجنائية المركزية العراقية
CENTCOM U.S.	Central Command	القيادة المركزية
CERP	Commander's Emergency Response Program	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد
CETI	Coordinator for Economic Transition in Iraq	المنسق لعملية الانتقال الاقتصادي في العراق
CF	Coalition Forces	قوات الائتلاف
CHRRP	Commanders Humanitarian Relief and Reconstruction Program	برنامج الإغاثة الإنسانية وإعادة الإعمار للقادة/القائد
CID-MPFU U.S.	Army Criminal Investigation Command, Major Procurement Fraud Unit	وحدة الكشف عن الاحتيال في المشتريات الرئيسية لدى قيادة التحريات الجنائية للجيش الأميركي

المختصرات والتعريفات

CIO	Chief Information Officer	الضابط الرئيسي للمعلومات
CMM	Capacity Maturity Model	نموذج نضوج السعة
CNPC	China National Petroleum Corporation	الشركة الوطنية الصينية للنفط
CoI	Commission on Integrity (previously known as Commission on Public Integrity)	هيئة النزاهة
CoM	Chief of Mission Council of Ministers	مجلس الوزراء
CoR:	Council of Representatives	مجلس النواب
CPA	Coalition Provisional Authority	سلطة الائتلاف المؤقتة
CPA-SC	South Central Region of the Coalition provisional Authority	سلطة الائتلاف المؤقتة- الجنوب الأوسط
CPATT:	Civilian Police Assistance Training Team	فريق التدريب للمساعدة المدنية للشرطة
CRC	Civilian Reserve Corps Constitutional Review Committee	فيلق الاحتياط المدني لجنة المراجعة الدستورية
CSO	Civil Society Organization	منظمة المجتمع المدني
CSP	Community Stabilization Program	برنامج استقرار المجتمع الأهلي
CTC	Combat Training Center	منظمة التدريب على القتال
CY	Calendar Year	السنة التقويمية
DAD	Donor Assistance Database	قاعدة بيانات مساعدات المانحين
DCIS	Defense Criminal Investigative Service	دائرة التحقيقات الجنائية في وزارة الدفاع
DCS	Deputy Chief of Staff	نائب رئيس الأركان
DFAS	Defense Finance and Accounting Service	دائرة المالية الدفاعية والحسابات
DFI	Development Fund for Iraq	صندوق تنمية العراق
DHS/USCIS	Department of Homeland Security	وزارة الامن الوطني
DoD	Department of Defense	وزارة الدفاع
DoS	Department of State	وزارة الخارجية
DoS OIG	Department of State Office of Inspector General	مكتب المفتش العام في وزارة الخارجية
DSCA	Defense Security Cooperation Agency	وكالة التعاون الأمني الدفاعي
EFT	Electronic Funds Transfer	نظام التحويل الإلكتروني للأموال
EITI	Extractive Industries Transparency Initiative	مبادرة الشفافية للصناعات التعدينية
EPCO	Emergency project Coordination office	مكتب تنسيق المشاريع المستعجلة
EPLS	Excluded parties List System	نظام قائمة الاطراف المستثناة

المختصرات والتعريفات

ePRT	Embedded Provincial Reconstruction Team	فرق إعادة الإعمار المرافقة
ESF	Emergency Support Funds	أموال الدعم للطوارئ
FBI	Federal bureau of Investigation	مكتب التحقيقات الفدرالي
FCC	Freedom Consulting & Catering Co.	شركة الاستشارة والتمويل لبرنامج حرية العراق
FMS	Foreign Military Sales	مبيعات الأسلحة إلى الخارج
FOB	Forward Operating Base	القواعد العاملة الأمامية
FY	Fiscal Year	السنة المالية
GAO	Government Accountability Office	مكتب المحاسبة الحكومية
GAPTIS	Governorates Accounting and Project Tracking Information System	نظام معلومات حسابات المحافظة وتعقب المشاريع
GEO	Governorate Electoral Office	مكتب الانتخاب في المحافظة
GIS	Geographic Information Systems	أنظمة المعلومات الجغرافية
GOI	Government of Iraq	الحكومة العراقية
GRD	Gulf Region Division	فرقة منطقة الخليج
GWOT	Global War On Terror	الحرب الشاملة على الإرهاب
HHS	Department of Health and Human Services	وزارة الصحة والخدمات الإنسانية
HJC	her Judicial Council	مجلس القضاء الأعلى
HMMWV	High Mobility Multipurpose Wheeled Vehicles	إجراءات لإدارة قوائم البنود القابلة للإصلاح القديمة في برنامج إعادة التجديد
HQSOCEUR US	Army Headquarters, Special Operations Command- Europe	القيادة المركزية للجيش، قيادة العمليات الخاصة- أوروبا
HRIMS	Human Resource Information Management System	نظام إدارة المعلومات المتعلقة بالموارد البشرية
IA	Inter-Agency	اتفاقية بين الوكالات
IASD	Iraq Association of Securities Dealers	هيئة معاملات الأوراق المالية العراقية
IBS-CMM	Integrated Booking System Container management Module	نظام الحجز المتكامل، وحدة إدارة الحاويات
ICCM	Iraq Community-based Conflict Mitigation	تحقيق النزاعات المستندة إلى المجتمع المحلي العراقي
ICCTF	International Contract Corruption Task Force	صندوق الحكومة العراقية المؤقتة
ICE U.S	Immigration and Customs Enforcement	تطبيق أنظمة الهجرة والجمارك
I-CERP	Iraq-Commander's Emergency Response Program	برنامج الاستجابة الطارئة للقائد العراق

المختصرات والتعريفات

ICITAP	International Criminal Investigative Training Assistance program	البرنامج الدولي للمساعدة في التدريب على التحقيقات الجنائية
ID	Iraqi Dinar Infantry Division	دينار عراقي فرقة المشاة
IDA	International Development Association (World Bank)	رابطة التنمية الدولية (البنك الدولي)
IDP	Internally Displaced Person	هيئة التنمية الدولية
IED	Improvised Explosive Device	جهاز تفجير مرتجل
IG	Inspector General	المفتش العام
IHEC	Independent High Electoral Commission	اللجنة الانتخابية العليا المستقلة
IIGC	Iraq Inspectors General Council	مجلس المفتشين العاميين العراقي
IIGF	Iraq Interim Government Fund	صندوق الحكومة الانتقالية العراقية
IJ	Investigative Judge	قاضي تحقيق
IJIP	Iraq justice Integration Project	مشروع دمج العدل في العراق
IMET	International Military and Education Training	التدريب والتعليم العسكري الدولي
IMF	International Monetary Fund	صندوق النقد الدولي
INL	Bureau of International Narcotics and Law Enforcement Affairs (DoS)	مكتب المخدرات الدولي وفرض تطبيق القانون (وزارة الخارجية)
IP	Iraqi Police	الشرطة العراقية
IRAP	Iraq Rapid Assistance Program	برنامج المساعدة السريعة للعراق
IRFFI	International Reconstruction Fund Facility for Iraq	الصندوق الدولي لتمويل إعادة إعمار العراق
IRMS	Iraq Reconstruction Management System	نظام إدارة إعادة إعمار العراق
IRRF	Iraq Relief and Reconstruction Fund	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق
IRRF 1	Iraq Relief and Reconstruction	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الأول
IRRF 2	Iraq Relief and Reconstruction Fund-funded	صندوق إغاثة وإعادة إعمار العراق الثاني
IRS	Internal Revenue Service	دائرة الإيرادات الداخلية
ISAD	Iraqi Association of Securities Dealers	الجمعية العراقية المتعاملين بالسندات المالية
ISCI	Islamic Supreme Council of Iraq	المجلس الاسلامي الأعلى في العراق
ISF	Iraqi Security Forces	قوات الأمن العراقية
ISFF	Iraq Security Forces Fund	صندوق قوات الأمن العراقية
IPS	Iraqi Police Service	خدمة الشرطة العراقية

المختصرات والتعريفات

ISX	Iraq Stock Exchange	البورصة العراقية
ITAO	Iraq Transition Assistance Office	مكتب المساعدة الانتقالية للعراق
IZ	International Zone	منطقة دولية
JAM	Jaysh al-Mahdi	جيش المهدي
JCC-I/A	Joint Contracting Command-Iraq/Afghanistan	القيادة المشتركة للعقود في العراق وأفغانستان
JIEDDO	Joint IED Defeat Organization	المنظمة المشتركة لمقاومة أجهزة تفجير مرتجل
JPS	Judicial Protection Service	دائرة الحماية القضائية
Km	Kilometer	كيلومتر
KPP	Key Performance Parameter	معلم اداء رئيسي
KRG	Kurt	حكومة إقليم كردستان
kV	Kilovolt	كيلو فولت
LAOTF	Law and Order Task Force	فريق مهمة فرض القانون والنظام
LGP	Local Governance Programs	برامج الحكم المحلي
MAAWS	Money as a Weapon System	المال كنظام سلاح
MAT	Munitions Assessment Team	فريق تقييم الذخائر
MBPD	Million Barrels Per Day	مليون برميل في اليوم
MFI	Microfinance Institution	مؤسسة للتمويلات الصغيرة
MNC-I:	Multi-National Corps-Iraq	الفيلق المتعدد الجنسيات في العراق
MNF-I	Multi-National Force-Iraq	القوات المتعددة الجنسيات في العراق
MNSTC-I	Multi-National Security Transition Command-Iraq	القيادة الأمنية الانتقالية المتعددة الجنسيات في العراق
MOD	Ministry of Defense	وزارة الدفاع
MOI:	Ministry of Interior	وزارة الداخلية
MW	Megawatt	ميغا واط
MWh	Megawatt-hour	ميغا واط ساعة
NCD	National Capacity Development	إنماء القدرات القومية
NCO	Non-commissioned Officer	صف ضابط
NDAA	National Defense Authorization Act	قانون تفويض الدفاع القومي
NEA-I	Bureau of Near Eastern Affairs-Iraq (DoS)	مكتب شؤون الشرق الأدنى -العراق
NEC	New Embassy Compound	المجمع الجديد للسفارة
NGO	Non-governmental Organization	منظمة غير حكومية
NIC	National Investment Commission	اللجنة الوطنية للاستثمار
NP	National Police	الشرطة الوطنية (العراقية)
NRRRF	Natural Resources Risk Remediation Fund	صندوق معالجة أخطار الموارد الطبيعية
OEF	Operation Enduring Freedom	عملية الحرية الدائمة

المختصرات والتعريفات

OFDA	Office of Foreign Disaster Assistance	مكتب المساعدة الأجنبية في حالة الكوارث
OIF	Operation Iraqi Freedom	عملية حرية العراق
OMA	Operation and maintenance, Army	مكتب الإدارة والموازنة
OMB	Office of Management and Budget	مكتب الإدارة والموازنة
OMS	Operations, Maintenance, and Sustainment	التشغيل، الصيانة والاستدامة
ONE-NET	Outside the Continental United States Navy Enterprise Network	شبكة مشاريع الحرية خارج حدود الولايات المتحدة القارية
OPA	Office of Provincial Affairs	مكتب شؤون المحافظات
OPE	Overseas Processing Entity	هيئة المعالجة ما وراء البحار
OPIC	Overseas Private Investment Corporation	شركة الاستثمارات الخاصة ما وراء البحار
OPTEMPO	Operating Tempo	وتيرة التشغيل
OSI	US Air Force Office of Special Investigations	مكتب القوات الجوية للتحقيقات الخاصة
OTI	Office of Transition Initiatives	مكتب المبادرات الانتقالية
PAC	Procurement Assistance Center (Iraq)	مراكز المساعدة للمشتريات (العراق)
PC	Provincial Council	مجلس المحافظات
PDS	Public Distribution System	نظام التوزيع العام
PEG	Provincial Economic Growth	برنامج التنمية الاقتصادية للمحافظات
PEZ	Pipeline Exclusion Zone	مناطق حظر خطوط أنابيب النفط
PIC	Provincial Iraqi Control	سيطرة المحافظات العراقية
P.L.	Public Law	قانون عام
PPAT	Provincial Procurement Assistance Teams	فرق المساعدة لمشتريات المحافظات
PPS	Personal Protective Services	خدمات الحماية الشخصية
PRDC	Provincial Reconstruction Development Committees	لجان إعادة إعمار وتنمية المحافظات
PRM	Bureau of Population, Refugees, and Migration	مكتب السكان، اللاجئين والهجرة
PRT	Provincial Reconstruction Team	فرق إعادة إعمار المحافظات
PSC	Private security companies	الشركات الأمنية الخاصة
PST	Provincial Support Team	فريق دعم المحافظة
QA	Quality Assurance	ضمان الجودة/النوعية
QC	Quality Control	مراقبة الجودة/النوعية
QRF	Quick Response Fund	صندوق الاستجابة السريعة
RDT&E	Research, Development, Test, and Evaluation	البحث، التطوير، الاختبار والتقييم

المختصرات والتعريفات

RIE	Restore Iraqi Electricity	إعادة كهرباء العراق إلى وضعها السابق
RIO	Restore Iraqi Oil	إعادة نفط العراق إلى وضعه السابق
RMS	Readiness Management Support	دعم إدارة الجهوية
RRC	Response Readiness Corps	فيلق الاستعداد للاستجابة
RRT	Regional Reconstruction Team	فريق إعادة إعمار الاقاليم
RSCMA	Reconstruction and Stabilization Civilian management Act or 2008	قانون إعادة الإعمار وإدارة الاستقرار المدني
RTI	Research Triangle Institute	معهد الأبحاث تريانغل
SBA	Stand-By Arrangement (IMF)	ترتيبات القروض الاحتياطية (من صندوق النقد الدولي)
SBDC	Small Business Development Center	مركز تطوير شركات أعمال صغيرة
SDDC	Military Surface Development and Distribution Command	قيادة تطوير وتوزيع القوات العسكرية البرية
SFA	Strategic Framework Agreement	اتفاقية إطار العمل الاستراتيجي
SIGIR	Special Inspector General for Iraq Reconstruction	المفتش العام الخاص لإعادة إعمار العراق
SIV	Special Immigrant Visa	تأشيرة دخول خاصة للمهاجرين
SOE	State-owned Enterprise	مؤسسة تمتلكها الدولة
SOFA	Status of Forces Agreement	وضع اتفاقية القوات
SOI	Sons of Iraq	منظمة أبناء العراق
SPOT	Synchronized Predeployment Operational Tracker	المتتبع العملائي المتزامن قبل نشر القوات
TCS	Temporary Change Of Station	تغيير مؤقت للمحطات
TGA	Total Government Allegiance	الانتماء التام للحكومة
Treasury	United States Department of Treasury	وزارة المالية الأميركية
UAS	Unmanned Aircraft Systems	أنظمة الطائرة بدون طيارين
UCP	Unified Common Plan	خطة مشتركة موحدة
UN	United Nations	الأمم المتحدة
UNAMI UN	UN Assistance Mission for Iraq	بعثة مساعدة العراق التابعة للأمم المتحدة
UNDG- ITF	United Nations Development Group Iraq Trust Fund	صندوق الائتمان العراقي لدى مجموعة التنمية في الأمم المتحدة
UNDP:	United Nations Development Programme	برنامج الأمم المتحدة للتنمية
UNHCR	United Nations High Commissioner for Refugees	المفوضية العليا للاجئين التابعة للأمم المتحدة
UNICEF	United Nations Children's Fund	صندوق الأمم المتحدة للأطفال

المختصرات والتعريفات

UNODC	United Nations Office of Drugs and Crime	نكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة
UNOPS	United Nations Office for Project Services	مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع
USAID U.S	Agency for International Development	الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
USAID OIG US	Agency for International Development Office of Inspector General	مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
USAI/RIG U.S	Agency for International Development Office of Inspector General	مكتب المفتش العام لدى الوكالة الأميركية للتنمية الدولية
USDA U.S	Department of Agriculture	وزارة الزراعة
USIP U.S	Institute of Peace	معهد السلام
USTDA U.S	Trade and Development Agency	وكالة التجارة والتنمية
VRU	Voter Registration Update	تحديث معلومات تسجيل الناخبين
WB ITF	World Bank Iraq Trust Fund	صندوق ائتمان العراق لدى البنك الدولي
WJO	World Health Organization	منظمة الصحة العالمية
