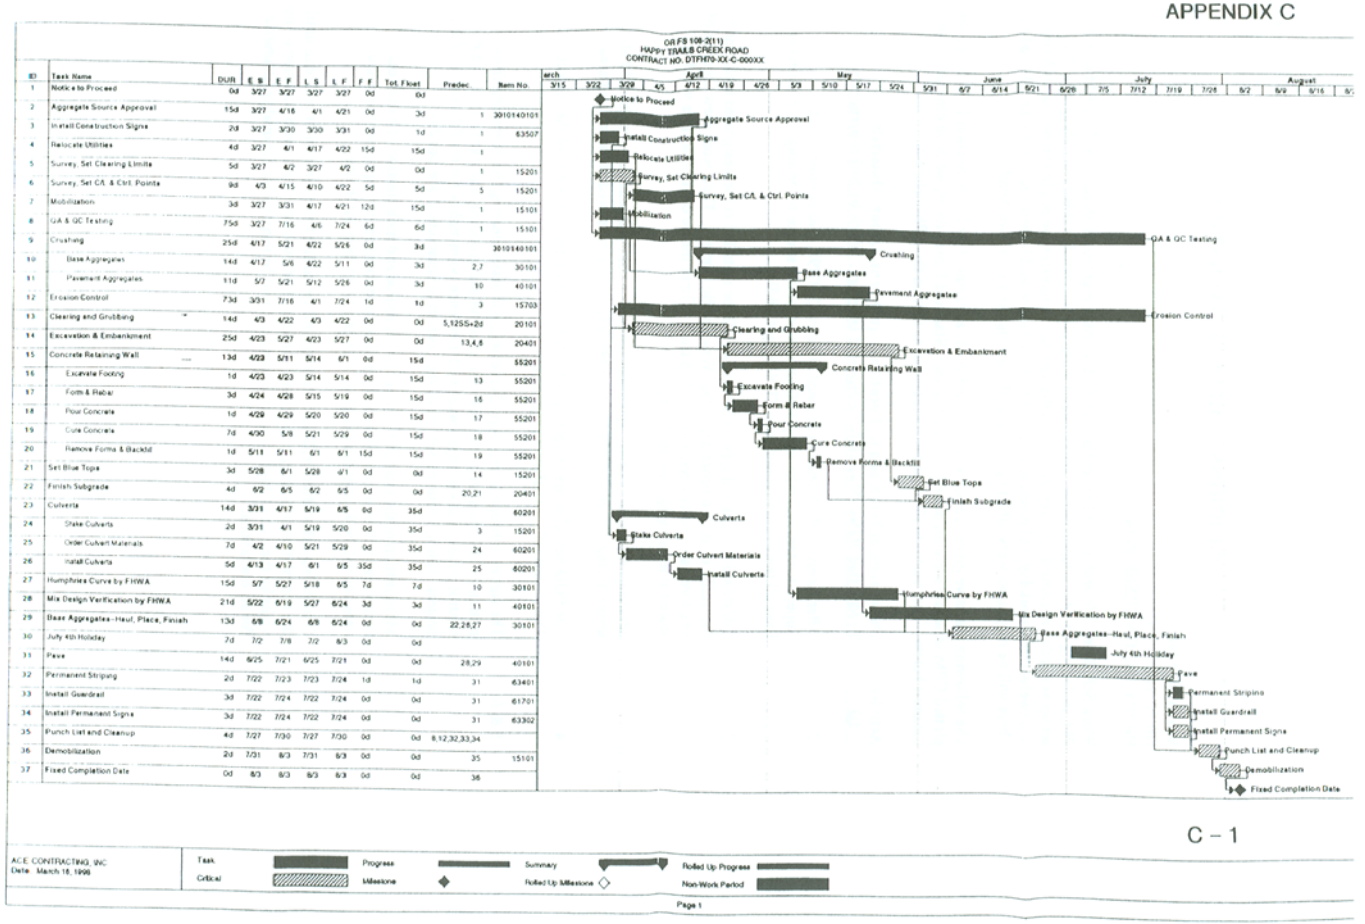


| ID | Task Name | DUR | E S | E F | L S | L F | F F | Tot. Float | Predec. | Item No. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Notice to Proceed | 0d | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 3/27 | 0d | 0d | | |
| 2 | Aggregate Source Approval | 15d | 3/27 | 4/16 | 4/1 | 4/21 | 0d | 3d | 1 | 3010140101 |
| 3 | Install Construction Signs | 2d | 3/27 | 3/30 | 3/30 | 3/31 | 0d | 1d | 1 | 63507 |
| 4 | Relocate Utilities | 4d | 3/27 | 4/1 | 4/17 | 4/22 | 15d | 15d | 1 | |
| 5 | Survey, Set Clearing Limits | 5d | 3/27 | 4/2 | 3/27 | 4/2 | 0d | 0d | 1 | 15201 |
| 6 | Survey, Set CA, & Ctrl. Points | 9d | 4/3 | 4/15 | 4/10 | 4/22 | 5d | 5d | 5 | 15201 |
| 7 | Mobilization | 3d | 3/27 | 3/31 | 4/17 | 4/21 | 12d | 15d | 1 | 15101 |
| 8 | QA & QC Testing | 75d | 3/27 | 7/16 | 4/6 | 7/24 | 6d | 6d | 1 | 15101 |
| 9 | Crushing | 25d | 4/17 | 5/21 | 4/22 | 5/26 | 0d | 3d | | 3010140101 |
| 10 | Base Aggregates | 14d | 4/17 | 5/6 | 4/22 | 5/11 | 0d | 3d | 2,7 | 30101 |
| 11 | Pavement Aggregates | 11d | 5/7 | 5/21 | 5/12 | 5/26 | 0d | 3d | 10 | 40101 |
| 12 | Erosion Control | 73d | 3/31 | 7/16 | 4/1 | 7/24 | 1d | 1d | 3 | 15703 |
| 13 | Clearing and Grubbing | 14d | 4/3 | 4/22 | 4/3 | 4/22 | 0d | 0d | 5,12SS+2d | 20101 |
| 14 | Excavation & Embankment | 25d | 4/23 | 5/27 | 4/23 | 5/27 | 0d | 0d | 13,4,8 | 20401 |
| 15 | Concrete Retaining Wall | 13d | 4/23 | 5/11 | 5/14 | 6/1 | 0d | 15d | | 55201 |
| 16 | Excavate Footing | 1d | 4/23 | 4/23 | 5/14 | 5/14 | 0d | 15d | 13 | 55201 |
| 17 | Form & Rebar | 3d | 4/24 | 4/28 | 5/15 | 5/19 | 0d | 15d | 16 | 55201 |
| 18 | Pour Concrete | 1d | 4/29 | 4/29 | 5/20 | 5/20 | 0d | 15d | 17 | 55201 |
| 19 | Cure Concrete | 7d | 4/30 | 5/8 | 5/21 | 5/29 | 0d | 15d | 18 | 55201 |
| 20 | Remove Forms & Backfill | 1d | 5/11 | 5/11 | 6/1 | 6/1 | 15d | 15d | 19 | 55201 |
| 21 | Set Blue Tops | 3d | 5/28 | 6/1 | 5/28 | d/1 | 0d | 0d | 14 | 15201 |
| 22 | Finish Subgrade | 4d | 6/2 | 6/5 | 6/2 | 6/5 | 0d | 0d | 20,21 | 20401 |
| 23 | Culverts | 14d | 3/31 | 4/17 | 5/19 | 6/5 | 0d | 35d | | 60201 |
| 24 | Stake Culverts | 2d | 3/31 | 4/1 | 5/19 | 5/20 | 0d | 35d | 3 | 15201 |
| 25 | Order Culvert Materials | 7d | 4/2 | 4/10 | 5/21 | 5/29 | 0d | 35d | 24 | 60201 |
| 26 | Install Culverts | 5d | 4/13 | 4/17 | 6/1 | 6/5 | 35d | 35d | 25 | 60201 |
| 27 | Humphries Curve by FHWA | 15d | 5/7 | 5/27 | 5/18 | 6/5 | 7d | 7d | 10 | 30101 |
| 28 | Mix Design Verification by FHWA | 21d | 5/22 | 6/19 | 5/27 | 6/24 | 3d | 3d | 11 | 40101 |
| 29 | Base Aggregates--Haul, Place, Finish | 13d | 6/8 | 6/24 | 6/8 | 6/24 | 0d | 0d | 22,26,27 | 30101 |
| 30 | July 4th Holiday | 7d | 7/2 | 7/8 | 7/2 | 8/3 | 0d | 0d | | |
| 31 | Pave | 14d | 6/25 | 7/21 | 6/25 | 7/21 | 0d | 0d | 28,29 | 40101 |
| 32 | Permanent Striping | 2d | 7/22 | 7/23 | 7/23 | 7/24 | 1d | 1d | 31 | 63401 |
| 33 | Install Guardrail | 3d | 7/22 | 7/24 | 7/22 | 7/24 | 0d | 0d | 31 | 61701 |
| 34 | Install Permanent Signs | 3d | 7/22 | 7/24 | 7/22 | 7/24 | 0d | 0d | 31 | 63302 |
| 35 | Punch List and Cleanup | 4d | 7/27 | 7/30 | 7/27 | 7/30 | 0d | 0d | 8,12,32,33,34 | |
| 36 | Demobilization | 2d | 7/31 | 8/3 | 7/31 | 8/3 | 0d | 0d | 35 | 15101 |
| 37 | Fixed Completion Date | 0d | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 8/3 | 0d | 0d | 36 | |
